

Руководитель
регионального проекта —
Ивлев Олег Валериевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

18.01.2021

Сертификат:

2A85F81016999DE63782F7BF73E13EAA67BEA4C4

Владелец: Ивлев Олег Валериевич

Действителен: с 06.03.2020 по 06.06.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(G5-32) Чистая вода (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Процент	98.3	0	0	0	98.3	98.3	100,00%	Согласно федерального проекта "Чистая вода" показатель является годовым. Значение показателя определяется по истечении периода в соответствии с методикой Роспотребнадзора по КО в апреле 2021 года
2		Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Процент	94	0	0	0	94.9	99.1	100,00%	Согласно федерального проекта "Чистая вода" показатель является годовым. Значение показателя определяется по истечении периода в соответствии с методикой Роспотребнадзора по КО в апреле 2021 года



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений




Сведения не представлены



Прогнозные сведения


3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 108 300,20 тыс. руб

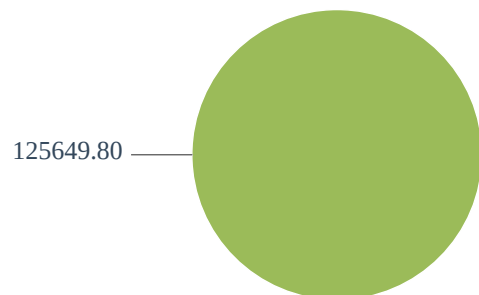


Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 123 541,40 тыс. руб



Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 27 621,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.	151 162,40	170 073,50	170 073,50	170 073,50	170 073,50	112,51	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	123 541,40	142 452,50	142 452,50	142 452,50	142 452,50	100,00	кассовое исполнение на 01.01.2021
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	108 300,20	125 832,10	125 832,10	125 649,80	125 649,80	99,86	кассовое исполнение на 01.01.2021
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	108 300,20	125 832,10	125 832,10	125 649,80	125 649,80	99,86	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	123 541,40	142 452,50	142 452,50	142 452,50	142 452,50	100,00	кассовое исполнение на 01.01.2021
1.2		внебюджетные источники	27 621,00	27 621,00	27 621,00	27 621,00	27 621,00	100,00	кассовое исполнение на 01.01.2021

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			151 162,40	170 073,50	170 073,50	170 073,50	170 073,50	112,51	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			123 541,40	142 452,50	142 452,50	142 452,50	142 452,50	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			108 300,20	125 832,10	125 832,10	125 649,80	125 649,80	99,86	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			108 300,20	125 832,10	125 832,10	125 649,80	125 649,80	99,86	
бюджеты муниципальных образований			123 541,40	142 452,50	142 452,50	142 452,50	142 452,50	100,00	
внебюджетные источники			27 621,00	27 621,00	27 621,00	27 621,00	27 621,00	100,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	
2		Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2024	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Ивлев О. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет Администрация Беловского городского округа от 01.01.2021г. №-, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0.
2.			Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Ивлев О. В.	Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 4 из 4.
2.1.	КРП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	15.02.2020	25.12.2019	Ивлев О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доп соглашение с Минстроем РФ на 2019-2021 годы"

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов				Соглашение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.12.2019г. №069-09-2019-247/1, приложен файл.
2.1.1	РРП		Организовано заключение соглашения с Минстроем России о финансовой поддержке Организовано заключение соглашения с Минстроем России о финансовой поддержке	15.02.2020	25.12.2019	Ивлев О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доп соглашение с Минстроем РФ на 2019-2021 годы" Соглашение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.12.2019г. №069-09-2019-247/1, приложен файл.
2.2.	КРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	01.04.2020	01.04.2020	Ивлев О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения за 2019 год" Отчет Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.04.2020г. №1-цэс/жк-1272, приложен файл. 2. "Сопроводительное письмо в Фонд содействия реформированию ЖКХ" Сводная информация Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 01.04.2020г. №1-цэс/жк-1272, приложен файл.
2.3.	КРП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	15.02.2021	15.02.2021	Ивлев О. В.	В работе. Отсутствие отклонений

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов				
2.3.1	РРП		Организовано заключение соглашений с Минстроем России о финансовой поддержке Организовано заключение соглашений с Минстроем России о финансовой поддержке	15.02.2021	15.02.2021	Ивлев О. В.	В работе. Отсутствие отклонений
2.4.	КРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	01.04.2021	01.04.2021	Ивлев О. В.	В работе. Отсутствие отклонений
2.4.1	РРП		В Кемеровской области реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2020 году В Кемеровской области реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2020 году	31.12.2020	31.12.2020	Ивлев О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия " Отчет Администрации Беловского городского округа от 01.01.2021г. №-, приложен файл. Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия на 01.01.2021г.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек

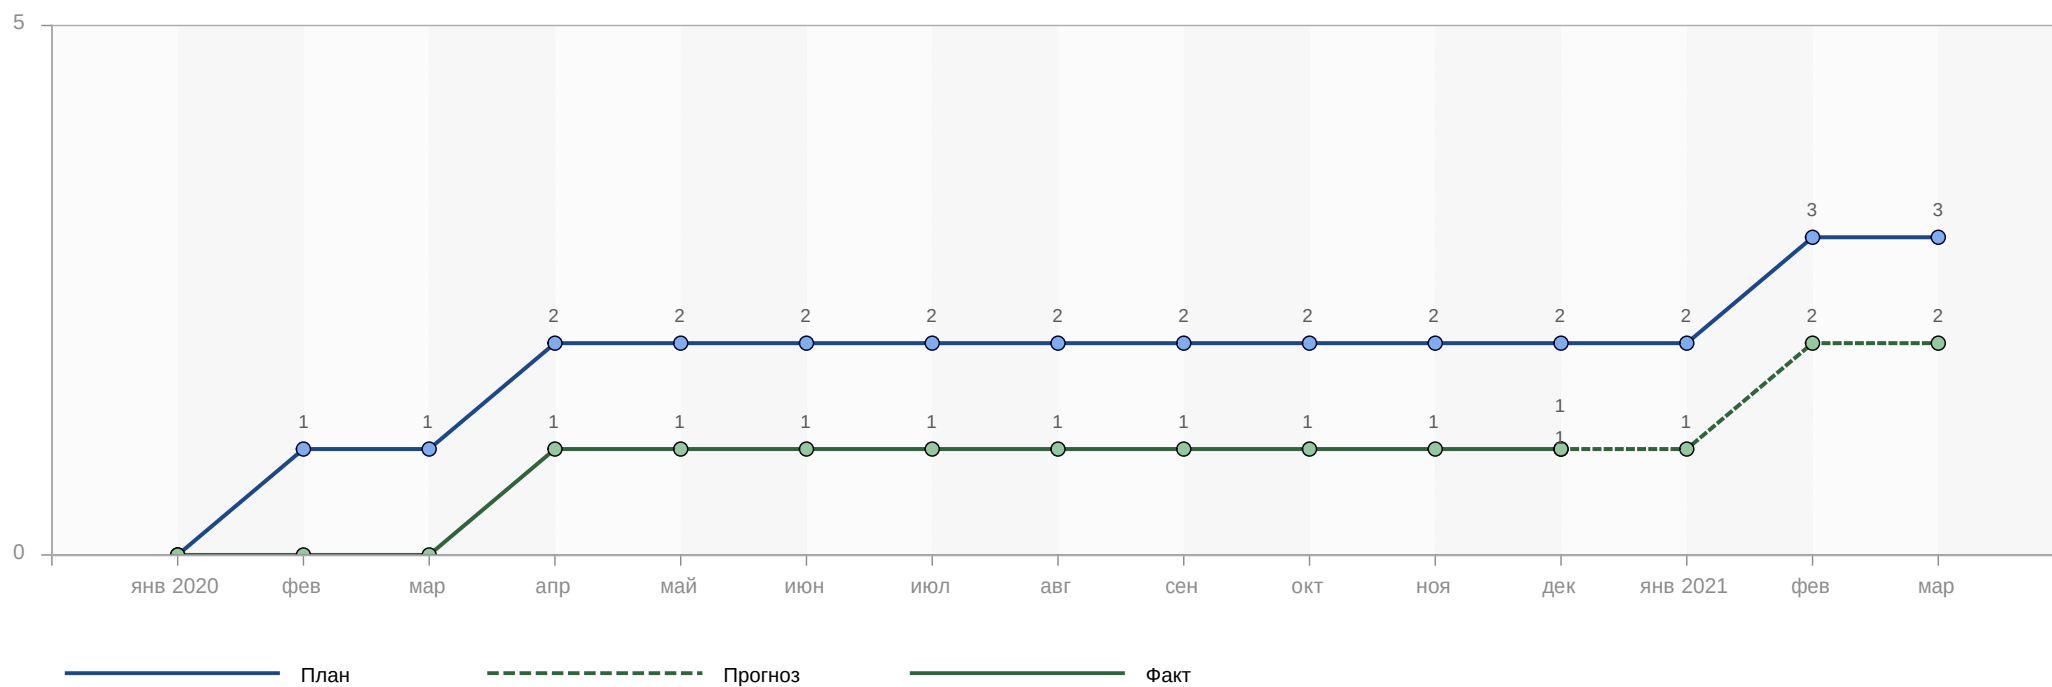


Рис. 1. "(G5-32) Чистая вода (Кемеровская область)"

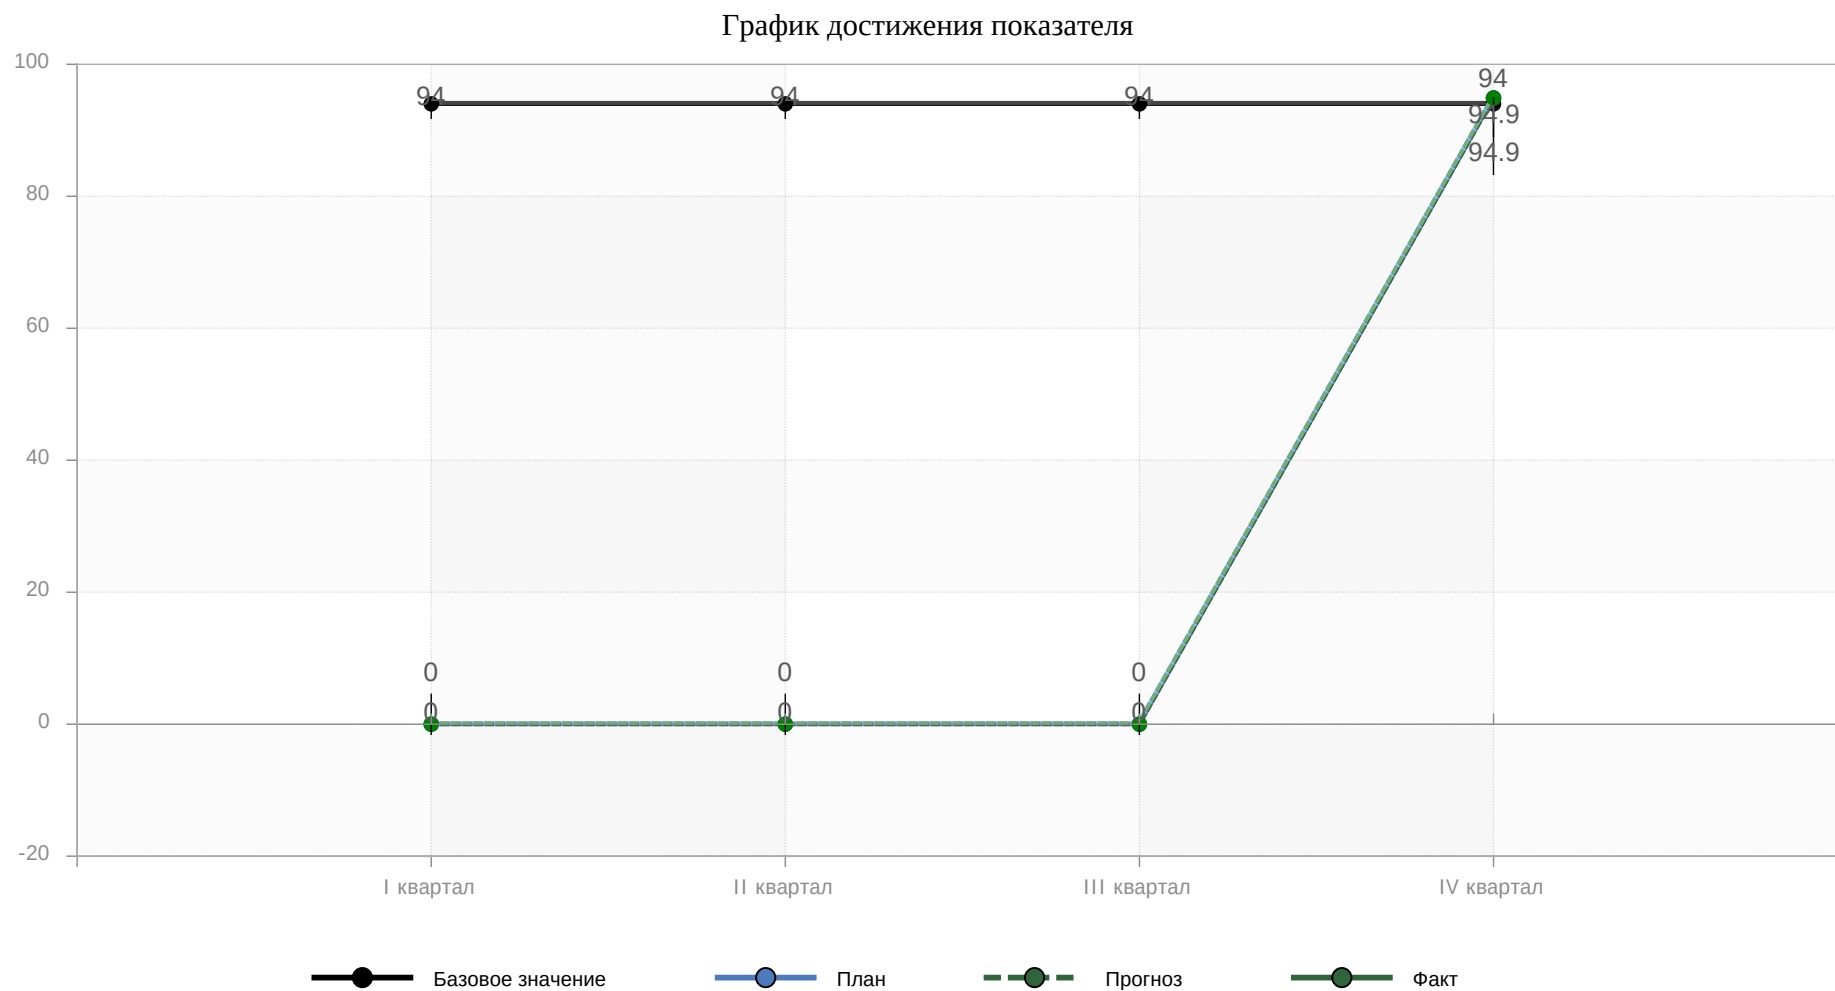


Рис. 1. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Диаграмма достижения показателя

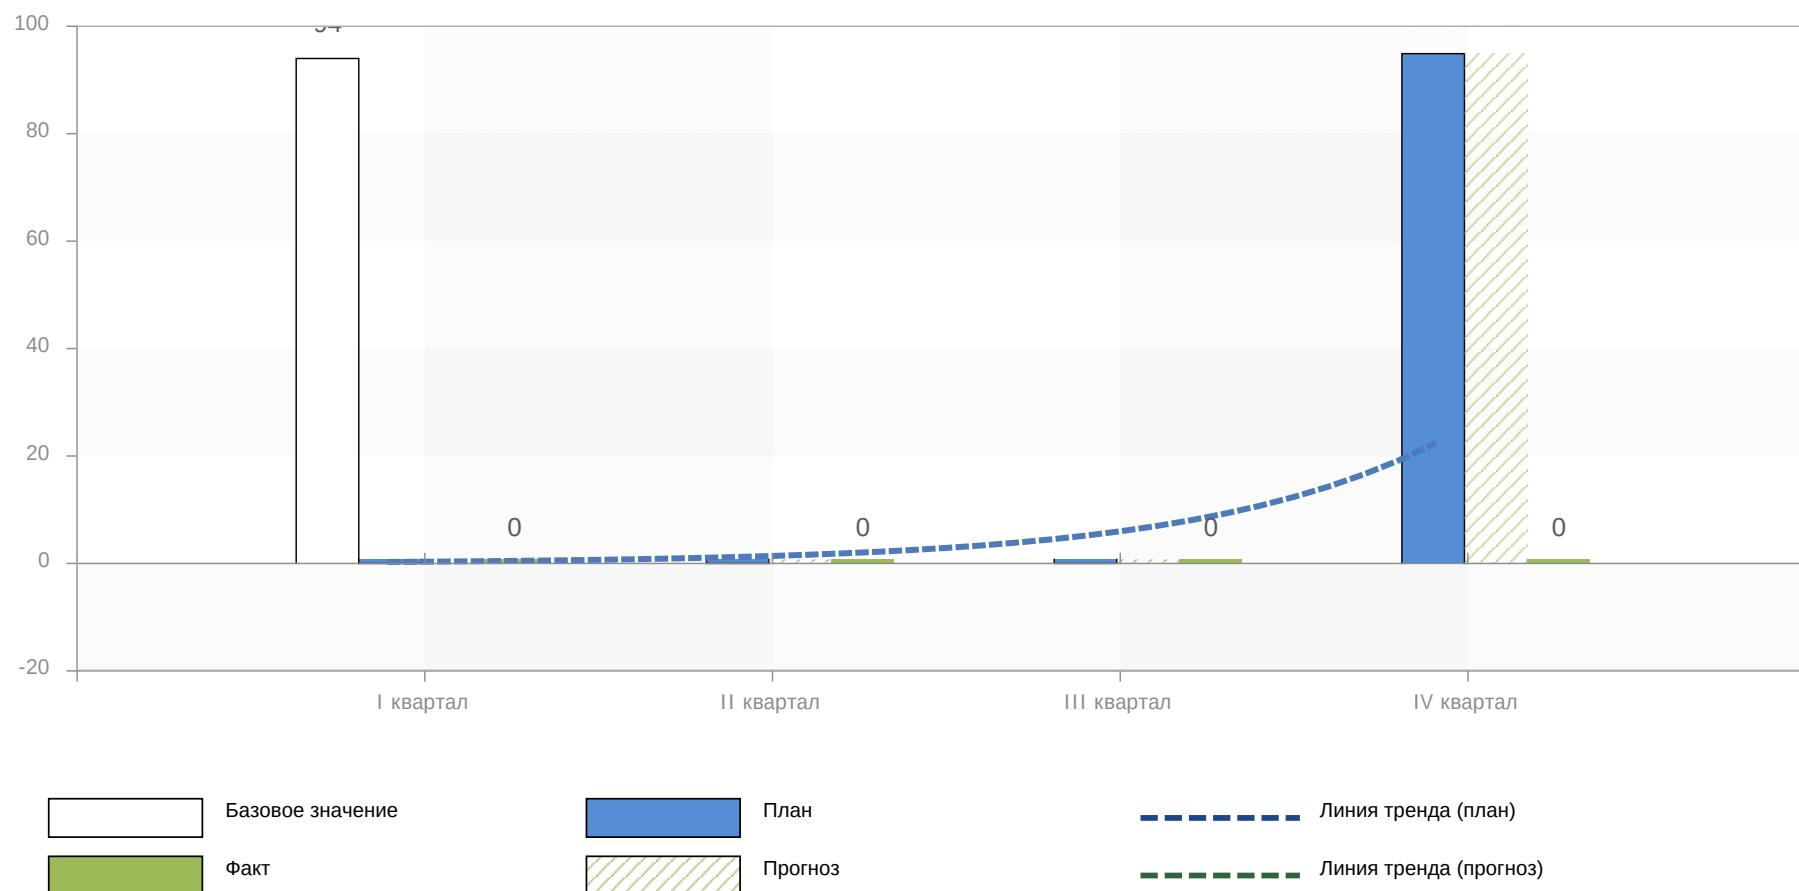


Рис. 2. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

График достижения показателя

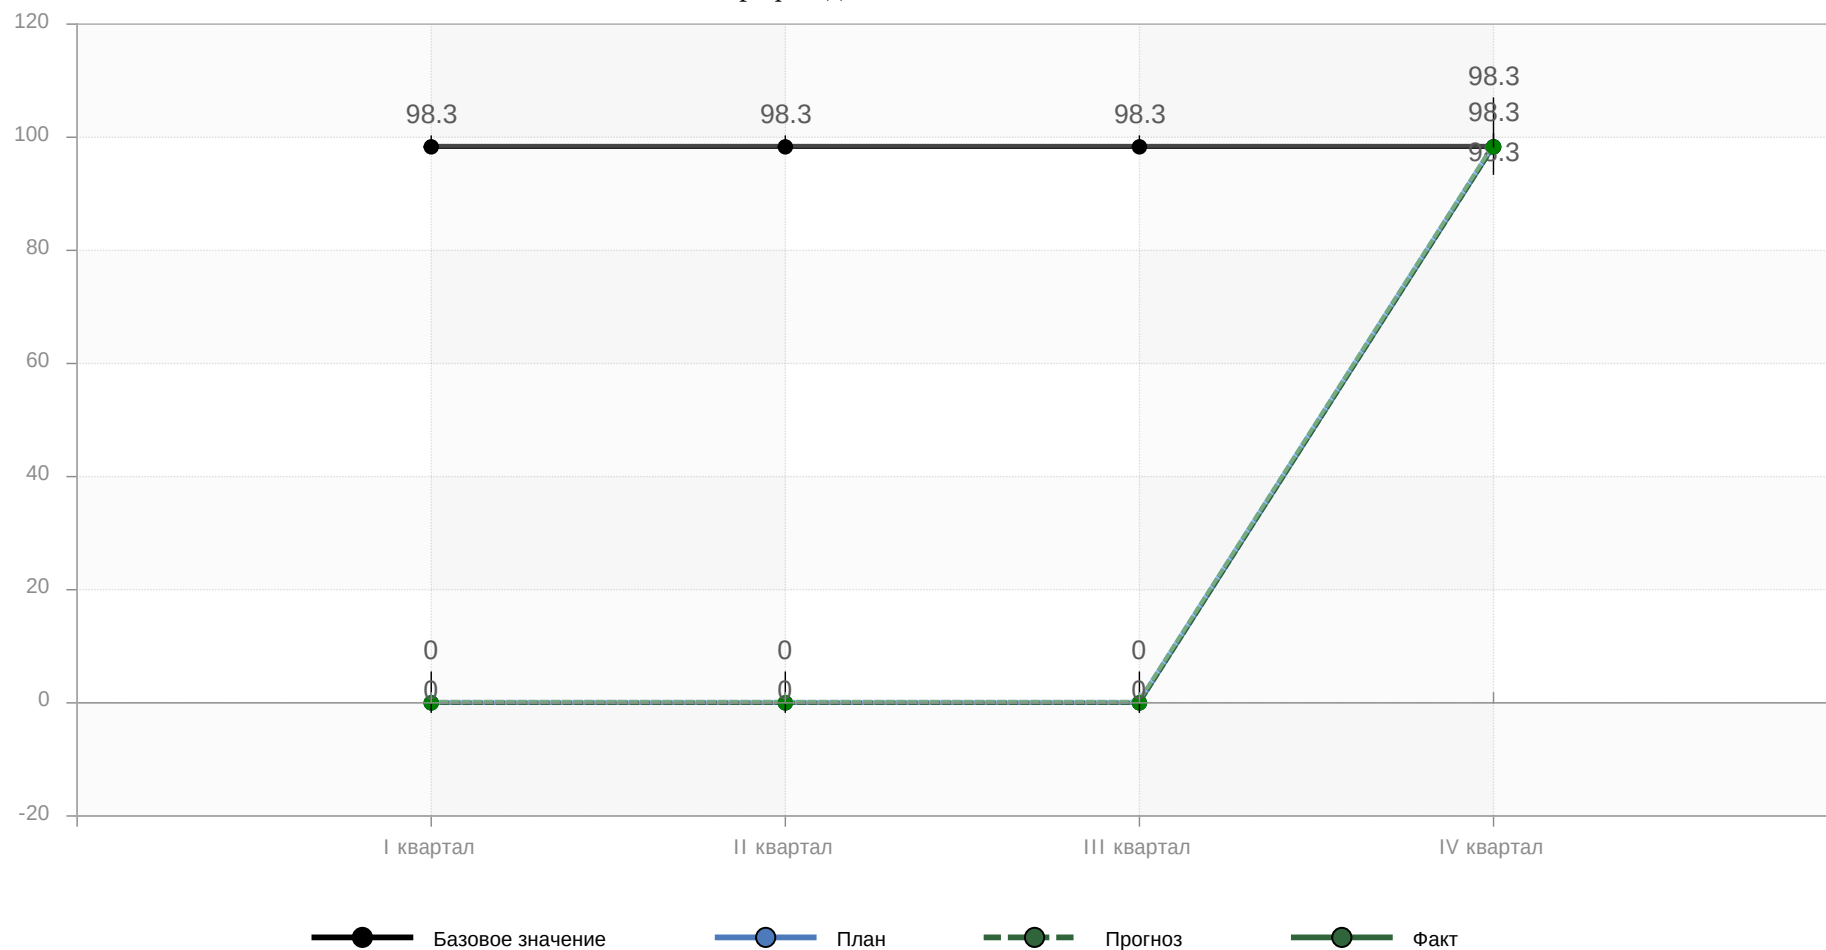


Рис. 3. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Диаграмма достижения показателя

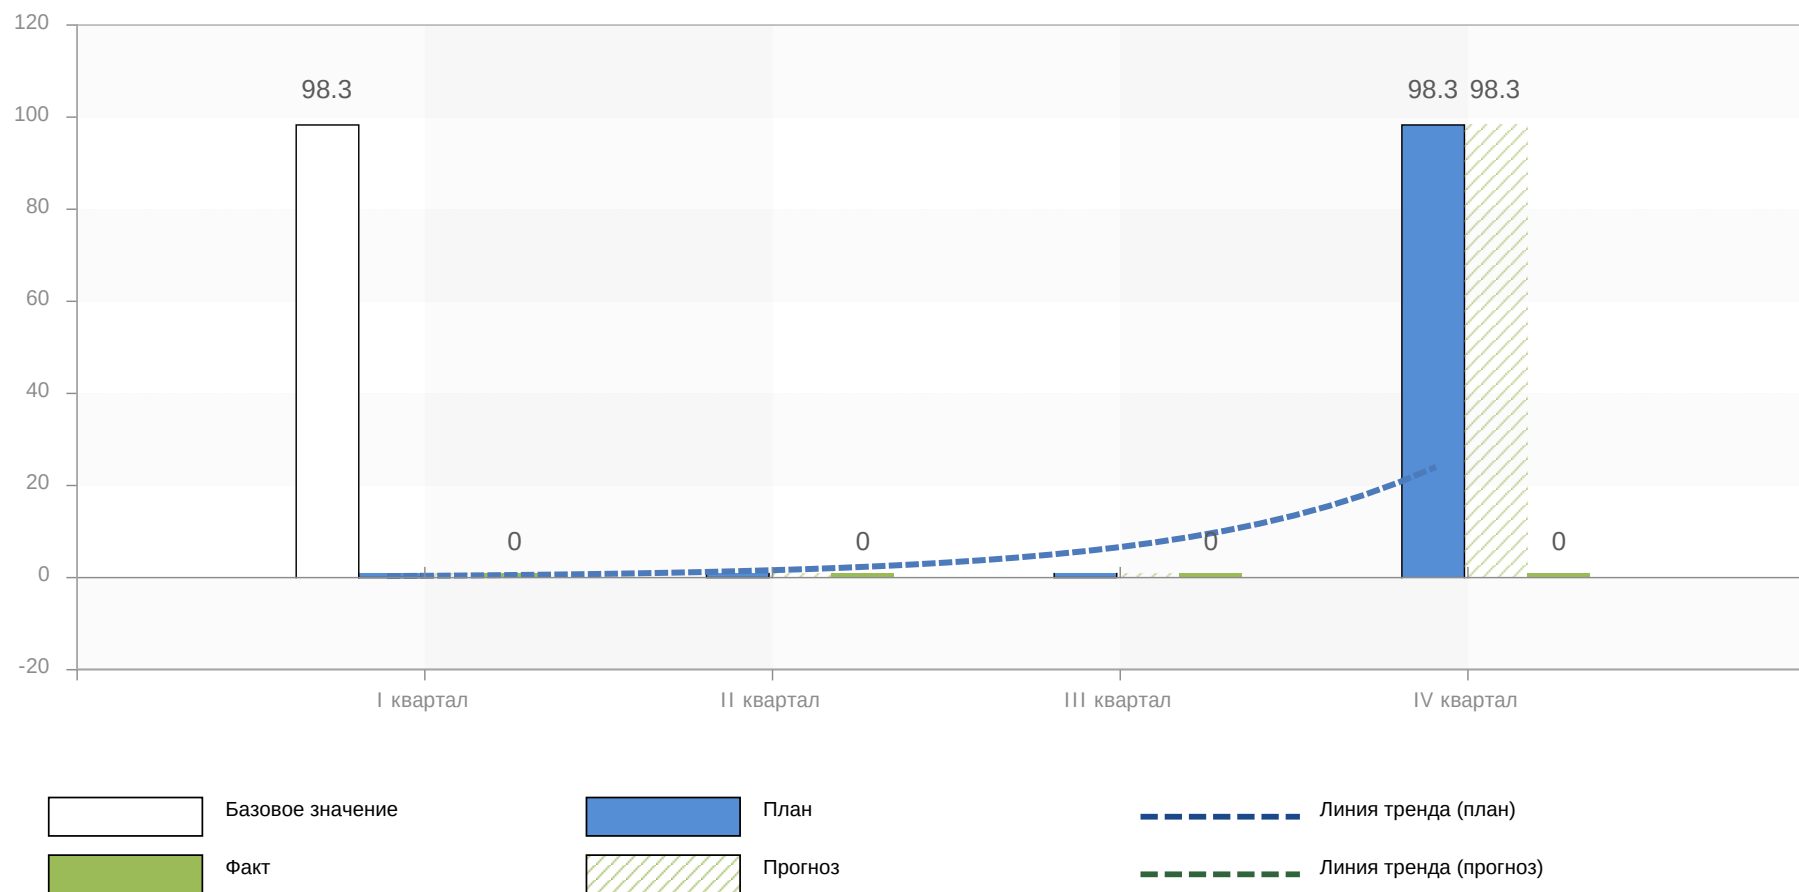


Рис. 4. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
