

Руководитель
регионального проекта —
Печеркина Ирина Александровна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

11.08.2020

Сертификат:
51816F6BBE11363C8203B54450E857DCCB119CF0

Владелец: Печеркина Ирина Александровна

Действителен: с 31.03.2020 по 01.07.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(F1-32) Жилье (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие критических отклонений	Наличие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1		3. Цели и показатели	Невозможность достижения показателя регионального проекта, предусматривающего ввод жилья в 2019 году 1,111 млн. кв. метров., Причина риска: Несоответствие значения показателя регионального проекта "Жилье" на 2019 год значению показателя федерального проекта "Жилье", доведенного Кемеровской области – Кузбассу., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Изменение объема ввода жилья в 2019 году не повлияет на исполнение целевого показателя регионального проекта "Жилье" "Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,515 млн. квадратных метров в год " в 2024 году.	1. Необходимо внесение изменений в соглашение от 01.02.2019 № 069-2019-F10048-1 в части корректировки объема ввода жилья в соответствии с письмами Минстроя России от 21.02.2019 № 6137-ВЯ/07 и 06.09.2019 № 32990-ОК/07., срок исполнения 31.12.2019, Направлено письмо от 25.02.2019 № И12-32/1685 в ответ на запрос Минстроя России от 21.02.2019 № 6137-ВЯ/07 о согласовании детализации по субъектам Российской Федерации значений показателя "Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров" с просьбой утвердить предлагаемый регионом объем ввода жилья: на 2019 год - 0,76 млн. кв. метров, 2020 год - 0,805 млн. кв. метров, на 2021 - 0,85 млн. кв. метров. Повторно направлено письмо от 12.07.2019 №И12-8/5999 на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Н.С. Стасишина о необходимости внесения изменений в соглашение от 01.02.2019 № 069-2019-F10048-1 в части значений показателей объема ввода жилья. Направлено письмо № ДС-04/3050 от 06.11.2019 о сроках изменения значений показателя. Согласно ответу Минстроя России от 10.12.2019 № 47265-ОК/07 корректировка будет возможна после принятия соответствующего решения Президента Российской Федерации.;
2		6. План мероприятий	Предоставление отчета НО "Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области", Причина риска: Несвоевременное предоставление отчета, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 20.01.2020г.	1. Предоставление отчета о расходах и достижениях показателей результативности от НО "Фонд РЖС", срок исполнения 20.01.2020;
3		6. План мероприятий	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу , Причина риска: Несвоевременное предоставление отчета о выполнении соглашения, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 20.01.2020г.	1. Предоставление отчета о расходах и достижениях показателей результативности от НО "Фонд РЖС", срок исполнения 20.01.2020;

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4		6. План мероприятий		
5		6. План мероприятий	Оказание услуги (выполнение работ), Причина риска: Несвоевременное предоставление отчета о расходах, о достижении показателей результативности, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 20.01.2020г.	1. Для подтверждения оказания услуги (выполнения работ) будет предоставлен отчет о расходах, о достижении показателей результативности, срок исполнения 20.01.2020;
6		4. Результаты	Реализация мероприятий, осуществляемых органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса., Причина риска: Несвоевременная реализация мероприятия, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 20.01.2020г.	1. Для реализации мероприятия необходимо будет получение отчета о расходах и достижении показателей результативности от НО "Фонд РЖС" согласно заключенному соглашению о предоставлении из областного бюджета субсидии от 31.05.2019 №1, срок исполнения 20.01.2020;
7		4. Результаты	Невозможность достижения значений результатов регионального проекта, предусматривающего ввод жилья в 2019 году 1,111 млн. кв. метров и в 2020 году 1,237 млн. кв. метров., Причина риска: Несоответствие значений результатов регионального проекта "Жилье" на 2019-2020 годы значению результата федерального проекта "Жилье", доведенного Кемеровской области – Кузбассу., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Изменение объема ввода жилья в 2019-2020 годах не повлияет на исполнение целевого показателя регионального проекта "Жилье" "Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,515 млн. квадратных метров в год " в 2024 году.	1. Необходимо внесение изменений в соглашение от 01.02.2019 № 069-2019-F10048-1 в части корректировки объема ввода жилья в соответствии с письмами Минстроя России от 21.02.2019 № 6137-ВЯ/07 и 06.09.2019 № 32990-ОК/07., срок исполнения 31.12.2019, Направлено письмо от 25.02.2019 № И12-32/1685 в ответ на запрос Минстроя России от 21.02.2019 № 6137-ВЯ/07 о согласовании детализации по субъектам Российской Федерации значений показателя "Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров" с просьбой утвердить предлагаемый регионом объем ввода жилья: на 2019 год - 0,76 млн. кв. метров, 2020 год - 0,805 млн. кв. метров, на 2021 - 0,85 млн. кв. метров. Повторно направлено письмо от 12.07.2019 №И12-8/5999 на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Н.С. Стаशिшина о необходимости внесения изменений в соглашение от 01.02.2019 № 069-2019-F10048-1 в части значений показателей объема ввода жилья. Направлено письмо № ДС-04/3050 от 06.11.2019 о сроках изменения значений показателя. Согласно ответу Минстроя России от 10.12.2019 № 47265-ОК/07 корректировка будет возможна после принятия соответствующего решения Президента Российской Федерации

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

				Федерации.;
8		6. План мероприятий	Перенос срока получения разрешения уполномоченного органа местного самоуправления на ввод объекта в эксплуатацию, Причина риска: Устранение замечаний, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.03.2020г.	1. Получение разрешения уполномоченного органа местного самоуправления на ввод объекта в эксплуатацию после получения заключения инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области , срок исполнения 31.03.2020;
9		6. План мероприятий	Перенос срока ввода объекта в эксплуатацию, Причина риска: Устранение замечаний, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.03.2020г.	1. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после получения заключения инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области , срок исполнения 31.03.2020;
10		6. План мероприятий	Перенос срока получения заключения инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области, Причина риска: Подана заявка в конце декабря 2019 года., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.02.2020г.	1. Провести итоговую проверку объекта, срок исполнения 01.02.2020;
11		6. План мероприятий	Перенос срока получения заключения органа государственного строительного надзора , Причина риска: Подана заявка в конце декабря 2019 года., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.02.2020г.	1. Провести итоговую проверку объекта, срок исполнения 01.02.2020;
12		4. Результаты	Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства., Причина риска: Несвоевременная реализация проектов по развитию территорий, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.03.2020г.	1. Для реализации проекта по развитию территорий необходимо получить разрешение уполномоченного органа местного самоуправления на ввод объекта в эксплуатацию, срок исполнения 31.03.2020;
13		3. Цели и показатели	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, га, Причина риска: Расчет значения показателя выполнен до утверждения методики Минстроем России (утверждена в апреле 2019 года) . В значение показателя включены все земельные участки, на которых запланировано строительство жилья., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Не влияет на целевой показатель регионального проекта.	1. В связи с завершением отчетного 2019 года данное значение показателя не переносится на следующий период, т.к. в 2020 году будет новое плановое значение показателя, срок исполнения 31.12.2019;
14		3. Цели и показатели	Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства, дни, Причина риска: Утвержденный регламент содержит срок 45 дней, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Не влияет на достижение целевого показателя в 2024 году	1. Завершение отчетного 2019 года. В 2020 году будет новое значение показателя. Разработка и утверждение регламента будет осуществлена при новом значении показателя в 2020 году., срок исполнения 31.12.2019;
15		3. Цели и показатели	Средняя стоимость одного квадратного метра модельного жилья на первичном рынке, тыс. рублей, Причина риска: Пониженная стоимость 1 кв.м. жилья относительно плановой, Вероятность: 100%, Последствия	1. Показатель не переносится на последующий период в связи с завершением отчетного 2019 года., срок исполнения 31.12.2019;

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

			наступления: Сутовые: Отклонение не является критическим	
16		3. Цели и показатели	Невыполнение планового показателя ввода жилья в многоквартирных жилых домах, Причина риска: Перенос ввода части домов, планируемых к вводу на 2020 год в связи с изменением законодательства в долевом строительстве жилья (переход на проектное финансирование с использованием счетов эскроу)., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутовые: Снижение общего объема ввода жилья	1. Невыполнение планового показателя ввода жилья в многоквартирных жилых домах в связи с завершением отчетного 2019 года, срок исполнения 31.12.2019;
17		6. План мероприятий	Опубликование документа, Причина риска: Документ не опубликован в установленный срок. Длительное согласование проекта документа, связанное с возвратом на доработку. Наличие неурегулированных разногласий., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2020г.	1. Устранить замечания. Урегулировать разногласия., срок исполнения 31.01.2020, Наличие не критических отклонений. Документ разработан и готовится к подписанию и опубликованию в установленном порядке.;
18		6. План мероприятий	Проведение актуализации плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование", утвержденного распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.02.2017 № 95-р с продлением до 2021 года., Причина риска: Документ не опубликован в установленный срок. Длительное согласование проекта документа, связанное с возвратом на доработку. Наличие неурегулированных разногласий., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2020г.	1. Устранить замечания. Урегулировать разногласия., срок исполнения 31.01.2020, Наличие не критических отклонений. Документ разработан и готовится к подписанию и опубликованию в установленном порядке.;

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Объем жилищного строительства	Миллион квадратных метров	1	0.0646	0.2444	0.3978	0.7658	1.111	68,93%	Подтверждающие документы: 1. "Экспресс-информация "О жилищном строительстве"" Иное Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Невозможность достижения показателя регионального проекта, предусматривающего ввод жилья в 2019 году 1,111 млн. кв. метров., Причина риска: Несоответствие значения показателя регионального проекта "Жилье" на 2019 год значению показателя федерального проекта "Жилье", доведенного Кемеровской области – Кузбассу., Вероятность: 100%, Сутевые: Изменение объема ввода жилья в 2019 году не повлияет на исполнение целевого показателя регионального проекта "Жилье" "Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,515 млн. квадратных метров в год " в 2024 году. Предлагаемые решения: 1. Необходимо внесение изменений в соглашение от 01.02.2019 № 069-2019-F10048-1 в части корректировки объема ввода жилья в соответствии с письмами Минстроя России от 21.02.2019 № 6137-ВЯ/07 и 06.09.2019 № 32990-ОК/07., срок исполнения 31.12.2019, Направлено письмо от 25.02.2019 № И12-32/1685 в ответ на запрос Минстроя России от 21.02.2019 № 6137-ВЯ/07 о согласовании детализации по субъектам Российской Федерации значений показателя "Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров" с просьбой утвердить предлагаемый регионом объем ввода жилья: на 2019 год - 0,76 млн. кв.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
											метров, 2020 год - 0,805 млн. кв. метров, на 2021 - 0,85 млн. кв. метров. Повторно направлено письмо от 12.07.2019 №И12-8/5999 на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Н.С. Стасишина о необходимости внесения изменений в соглашение от 01.02.2019 № 069-2019-F10048-1 в части значений показателей объема ввода жилья. Направлено письмо № ДС-04/3050 от 06.11.2019 о сроках изменения значений показателя. Согласно ответу Минстроя России от 10.12.2019 № 47265-ОК/07 корректировка будет возможна после принятия соответствующего решения Президента Российской Федерации..Завершение отчетного 2019 года
2		Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Миллион квадратных метров	0.17	0	0.032	0.046	0.112	0.0818	136,92%	Подтверждающие документы:1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Администрация города Кемерово от 29.11.2019г. №42-305-62-2019 , приложен файл.2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Администрация города Кемерово от 26.11.2019г. №42-305-57-2019 , приложен файл.3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Администрация города Кемерово от 26.11.2019г. №42-305-58-2019 , приложен файл.4. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Администрация города Кемерово от 24.12.2019г. №42-305-67-2019 , приложен файл.5. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Администрация города Кемерово от 29.04.2019г. №42-305-14-2019 , приложен файл.6. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Администрация города Кемерово от 30.09.2019г. №42-305-47-2019 , приложен файл.7. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Администрация города Кемерово от 19.12.2019г. №42-305-65-2019 , приложен файл.8. "Разрешение на ввод

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
											объекта в эксплуатацию" Администрация города Кемерово от 30.04.2019г. №42-305-15-2019 , приложен файл.9. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Администрация города Кемерово от 30.12.2019г. №42-305-74-2019 , приложен файл.10. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Администрация города Кемерово от 15.07.2019г. №42-305-28-2019 , приложен файл.
3		Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах	Миллион квадратных метров	0.456	0	0.1	0.154	0.326	0.35	93,14%	Подтверждающие документы:1. "Мониторинг ввода жилья в 2019 году" Иное Департамента строительства Кемеровской области от г. №, приложен файл.Существует риск:Невыполнение планового показателя ввода жилья в многоквартирных жилых домах, Причина риска: Перенос ввода части домов, планируемых к вводу на 2020 год в связи с изменением законодательства в долевом строительстве жилья (переход на проектное финансирование с использованием счетов эскроу)., Вероятность: 100%, Судебные: Снижение общего объема ввода жильяПредлагаемые решения:1. Невыполнение планового показателя ввода жилья в многоквартирных жилых домах в связи с завершением отчетного 2019 года, срок исполнения 31.12.2019.Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса.
4		Объем многоквартирного жилья в стадии строительства	Миллион квадратных метров	0.866	0.963	1.2356	1.081	1.0268	0.9	114,09%	Подтверждающие документы:1. "Справка" департамента строительства Кемеровской области от 31.12.2019г. №6/н, приложен файл.Справка составлена по оперативным данным органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
5		Объем ввода жилья, построенного населением	Миллион квадратных метров	0.544	0.064	0.144	0.2433	0.4432	0.41	108,10%	Подтверждающие документы:1. "Экспресс-информация "О построенных населением жилых домах"" Иное Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
6		Средняя стоимость одного квадратного метра модельного жилья на первичном рынке	Тысяча рублей	39.536	0	0	0	45.9	48.31	95,01%	Подтверждающие документы:1. "Отчет "Цены на рынке жилья"" Росстата от 10.01.2020г. №б/н, приложен файл.Существует риск:Средняя стоимость одного квадратного метра модельного жилья на первичном рынке, Причина риска: Пониженная стоимость 1 кв.м. жилья относительно плановой, Вероятность: 100%, Сутовые: Отклонение не является критическимПредлагаемые решения:1. Показатель не переносится на последующий период в связи с завершением отчетного 2019 года., срок исполнения 31.12.2019.Оперативные данные, рассчитанные департаментом строительства Кемеровской области - 45,9 тыс. рублей за 1 кв. метр жилья на основании данных Росстата "Цены на рынке жилья". Показатель формируется с годовой периодичностью.
7		Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию	Сутки	7	0	0	0	5	5	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Письмо об исполнении показателей регионального проекта "Жилье"" главного управления архитектуры и градостроительства Кемеровской области от 31.12.2019г. №01-11/1-2314, приложен файл.Сводный показатель по оперативным данным органов местного самоуправления (по разрешениям на строительство4,64 дня, по разрешениям на ввод объекта в эксплуатацию - 5 дней).
8		Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных	Сутки	45	0	0	0	45	30	150,00%	Подтверждающие документы:1. "О выполнении показателей регионального проекта "Жилье"" Иное Главного управления

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
		изысканий для объектов жилищного строительства									архитектуры и градостроительства Кемеровской области от 31.12.2019г. №01-11/1-2314, приложен файл. Существует риск: Недостижение показателя в 2019 году, Причина риска: Утвержденный регламент содержит срок 45 дней, Вероятность: 100%, Сутевые: Не влияет на достижение целевого показателя в 2024 году Предлагаемые решения: 1. Завершение отчетного 2019 года. В 2020 году будет новое значение показателя. Разработка и утверждение регламента будет осуществлена при новом значении показателя в 2020 году., срок исполнения 31.12.2019. Действующий регламент содержит срок 45 дней. Изменение регламента по новому значению показателя будет утверждаться в 2020 году. В связи с завершением отчетного периода данное значение показателя не переносится.
9		Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства	Тысяча гектаров	1.9873	0	0	0	0.5084	1.037	49,03%	Подтверждающие документы: 1. "Сводная информация о площади земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства" департамента строительства Кемеровской области от г. №, приложен файл. Существует риск: Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства., Причина риска: Расчет значения показателя выполнен до утверждения методики Минстроем России (утверждена в апреле 2019 года). В значение показателя включены все земельные участки, на которых запланировано строительство жилья., Вероятность: 100%, Сутевые: Не влияет на целевой показатель регионального проекта. Предлагаемые решения: 1. В связи с завершением отчетного 2019 года данное значение показателя не переносится на следующий период, т.к. в 2020 году будет новое плановое значение показателя, срок исполнения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
											31.12.2019.Оперативные данные органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса.

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Внебюджетные источники
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства.	662 016,73	662 016,73	662 016,73	662 016,73	570 315,91	86,15	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	662 016,73	662 016,73	662 016,73	662 016,73	570 315,91	86,15	Выполнено. Потребность отсутствует.
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	662 016,73	662 016,73	662 016,73	662 016,73	570 315,91	86,15	Выполнено. Потребность отсутствует.
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	662 016,73	662 016,73	662 016,73	662 016,73	570 315,91	86,15	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	662 016,73	662 016,73	662 016,73	662 016,73	570 315,91	86,15	выполнено. Потребность отсутствует.
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(06) Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса.	1 186 586,01	1 186 586,00	1 186 586,00	1 044 061,68	1 044 061,68	87,99	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 186 586,01	1 186 586,00	1 186 586,00	1 044 061,68	1 044 061,68	87,99	Неосвоение бюджетных средств связано с отсутствием потребности в перечислении средств по заключенным договорам
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 186 586,01	1 186 586,00	1 186 586,00	1 044 061,68	1 044 061,68	87,99	Неосвоение бюджетных средств связано с отсутствием потребности в перечислении средств по заключенным договорам
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 848 602,74	1 848 602,73	1 848 602,73	1 706 078,41	1 614 377,59	87,33	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 848 602,74	1 848 602,73	1 848 602,73	1 706 078,41	1 614 377,59	87,33	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 848 602,74	1 848 602,73	1 848 602,73	1 706 078,41	1 614 377,59	87,33	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			662 016,73	662 016,73	662 016,73	662 016,73	570 315,91	86,15	
бюджеты муниципальных образований			662 016,73	662 016,73	662 016,73	662 016,73	570 315,91	86,15	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Принято решение об участии в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. Сформирован перечень проектов жилищного строительства и объектов капитального строительства (мероприятий) муниципальных образований для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2019	
2		Принято решение об участии в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. Сформирован перечень проектов жилищного строительства и объектов капитального строительства (мероприятий) муниципальных образований для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2020	
3		Направлена заявка в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о выделении средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса". Значение: 1,0000 Дата: 10.07.2019	
4		Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства. Значение: 2,0000 Дата: 20.01.2020	
5		Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства. Значение: 1,0000 Дата: 20.01.2021	
6		Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации Значение: 1,1110 Дата: 31.12.2019	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
7		Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации Значение: 1,2370 Дата: 31.12.2020	
8		Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса. Значение: 400,0000 Дата: 31.12.2019	 
9		Обеспечено достижение целевых показателей , предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Принято решение об участии в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. Сформирован перечень проектов жилищного строительства и объектов капитального строительства (мероприятий) муниципальных образований для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации Значение: 1, на дату 01.07.2019	01.07.2019	25.06.2019	Печеркина И. А.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания комиссии департамента строительства Кемеровской области по отбору муниципальных образований Кемеровской области и объектов для включения в перечень подпрограмм государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2020 год, а также для отбора муниципальных образований Кемеровской области для участия в мероприятиях государственных программ Российской Федерации" комиссии департамента строительства Кемеровской области от 31.05.2019г. №5, приложен файл. 2. "Протокол заседания комиссии департамента строительства Кемеровской области по отбору муниципальных образований Кемеровской области и объектов для включения в перечень подпрограмм государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2020 год, а также для отбора муниципальных образований Кемеровской области для участия в мероприятиях государственных программ Российской Федерации" комиссии департамента строительства Кемеровской области от 25.06.2019г. №9, приложен файл. Протоколом №9 от 25.06.2019 внесены изменения в поток №5 от 31.05.2019 Информация по результату: В работе.
1.1.	ПК		Проведено исследование по вопросу	31.03.2019	31.03.2019	Костякова О. В.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			формирования и (или) тематике документа				Подтверждающие документы: 1. "Заявка на участие в мв мероприятии «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2021 годы" Заявка администрации города Кемерово от 28.03.2019г. №01-17/552, приложен файл. 2. "Заявка на участие в мероприятии «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2021 годы" Заявка администрации Беловского городского округа от 22.03.2019г. №И1271-16, приложен файл. 3. "Заявка на участие в мероприятии «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2021 годы" Заявка администрации Промышленновского муниципального района от 28.03.2019г. №б/н, приложен файл.
1.1.1	РРП		Формирование и направление на рассмотрение заявок муниципальных образований на участие в мероприятии "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса".	31.03.2019	31.03.2019	Максименко Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Заявка на участие в мероприятии "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014-2021 годы"" Заявка администрации Промышленновского муниципального района от 28.03.2019г. №б/н, приложен файл. 2. ""Заявка на участие в мероприятии "Стимулирование

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014-2021 годы" " Заявка администрации Беловского городского округа от 22.03.2019г. №И 1271-16, приложен файл. 3. ""Заявка на участие в мероприятии "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014-2021 годы" " Заявка администрации города Кемерово от 28.03.2019г. №01-17/552, приложен файл.
1.2.	ПК		Документ разработан	31.05.2019	31.05.2019	Костякова О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания комиссии департамента строительства Кемеровской области по отбору муниципальных образований Кемеровской области и объектов для включения в перечень подпрограмм государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2020 год, а также для отбора муниципальных образований Кемеровской области для участия в мероприятиях государственных программ Российской Федерации" Протокол Комиссии департамента строительства Кемеровской области от 31.05.2019г. №5, приложен файл. Протоколом №9 от 25.06.2019 внесены изменения.
1.2.1	РРП		Проведение отбора заявок муниципальных образований на участие в мероприятии "Стимулирование программ развития жилищного	31.05.2019	31.05.2019	Максименко Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания комиссии департамента

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			строительства субъектов Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса".				строительства Кемеровской области по отбору муниципальных образований Кемеровской области и объектов для включения в перечень подпрограмм государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2020 год, а также для отбора муниципальных образований Кемеровской области для участия в мероприятиях государственных программ Российской Федерации" Протокол комиссии департамента строительства Кемеровской области от 31.05.2019г. №5, приложен файл. Протоколом №9 от 25.06.2019 внесены изменения.
1.3.	ПК		Документ утвержден (подписан)	01.07.2019	25.06.2019	Костякова О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания комиссии департамента строительства Кемеровской области по отбору муниципальных образований Кемеровской области и объектов для включения в перечень подпрограмм государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2020 год, а также для отбора муниципальных образований Кемеровской области для участия в мероприятиях государственных программ Российской Федерации " Протокол департамента строительства Кемеровской области от 31.05.2019г. №5, приложен файл. 2. "Протокол заседания комиссии департамента строительства Кемеровской области по отбору муниципальных образований Кемеровской области и объектов для включения в перечень подпрограмм государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2020 год, а также для отбора муниципальных

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							образований Кемеровской области для участия в мероприятиях государственных программ Российской Федерации" комиссии департамента строительства Кемеровской области от 25.06.2019г. №9, приложен файл. Протоколом №9 от 25.06.2019 внесены изменения в протокол №5 от 31.05.2019
1.3.1	РРП		Утверждение протокола отбора заявок муниципальных образований на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса".	01.07.2019	31.05.2019	Максименко Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания комиссии департамента строительства Кемеровской области по отбору муниципальных образований Кемеровской области и объектов для включения в перечень подпрограмм государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2020 год, а также для отбора муниципальных образований Кемеровской области для участия в мероприятиях государственных программ Российской Федерации" Протокол департамента строительства Кемеровской области от 31.05.2019г. №5, приложен файл. Протоколом №9 от 25.06.2019 внесены изменения в протокол №5 от 31.05.2019
2.			Принято решение об участии в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. Сформирован перечень проектов жилищного строительства и объектов капитального строительства (мероприятий) муниципальных образований для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития	01.07.2020	01.07.2020	Печеркина И. А.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>жилищного строительства субъектов Российской Федерации Значение: 1, на дату 01.07.2020</i>				
2.1.	ПК		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	31.03.2020	31.03.2020	Костякова О. В.	В работе.
2.1.1	РРП		Формирование и направление на рассмотрение заявок муниципальных образований для участия в мероприятии "Стимулирование программ развития жилищного строительства в субъектах Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса".	31.03.2020	31.03.2020	Максименко Н. В.	В работе.
3.			Направлена заявка в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о выделении средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса". Значение: 1, на дату 10.07.2019	10.07.2019	25.06.2019	Печеркина И. А.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на участие в федеральном проекте "Жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"" Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.06.2019г. №И 12-32/5396, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
3.1.	ПК		Документ разработан	07.07.2019	25.06.2019	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на участие в федеральном проекте "Жилье"

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.06.2019г. №И 12-32/5396, приложен файл.
3.1.1	РРП		Подготовка заявки на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».	07.07.2019	25.06.2019	Максименко Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на участие в федеральном проекте "Жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" " Заявка Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.06.2019г. №И 12-32/5396, приложен файл.
3.2.	ПК		Документ утвержден (подписан)	10.07.2019	25.06.2019	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на участие в федеральном проекте "Жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" " Правительству Кемеровской области - Кузбасса от 25.06.2019г. №И 12-32/5396, приложен файл.
3.2.1	РРП		Подписание заявки Кемеровской области на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и	10.07.2019	25.06.2019	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на участие в федеральном проекте "Жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" Правительством Кузбасса.				федерации"" Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.06.2019г. №И 12-32/5396, приложен файл.
4.			<i>Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства. Значение: 2, на дату 20.01.2020</i>	20.01.2020	31.03.2020	Печеркина И. А.	Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства., Причина риска: Несвоевременная реализация проектов по развитию территорий, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2020г. Предлагаемые решения: 1. Для реализации проекта по развитию территорий необходимо получить разрешение уполномоченного органа местного самоуправления на ввод объекта в эксплуатацию, срок исполнения 31.03.2020. Отклонения отсутствуют. Просрочка 71 день. Предоставлена информация : 0 из 2. Информация по результату: Существует риск: перенос срока получения заключения органа государственного строительного надзора, Причина риска: Сдвиг сроков завершения строительных работ в связи с двукратным проведением конкурсных процедур по определению подрядной организации (отсутствие заявок при первом проведении конкурсных процедур)., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2019г. Предлагаемые решения:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							1. Провести итоговую проверку в декабре 2019 года., срок исполнения 30.12.2019.
4.1.	ПК		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	30.04.2019	02.04.2019	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение между департаментом строительства Кемеровской области и администрацией города Кемерово о предоставлении в 2019 году субсидии бюджету города Кемерово на реализацию мероприятия "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014-2021 годы" Соглашение департамента строительства Кемеровской области и администрации города Кемерово от 02.04.2019г. №32701000-1-2019-003 , приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.02.2019г. №069-09-2019-108 , приложен файл.
4.1.1	РПП		Заключение соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении Кемеровской области-Кузбассу субсидии федерального бюджета на реализацию мероприятия "Региональный проект "Жилье", в том числе мероприятие по стимулированию программ развития жилищного	28.02.2019	12.02.2019	Максименко Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.02.2019г. №069-09-2019-108 , приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			строительства в субъектах Российской Федерации.				
4.1.2	РРП		Заключение соглашения на предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на реализацию мероприятий муниципальных программ по развитию жилищного строительства.	30.04.2019	02.04.2019	Максименко Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение между департаментом строительства Кемеровской области и администрацией города Кемерово о предоставлении в 2019 году субсидии бюджету города Кемерово на реализацию мероприятия "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014-2021 годы" Соглашение департамента строительства Кемеровской области и администрации города Кемерово от 02.04.2019г. №32701000-1-2019-003 , приложен файл.
4.2.	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	20.01.2020	20.01.2020	Печеркина И. А.	В работе. Отклонения отсутствуют.
4.2.1	РРП		Сформирован и направлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчет в Соответствии с Соглашением.	20.01.2020	20.01.2020	Максименко Н. В.	В работе.
4.3.	ПК		Земельный участок предоставлен заказчику	01.05.2019	07.05.2019	Печеркина И. А.	Выполнено. Просрочка 6 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о передаче полномочий" управления городского развития администрации города Кемерово с МП "ГорУКС" от 28.01.2019г. №1, приложен файл. 2. "Выписка из единого государственного реестра недвижимости" ФГИС ЕГРН от 22.01.2019г. №б/н,

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							приложен файл. 3. "Договор безвозмездного срочного пользования земельным участком" Комитета по управлению Государственным имуществом Кемеровской области и МП "ГорУКС" от 23.10.2014г. №БСП-01-10/14 , приложен файл. 4. "Соглашение о передаче полномочий " управления городского развития администрации города Кемерово с МП "ГорУКС от 28.01.2019г. №2, приложен файл. 5. "Соглашение об установлении сервитута на земельный участок" МБУ "Кемдор" и МП "ГорУКС" от 22.04.2019г. №б/н, приложен файл. 6. "Договор безвозмездного срочного пользования земельным участком " МБУ "Кемдор" и управление городского развития администрации города Кемерово от 07.05.2019г. №1, приложен файл. 7. "Договор безвозмездного срочного пользования земельным участком " МБУ "Кемдор" и управление городского развития администрации города Кемерово от 07.05.2019г. №2, приложен файл. Риск снят: Предоставление земельного участка заказчику, Причина риска: Несвоевременное предоставление земельного участка заказчику, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 07.05.2019г. Предлагаемые решения: 1. Земельный участок предоставлен заказчику, срок исполнения 07.05.2019. Риск снят
4.3.1	РРП		Оформлено право на земельный участок.	01.05.2019	07.05.2019	Максименко Н. В.	Выполнено. Просрочка 6 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о передаче полномочий" управления

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							городского развития администрации города Кемерово с МП "ГорУКС" от 28.01.2019г. №1, приложен файл. 2. "Выписка из единого государственного реестра недвижимости" ФГИС ЕГРН от 22.01.2019г. №б/н, приложен файл. 3. "Договор безвозмездного срочного пользования земельным участком" Комитета по управлению Государственным имуществом Кемеровской области и МП "ГорУКС" от 23.10.2014г. №БСП-01-10/14 , приложен файл. 4. "Соглашение о передаче полномочий" управления городского развития администрации города Кемерово с МП "ГорУКС" от 28.01.2019г. №2, приложен файл. 5. "Соглашение об установлении сервитута на земельный участок" МБУ "Кемдор" и МП "ГорУКС" от 22.04.2019г. №б/н, приложен файл. 6. "Договор безвозмездного срочного пользования земельным участком" МБУ "Кемдор" и управление городского развития администрации города Кемерово от 07.05.2019г. №1, приложен файл. 7. "Договор безвозмездного срочного пользования земельным участком" МБУ "Кемдор" и управление городского развития администрации города Кемерово от 07.05.2019г. №2, приложен файл. Риск снят: Оформление права на земельный участок., Причина риска: Несвоевременное оформление права на земельный участок, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 07.05.2019г. Предлагаемые решения: 1. Оформление права на земельный участок, срок исполнения 07.05.2019. Риск снят
4.4.	ПК		Строительно-монтажные работы	28.11.2019	29.11.2019	Печеркина И. А.	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			завершены				Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Извещение об окончании строительства" Иной вид документа МП "ГорУКС" от 28.11.2019г. №1, приложен файл. 2. "Извещение об окончании строительства" Иной вид документа МП "ГорУКС" от 29.11.2019г. №1, приложен файл. Риск снят: Строительно-монтажные работы завершены, Причина риска: Извещение подготовлено позже сроком, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 29.11.2019г. Предлагаемые решения: 1. Извещение о завершении строительства, срок исполнения 29.11.2019. Риск снят
4.4.1	РРП		Строительные работы завершены. Направлено извещение в инспекцию государственного строительного надзора Кемеровской области о проведении итоговой проверки.	28.11.2019	29.11.2019	Максименко Н. В.	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Извещение об окончании строительства" МП "ГорУКС" от 29.01.2019г. №1, приложен файл. 2. "Извещение об окончании строительства " МП "ГорУКС" от 28.11.2019г. №1, приложен файл. Риск снят: Строительные работы завершены. Направлено извещение в инспекцию государственного строительного надзора Кемеровской области о проведении итоговой проверки., Причина риска: Извещение подготовлено позже сроком, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 29.11.2019г. Предлагаемые решения:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							1. Извещение о завершении строительства, срок исполнения 29.11.2019. Риск снят
4.5.	ПК		Техническая готовность объекта, %	28.11.2019	27.11.2019	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О завершении строительства" АО Кемеровоспецстрой от 27.11.2019г. №340 , приложен файл. 2. "О завершении строительства" ООО СУ РСТ от 20.10.2019г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений
4.5.1	РРП		Достигнута техническая готовность объекта, %.	20.11.2019	27.11.2019	Максименко Н. В.	Выполнено. Просрочка 7 дней. Подтверждающие документы: 1. "О завершении строительства" АО Кемеровоспецстрой от 27.11.2019г. №340 , приложен файл. 2. "О завершении строительства" ООО СУ РСТ от 20.10.2019г. №б/н, приложен файл. Риск снят: Достижение технической готовности объекта, Причина риска: Дата регистрации письма АО "Кемеровоспецстрой" о завершении строительства объекта от 27.11.2019, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 27.11.2019г. Предлагаемые решения: 1. Информация о завершении строительства объекта согласно письму АО "Кемеровоспецстрой", срок исполнения 27.11.2019. Риск снят
4.6.	ПК		Заключение органа государственного строительного надзора получено	28.11.2019	20.01.2020	Печеркина И. А.	В работе. Существует риск:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Перенос срока получения заключения органа государственного строительного надзора, Причина риска: Сдвиг сроков завершения строительных работ в связи с двукратным проведением конкурсных процедур по определению подрядной организации (отсутствие заявок при первом проведении конкурсных процедур)., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 20.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. Провести итоговую проверку , срок исполнения 20.01.2020. Наличие не критических отклонений
4.6.1	РРП		Получено заключение инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области.	28.11.2019	20.01.2020	Максименко Н. В.	В работе. Просрочка 53 дней. Существует риск: Перенос срока получения заключения инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области, Причина риска: Сдвиг сроков завершения строительных работ в связи с двукратным проведением конкурсных процедур по определению подрядной организации (отсутствие заявок при первом проведении конкурсных процедур)., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 20.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. Провести итоговую проверку , срок исполнения 20.01.2020. Наличие не критических отклонений
4.7.	ПК		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	30.11.2019	31.03.2020	Печеркина И. А.	В работе. Существует риск: Перенос срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Причина риска: Не проведена итоговая проверка объекта капитального строительства

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							инспекцией государственного строительного надзора Кемеровской области, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2020г. Предлагаемые решения: 1. получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию после проведения итоговой проверки инспекцией государственного строительного надзора, срок исполнения 31.03.2020. Наличие не критических отклонений
4.7.1	РРП		Получено разрешение уполномоченного органа местного самоуправления на ввод объекта в эксплуатацию.	30.11.2019	31.03.2020	Максименко Н. В.	В работе. Просрочка 122 дней. Существует риск: Перенос срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Причина риска: Не проведена итоговая проверка объекта капитального строительства инспекцией государственного строительного надзора Кемеровской области, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2020г. Предлагаемые решения: 1. Получение разрешения после получения заключения инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области, срок исполнения 31.03.2020. Наличие не критических отклонений
5.			Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства. Значение: 1, на дату	20.01.2021	20.01.2021	Печеркина И. А.	Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1. Информация по результату: Существует риск: перенос срока получения заключения органа государственного строительного надзора, Причина риска: Сдвиг сроков завершения строительных работ в связи с двукратным проведением конкурсных процедур

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений






Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			20.01.2021				по определению подрядной организации (отсутствие заявок при первом проведении конкурсных процедур)., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. Провести итоговую проверку в декабре 2019 года., срок исполнения 30.12.2019.
5.1.	ПК		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	29.02.2020	29.02.2020	Костякова О. В.	В работе. Отсутствуют отклонения.
5.1.1	РРП		Заключено соглашение Минстроя России с Правительством Кемеровской области - Кузбасса	29.02.2020	27.12.2019	Максименко Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Минстроя России с Правительством Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2019г. №069-09-2020-331, приложен файл.
5.1.2	РРП		Заключено соглашение департамента строительства Кемеровской области с Администрацией города Кемерово	29.02.2020	29.02.2020	Максименко Н. В.	В работе. Отсутствуют отклонения.
5.2.	ПК		Земельный участок предоставлен заказчику	15.06.2020	25.03.2020	Максименко Н. В.	В работе. Отклонения отсутствуют.
5.2.1	РРП		Заключены соглашения (договоры) на установление сервитута, получение права пользования земельным участком для строительства объекта "просп. Комсомольский на участке от просп. Ленина до просп. Химиков в г.	25.03.2020	25.03.2020	Максименко Н. В.	В работе. Отклонения отсутствуют.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Кемерово"				
6.			Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации Значение: 1.111, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Печеркина И. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Экспресс-информация "О жилищном строительстве"" Иное Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Риск снят: Невозможность достижения результата регионального проекта, предусматривающего ввод жилья в 2019 году 1,111 млн. кв. метров., Причина риска: Несоответствие значения результата регионального проекта "Жилье" на 2019 год значению результата федерального проекта "Жилье", доведенного Кемеровской области – Кузбассу., Вероятность: 100%, Сутевые: Изменение объема ввода жилья в 2019 году не повлияет на исполнение целевого показателя регионального проекта "Жилье" "Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,515 млн. квадратных метров в год " в 2024 году. Предлагаемые решения: 1. Необходимо внесение изменений в соглашение от 01.02.2019 № 069-2019-F10048-1 в части корректировки объема ввода жилья в соответствии с письмами Минстроя России от 21.02.2019 № 6137-ВЯ/07 и 06.09.2019 № 32990-ОК/07., срок исполнения 31.12.2019, Направлено письмо от 25.02.2019 № И12-32/1685 в ответ на запрос Минстроя России от 21.02.2019 № 6137-ВЯ/07 о согласовании детализации по субъектам Российской Федерации значений показателя "Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров" с просьбой утвердить предлагаемый регионом объем ввода жилья: на 2019 год - 0,76 млн. кв. метров, 2020 год - 0,805 млн. кв. метров, на 2021 - 0,85 млн. кв. метров. Повторно направлено письмо от 12.07.2019 №

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							И12-8/5999 на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Н.С. Стаशिшина о необходимости внесения изменений в соглашение от 01.02.2019 № 069-2019-F10048-1 в части значений показателей объема ввода жилья. Направлено письмо № ДС-04/3050 от 06.11.2019 о сроках изменения значений показателя. Согласно ответу Минстроя России от 10.12.2019 № 47265-ОК/07 корректировка будет возможна после принятия соответствующего решения Президента Российской Федерации.. Фактическое значение результата в 2019 году составило 0,7658 из 1,111. В 2020 году сведения будут предоставляться по новому значению результата 1,237. Недостижение планового показателя в 2019 году не повлияет на целевой показатель регионального проекта в 2024 году. Предоставлена информация : 1.111 из 1.111.
6.1.	ПК		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	31.12.2019	31.12.2019	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Экспресс-информация "О жилищном строительстве"" Иное Территориального органа Федеральной службы государственной службы по Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Риск снят: невозможность достижения результата регионального проекта, предусматривающего ввод жилья в 2019 году 1.111 млн. кв. метров., Причина риска: несоответствие значения результата регионального проекта "Жилье" на 2019 год значению результата федерального проекта, доведенного Кемеровской области – Кузбассу., Вероятность: 100%, Сутевые: Ввод жилья по

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Кемеровской области - Кузбассу составит менее 1,111 млн. кв. метров. Изменение объема ввода жилья в 2019 году не повлияет на исполнение целевого показателя регионального проекта "Жилье" "Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,515 млн. квадратных метров в год" в 2024 году. Предлагаемые решения: 1. Необходимо внесение изменений в соглашение от 01.02.2019 № 069-2019-F10048-1 в части корректировки объема ввода жилья в соответствии с письмами Минстроя России от 21.02.2019 № 6137-ВЯ/07 и 06.09.2019 № 32990-ОК/07., срок исполнения 31.12.2019. Мониторинг обеспечен.
6.1.1	РРП		Определение объема введенного в эксплуатацию в 2019 году жилья, млн. кв. м. на основании данных органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса.	31.12.2019	31.12.2019	Максименко Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Экспресс-информация "О жилищном строительстве"" Иное Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
7.			Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации Значение: 1.237, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Печеркина И. А.	Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Невозможность достижения результата регионального проекта, предусматривающего ввод жилья в 2020 году 1,2370 млн. кв. метров., Причина риска: Несоответствие значения результата регионального проекта "Жилье" на 2020 год значению результата федерального проекта "Жилье", доведенного Кемеровской области – Кузбассу., Вероятность: 100%, Сутевые: Изменение объема ввода жилья в 2020 году не повлияет на исполнение целевого показателя регионального проекта "Жилье" "Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,515

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							млн. квадратных метров в год " в 2024 году. Предлагаемые решения: 1. Необходимо внесение изменений в соглашение от 01.02.2019 № 069-2019-F10048-1 в части корректировки объема ввода жилья в соответствии с письмами Минстроя России от 21.02.2019 № 6137-ВЯ/07 и 06.09.2019 № 32990-ОК/07., срок исполнения 31.12.2020, Направлено письмо от 25.02.2019 № И12-32/1685 в ответ на запрос Минстроя России от 21.02.2019 № 6137-ВЯ/07 о согласовании детализации по субъектам Российской Федерации значений показателя "Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров" с просьбой утвердить предлагаемый регионом объем ввода жилья: на 2019 год - 0,76 млн. кв. метров, 2020 год - 0,805 млн. кв. метров, на 2021 - 0,85 млн. кв. метров. Повторно направлено письмо от 12.07.2019 № И12-8/5999 на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Н.С. Стаशिшина о необходимости внесения изменений в соглашение от 01.02.2019 № 069-2019-F10048-1 в части значений показателей объема ввода жилья. Направлено письмо № ДС-04/3050 от 06.11.2019 о сроках изменения значений показателя. Согласно ответу Минстроя России от 10.12.2019 № 47265-ОК/07 корректировка будет возможна после принятия соответствующего решения Президента Российской Федерации.. Возможно достижение результата 0,805 млн. кв. метров. Наличие критических отклонений Предоставлена информация : 0 из 1.237.
7.1.	ПК		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации	31.12.2020	31.12.2020	Костякова О. В.	В работе. Отклонения отсутствуют.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений




 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)				
7.1.1	РРП		Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса	31.01.2020	31.01.2020	Максименко Н. В.	В работе.
7.1.2	РРП		Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса	29.02.2020	29.02.2020	Максименко Н. В.	В работе. Отклонения отсутствуют.
7.1.3	РРП		Определение объема введенного в эксплуатацию жилья в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса	31.03.2020	31.03.2020	Максименко Н. В.	В работе. Отклонения отсутствуют.
8.			Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса. Значение: 400, на дату 31.12.2019	31.12.2019	20.01.2020	Печеркина И. А.	Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Реализация мероприятий, осуществляемых органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса., Причина риска: Несвоевременная реализация мероприятия, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 20.01.2020г. Предлагаемые решения:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							1. Для реализации мероприятия необходимо будет получение отчета о расходах и достижении показателей результативности от НО "Фонд РЖС" согласно заключенному соглашению о предоставлении из областного бюджета субсидии от 31.05.2019 №1, срок исполнения 20.01.2020. Наличие не критических отклонений Просрочка 20 дней. Предоставлена информация : 400 из 400.
8.1.	ПК		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	Костякова О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка" департамента строительства Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений
8.1.1	РПП		Принято решение областной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений.	31.12.2019	31.12.2019	Костякова О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка" департамента строительства Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
8.2.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	20.01.2020	Костякова О. В.	В работе. Существует риск: Оказание услуги (выполнение работ), Причина риска: Несвоевременное предоставление отчета о расходах, о достижении показателей результативности, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 20.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. Для подтверждения оказания услуги (выполнения работ) будет предоставлен отчет о расходах, о достижении показателей результативности, срок исполнения 20.01.2020.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Наличие некритических отклонений
8.2.1	РРП		Предоставлены долгосрочные целевые жилищные займы и социальные выплаты на приобретение жилых помещений	31.12.2019	20.01.2020	Костякова О. В.	В работе. Существует риск: Предоставление долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений, Причина риска: Несвоевременное предоставление отчета о расходах, о достижении показателей результативности, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 20.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. Для подтверждения реализации мероприятия будет предоставлен отчет о расходах, о достижении показателей результативности, срок исполнения 20.01.2020.
8.3.	ПК		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.07.2019	31.05.2019	Костякова О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением" департамента строительства Кемеровской области с НО "Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области" от 31.05.2019г. №1, приложен файл.
8.3.1	РРП		Заключение соглашения о предоставлении субсидии НО "Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области"	01.07.2019	31.05.2019	Костякова О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением" Департамента строительства с НО "Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области" от

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							31.05.2019г. №1, приложен файл.
8.4.	ПК		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	30.12.2019	20.01.2020	Костякова О. В.	В работе. Существует риск: Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, Причина риска: Несвоевременное предоставление отчета о выполнении соглашения, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 20.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. Предоставление отчета о расходах и достижении показателей результативности от НО "Фонд РЖС", срок исполнения 20.01.2020. Наличие не критических отклонений
8.4.1	РПП		Предоставление отчета НО "Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области".	30.12.2019	20.01.2020	Костякова О. В.	В работе. Существует риск: Предоставление отчета НО "Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области", Причина риска: Несвоевременное предоставление отчета, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 20.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. Предоставление отчета о расходах и достижении показателей результативности от НО "Фонд РЖС", срок исполнения 20.01.2020.
9.			Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" Значение: 1, на дату 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Костиков В. С.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
9.1.	ПК		Документ опубликован	31.12.2019	31.01.2020	Костиков В. С.	В работе. Существует риск: Документ не опубликован в установленный срок, Причина риска: Длительное согласование проекта документа, связанное с возвратом на доработку. Наличие неурегулированных разногласий., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. Устранить замечания. Урегулировать разногласия., срок исполнения 31.01.2020. Наличие не критических отклонений. Документ разработан и готовится к подписанию и опубликованию в установленном порядке.
9.1.1	РПП		Проведена актуализация плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование", утвержденного распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.02.2017 № 95-р с продлением до 2021 года.	31.12.2019	31.01.2020	Костиков В. С.	В работе. Просрочка 31 дней. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") третьего этапа внедрения целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" до 2021 года " Правительства Кемеровской области - Кузбасса от г. №, приложен файл. Существует риск: Документ не опубликован в установленный срок, Причина риска: Длительное согласование проекта документа, связанное с возвратом на доработку. Наличие неурегулированных разногласий., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. Устранить замечания. Урегулировать разногласия., срок исполнения 31.01.2020. Разработан проект документа, который в настоящее время проходит процедуру согласования. Наличие

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							некритических отклонений

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек

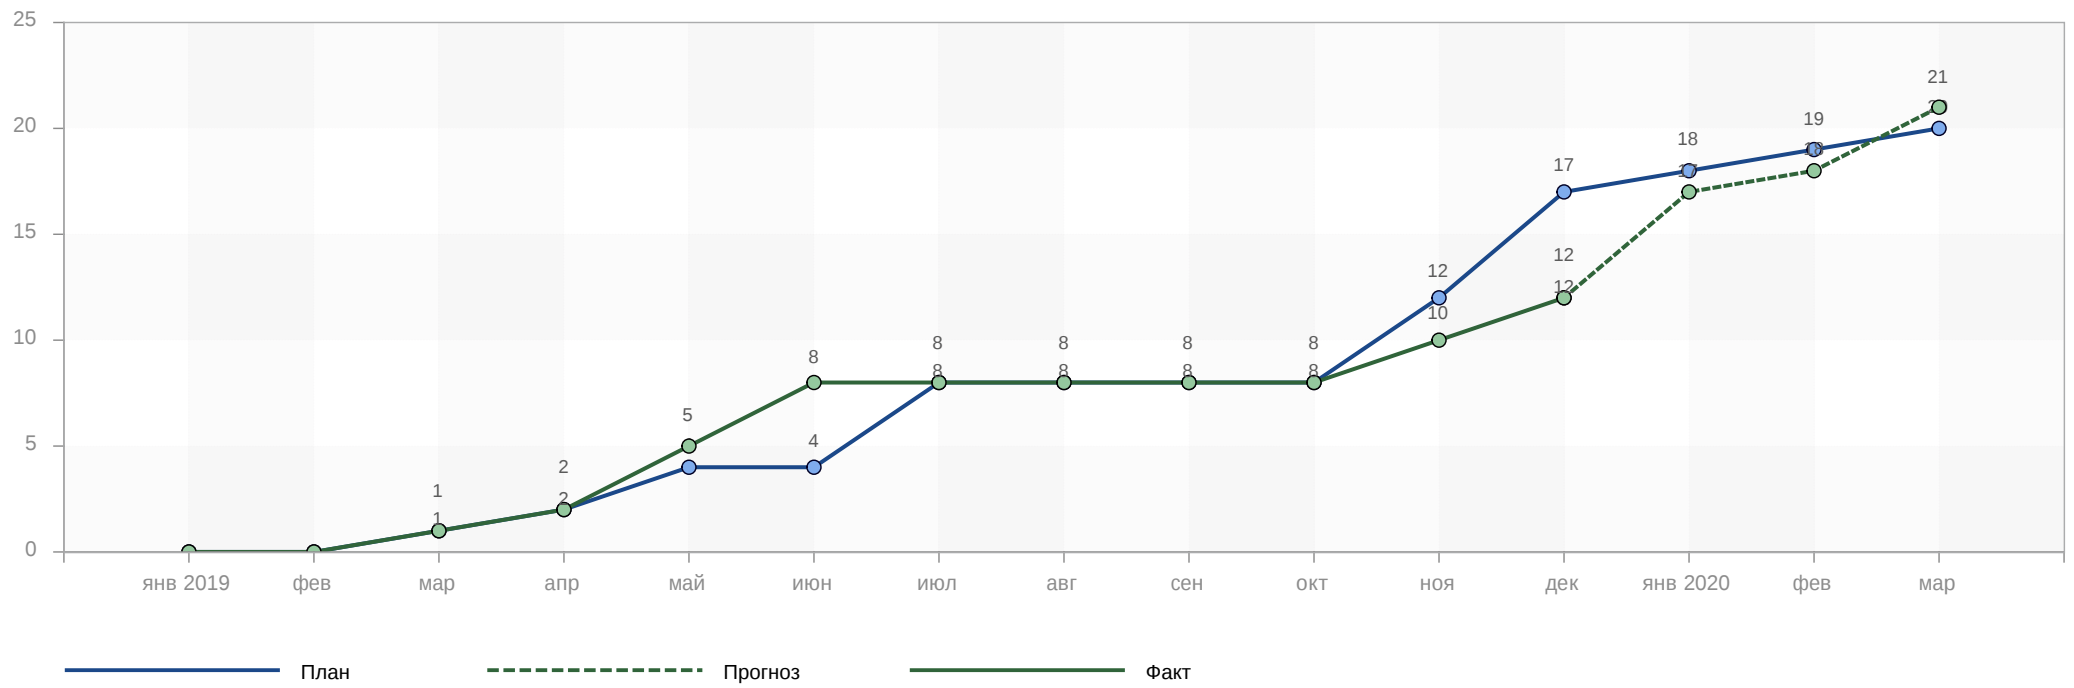


Рис. 1. "(F1-32) Жилье (Кемеровская область)"

График достижения показателя

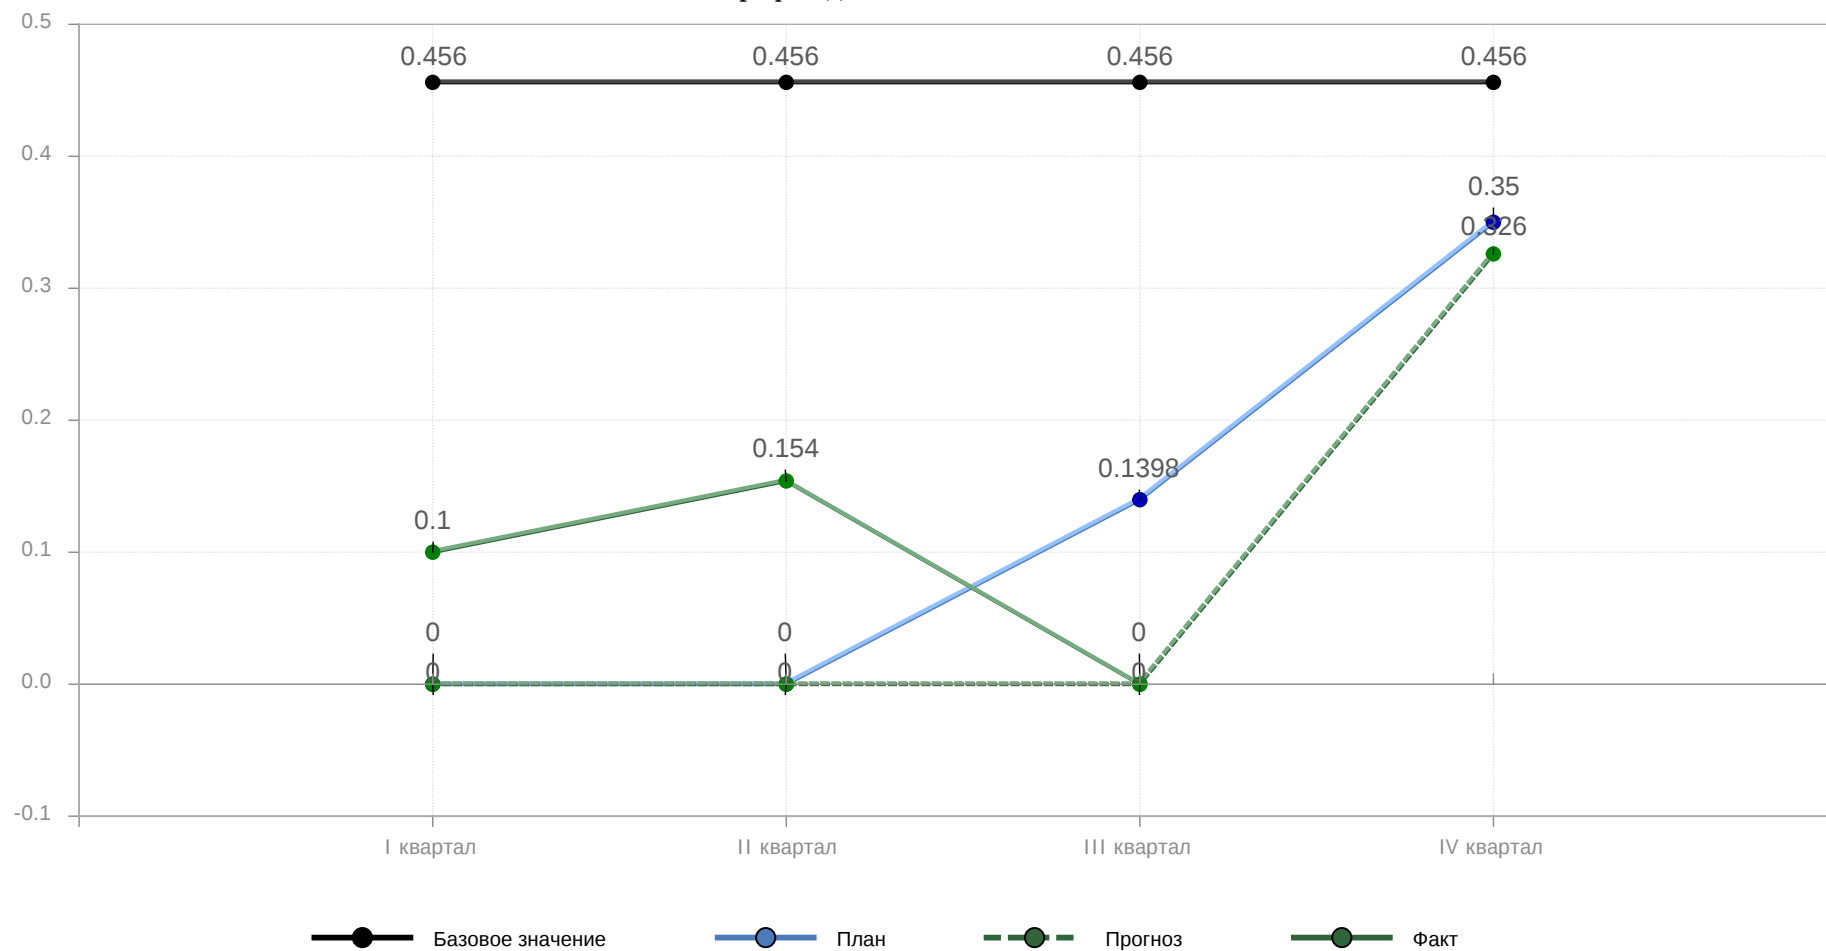


Рис. 1. Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах

Диаграмма достижения показателя

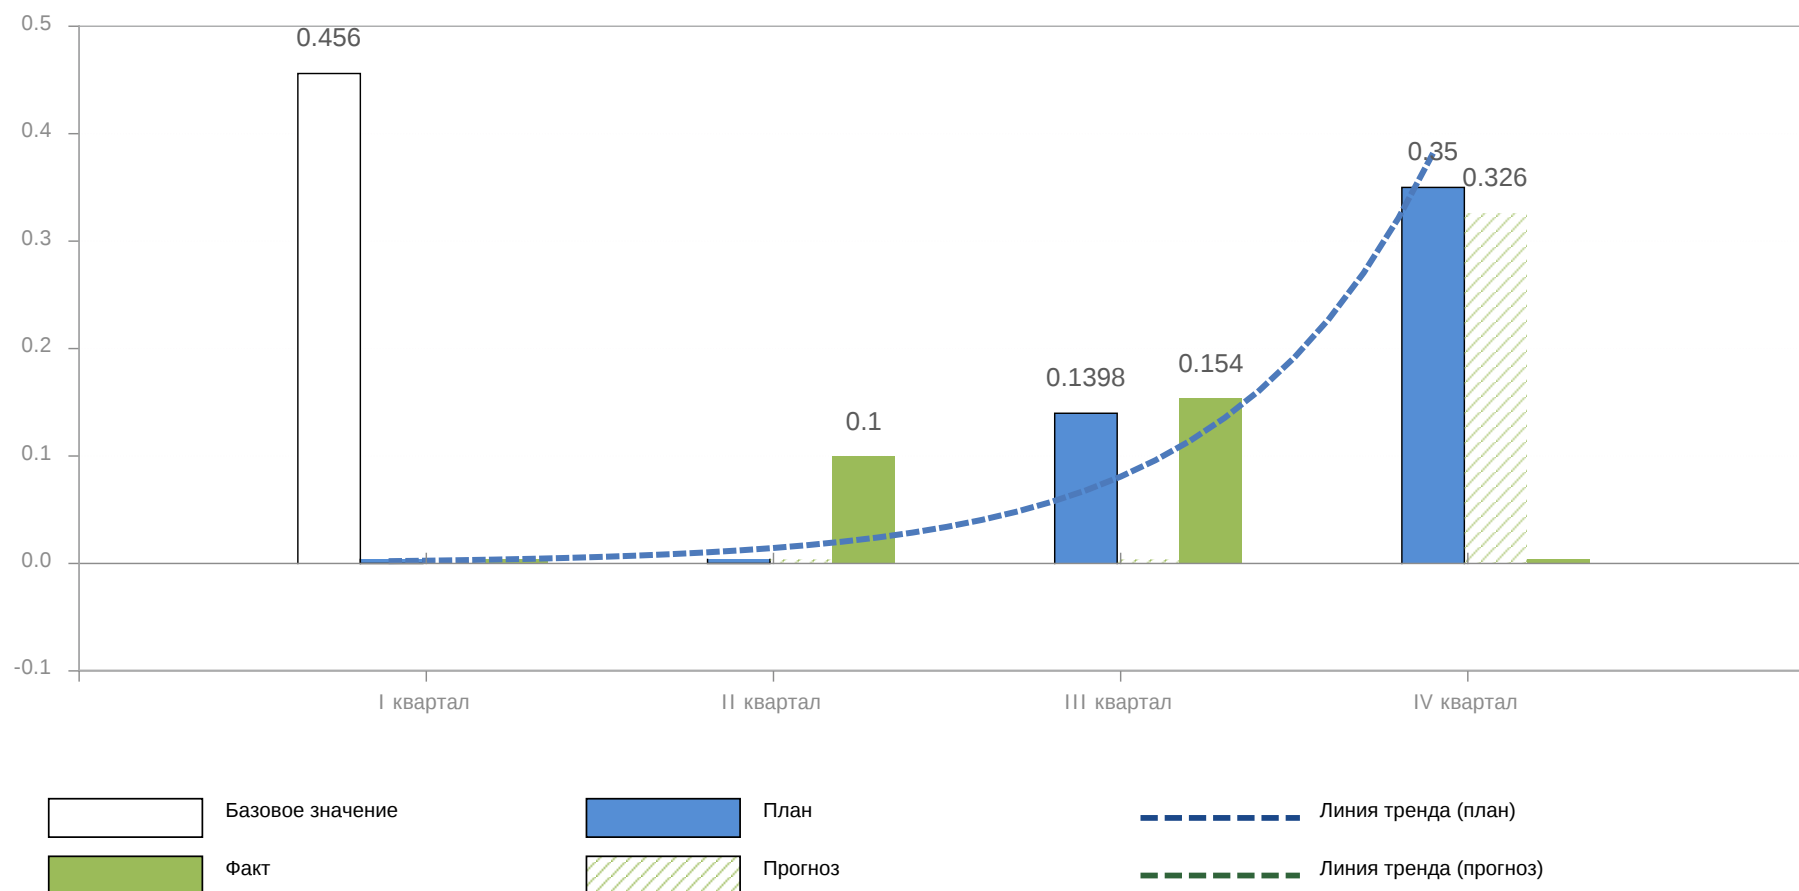


Рис. 2. Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах

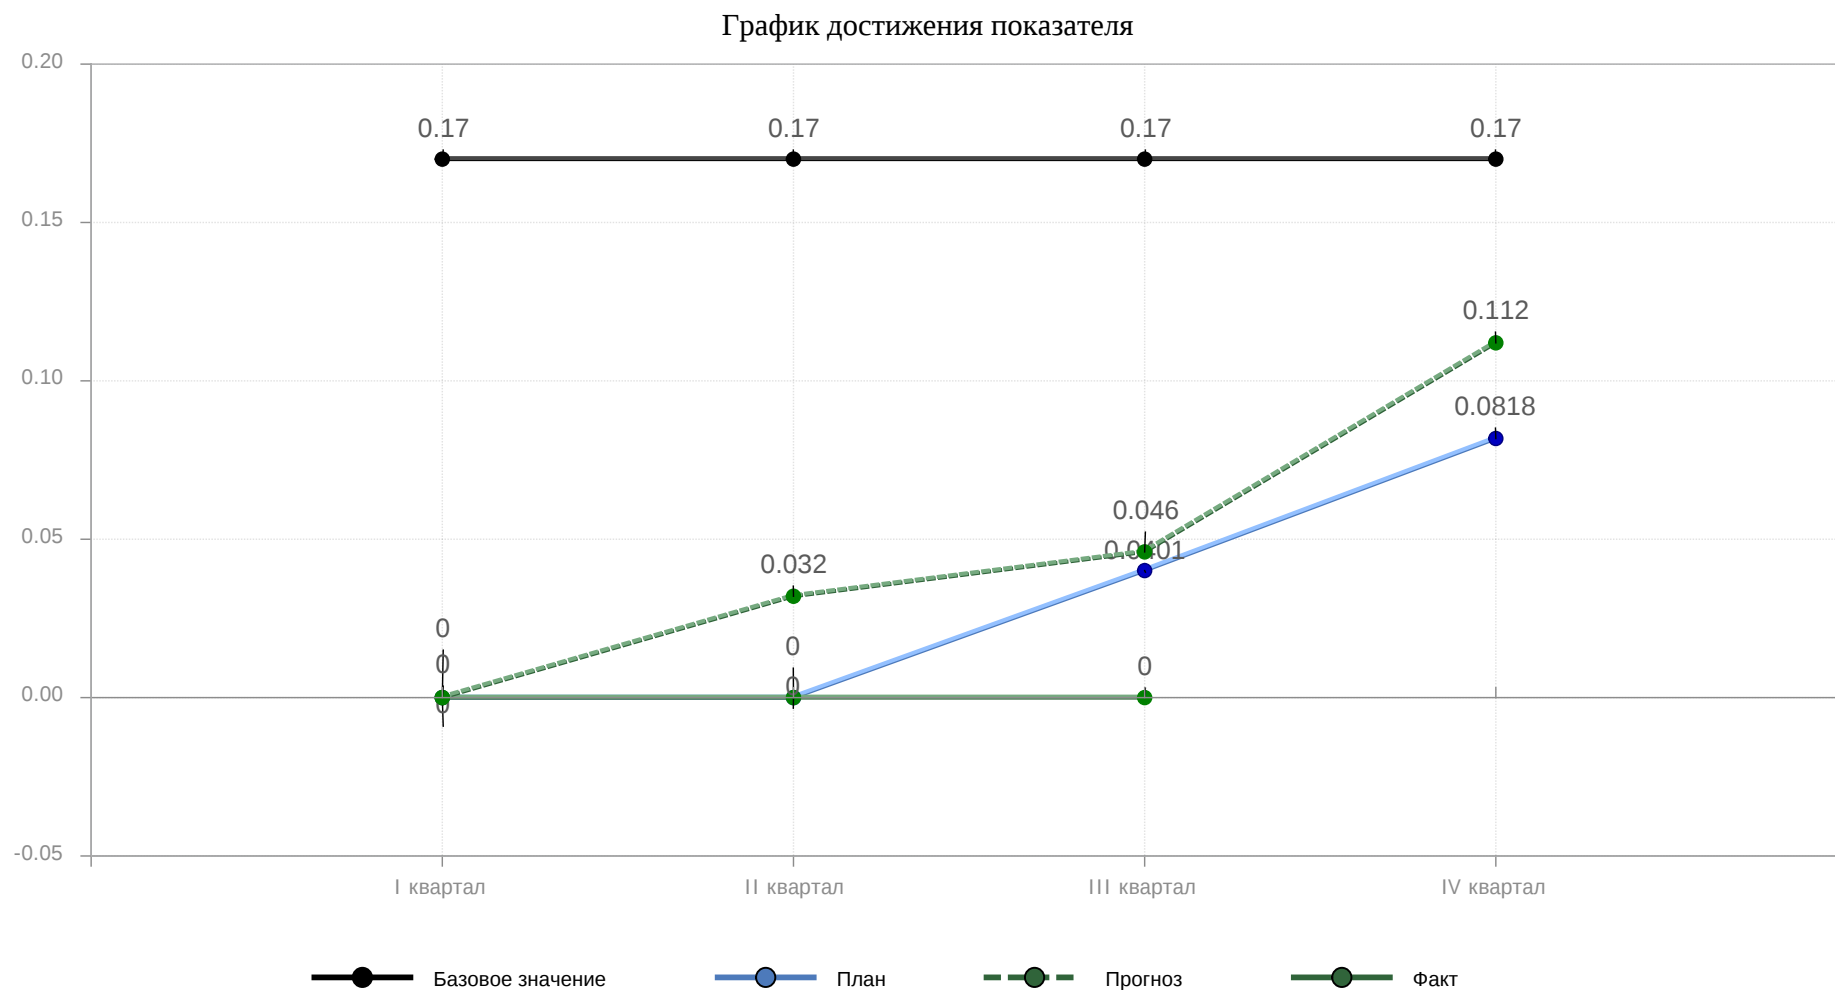


Рис. 3. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

Диаграмма достижения показателя

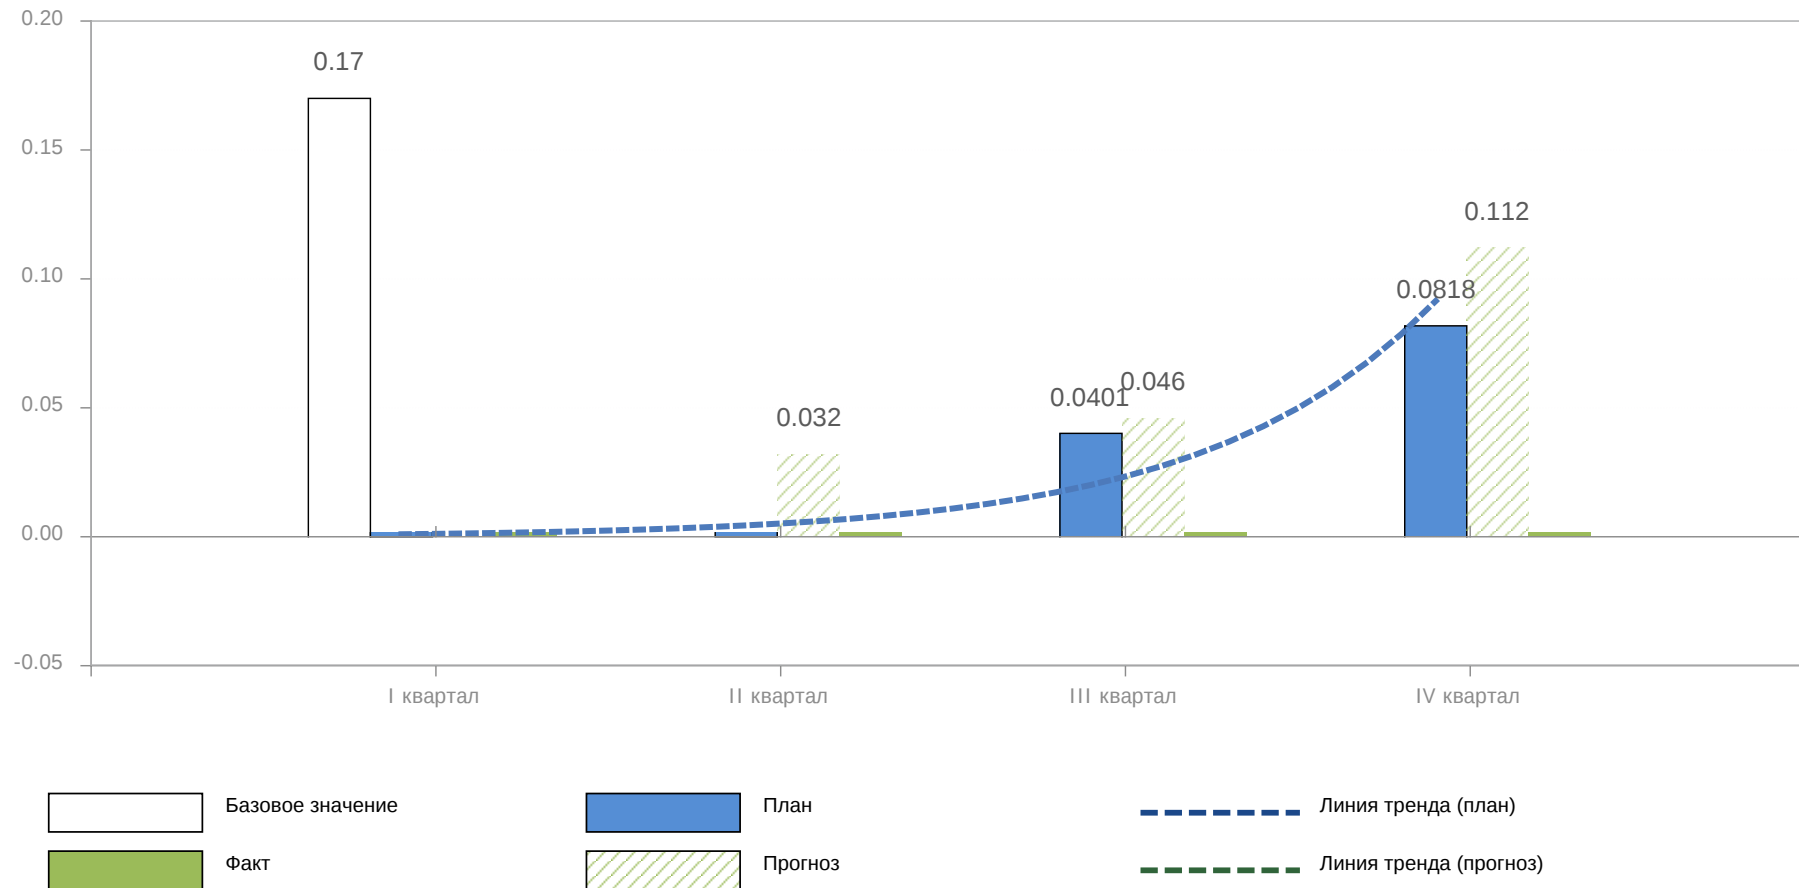


Рис. 4. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

График достижения показателя

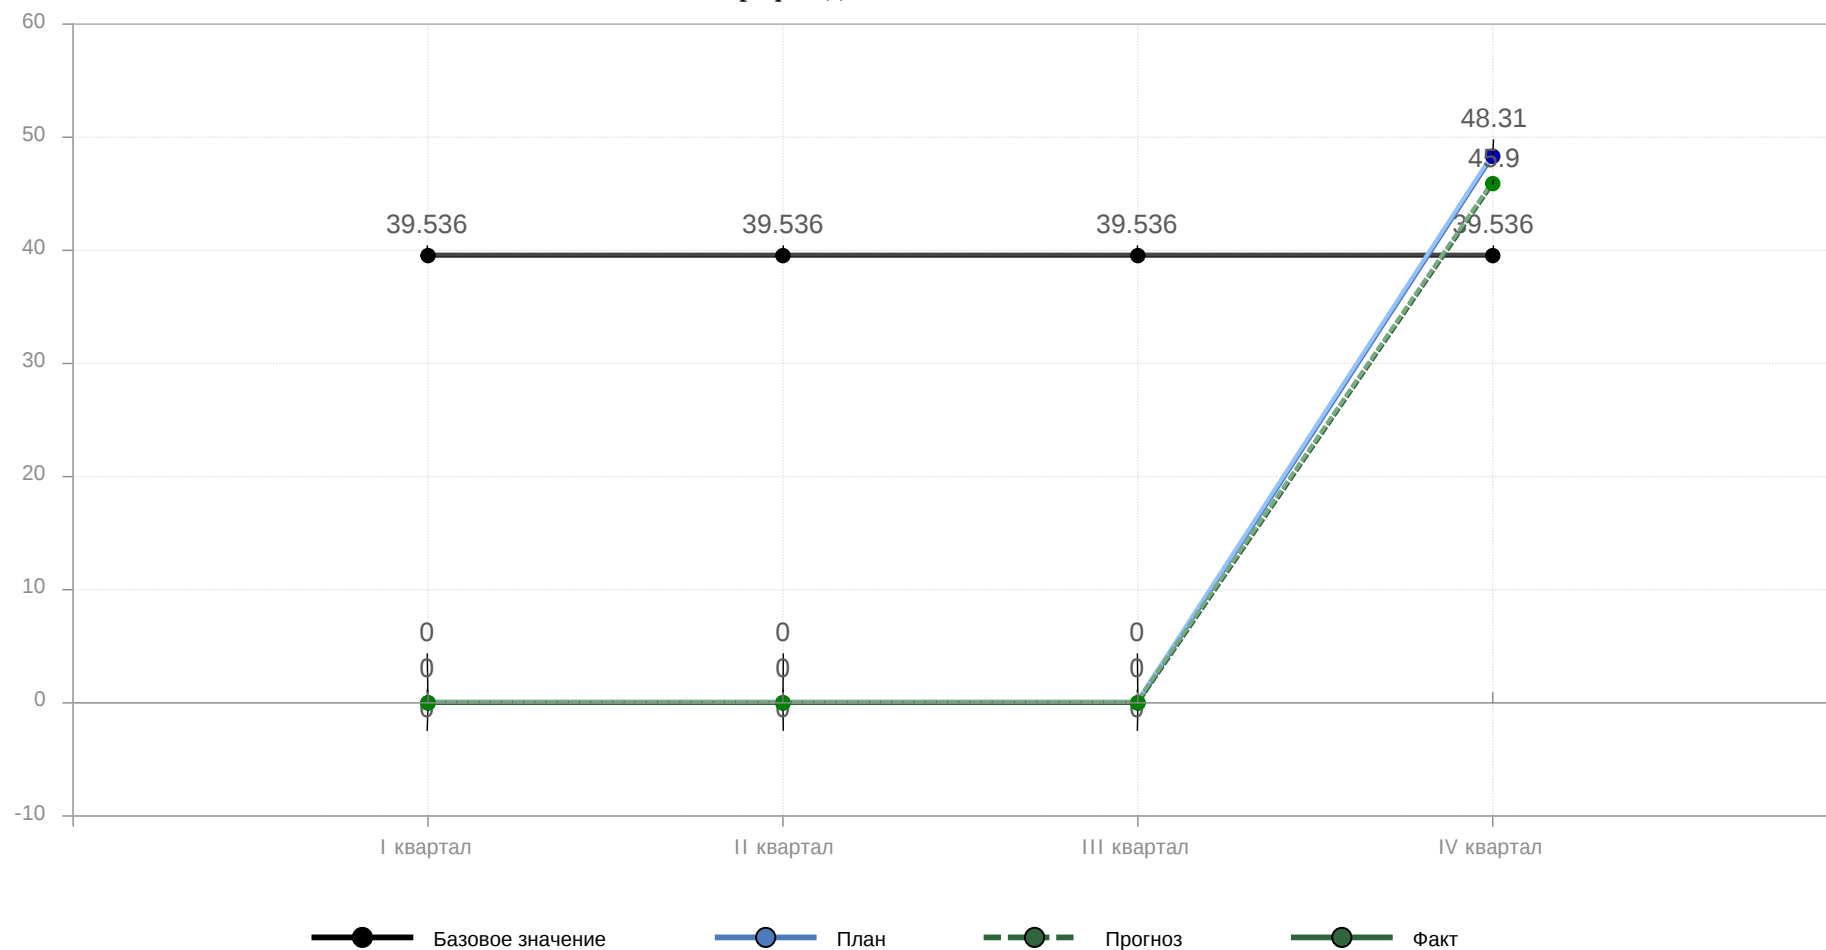


Рис. 5. Средняя стоимость одного квадратного метра модельного жилья на первичном рынке

Диаграмма достижения показателя

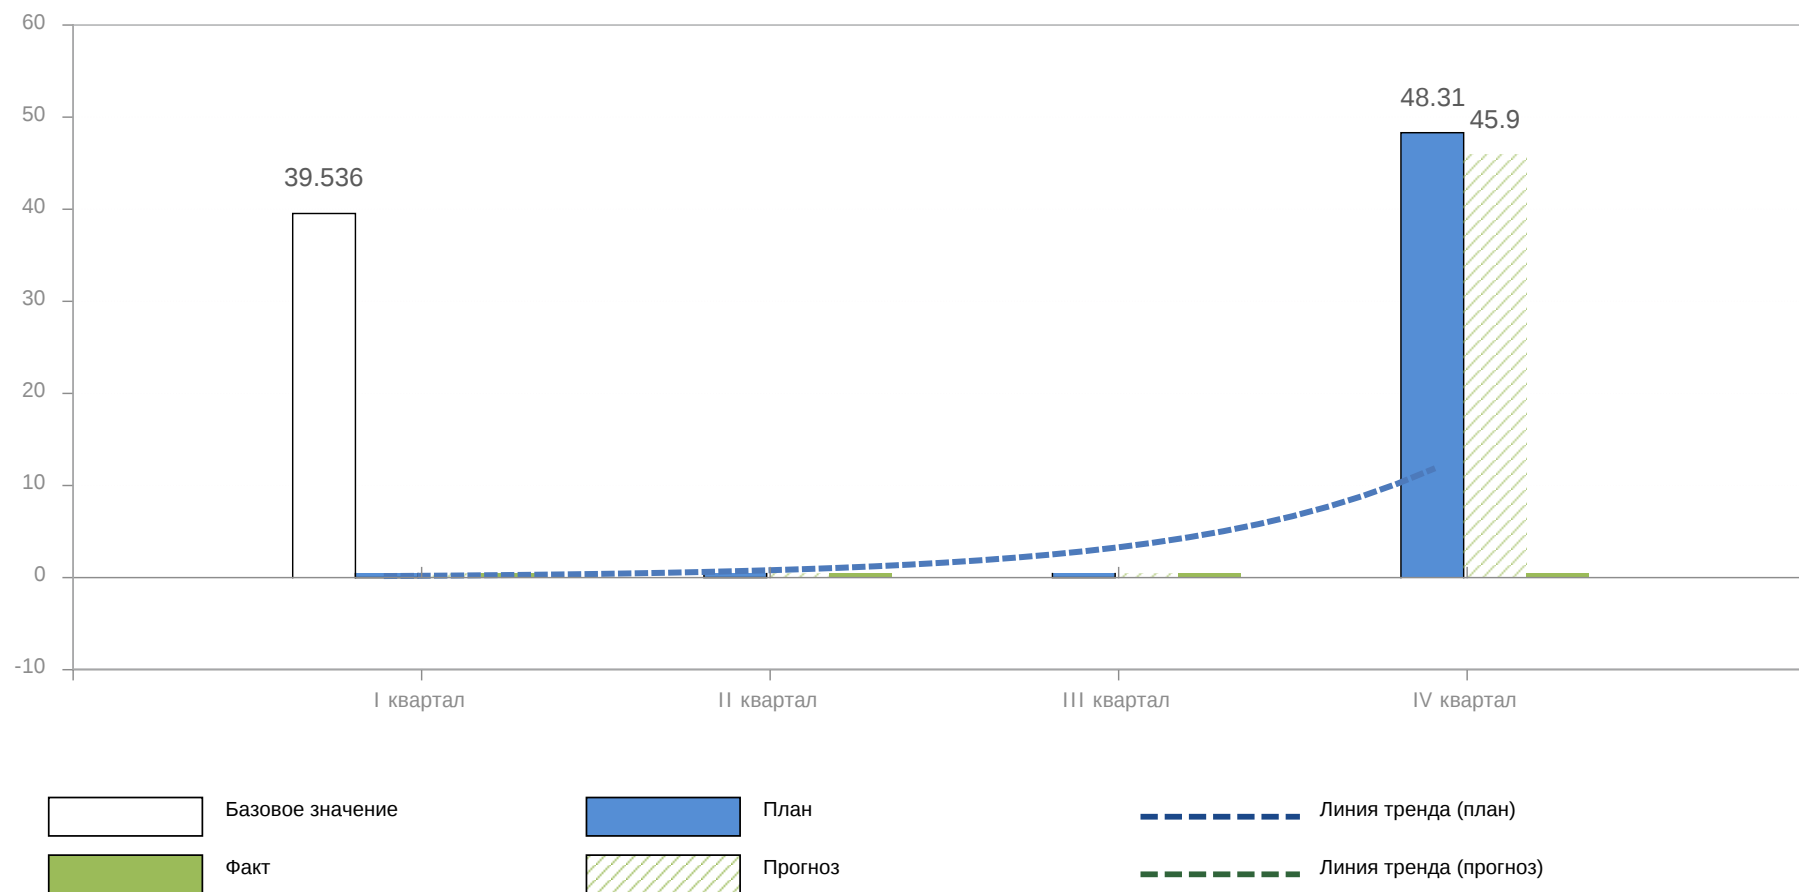


Рис. 6. Средняя стоимость одного квадратного метра модельного жилья на первичном рынке

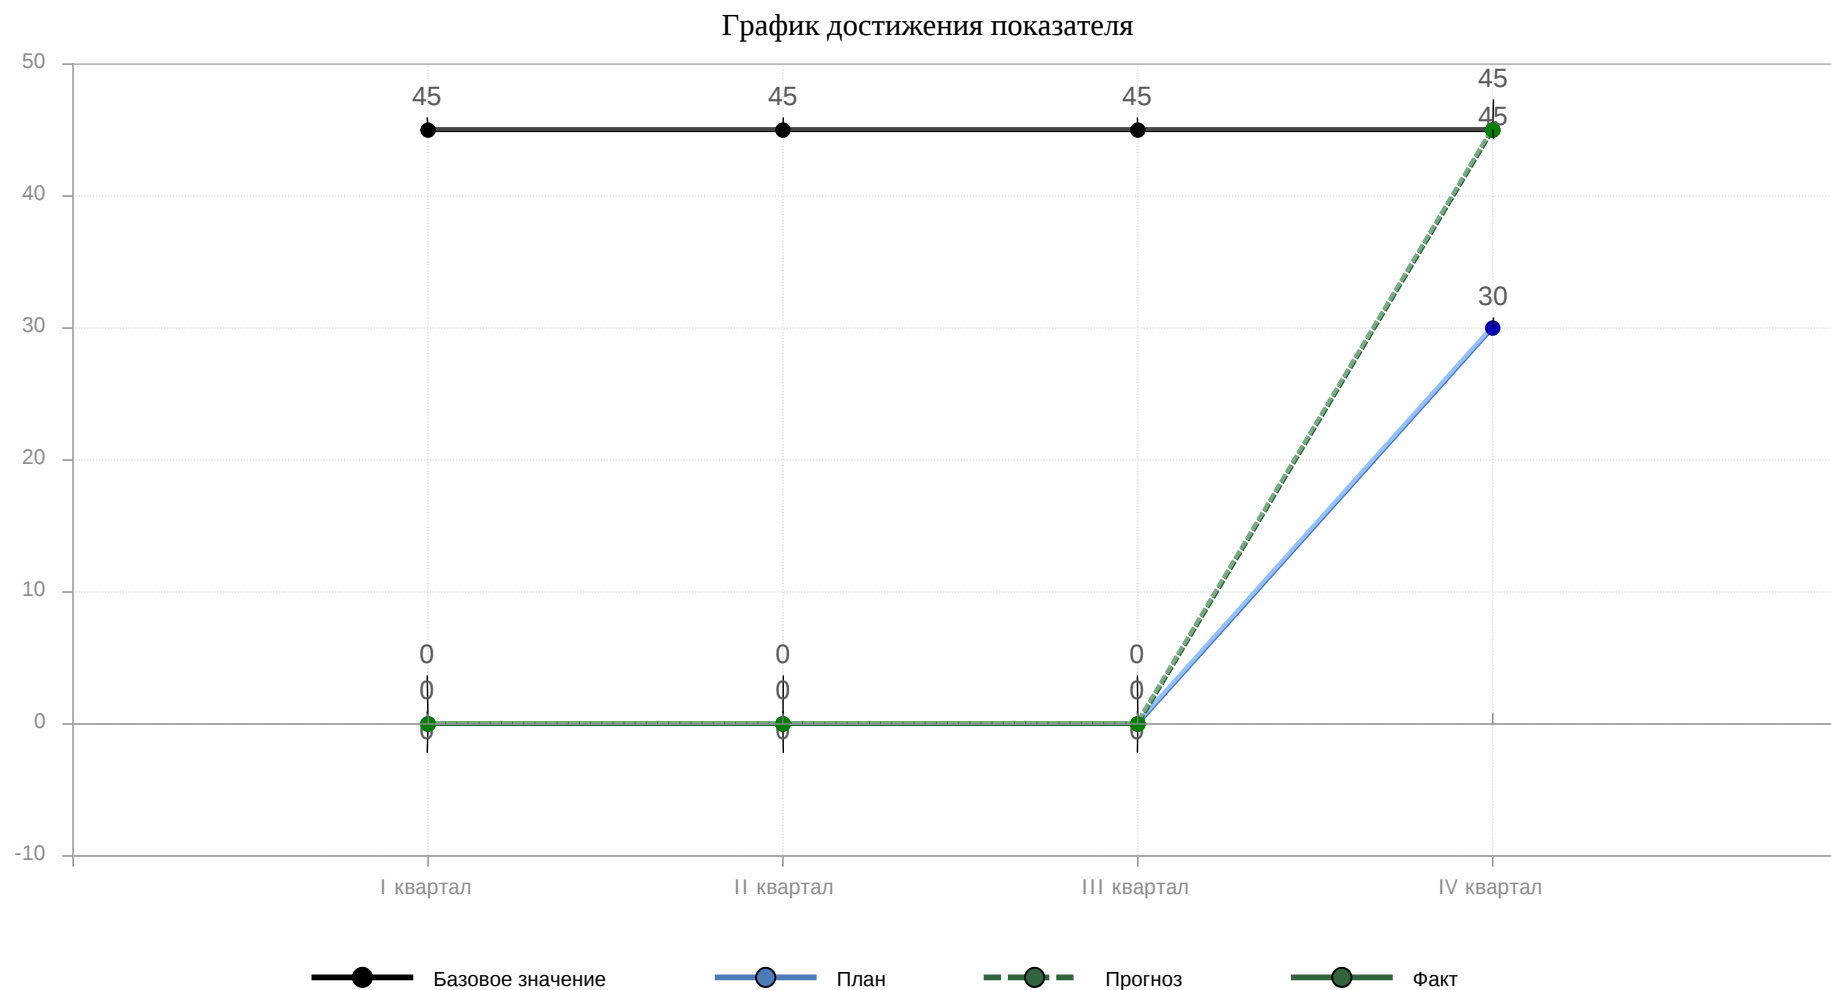


Рис. 7. Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства

Диаграмма достижения показателя

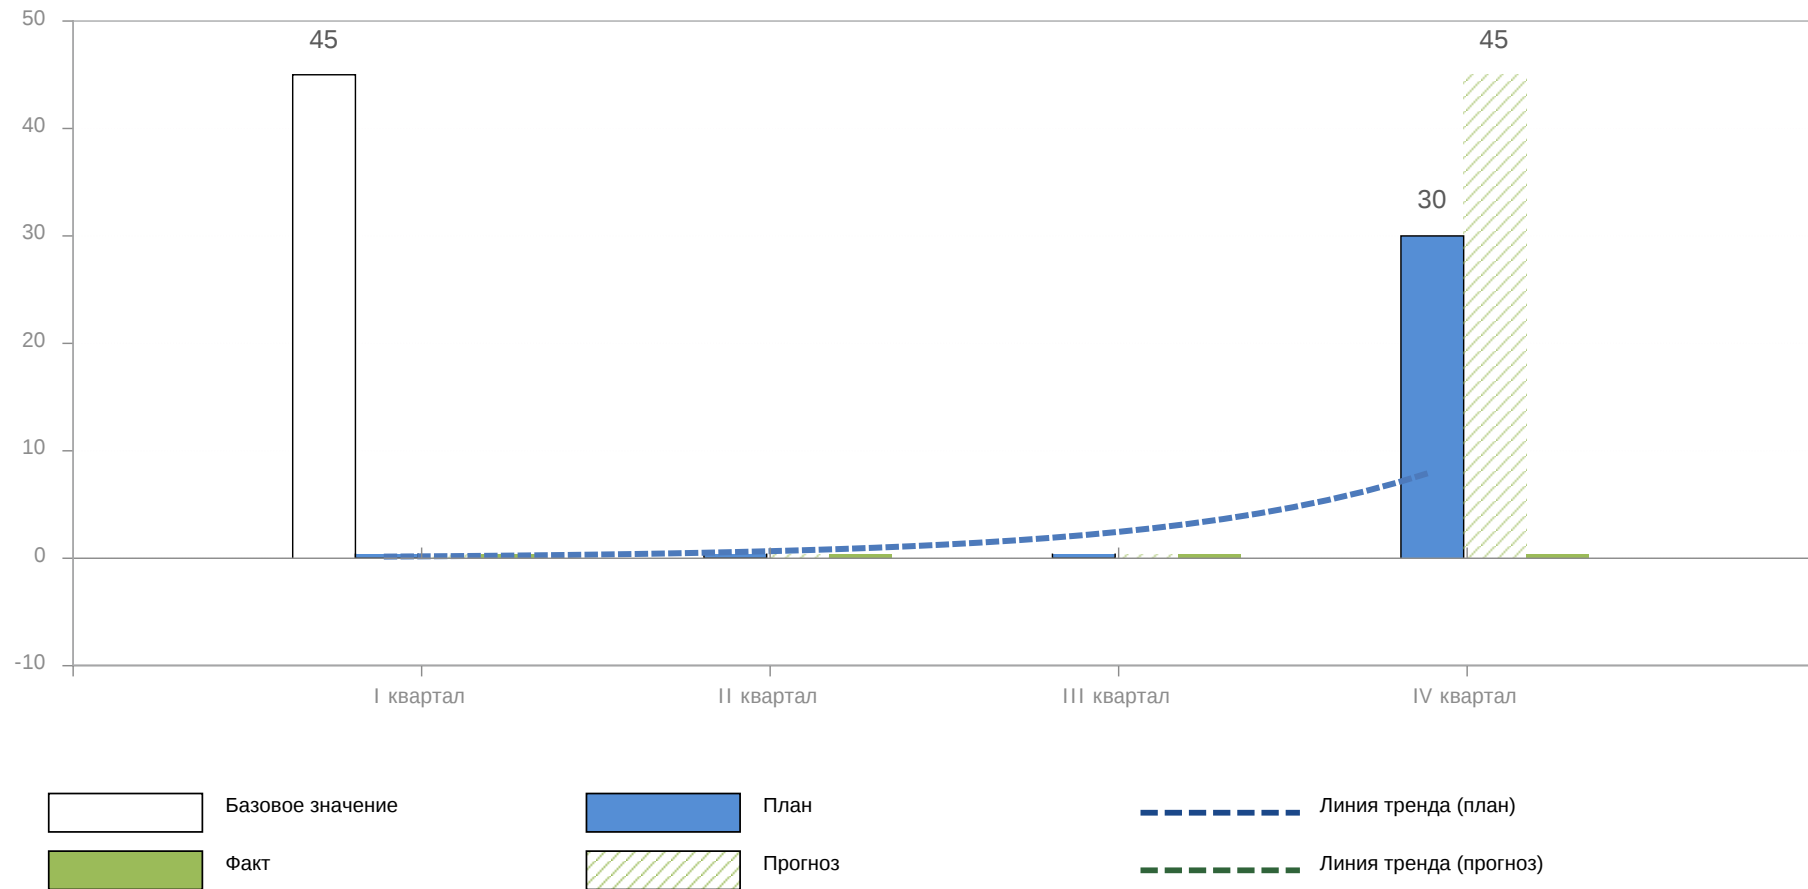


Рис. 8. Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства

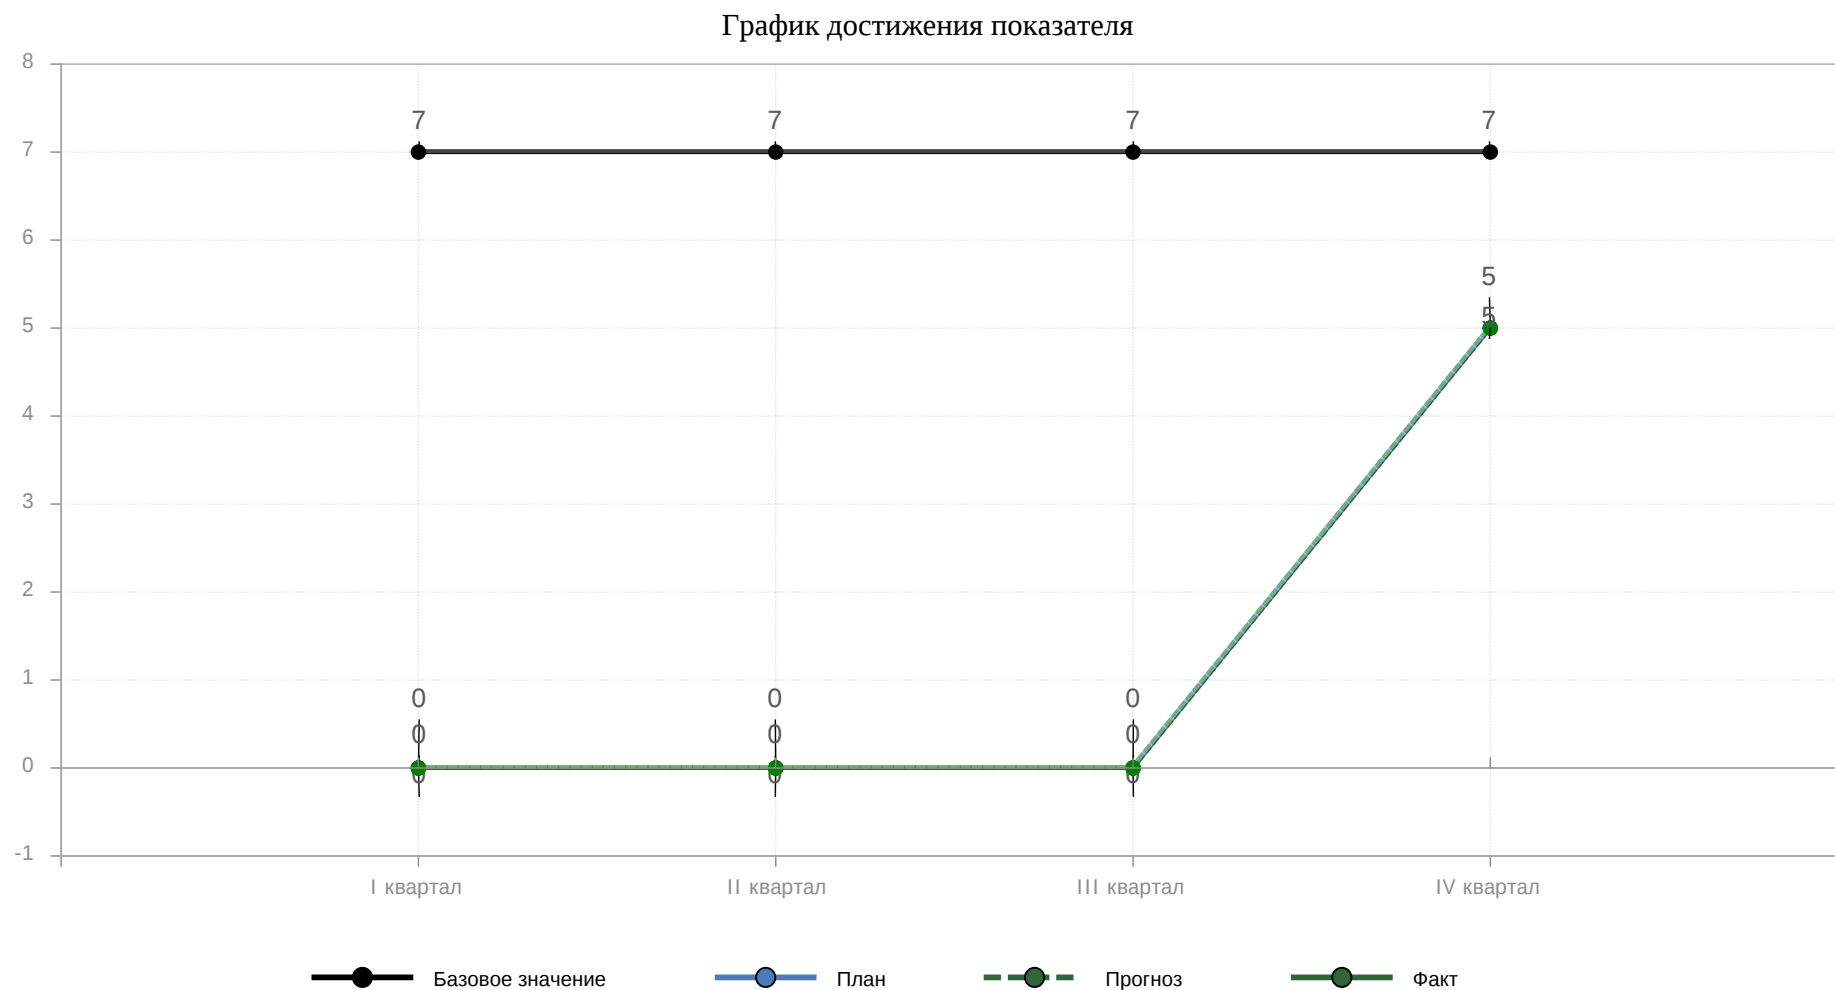


Рис. 9. Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию

Диаграмма достижения показателя

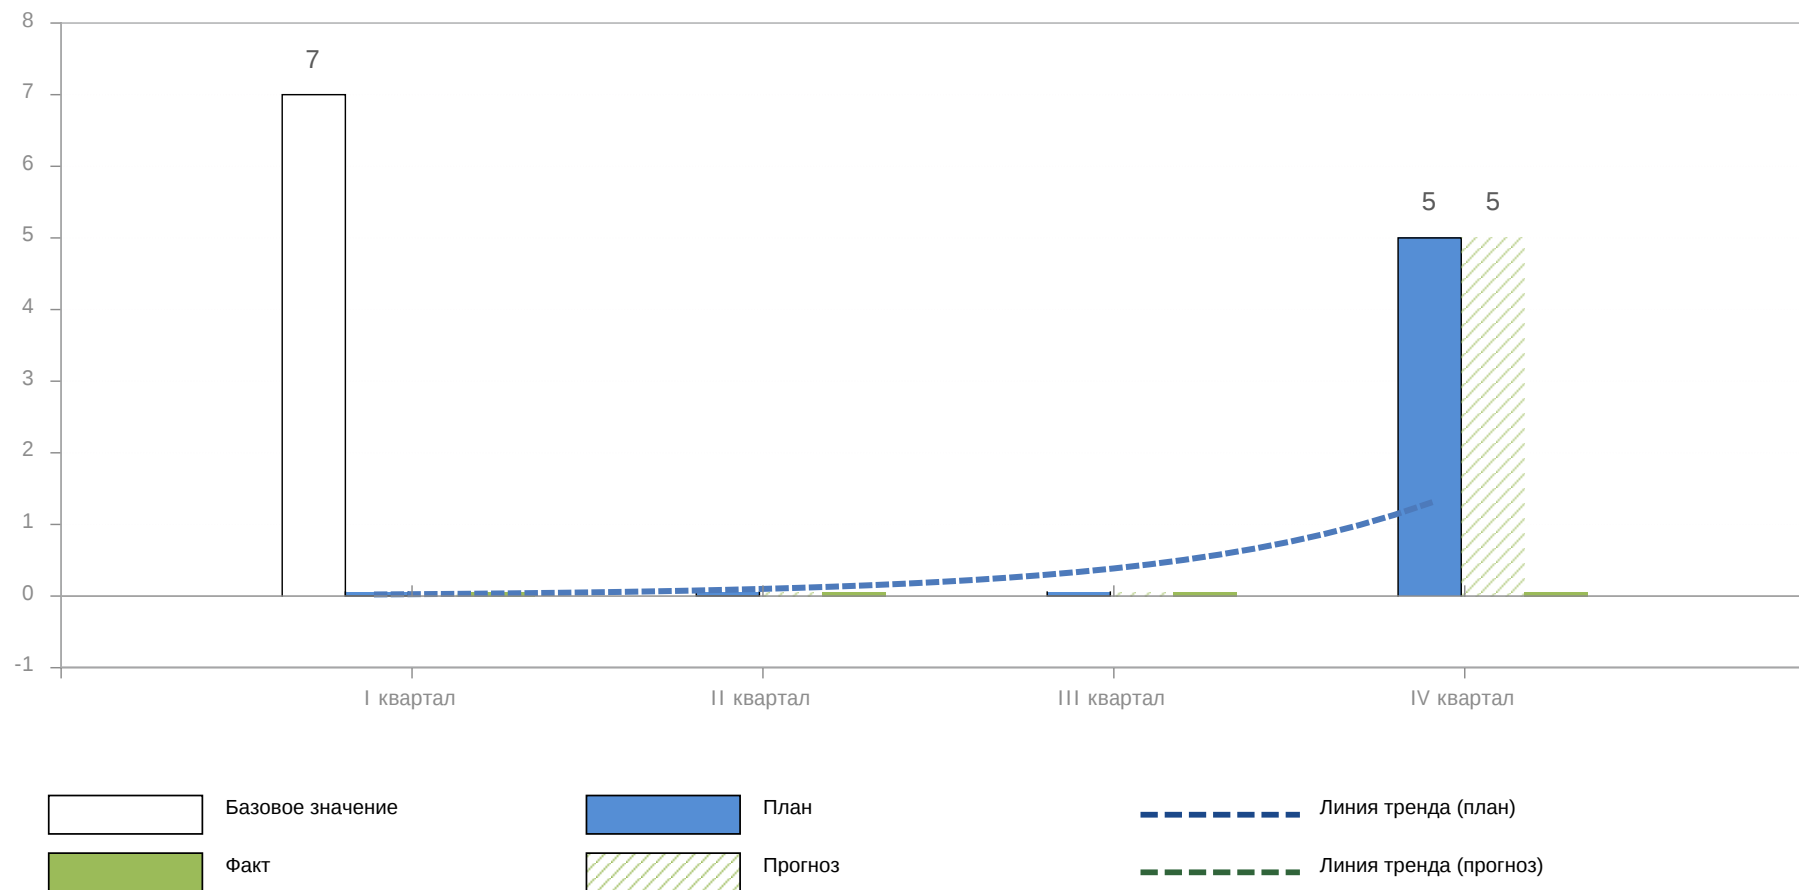


Рис. 10. Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию

График достижения показателя

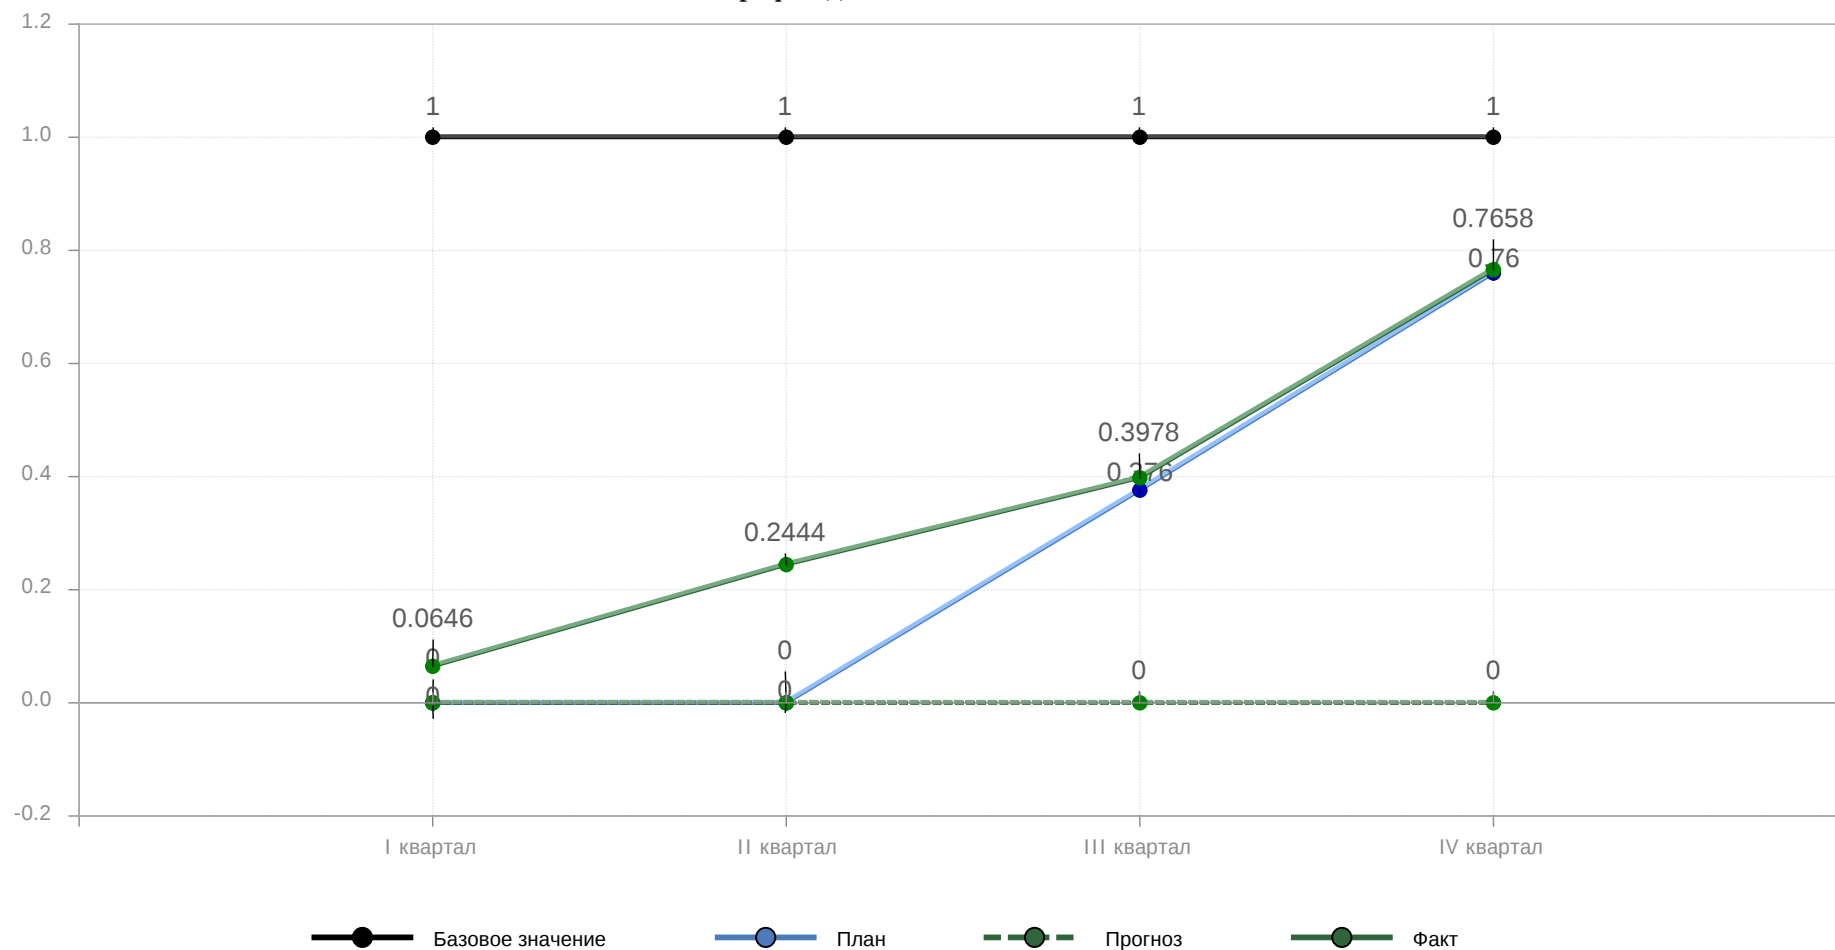


Рис. 11. Объем жилищного строительства

Диаграмма достижения показателя

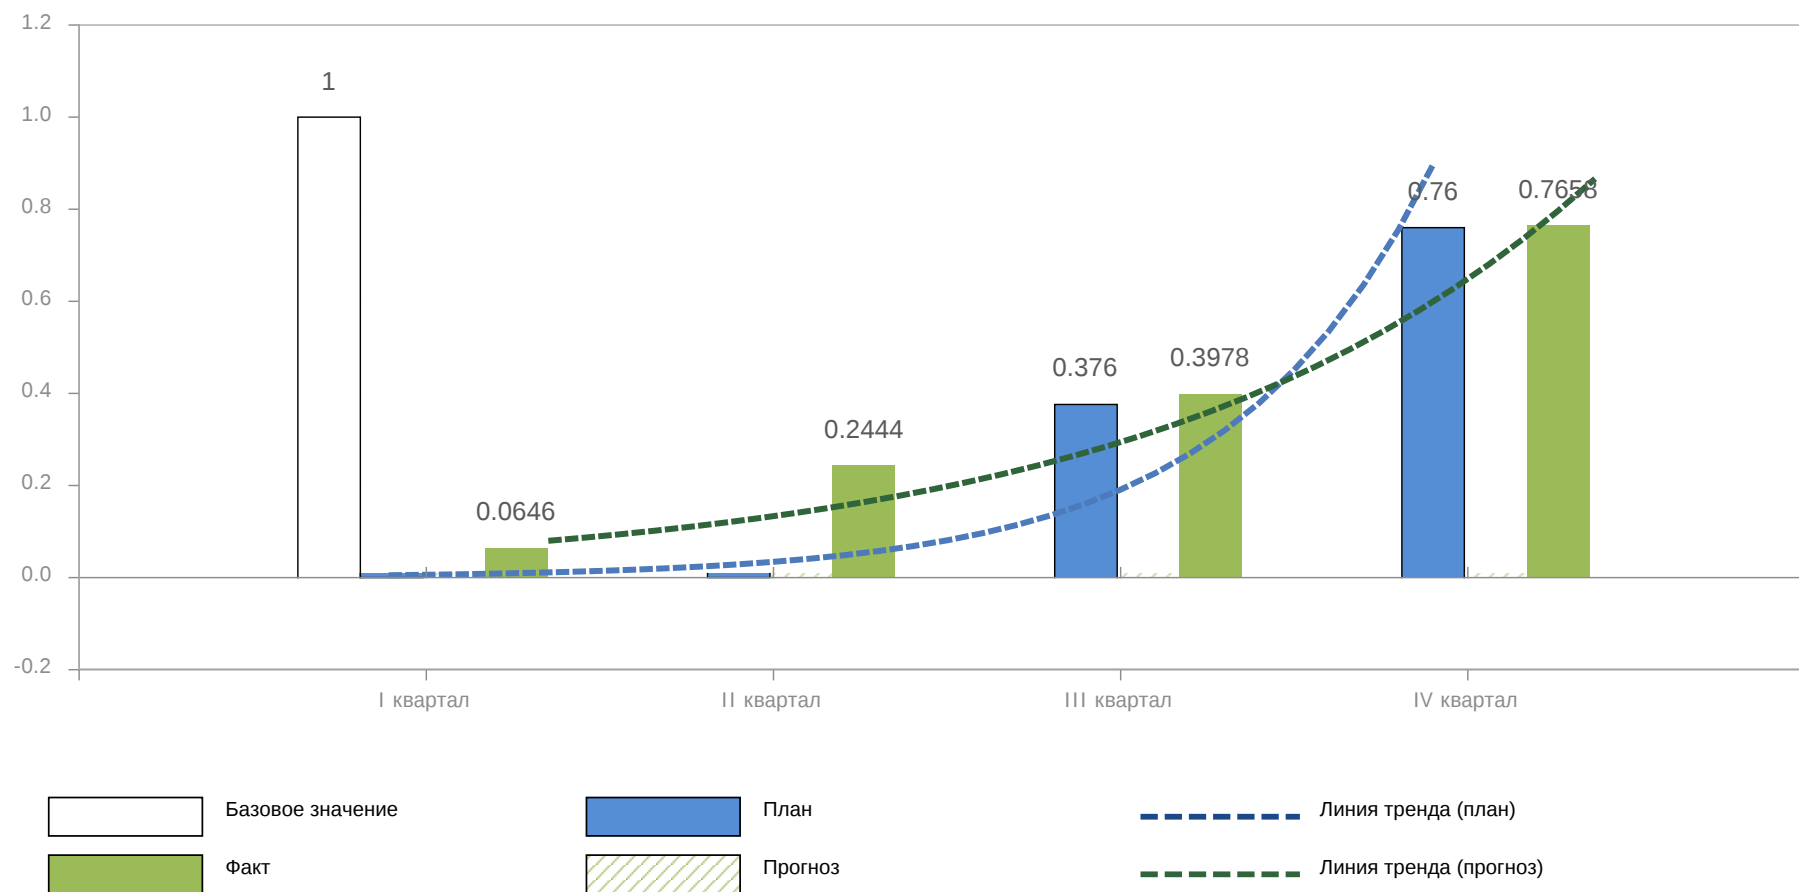


Рис. 12. Объем жилищного строительства

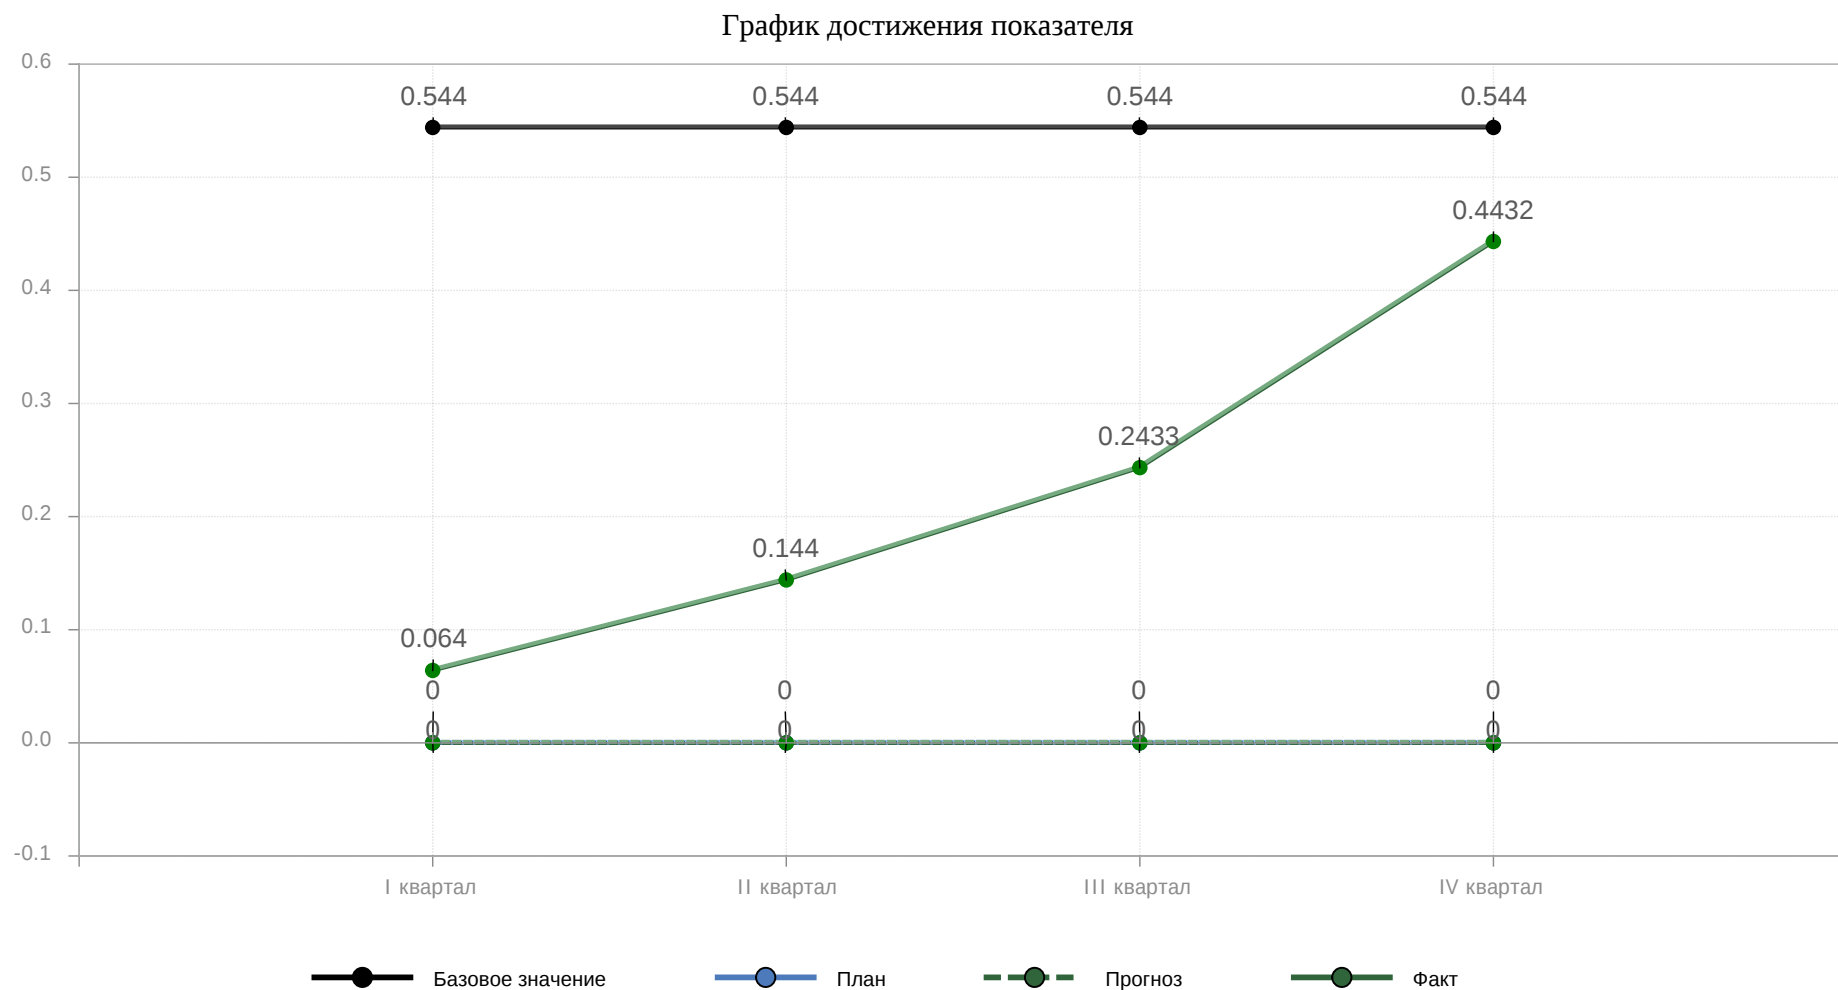


Рис. 13. Объем ввода жилья, построенного населением

Диаграмма достижения показателя

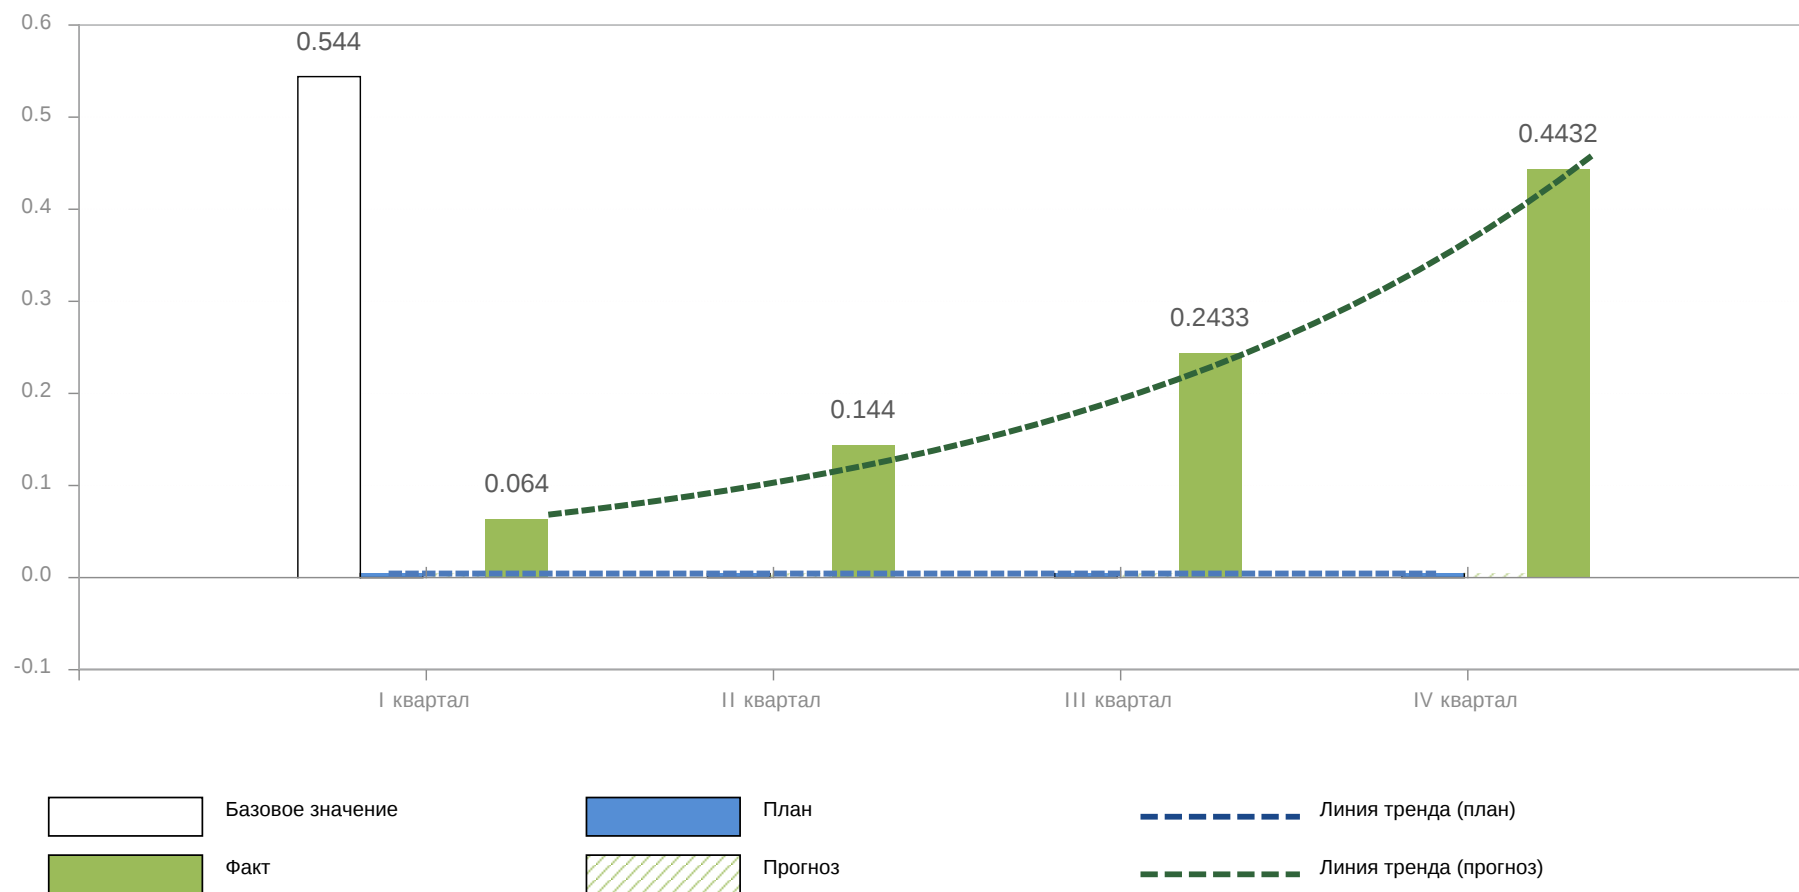


Рис. 14. Объем ввода жилья, построенного населением

График достижения показателя

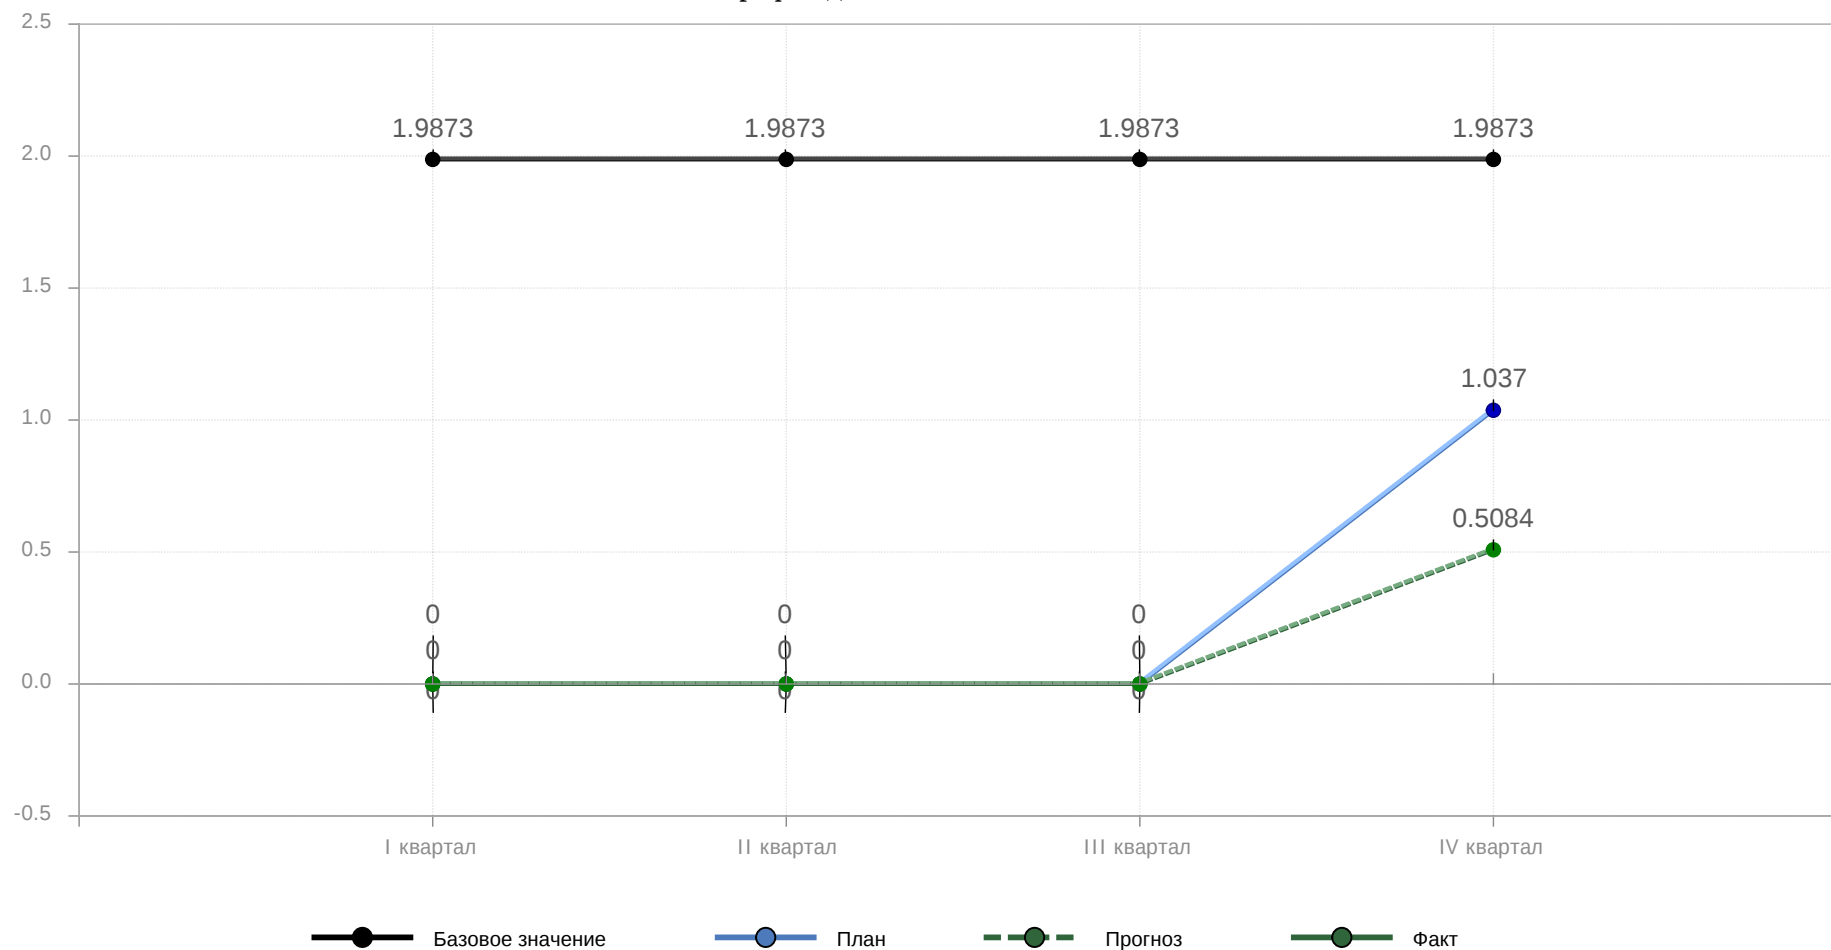


Рис. 15. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства

Диаграмма достижения показателя

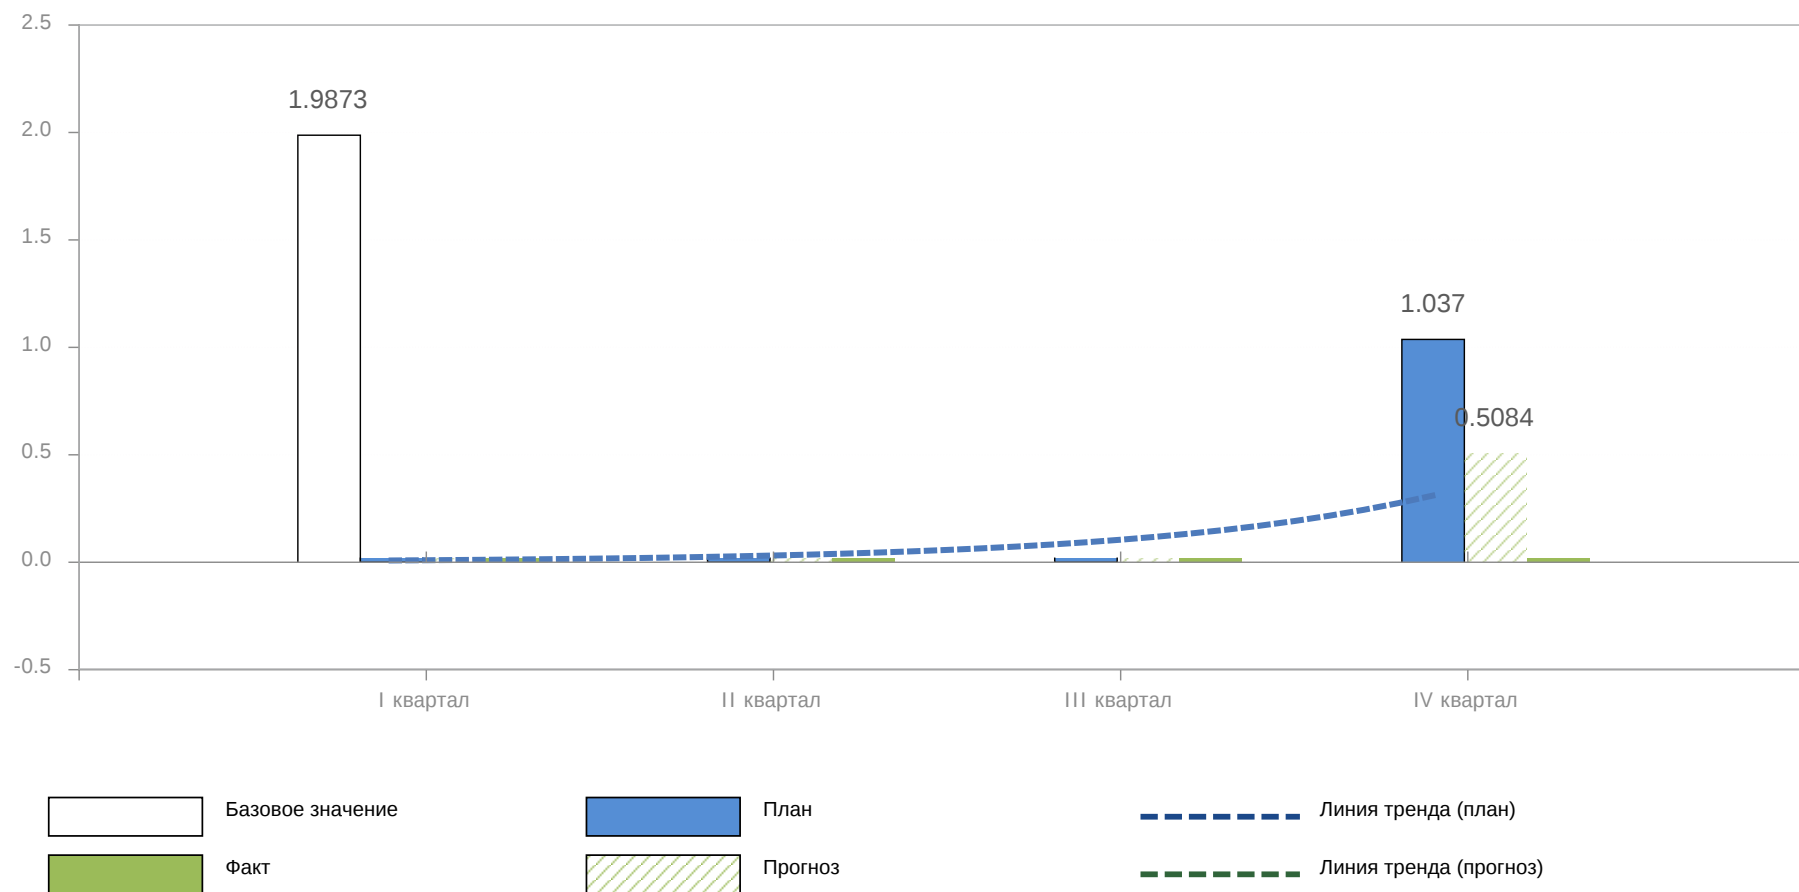


Рис. 16. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства

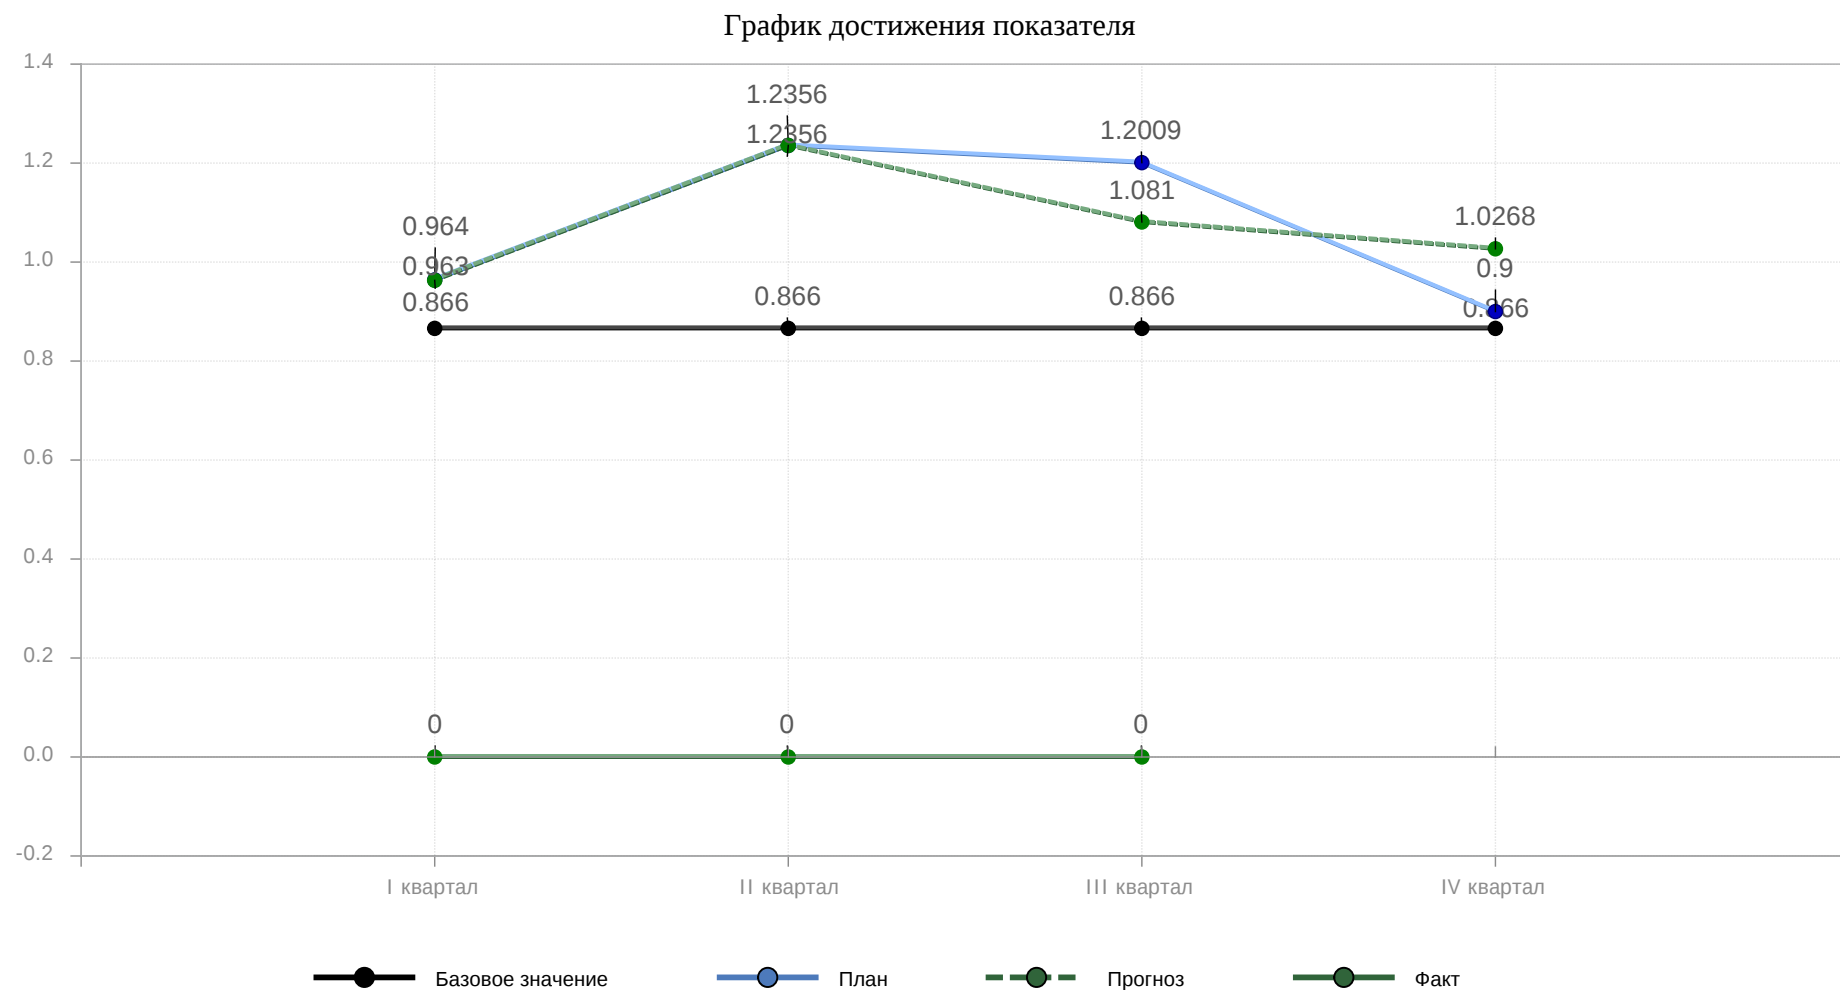


Рис. 17. Объем многоквартирного жилья в стадии строительства

Диаграмма достижения показателя

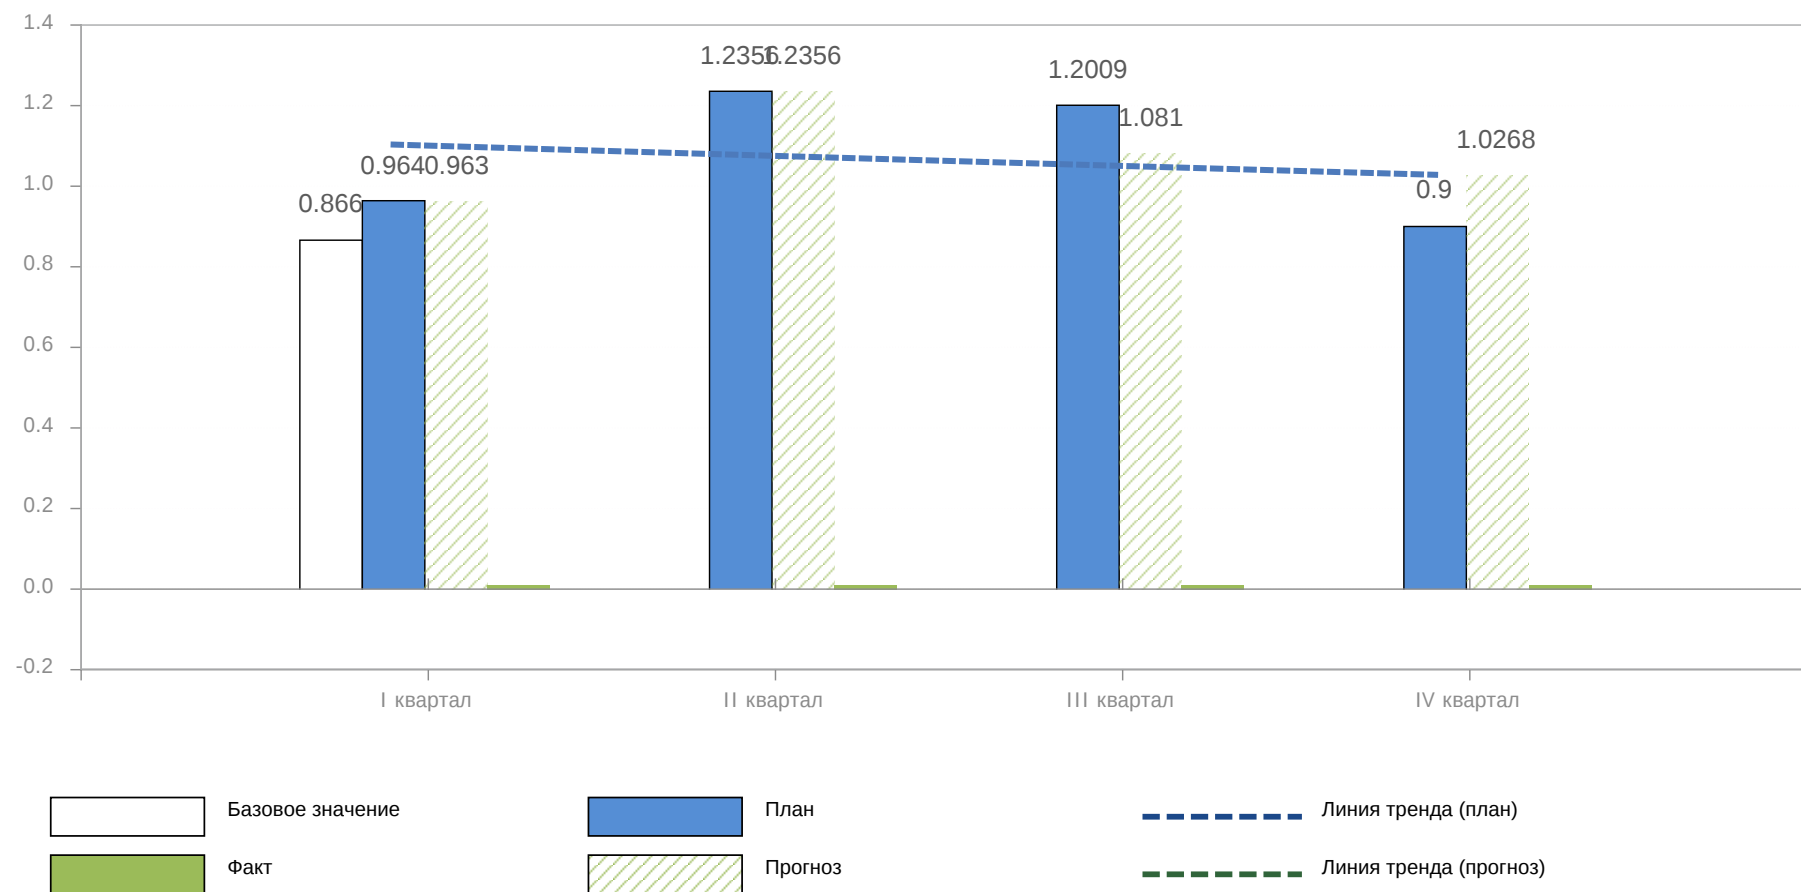


Рис. 18. Объем многоквартирного жилья в стадии строительства
