

Руководитель
регионального проекта —
документ подписан
Печеркина Ирина Александровна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
51816F6BBE11363C8203B54450E857DCCB119CF0

Владелец: Печеркина Ирина Александровна

Действителен: с 31.03.2020 по 01.07.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

" (F3-32) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, тыс. кв. м нарастающим итогом	Тысяча квадратных метров общей площади	40.44	50.9344	56.4888	68.768	84.5101	45.9	184,12%	Подтверждающие документы: 1. "уточненный годовой отчет о ходе реализации региональной адресной программы" Отчет государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 26.02.2021г. №И10-19/1776, приложен файл.
2		Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек нарастающим итогом	Тысяча человек	2.18	2.682	2.951	3.519	4.293	2.51	171,04%	Подтверждающие документы: 1. "уточненный годовой отчет о ходе реализации региональной адресной программы" Отчет Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 26.02.2021г. №И10-19/1776, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений




Сведения не представлены



Прогнозные сведения


3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 1 833 057,31 тыс. руб

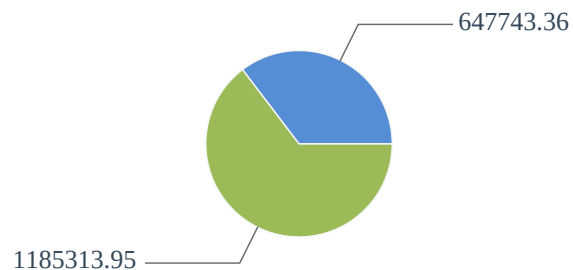

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 1 924 434,00 тыс. руб

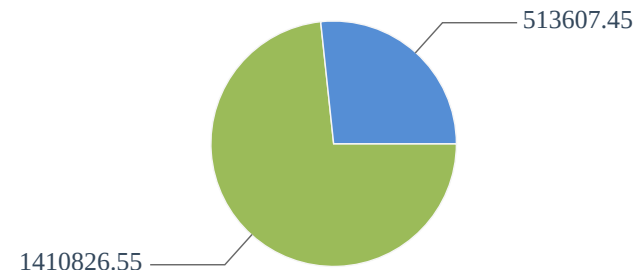

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения





Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	1 924 434,00	2 131 770,33	2 131 770,33	1 410 826,55	1 410 826,55	66,18	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 924 434,00	2 131 770,33	2 131 770,33	1 410 826,55	1 410 826,55	66,18	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 833 057,31	1 833 057,31	1 833 057,31	1 185 313,95	1 185 313,95	64,66	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 833 057,31	1 833 057,31	1 833 057,31	1 185 313,95	1 185 313,95	64,66	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	1 924 434,00	2 131 770,33	2 131 770,33	1 410 826,55	1 410 826,55	66,18	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 924 434,00	2 131 770,33	2 131 770,33	1 410 826,55	1 410 826,55	66,18	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 924 434,00	2 131 770,33	2 131 770,33	1 410 826,55	1 410 826,55	66,18	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 833 057,31	1 833 057,31	1 833 057,31	1 185 313,95	1 185 313,95	64,66	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			1 833 057,31	1 833 057,31	1 833 057,31	1 185 313,95	1 185 313,95	64,66	
бюджеты муниципальных образований			1 924 434,00	2 131 770,33	2 131 770,33	1 410 826,55	1 410 826,55	66,18	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Значение: 52,3300 Дата: 31.12.2020	
2		Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Значение: 98,2300 Дата: 31.12.2021	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Значение: 52,3300 Дата: 31.12.2020	31.12.2020	30.12.2020	Печеркина Ирина Александровна	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 30.12.2020г. № МС-03/4579, приложен файл. Предоставлена информация : 81.25 из 52.33.
1.1.	РРП		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	31.12.2020	30.12.2020	Печеркина Ирина Александровна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ежемесячный мониторинг реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 30.12.2020г. №МС-03/4579, приложен файл.
1.1.1	РРП		Предоставлены отчеты органами местного самоуправления за январь 2020 года	25.01.2020	25.01.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам; в разрезе муниципальных образований" Отчет Департаментом строительства Кемеровской области от 25.01.2020г. №б/н, приложен файл.
1.1.2	РРП		Предоставлен отчет органами местного самоуправления за февраль 2020 года	25.02.2020	25.02.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам; в разрезе муниципальных образований" Отчет Департамент строительства Кемеровской области от 25.02.2020г. №б/н, приложен файл.
1.1.3	РРП		Предоставлен отчет органами местного самоуправления за март 2020 года	25.03.2020	25.03.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам; в разрезе муниципальных образований" Отчет

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Министерство строительства Кузбасса от 25.03.2020г. № б/н, приложен файл.
1.1.4	РРП		Предоставлен отчет органами местного самоуправления за апрель 2020 года	25.04.2020	25.04.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам; в разрезе муниципальных образований" Отчет Министерство строительства Кузбасса от 25.04.2020г. № б/н, приложен файл.
1.1.5	РРП		Предоставлен отчет органами местного самоуправления за май 2020 года	25.05.2020	25.05.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам; в разрезе муниципальных образований" Отчет Министерство строительства Кузбасса от 25.05.2020г. №б/н, приложен файл.
1.1.6	РРП		Предоставлен отчет органами местного самоуправления за июнь 2020 года	25.06.2020	25.06.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							1. "Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам; в разрезе муниципальных образований." Отчет Министерство строительства Кузбасса от 25.06.2020г. №б/н, приложен файл.
1.1.7	РРП		Предоставлен отчет органами местного самоуправления за июль 2020 года	25.07.2020	25.07.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам; в разрезе муниципальных образований;" Отчет Министерством строительства Кузбасса от 25.07.2020г. №б/н, приложен файл.
1.1.8	РРП		Предоставлен отчет органами местного самоуправления за август 2020 года	25.08.2020	25.08.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам; в разрезе муниципальных образований." Отчет Министерством строительства Кузбасса от 25.08.2020г. №б/н, приложен файл.
1.1.9	РРП		Предоставлен отчет органами местного самоуправления за сентябрь 2020 года	25.09.2020	25.09.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам; в разрезе муниципальных образований;" Отчет Министерством строительства Кузбасса от 25.09.2020г. №б/н, приложен файл.
1.1.10	РРП		Предоставлен отчет органами местного самоуправления за октябрь 2020 года	25.10.2020	24.10.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам; в разрезе муниципальных образований;" Отчет Министерством строительства Кузбасса от 24.10.2020г. №б/н, приложен файл.
1.1.11	РРП		Предоставлен отчет органами местного самоуправления за ноябрь 2020 года	25.11.2020	25.11.2020	Костякова Олеся Владимировна	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			самоуправления за ноябрь 2020 года			Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам; в разрезе муниципальных образований" Отчет Министерством строительства Кузбасса от 25.11.2020г. №б/н, приложен файл.
1.1.12	РРП		Предоставлены отчеты органами местного самоуправления за декабрь 2020 года	25.12.2020	25.12.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам; в разрезе муниципальных образований" Отчет Министерством строительства Кузбасса от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл.
1.1.13	РРП		Предоставлены отчеты Министерством строительства Кузбасса за январь 2020 года	02.02.2020	31.01.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат;

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам; в разрезе муниципальных образований" Отчет Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 31.01.2020г. №ДС-03/307, приложен файл.
1.1.14	РРП		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за февраль 2020 года	02.03.2020	02.03.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам; в разрезе муниципальных образований" Отчет Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 02.03.2020г. №ДС-03/667, приложен файл.
1.1.15	РРП		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за март 2020 года	02.04.2020	02.04.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам; в разрезе муниципальных образований" Отчет

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 02.04.2020г. №МС-03/970, приложен файл.
1.1.16	РРП		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасс за апрель 2020 года	02.05.2020	30.04.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам; в разрезе муниципальных образований" Отчет Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 30.04.2020г. №МС-03/1436-1, приложен файл.
1.1.17	РРП		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за мая 2020 года	02.06.2020	02.06.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам; в разрезе муниципальных образований" Отчет Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 02.06.2020г. №МС-03/1733, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.18	РРП		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за июнь 2020 года	02.07.2020	02.07.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 02.07.2020г. № МС-03/2058-1, приложен файл.
1.1.19	РРП		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за июль 2020 года	02.08.2020	31.07.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда." Отчет Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 31.07.2020г. № МС-03/2442, приложен файл.
1.1.20	РРП		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за август 2020 года	02.09.2020	01.09.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 01.09.2020г. № МС-03/2787, приложен файл.
1.1.21	РРП		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за сентябрь	02.10.2020	01.10.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			2020 года				Подтверждающие документы: 1. "Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 01.10.2020г. № МС-03/3176, приложен файл.
1.1.22	РРП		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за октябрь 2020 года	02.11.2020	02.11.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъекта Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 02.11.2020г. №МС-03/3573, приложен файл.
1.1.23	РРП		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за ноябрь 2020 года	02.12.2020	01.12.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 01.12.2020г. № МС-013/4091, приложен файл.
1.1.24	РРП		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за декабрь 2020 года	31.12.2020	30.12.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							1. "Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 30.12.2020г. № МС-03/4579, приложен файл.
1.2.	РРП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	01.05.2020	30.01.2020	Печеркина Ирина Александровна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчеты" Отчет Департаментом строительства Кемеровской области от 30.01.2020г. №б/н, приложен файл.
1.2.1	РРП		Предоставлены итоговые отчеты органов местного самоуправления, участвующих в реализации региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда за 2019 год	01.04.2020	30.01.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчеты" Отчет Департаментом строительства Кемеровской области от 30.01.2020г. №б/н, приложен файл.
1.3.	РРП		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	31.12.2020	30.12.2020	Печеркина Ирина Александровна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" Распоряжение Правительство Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2020г. №873-р, приложен файл.
1.3.1	РРП		Внесены изменения в распределение межбюджетных трасфертов за 2020 год	31.12.2020	30.12.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							1. "О внесении изменений в распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" Распоряжение Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2020г. №873-р, приложен файл.
1.4.	РРП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	31.12.2020	29.12.2020	Печеркина Ирина Александровна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О рассмотрении заявки Кемеровской области - Кузбасса на предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда" Решение правление государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 29.12.2020г. № 1037, приложен файл.
1.5.	РРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2020	30.12.2020	Печеркина Ирина Александровна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части финансирования и произведенных кассовых расходов" Отчет государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 30.12.2020г. №МС-03/4579, приложен файл.
1.6.	ПК		Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального	01.07.2020	26.03.2020	Печеркина Ирина Александровна	Выполнено. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)				1. "Дополнительное соглашение к Договору от 29 апреля 2019 года о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда" Соглашение Департаментом строительства Кемеровской области от 16.12.2019г. №б/н, приложен файл.
1.6.1	РРП		Доведение лимитов финансирования до органов местного самоуправления	01.05.2020	26.03.2020	Анферова Анастасия Анатольевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам" уведомление Министерством строительства Кузбасса от 26.03.2020г. №б/н, приложен файл.
1.6.2	РРП		Заключены соглашения (дополнительные соглашения) с органами местного самоуправления по этапу 2020 года	01.04.2020	16.12.2019	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Договору от 29 апреля 2019 года о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда." Соглашение Департаментом строительства Кемеровской области от 16.12.2019г. №б/н, приложен файл.
1.7.	КРП		Документ утвержден (подписан)	31.12.2020	24.12.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							1. "заявка на предоставление финансовой поддержки Кемеровской области - Кузбассу от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Письмо государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 24.12.2020г. №И10-18/10563, приложен файл.
1.7.1	РРП		Направление заявки в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию этапа 2021 года.	31.12.2020	24.12.2020	Костякова Олеся Владимировна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "заявка на предоставление финансовой поддержки Кемеровской области - Кузбассу от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Письмо государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 24.12.2020г. №И10-18/10563, приложен файл.
2.			<i>Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Значение: 98,2300 Дата: 31.12.2021</i>	31.12.2021	31.12.2021	Печеркина Ирина Александровна	Информация по значению результата: В работе.отсутствие отклонений Предоставлена информация : 98.23 из 98.23.
2.1.	РРП		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование	31.12.2021	31.12.2021	Печеркина Ирина Александровна	В работе. отклонения отсутствуют

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений







Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)				
2.1.1	РРП		Предоставлены отчеты органами местного самоуправления за январь 2021 года	25.01.2021	25.01.2021	Костякова Олеся Владимировна	В работе.
2.1.2	РРП		Предоставлен отчет органами местного самоуправления за февраль 2021 года	25.02.2021	25.02.2021	Костякова Олеся Владимировна	В работе.
2.1.3	РРП		Предоставлен отчет органами местного самоуправления за март 2021 года	25.03.2021	25.03.2021	Костякова Олеся Владимировна	В работе.
2.1.4	РРП		Предоставлены отчеты Министерством строительства Кузбасса за январь 2021 года	02.02.2021	02.02.2021	Костякова Олеся Владимировна	В работе.
2.1.5	РРП		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за февраль 2021 года	02.03.2021	02.03.2021	Костякова Олеся Владимировна	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Динамика достижения контрольных точек

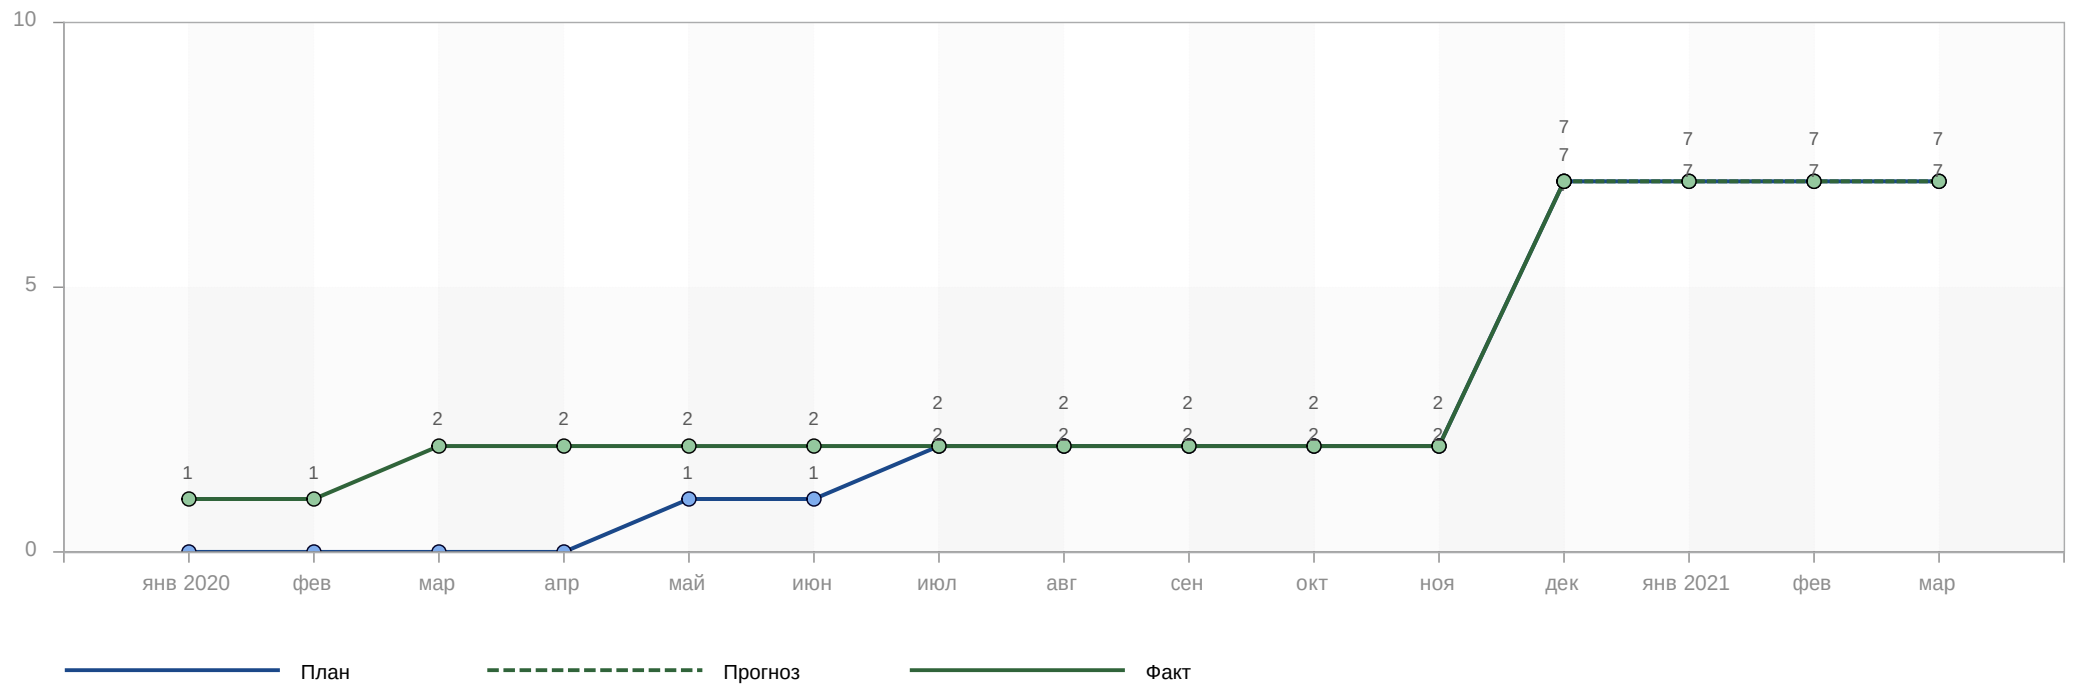


Рис. 1. " (F3-32) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Кемеровская область)"

График достижения показателя

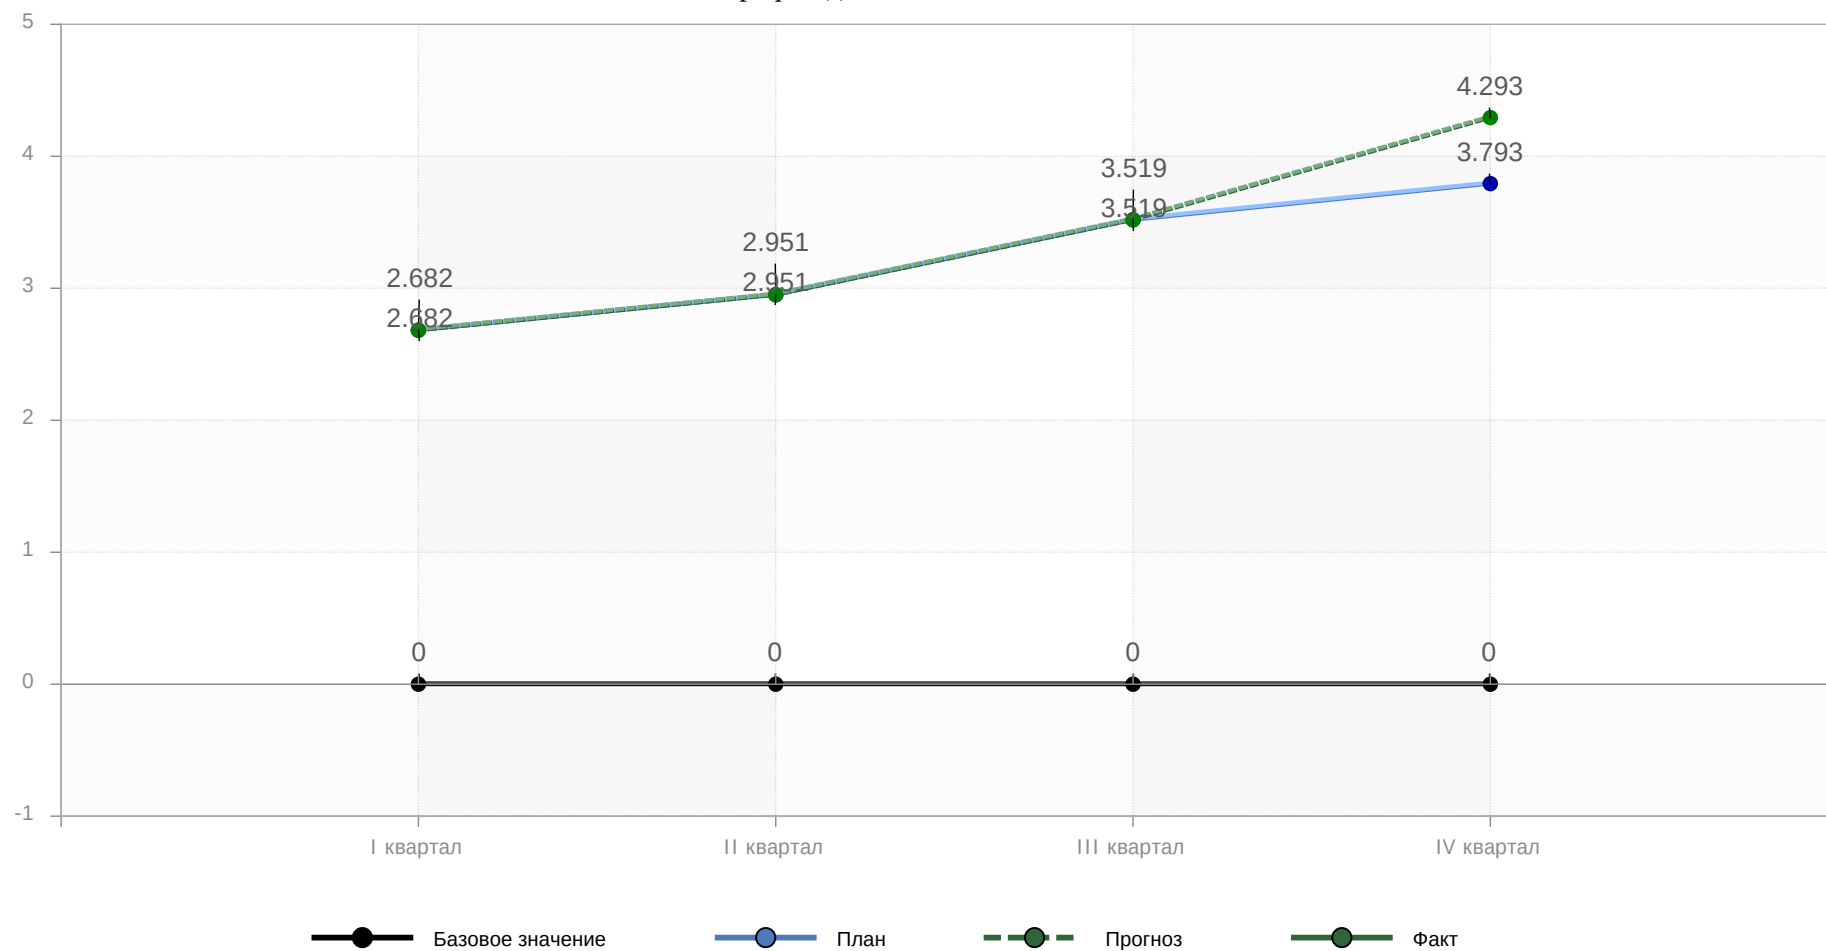


Рис. 1. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя

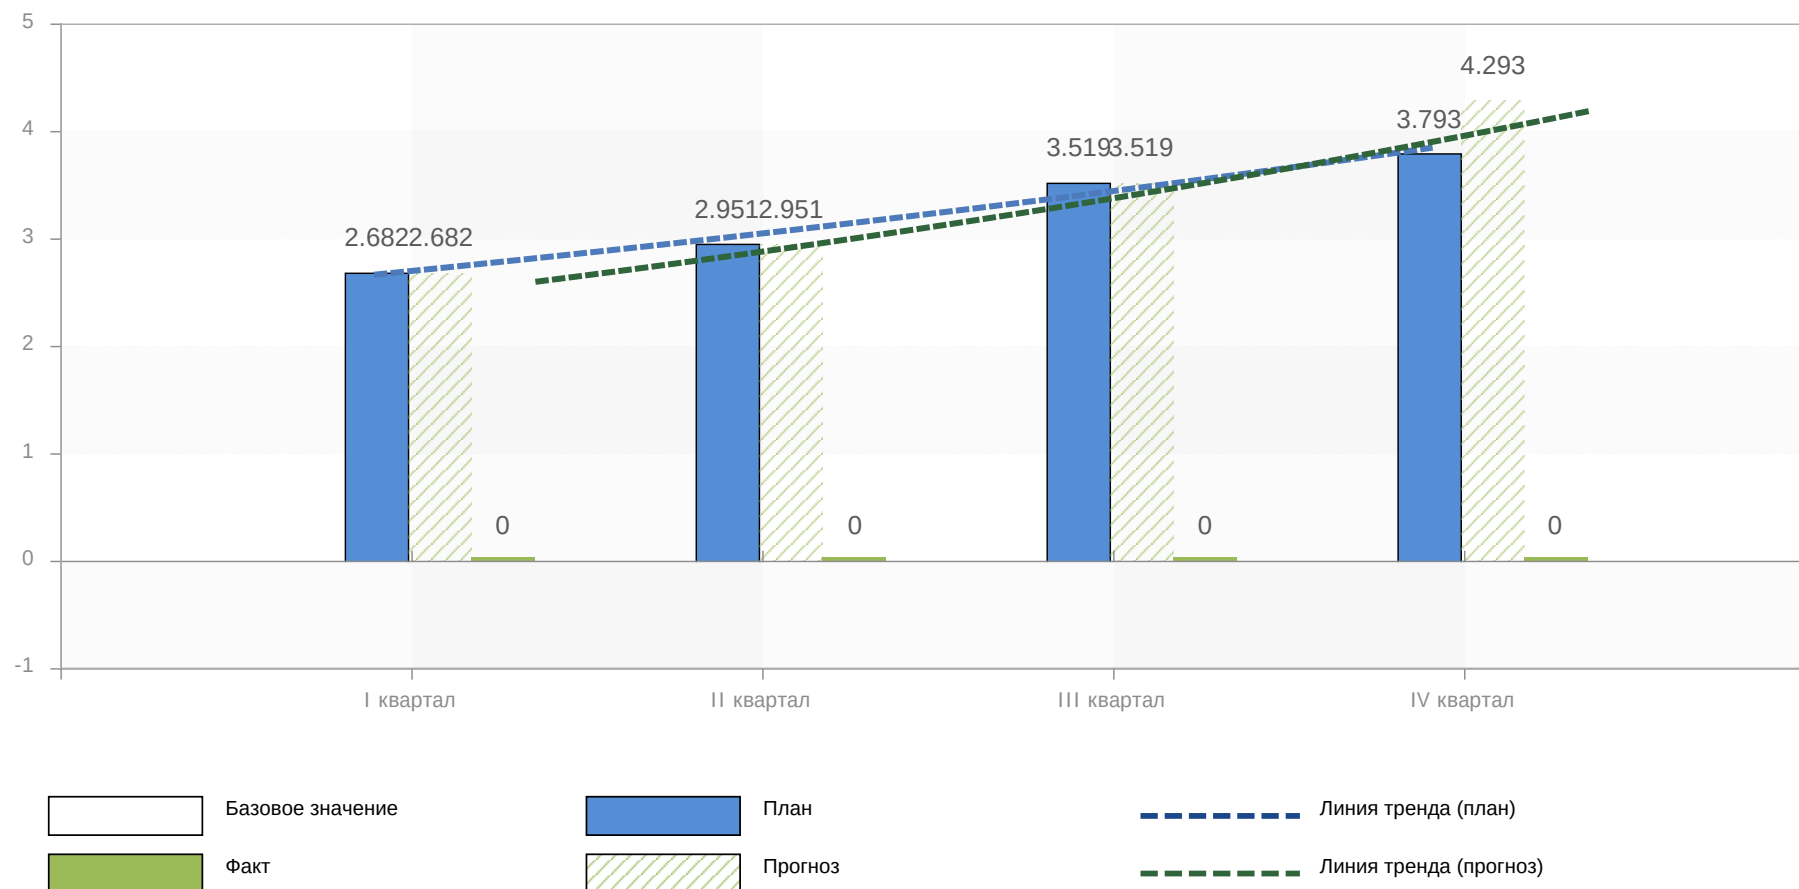


Рис. 2. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек нарастающим итогом

График достижения показателя

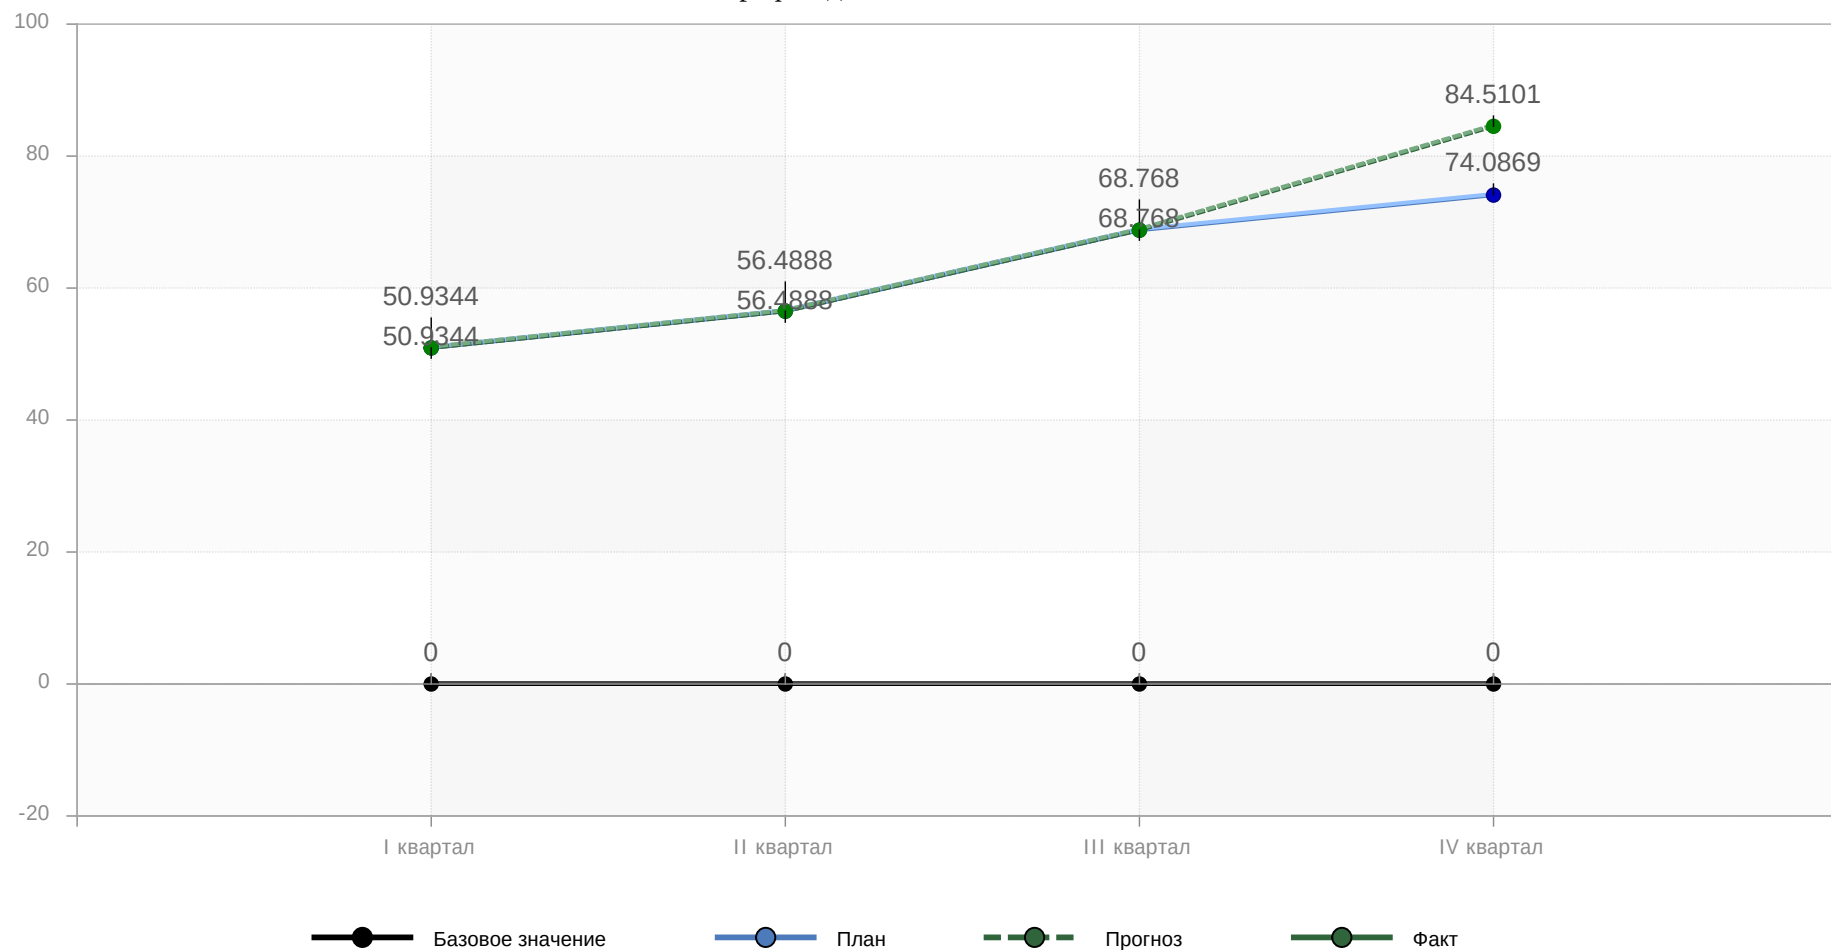


Рис. 3. Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, тыс. кв. м нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя

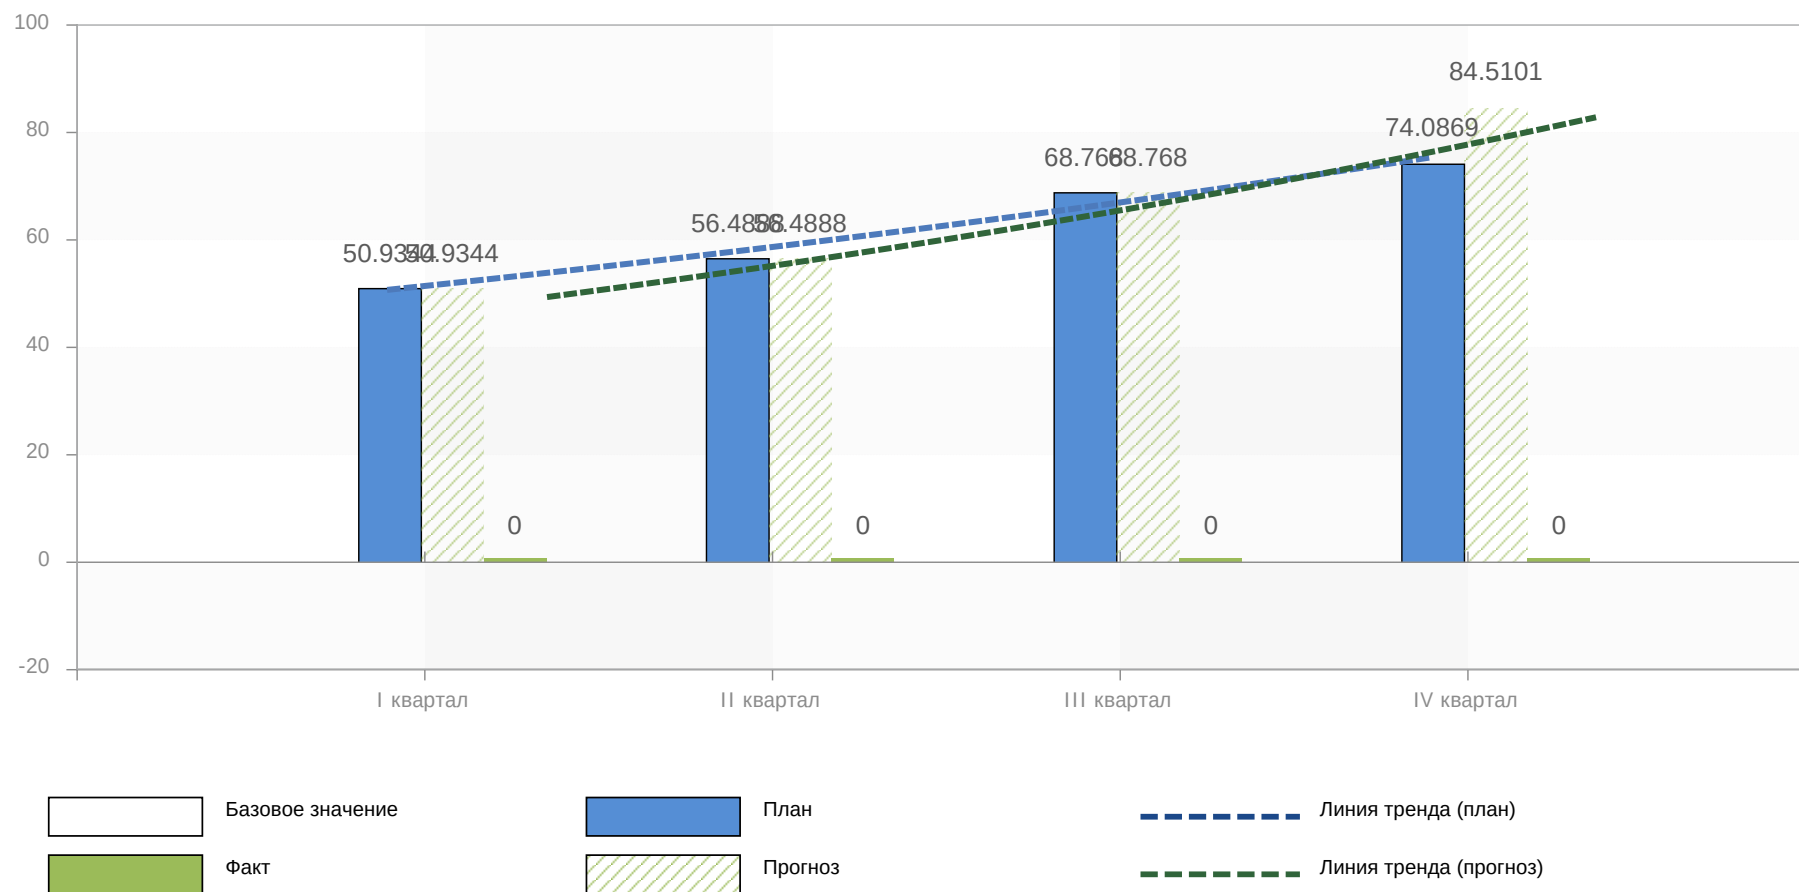


Рис. 4. Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, тыс. кв. м нарастающим итогом
