

Руководитель
регионального проекта —
Ивлев Олег Валериевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

10.01.2020

Сертификат:

20488C39DC94EA19ACF77AFB07338A0980D8912E

Владелец: Ивлев Олег Валериевич

Действителен: с 07.08.2019 по 07.11.2020

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(G5-32) Чистая вода (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Процент	98.3	0	0	0	98.3	98.3	100,00%	
2		Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Процент	94	0	0	0	94	94	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о результатах оценки состояния объектов систем водоснабжения_ Кемеровская область, 2018 год" Отчет Департамента ЖК и ДК КО от 30.04.2019г. №И15-50/4006, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений




Сведения не представлены




Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2019 год
Всего: 12 796,60 тыс. руб

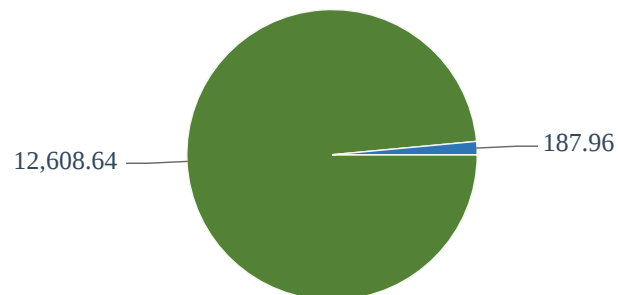


Сводный бюджет МО
на 2019 год
Всего: 14 218,40 тыс. руб

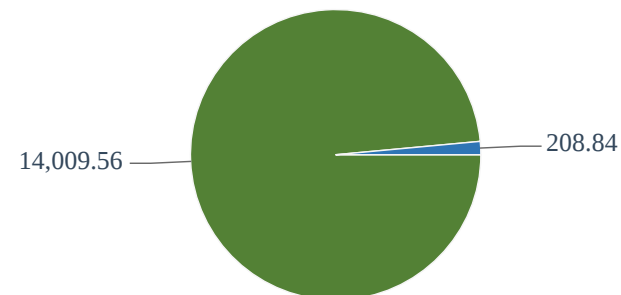

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2019 год
Всего: 4 400,00 тыс. руб



■ Фактически исполнено

■ Риски исполнения

■ Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.	18 618,40	18 618,40	18 618,40	18 618,40	18 409,56	98,88	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	14 218,40	14 218,40	14 218,40	14 218,40	14 009,56	98,53	кассовое исполнение от 28.12.2019
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	12 796,60	12 796,60	12 796,60	12 796,60	12 608,64	98,53	кассовое исполнение от 28.12.2019
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	12 796,60	12 796,60	12 796,60	12 796,60	12 608,64	98,53	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	14 218,40	14 218,40	14 218,40	14 218,40	14 009,56	98,53	кассовое исполнение от 28.12.2019
1.2		внебюджетные источники	4 400,00	X	X	X	4 400,00	100,00	кассовое исполнение от 28.12.2019

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			18 618,40	18 618,40	18 618,40	18 618,40	18 409,56	98,88	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			14 218,40	14 218,40	14 218,40	14 218,40	14 009,56	98,53	
бюджет субъекта Российской Федерации			12 796,60	12 796,60	12 796,60	12 796,60	12 608,64	98,53	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			12 796,60	12 796,60	12 796,60	12 796,60	12 608,64	0,00	
бюджеты муниципальных образований			14 218,40	14 218,40	14 218,40	14 218,40	14 009,56	98,53	
внебюджетные источники			4 400,00	X	X	X	4 400,00	100,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.	 
2		Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности.	
3		Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены





 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения. Значение: 1, на дату 02.08.2019	02.08.2019	01.05.2019	Ивлев О. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о результатах оценки состояния объектов систем водоснабжения_ Кемеровская область, 2018 год" Отчет Департамента ЖК и ДК КО от 30.04.2019г. №И15-50/4006, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
1.1	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	01.08.2019	01.05.2019	Ивлев О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о результатах оценки состояния объектов систем водоснабжения_ Кемеровская область, 2018 год" Отчет Департамента ЖК и ДК КО от 30.04.2019г. №И15-50/4006, приложен файл.
1.1.1	РПП		В Кемеровской области проведена инвентаризация объектов водоснабжения в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации и представлены отчеты в Фонд ЖКХ	01.05.2019	01.05.2019	Ивлев О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о результатах оценки состояния объектов систем водоснабжения_ Кемеровская область, 2018 год" Отчет Департамента ЖК и ДК КО от 30.04.2019г. №И15-50/4006, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2			Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности. Значение: 1, на дату 01.10.2019	01.10.2019	01.08.2019	Ивлев О. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 458 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014-2024 годы" Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.07.2019г. №466, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
2.1	ПК		Документ разработан	01.08.2019	01.08.2019	Ивлев О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 458 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014-2024 годы" Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.07.2019г. №466, приложен файл.
2.1.1	РПП		В Кемеровской области разработан проект региональной программы на период с 2019 по 2024 год	01.08.2019	01.08.2019	Ивлев О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в государственную программу Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014-2024 годы" Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.07.2019г. №466, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3			Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Значение: 9, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Ивлев О. В.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 9 из 9. Информация по результату: В работе.
3.1			С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	15.02.2019	12.02.2019	Ивлев О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области" Соглашение Коллегия АКО от 12.02.2019г. №069-09-2019-247, приложен файл.
3.1.1	РРП		Организовано заключение соглашений с Минстроем России о финансовой поддержке	15.02.2019	12.02.2019	Ивлев О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области" Соглашение Коллегия АКО от 12.02.2019г. №069-19-2019, приложен файл.
3.2	КРП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	15.02.2020	15.02.2020	Ивлев О. В.	В работе.
3.2.1	РРП		Организовано заключение соглашения с Минстроем России о финансовой поддержке	15.02.2020	15.02.2020	Ивлев О. В.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.3	КРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	01.04.2020	01.04.2020	Ивлев О. В.	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Протокол техсовещания" Протокол Беловского городского округа от 23.12.2019г. №6/н, приложен файл. 2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Акт приема-передачи МКУ СЗ ЖКХ от 23.12.2019г. №1, приложен файл. 3. "Дополнительное соглашение" Контракт МКУ СЗ ЖКХ от 23.12.2019г. №2, приложен файл.
3.3.1	РРП		В Кемеровской области реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2019 году	31.12.2019	30.12.2019	Ивлев О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол техсовещания" Протокол Беловского городского округа от 23.12.2019г. №6/н, приложен файл. 2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" Акт приема-передачи МКУ СЗ ЖКХ от 23.12.2019г. №1, приложен файл. 3. "Дополнительное соглашение" Контракт МКУ СЗ ЖКХ от 23.12.2019г. №2, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек

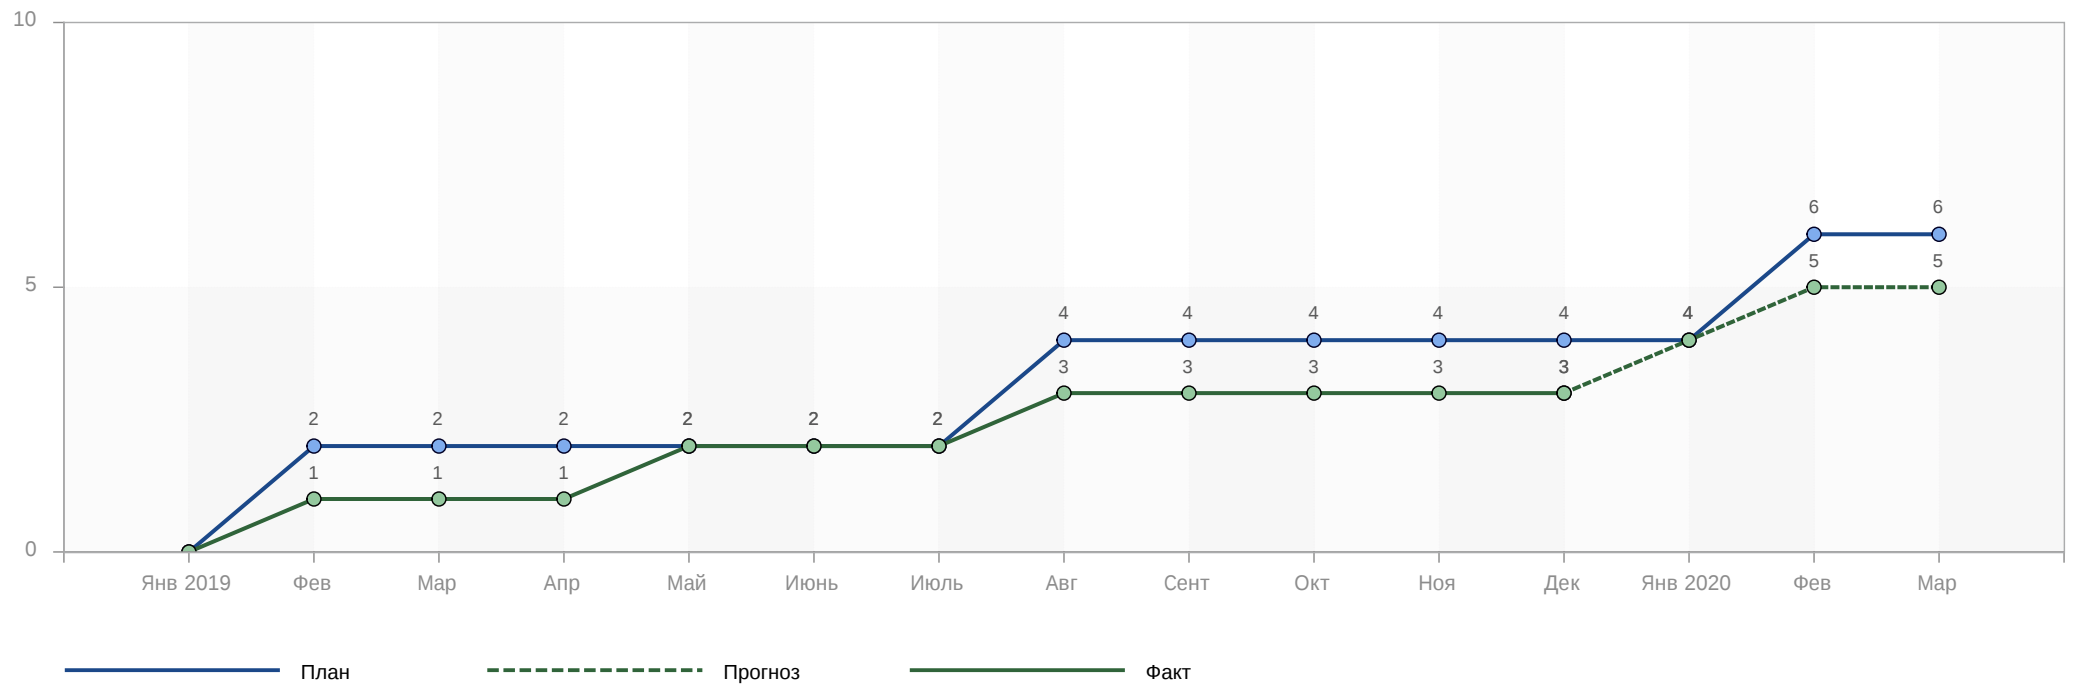


Рис. 1. "(G5-32) Чистая вода (Кемеровская область)"

График достижения показателя

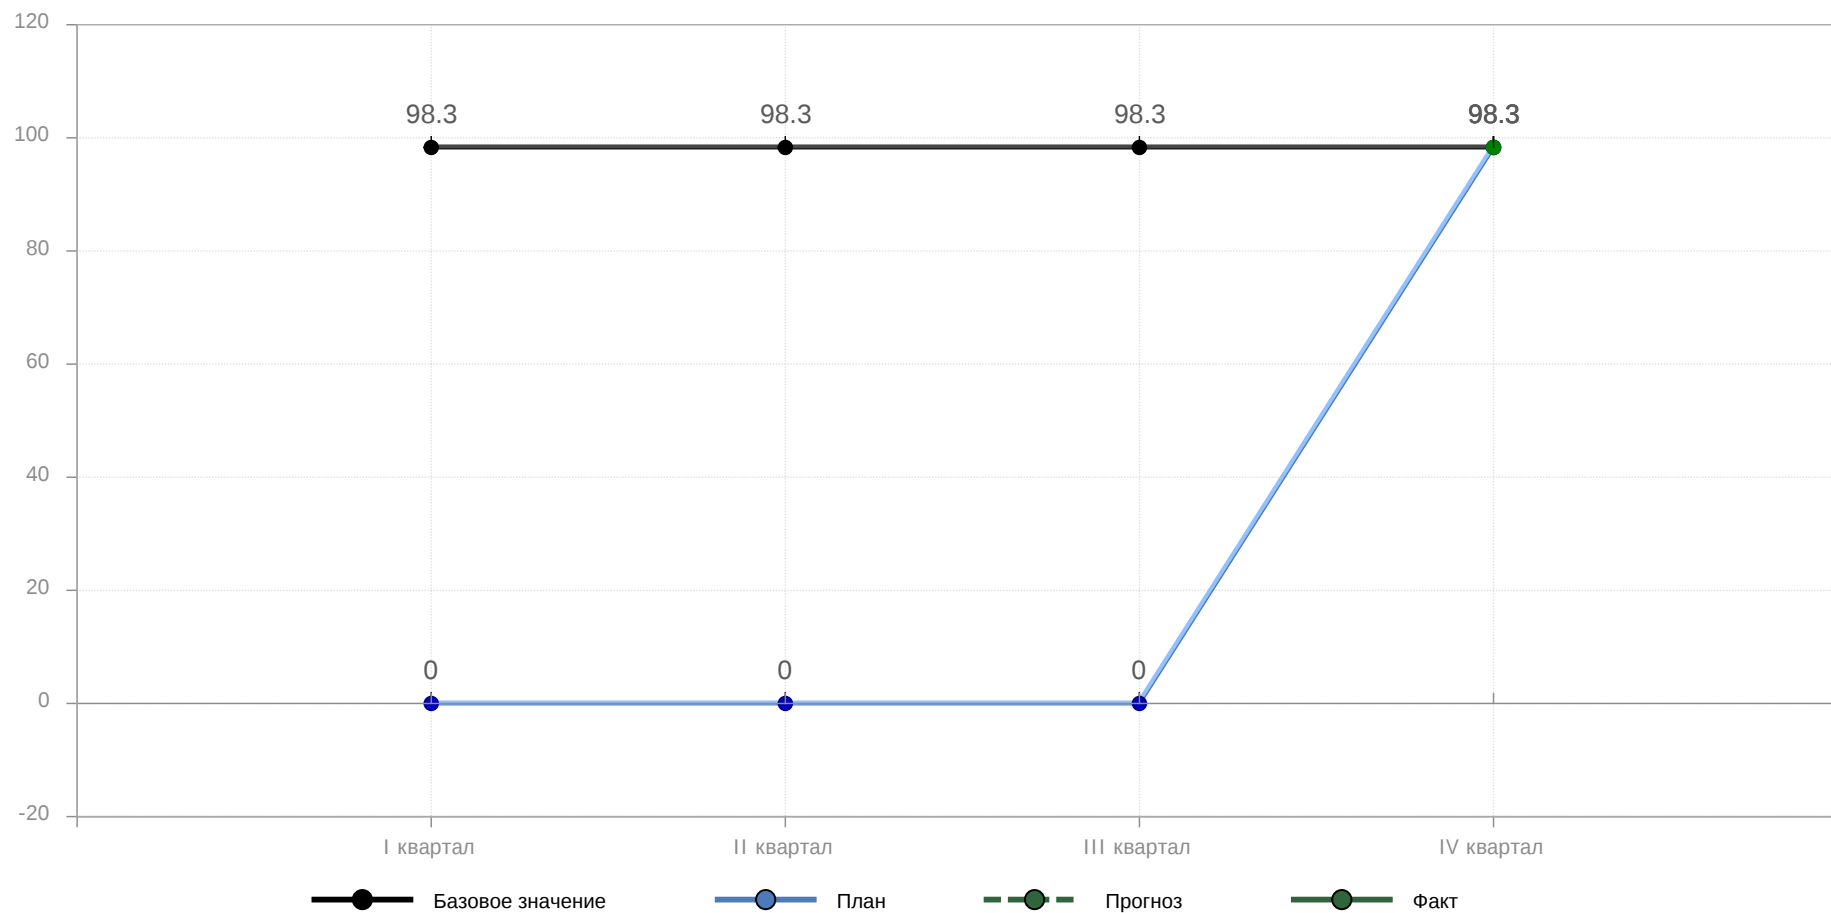


Рис. 1. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Диаграмма достижения показателя

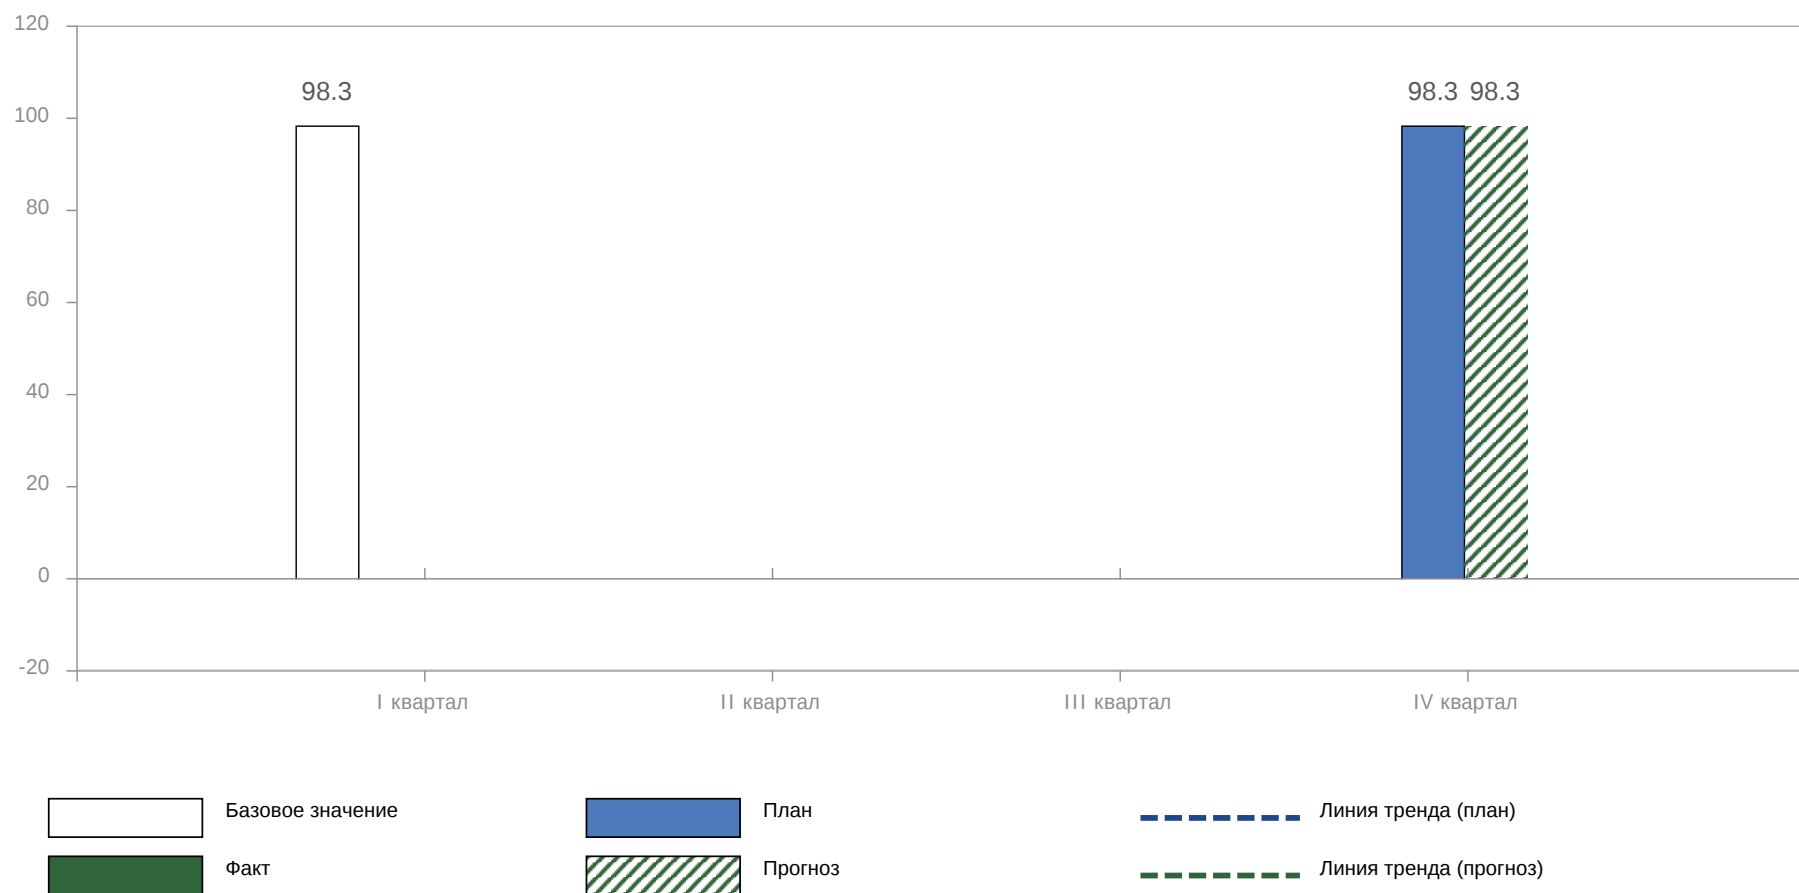


Рис. 2. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

График достижения показателя

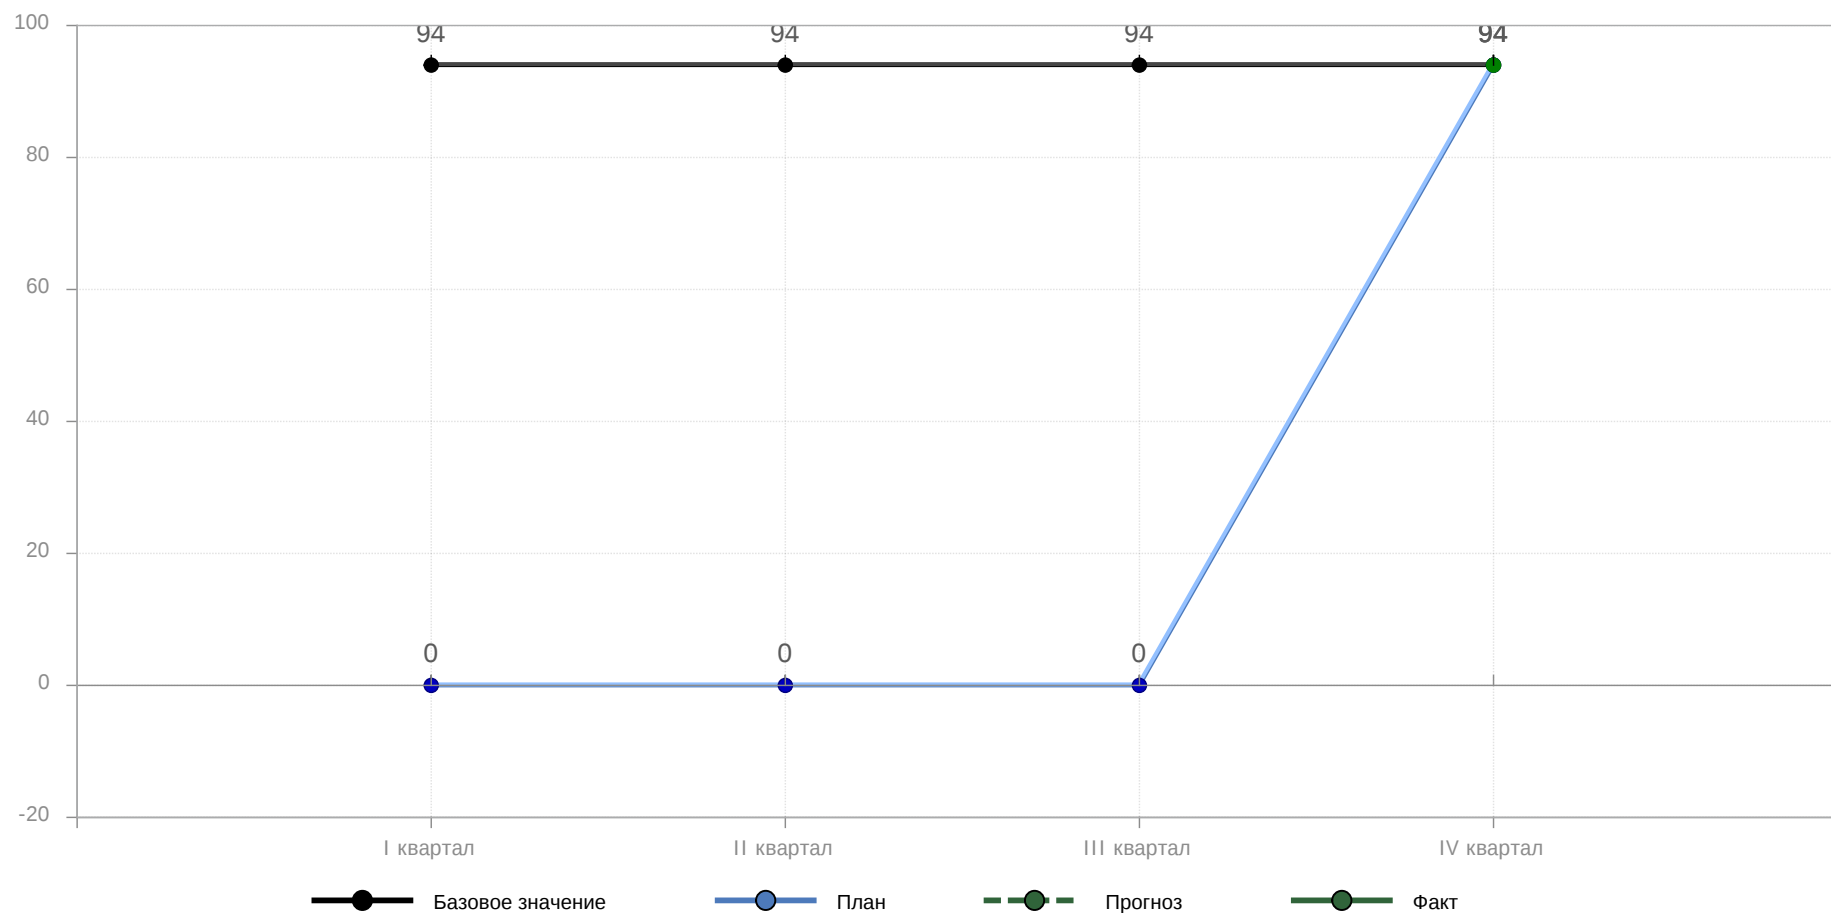


Рис. 3. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченной качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Диаграмма достижения показателя

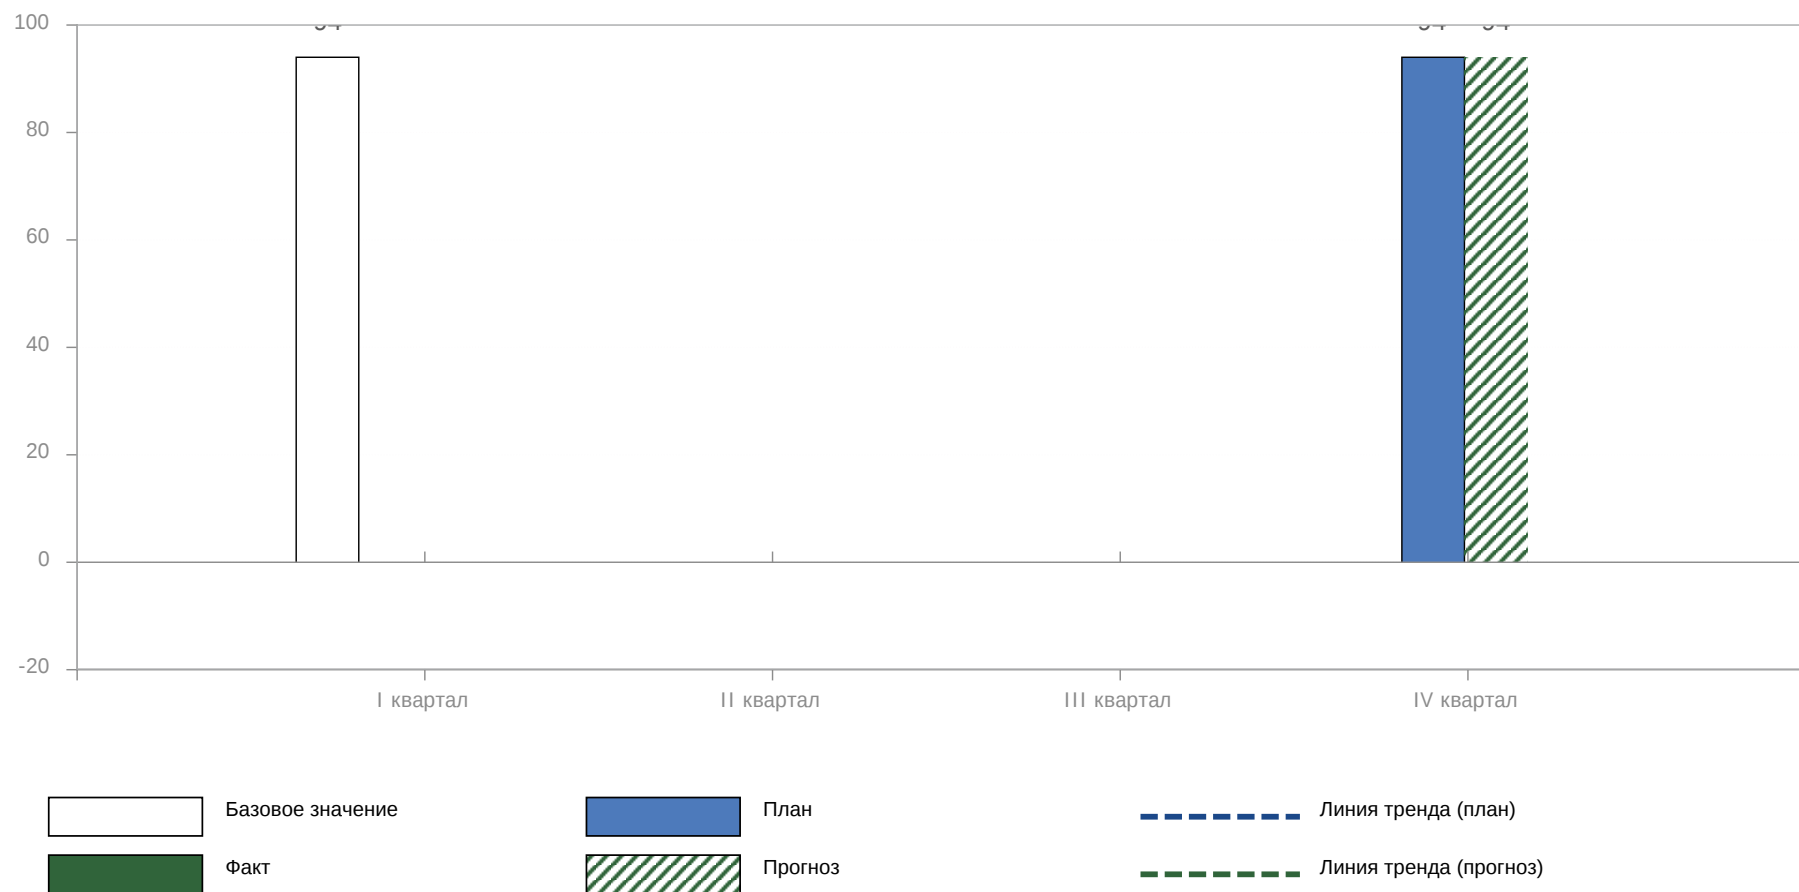


Рис. 4. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
