

Руководитель
документ подписан
электронной подписью
Садиков Максим Владимирович

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

(подпись)
Сертификат:
209E77DF83F221F7B3B98842C16E7062C485DA6E
Владелец: САДИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Действителен: с 13.01.2020 по 13.04.2021

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(D2-32) Информационная инфраструктура (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"	Процент	100	100	100	100	100	100	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о показателе регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 2020 году" Иное Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл. На момент создания регионального проекта "Информационная инфраструктура" все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники) Кемеровской области уже были подключены к сети "Интернет". Отсутствие отклонений.
2		Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"	Процент	26.35	34.58	34.58	34.58	71	69	102,90%	Подтверждающие документы: 1. "Сведения о подключении СЗО на территории Кемеровской области" Акт приема-передачи Министерства цифрового развития и связи Кузбасса от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл. В таблице Сведения о подключении СЗО на территории Кемеровской области данные приведены в абсолютных величинах. Показатель "Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет" рассчитывается согласно приказу Минкомсвязи России от 06.04.2020



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
											№160.Риск отсутствует.
3		Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"	Процент	15.74	17.28	17.28	17.28	79	77	102,60%	Подтверждающие документы:1. "Сведения о подключении СЗО на территории Кемеровской области " Акт приема-передачи Министерства цифрового развития и связи Кузбасса от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.В таблице "Сведения о подключении СЗО на территории Кемеровской области" данные представлены в абсолютных величинах.Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" рассчитывается согласно приказу Минкомсвязи России от 06.04.2020 №160 Риск отсутствует.
4		Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"	Процент	17.2	25.8	25.8	25.8	92	92	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Сведения о подключении СЗО на территории Кемеровской области" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.В таблице "Сведения о подключении СЗО на территории Кемеровской области" данные представлены в абсолютных величинах.Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет" рассчитывается согласно приказу Минкомсвязи России от 06.04.2020 №160 Риск отсутствует.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 335 851,20 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

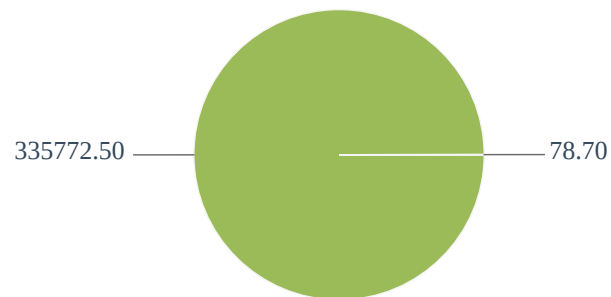

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(88) Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций	335 851,20	335 851,20	335 851,20	335 772,50	335 772,50	99,98	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	335 851,20	335 851,20	335 851,20	335 772,50	335 772,50	99,98	Экономия в размере 78,7 тыс. руб. возвращена в соотношении 97% в федеральный бюджет, 3% в областной бюджет
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	335 851,20	335 851,20	335 851,20	335 772,50	335 772,50	99,98	Экономия в размере 78,7 тыс. руб. возвращена в соотношении 97% в федеральный бюджет, 3% в областной бюджет
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			335 851,20	335 851,20	335 851,20	335 772,50	335 772,50	99,98	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			335 851,20	335 851,20	335 851,20	335 772,50	335 772,50	99,98	
бюджет субъекта Российской Федерации			335 851,20	335 851,20	335 851,20	335 772,50	335 772,50	99,98	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Оказано содействие подключению к сети «Интернет» фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области Значение: 507,0000 Дата: 31.12.2020	
2		Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций Значение: 172,0000 Дата: 01.09.2020	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены






Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Оказано содействие подключению к сети «Интернет» фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области Значение: 507,0000 Дата: 31.12.2020	31.12.2020	28.12.2020	Садиков М. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет об итогах реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 2020 году " Отчет Министерства цифрового развития и связи Кузбасса от 28.12.2020г. №бн, приложен файл. Предоставлена информация : 507 из 507.
1.1.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	28.12.2020	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об итогах реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 2020 году " Отчет Министерства цифрового развития и связи Кузбасса от 28.12.2020г. №бн, приложен файл. Риск отсутствует.
1.1.1	РПП		Участие в приемке работ (услуг) у поставщиков (подрядчиков), выполнявших мероприятия федерального проекта на основании государственных контрактов (договоров), заключенных участниками федерального проекта	31.12.2020	30.11.2020	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о подключении социально значимых объектов на территории Кемеровской области" Акт приема-передачи Министерства цифрового развития и связи Кузбасса от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл. Риск отсутствует.
2.			Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной	01.09.2020	01.09.2020	Балакирева С. Ю.	Информация по значению результата:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций Значение: 172,0000 Дата: 01.09.2020</i>				Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет "Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций"" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 01.09.2020г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 172 из 172.
2.1.	ПК		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.09.2020	08.06.2020	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства образования и науки Кузбасса от 02.06.2020г. №885515, приложен файл. 2. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства образования и науки Кузбасса от 04.06.2020г. №38536, приложен файл. 3. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства образования и науки Кузбасса от 08.06.2020г. №87261, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек

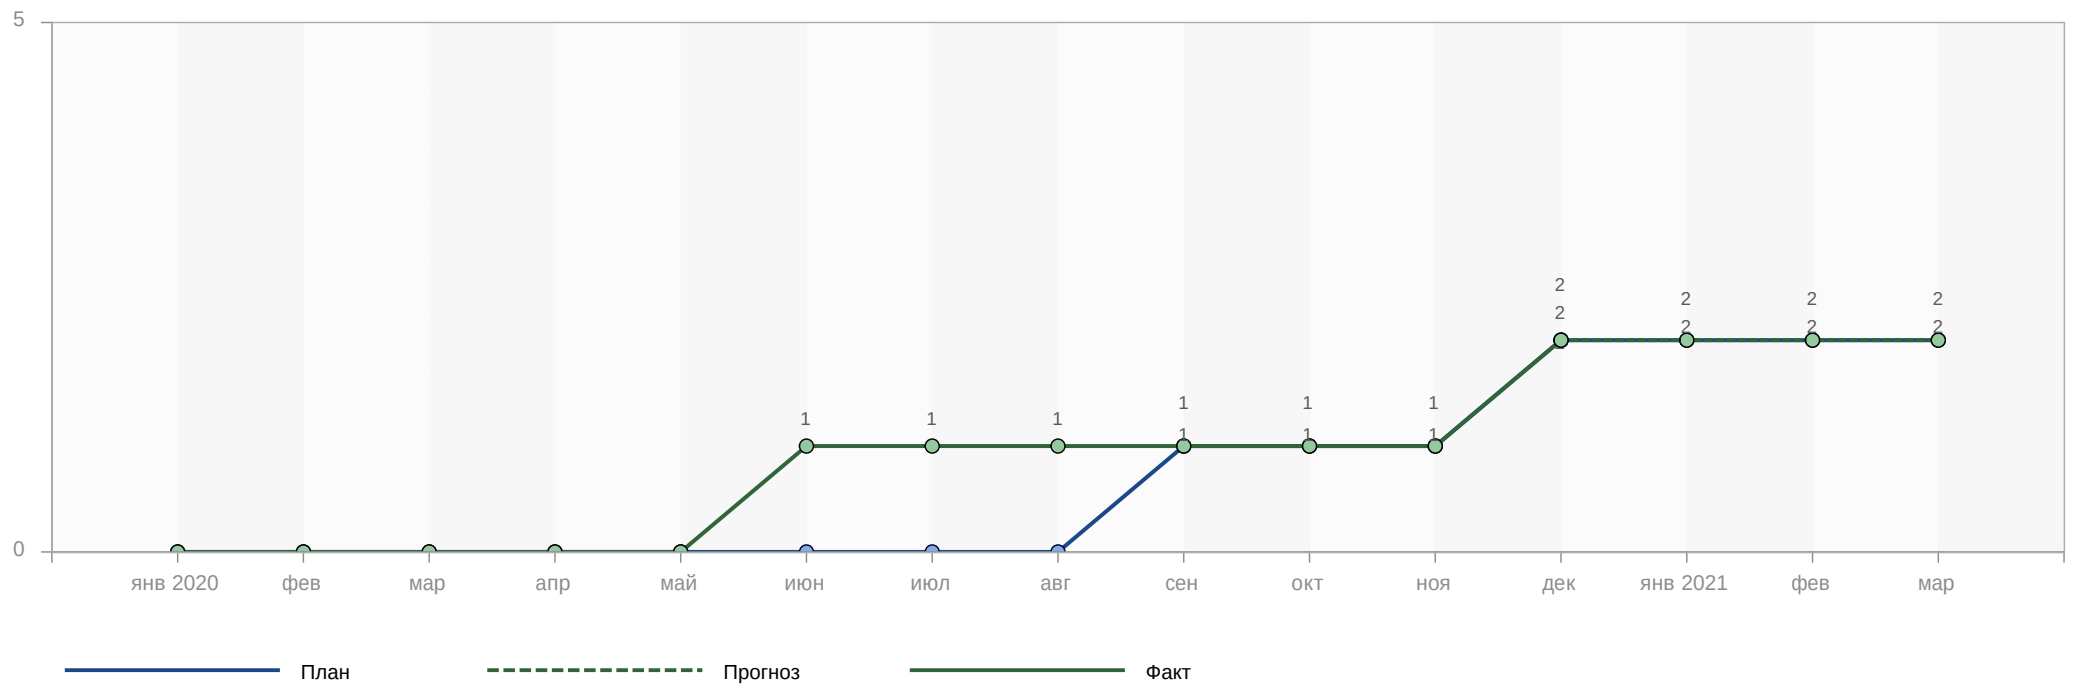


Рис. 1. "(D2-32) Информационная инфраструктура (Кемеровская область - Кузбасс)"

График достижения показателя

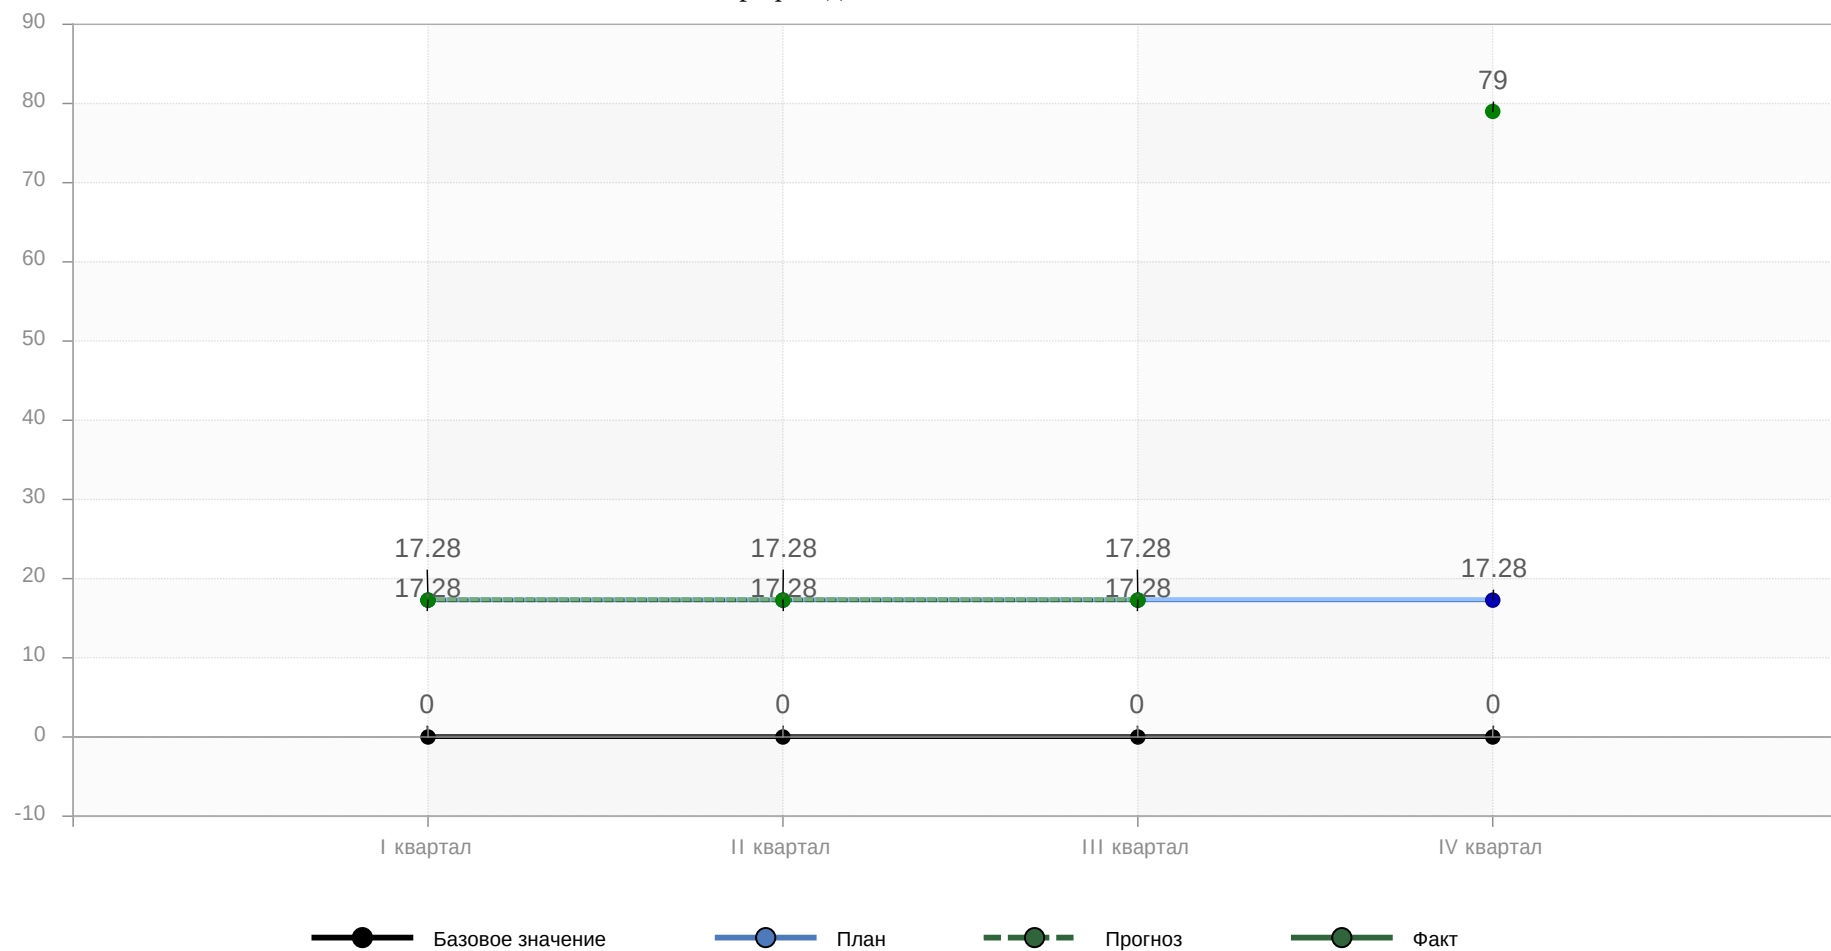


Рис. 1. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

Диаграмма достижения показателя

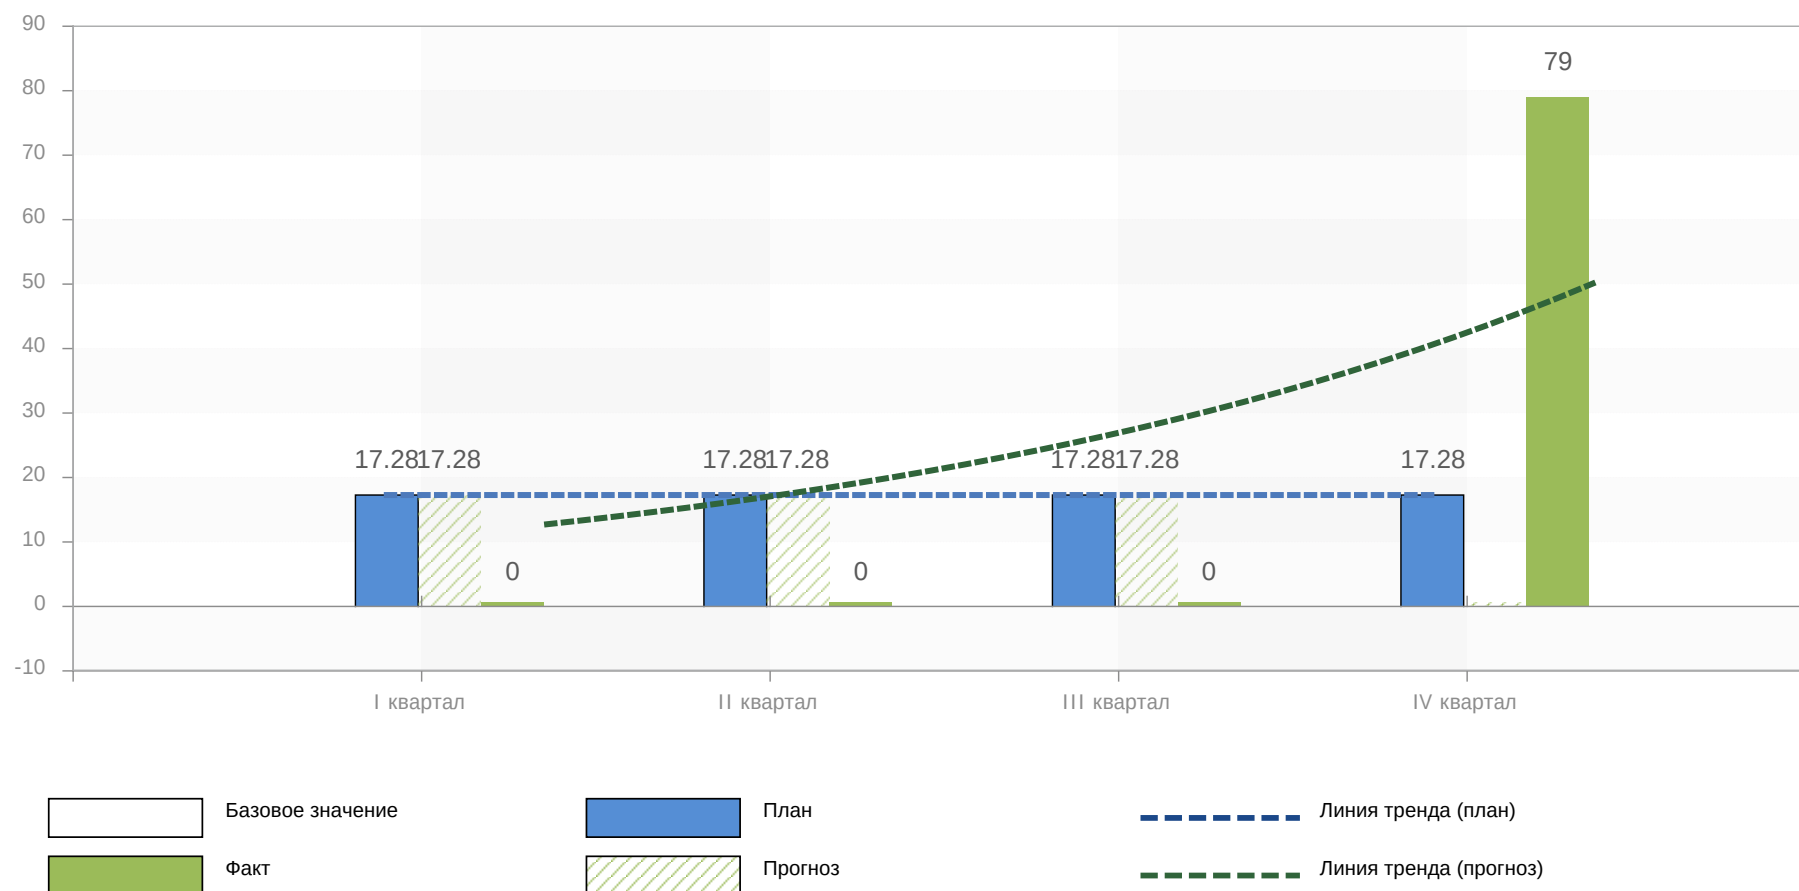


Рис. 2. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

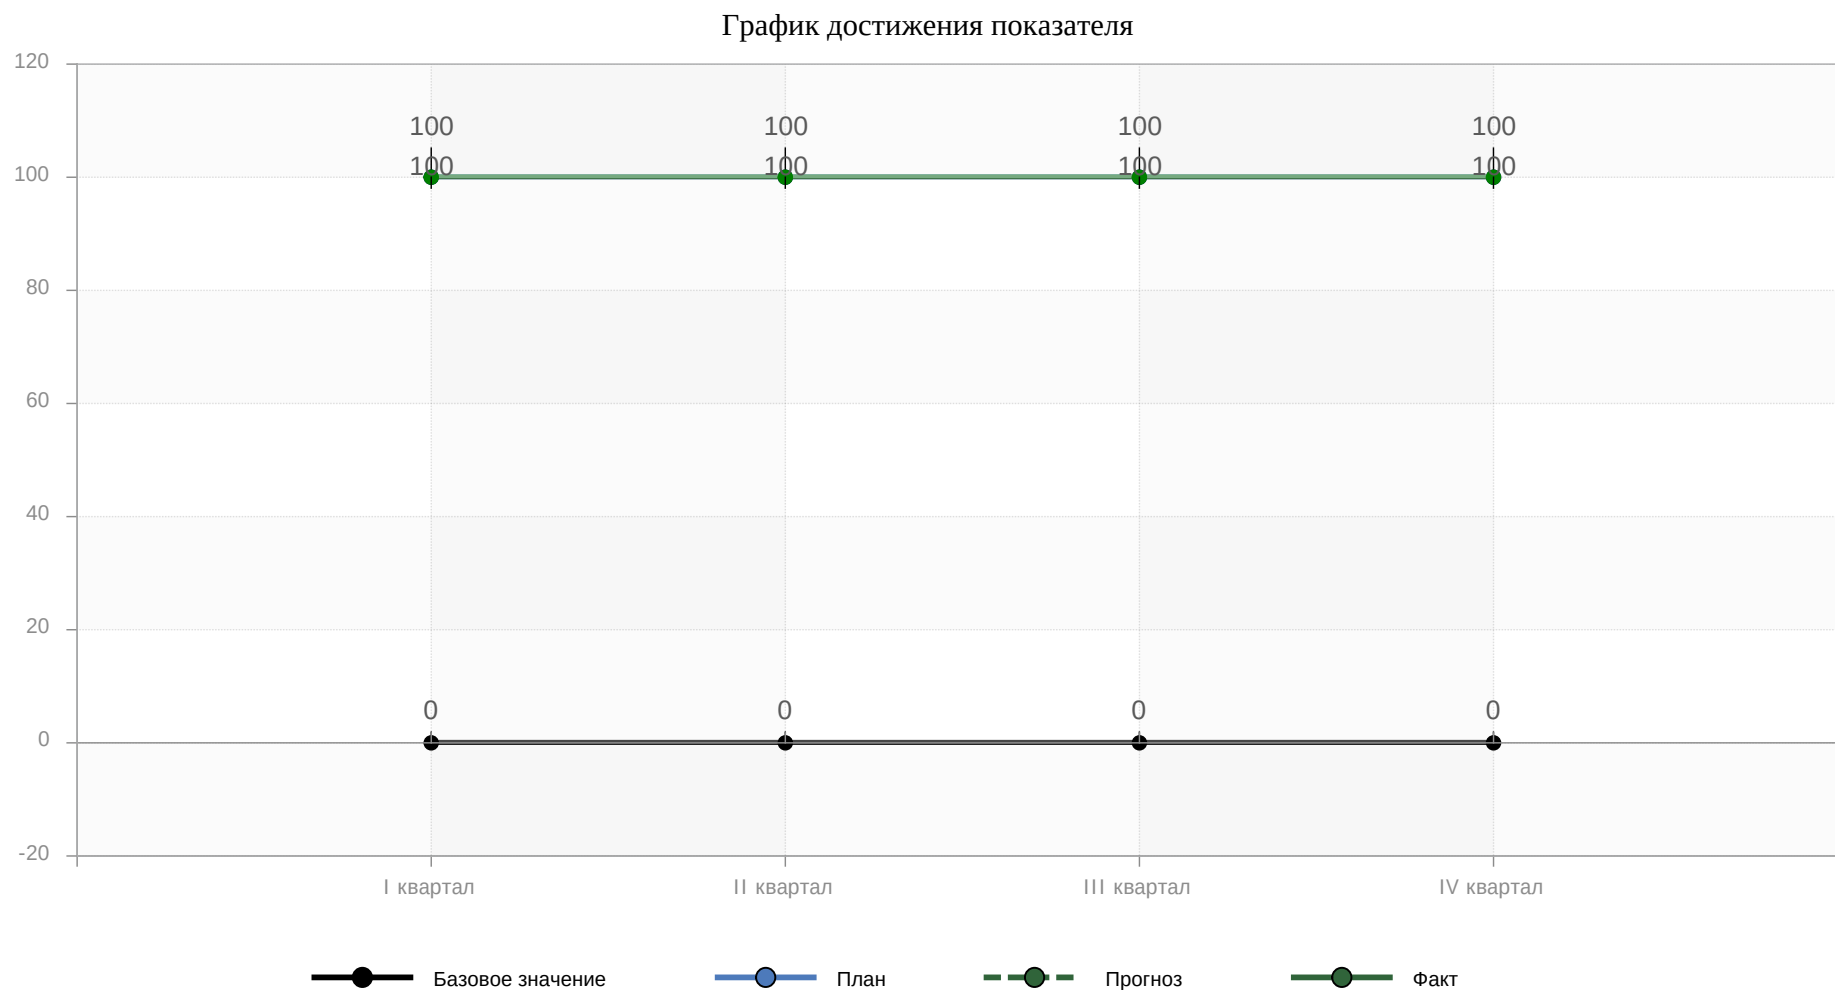


Рис. 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"

120

100

80

60

40

20

0

-20

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

100

100

100

100

100

100

100

100

0

Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

Рис. 4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"

График достижения показателя



Рис. 5. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"

Диаграмма достижения показателя

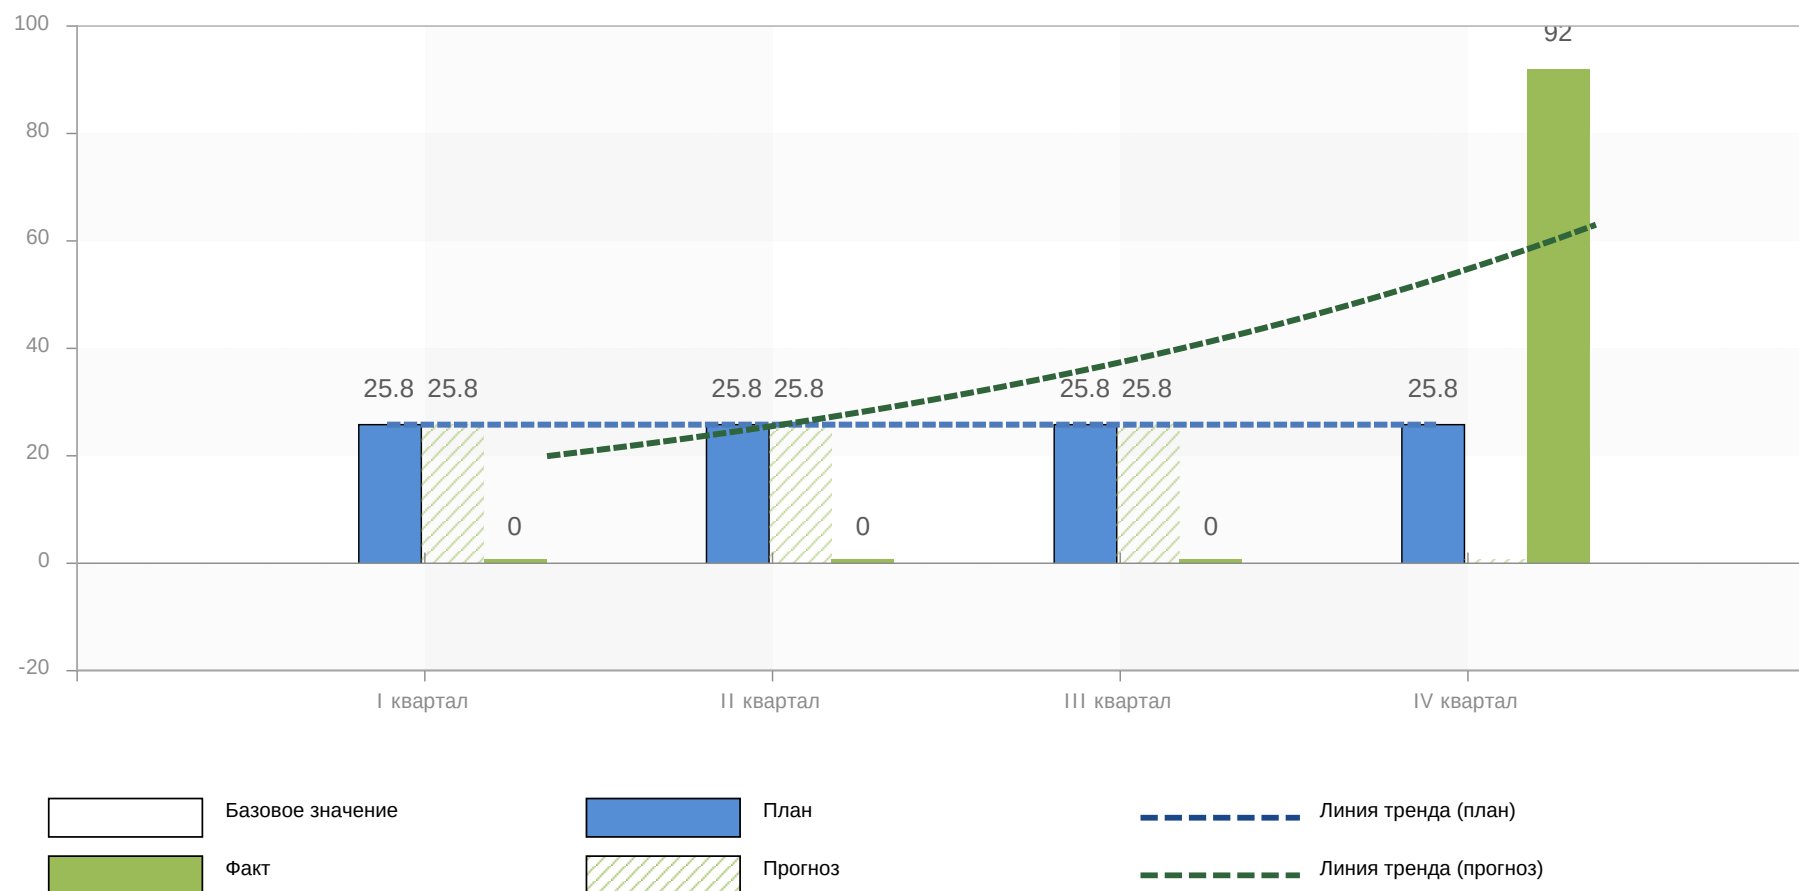


Рис. 6. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"

График достижения показателя

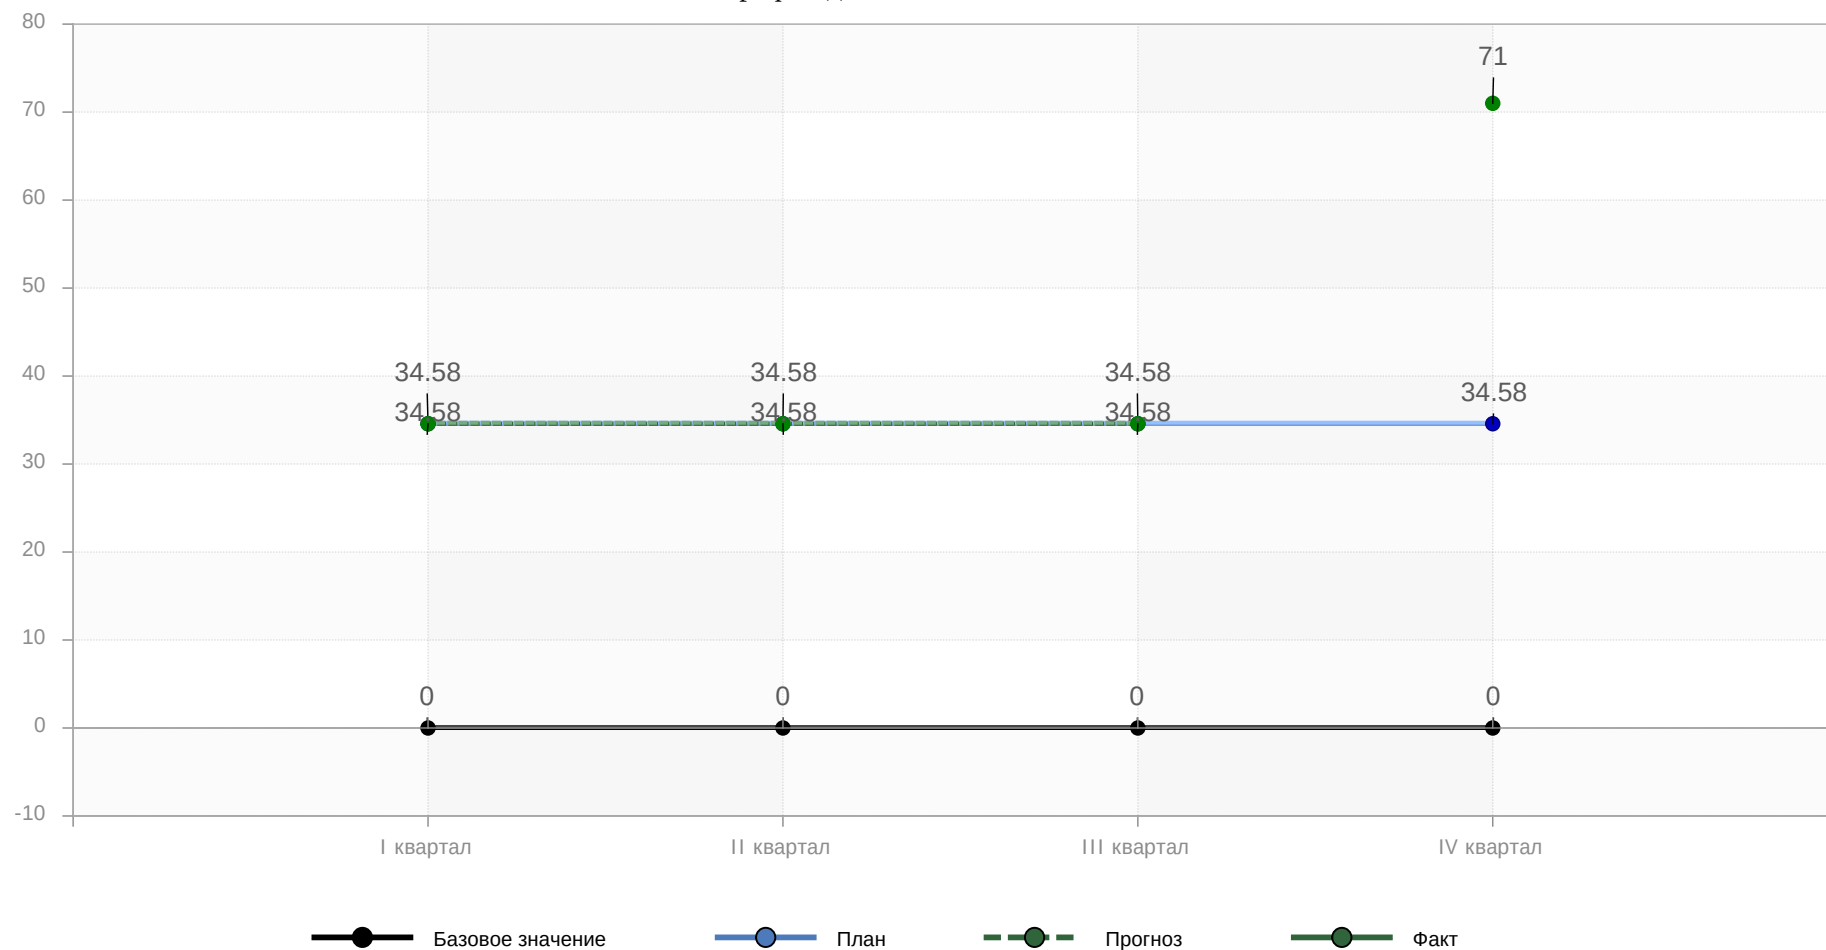


Рис. 7. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"

Диаграмма достижения показателя

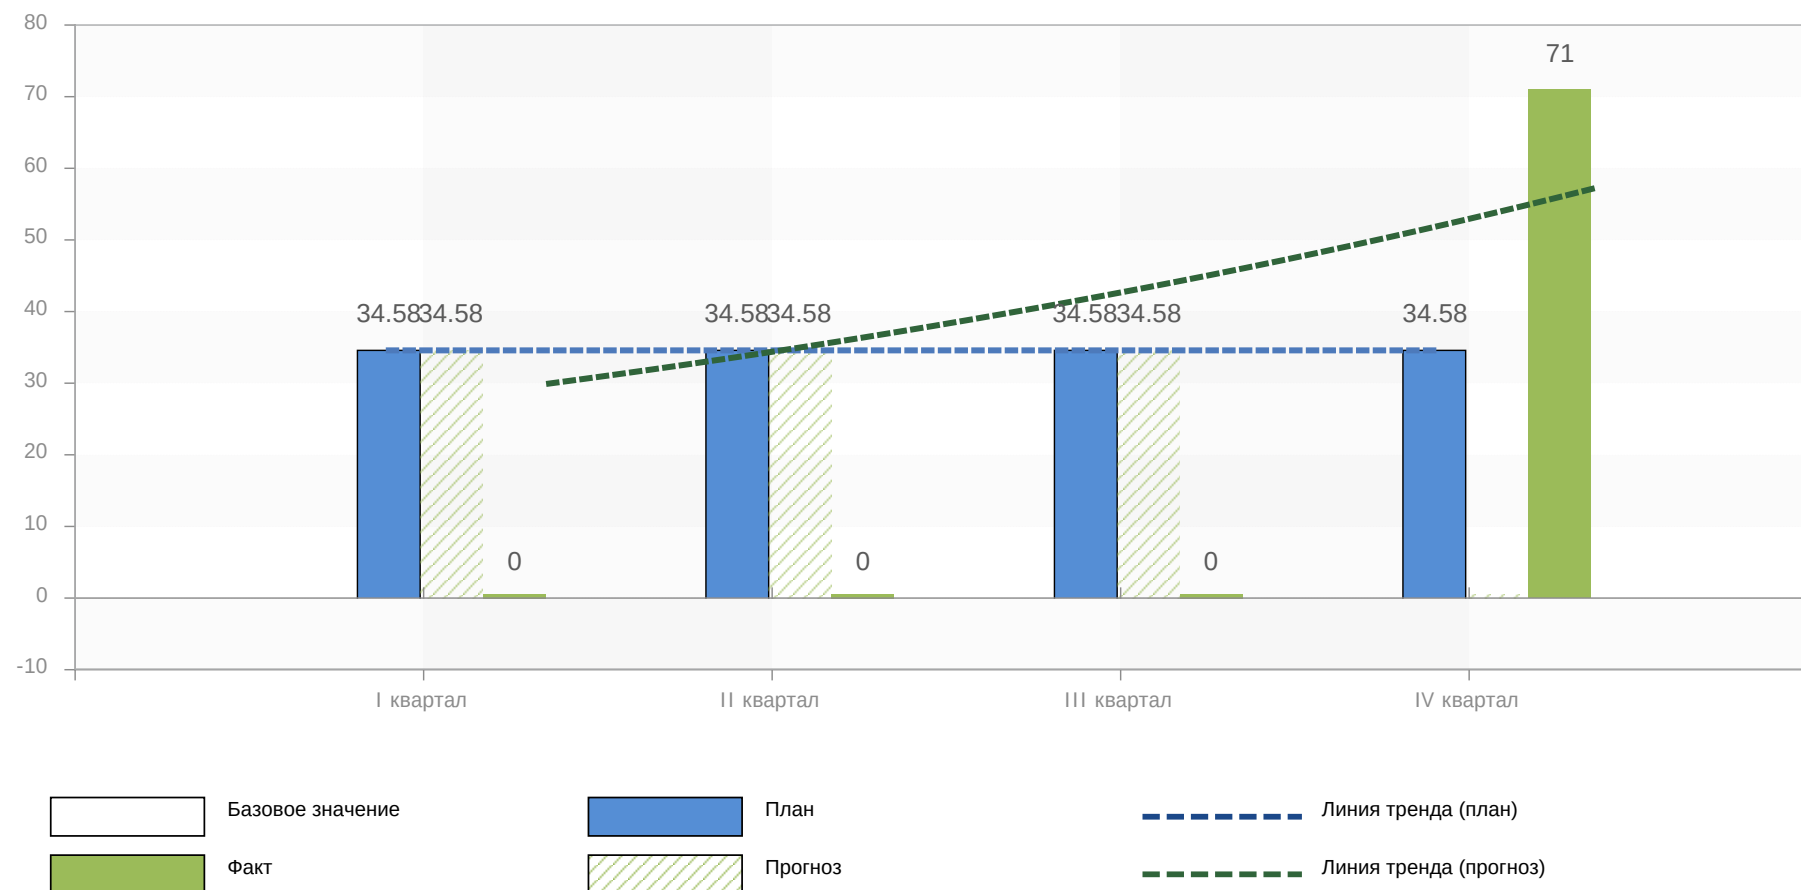


Рис. 8. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"
