

Руководитель
регионального проекта —
Мяус Сергей Анатольевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

09.05.2021

Сертификат:
335FBE9DE4B56A9FD637DD66D4A32B938DE0BB60

Владелец: Мяус Сергей Анатольевич

Действителен: с 07.04.2020 по 07.07.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(Р5-32) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Кемеровская область) "

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	99.72	99.72	99.72	99.72	89.6	99.6	89,96%	Подтверждающие документы: 1. "О направлении статотчета 1-ФК" Письмо Министерство физической культуры и спорта Кузбасса от 10.02.2021г. №313/03-02, приложен файл. 2. "Доп. соглашение о реализации регионального проекта "Соглашение Министерство физической культуры и спорта Кузбасса от 04.12.2020г. № 777-2019-Р50042-1/5, приложен файл. Существует риск: Снижение показателя, Причина риска: Фактическое значение меньше планового в связи с тем, что проведена работа по уменьшению задвоенности числа занимающихся в данной категории. Риск отсутствует. Данный показатель направлен в Минспорт России. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. Как таковой риск отсутствует. , срок исполнения 30.12.2020. Фактическое значение меньше планового в связи с тем, что проведена работа по уменьшению задвоенности числа занимающихся в данной категории. Данный показатель направлен в Минспорт России, замечаний в адрес Министерства физической культуры и спорта Кузбасса не поступало. Согласно



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
											дополнительному соглашению от 04.12.2020 № 777-2019-Р50042-1/5 данный показатель исключен из паспортов ФП и РП "Спорт - норма жизни"
2		Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	24	24	24	24	33.2	23.8	139,50%	Подтверждающие документы: 1. "О направлении статотчета 1-ФК" Письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 10.02.2021г. №313/03-02, приложен файл. В условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции Covid-19, в России реализовывались множества онлайн программ, направленных на ежедневную двигательную активность не выходя из дома, с применением современных цифровых технологий, тахи как "Человек идущий" онлайн тренировки от Ассоциации студенческого баскетбола и другие.
3		Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	10.4	10.4	10.4	10.4	18.6	9.5	195,79%	Подтверждающие документы: 1. "О направлении статотчета 1-ФК" Письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 10.02.2021г. №313/03-02, приложен файл.
4		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	66.7	66.8	66.9	67	67.9	67.1	101,19%	Подтверждающие документы: 1. "О направлении статотчета 1-ФК" Письмо Министерство физической культуры и спорта Кузбасса от 10.02.2021г. №313/03-02, приложен файл.
5		Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Процент	55	56.35	57.7	59	80.3	60.4	132,95%	Подтверждающие документы: 1. "О направлении статотчета 1-ФК" Письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 10.02.2021г. №313/03-02, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 429 242,90 тыс. руб

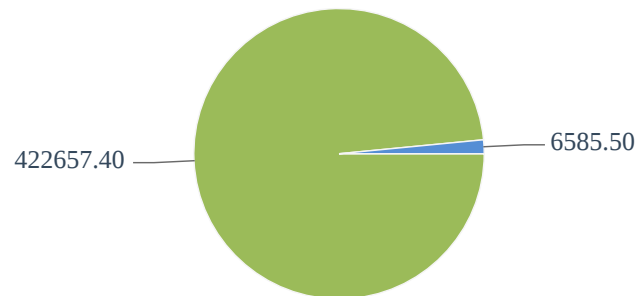

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 417 421,08 тыс. руб

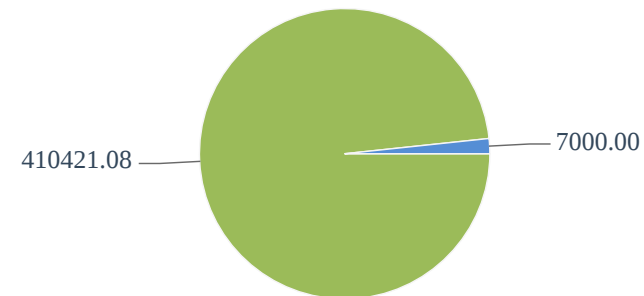

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	28 351,20	28 351,20	28 351,20	28 351,20	28 351,20	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	28 351,20	28 351,20	28 351,20	28 351,20	28 351,20	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	25 773,20	25 773,20	25 773,20	25 773,20	25 773,20	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	25 773,20	25 773,20	25 773,20	25 773,20	25 773,20	100,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	28 351,20	28 351,20	28 351,20	28 351,20	28 351,20	100,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(04) Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	31 641,30	31 641,30	31 641,30	31 641,30	31 641,30	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	31 641,30	31 641,30	31 641,30	31 641,30	31 641,30	100,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	27 641,30	27 641,30	27 641,30	27 641,30	27 641,30	100,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(07) Поставлены комплекты спортивного оборудования	12 040,80	11 919,60	11 919,60	11 919,60	11 919,60	100,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	12 040,80	11 919,60	11 919,60	11 919,60	11 919,60	100,00	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	12 040,80	11 919,60	11 919,60	11 919,60	11 919,60	100,00	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		(16) Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"	49 048,62	42 103,62	42 103,62	42 103,62	42 103,62	100,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	49 048,62	42 103,62	42 103,62	42 103,62	42 103,62	100,00	Расхождения в столбце «Предусмотрено паспортом РП» и «Кассовое исполнение» – экономия средств бюджета. Столбец «Предусмотрено паспортом РП» будет исправлен в новой редакции паспорта проекта РП, после утверждения паспорта ФП.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	45 060,50	38 680,20	38 680,20	38 680,20	38 680,20	100,00	Расхождения в столбце «Предусмотрено паспортом РП» и «Кассовое исполнение» – экономия средств бюджета. Столбец «Предусмотрено паспортом РП» будет исправлен в новой редакции паспорта проекта РП, после утверждения паспорта ФП.
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	45 060,50	38 680,20	38 680,20	38 680,20	38 680,20	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2.3		бюджеты муниципальных образований	49 048,62	42 103,62	42 103,62	42 103,62	42 103,62	100,00	Расхождения в столбце «Предусмотрено паспортом РП» и «Кассовое исполнение» – экономия средств бюджета. Столбец «Предусмотрено паспортом РП» будет исправлен в новой редакции паспорта проекта РП, после утверждения паспорта ФП.
4.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		(17) Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	303 060,60	303 060,60	303 060,60	303 060,60	303 060,60	100,00	
5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	303 060,60	303 060,60	303 060,60	303 060,60	303 060,60	100,00	
5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	273 060,60	273 060,60	273 060,60	273 060,60	273 060,60	100,00	
5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	273 060,60	273 060,60	273 060,60	273 060,60	273 060,60	100,00	
5.2.3		бюджеты муниципальных образований	303 060,60	303 060,60	303 060,60	303 060,60	303 060,60	100,00	
5.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		(22) В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	5 960,46	5 960,46	5 960,46	5 960,46	5 960,46	100,00	
6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 960,46	5 960,46	5 960,46	5 960,46	5 960,46	100,00	
6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 418,60	5 418,60	5 418,60	5 418,60	5 418,60	100,00	
6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	5 418,60	5 418,60	5 418,60	5 418,60	5 418,60	100,00	
6.2.3		бюджеты муниципальных образований	5 960,46	5 960,46	5 960,46	5 960,46	5 960,46	100,00	
6.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7		(23) В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 -2020 годы"	11 000,20	10 945,20	10 945,20	10 945,20	10 945,20	100,00	
7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	11 000,20	10 945,20	10 945,20	10 945,20	10 945,20	100,00	Расхождения в столбце «Предусмотрен о паспортом РП» и «Кассовое исполнение» – экономия средств бюджета. Столбец «Предусмотрен о паспортом РП» будет исправлен в новой редакции паспорта проекта РП, после утверждения паспорта ФП.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	10 000,20	9 950,20	9 950,20	9 950,20	9 950,20	100,00	Расхождения в столбце «Предусмотрено паспортом РП» и «Кассовое исполнение» – экономия средств бюджета. Столбец «Предусмотрено паспортом РП» будет исправлен в новой редакции паспорта проекта РП, после утверждения паспорта ФП.
7.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	10 000,20	9 950,20	9 950,20	9 950,20	9 950,20	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2.3		бюджеты муниципальных образований	11 000,20	10 945,20	10 945,20	10 945,20	10 945,20	100,00	Расхождения в столбце «Предусмотрено паспортом РП» и «Кассовое исполнение» – экономия средств бюджета. Столбец «Предусмотрено паспортом РП» будет исправлен в новой редакции паспорта проекта РП, после утверждения паспорта ФП.
7.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8		(27) Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	
8.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	
8.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	
8.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9		(28) Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты	24 978,00	25 038,00	25 038,00	24 944,00	24 944,00	99,62	
9.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	24 978,00	25 038,00	25 038,00	24 944,00	24 944,00	99,62	Кассовое исполнение 99,6% в связи с изменением перечня лиц, получающих меры социальной поддержки.
9.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	24 978,00	25 038,00	25 038,00	24 944,00	24 944,00	99,62	Кассовое исполнение 99,6% в связи с изменением перечня лиц, получающих меры социальной поддержки.
9.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		(29) Проведены областные мероприятия и изготовлена медиапродукция по пропаганде физической культуры и спорта	4 019,70	4 019,70	4 019,70	4 019,70	4 019,70	100,00	
10.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 019,70	4 019,70	4 019,70	4 019,70	4 019,70	100,00	
10.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 019,70	4 019,70	4 019,70	4 019,70	4 019,70	100,00	
10.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			471 350,88	464 289,68	464 289,68	464 195,68	464 195,68	99,98	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			471 350,88	464 289,68	464 289,68	464 195,68	464 195,68	99,98	
бюджет субъекта Российской Федерации			429 242,90	422 751,40	422 751,40	422 657,40	422 657,40	99,98	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			375 313,10	368 882,80	368 882,80	368 882,80	368 882,80	100,00	
бюджеты муниципальных образований			417 421,08	410 421,08	410 421,08	410 421,08	410 421,08	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения Значение: 13,0000 Дата: 15.12.2020	
2		Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения Значение: 13,0000 Дата: 15.12.2021	
3		В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020	
4		Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Значение: 77,0000 Дата: 25.12.2020	
5		Поставлены комплекты спортивного оборудования Значение: 4,0000 Дата: 25.12.2020	
6		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы" Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020	
7		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2020	
8		В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020	
9		В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
10		Проведены областные мероприятия и изготовлена медиапродукция по пропаганде физической культуры и спорта Значение: 5,0000 Дата: 25.12.2020	
11		Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты Значение: 510,0000 Дата: 31.12.2020	
12		Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты Значение: 510,0000 Дата: 31.12.2021	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения Значение: 13,0000 Дата: 15.12.2020	15.12.2020	25.12.2020	Боксгорн А. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о внесении изменений в приказ " Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 25.12.2020г. №1427, приложен файл. Приказ о внесении изменений в приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 25.12.2019 № 1349 «Об утверждении регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2020 году» . Итоговая версия регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2020 году размещена на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса. Просрочка 9 дней. Предоставлена информация : 13 из 13.
1.1.	ПК		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	15.12.2020	30.11.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "перечень положений официальных спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных на территории Кузбасса в 2020 году в рамках реализации регионального проекта" Иное Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл. Проведение мероприятий завершено 30.11.2020. Все 13

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений






Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							запланированных мероприятий проведены.
1.1.1	РРП		Разработка, согласование и утверждение организаторами физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий положений о физкультурных и комплексных физкультурных мероприятиях	15.12.2020	30.11.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "перечень положений официальных спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных на территории Кузбасса в 2020 году в рамках реализации регионального проекта" Иное Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл. Проведение мероприятий завершено 30.11.2020. Все 13 запланированных мероприятий проведены.
1.2.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	15.12.2020	25.12.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено. Просрочка 10 дней. Подтверждающие документы: 1. "о внесении изменений в приказ" Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 25.12.2020г. №1427, приложен файл. Приказ о внесении изменений в приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 25.12.2019 № 1349 «Об утверждении регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2020 году» . Приказ о внесении изменений в приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 25.12.2019 № 1349 «Об утверждении регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2020 году» .
1.2.1	РРП		Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащихся	15.12.2020	25.12.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено. Просрочка 10 дней. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			молодежи				1. "о внесении изменений в приказ" Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 25.12.2020г. №1427, приложен файл. Приказ о внесении изменений в приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 25.12.2019 № 1349 «Об утверждении регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2020 году» . Итоговая версия регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2020 году размещена на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса.
1.2.2	РРП		Проведено не менее 2 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп	15.12.2020	25.12.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено. Просрочка 10 дней. Подтверждающие документы: 1. "о внесении изменений в приказ" Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 25.12.2020г. №1427, приложен файл. Приказ о внесении изменений в приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 25.12.2019 № 1349 «Об утверждении регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2020 году» . Итоговая версия регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2020 году размещена на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса.
1.2.3	РРП		Проведено не менее 1 физкультурного и комплексного физкультурного	15.12.2020	25.12.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			мероприятия среди инвалидов				Просрочка 10 дней. Подтверждающие документы: 1. "о внесении изменений в приказ " Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 25.12.2020г. №1427, приложен файл. Приказ о внесении изменений в приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 25.12.2019 № 1349 «Об утверждении регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2020 году» . Итоговая версия регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2020 году размещена на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса.
1.2.4	РРП		Проведено не менее 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" ГТО	15.12.2020	25.12.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено. Просрочка 10 дней. Подтверждающие документы: 1. "о внесении изменений в приказ " Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 25.12.2020г. №1427, приложен файл. Приказ о внесении изменений в приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 25.12.2019 № 1349 «Об утверждении регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2020 году». Итоговая версия регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2020 году размещена на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений






Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.			Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения Значение: 13,0000 Дата: 15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	Боксгорн А. А.	Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 13.
2.1.	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	30.12.2020	29.12.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о формировании регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2021 году " Письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 09.11.2020г. №2969/03-02, приложен файл. 2. "Об утверждении регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2021 году" Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 29.12.2020г. №1435, приложен файл.
2.1.1	РРП		Разработка проекта приказа Министерства физической культуры и спорта Кузбасса	30.12.2020	29.12.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2021 году" Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 29.12.2020г. №1435, приложен файл. Отсутствие отклонений
2.1.2	РРП		Сбор и обобщение предложений физкультурно-спортивных организаций, включая спортивные федерации, и предложения муниципальных образований Кемеровской области -	30.11.2020	09.11.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о формировании регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2021

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Кузбасса по включению мероприятий в РКП				году " Письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 09.11.2020г. №2969/03-02, приложен файл.
3.			<i>В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020</i>	25.12.2020	25.12.2020	Мещерякова Н. Г.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "предварительный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет от г. №, приложен файл. Прикреплен предварительный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, сформированный в ГИИС «Электронный бюджет». Подписанные отчеты будут сформированы до 15.01.2021 Предоставлена информация : 1 из 1.
3.1.	ПК		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	25.12.2020	22.01.2020	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области бюджету муниципального образования на софинансирование расходов" Соглашение департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 22.01.2020г. №32731000-1-2019-012/1, приложен файл.
3.1.1	РРП		Заключение соглашений	25.12.2020	22.01.2020	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области бюджету муниципального образования на софинансирование расходов" Соглашение департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 22.01.2020г.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							№32731000-1-2019-012/1, приложен файл.
3.2.	ПК		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	01.05.2020	14.12.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ" Соглашение Министерства спорта РФ от 14.12.2019г. №777-08-2019-048/4, приложен файл.
3.2.1	РПП		Формирование соглашения	01.05.2020	14.12.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ" Министерства спорта РФ от 14.12.2019г. №777-08-2019-048/4, приложен файл.
3.3.	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	25.12.2020	25.12.2020	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "предварительный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет от г. №, приложен файл. Прикреплен предварительный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, сформированный в ГИИС «Электронный бюджет». Подписанные отчеты будут сформированы до 15.01.2021
3.3.1	РПП		Формирование отчета	25.12.2020	25.12.2020	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "предварительный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет от г. №, приложен файл. Прикреплен предварительный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, сформированный в ГИИС «Электронный бюджет».

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Подписанные отчеты будут сформированы до 15.01.2021
3.4.	ПК		Оборудование приобретено	25.12.2020	21.09.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "к договору поставки товара № 488-1704" Акт приема-передачи МФСУ «СШОР «Металлург» от 21.09.2020г. № б/н, приложен файл. 2. "к договору поставки № 493-1704" Акт приема-передачи МФСУ «СШОР «Металлург» от 17.07.2020г. № б/н, приложен файл. 3. "к договору № 497-1704" Акт приема-передачи МФСУ «СШОР «Металлург» от 06.07.2020г. №115, приложен файл. 4. "к договору № 499-1704" Акт приема-передачи МФСУ «СШОР «Металлург» от 24.07.2020г. №101, приложен файл. 5. "на ворота" Платежное поручение МФСУ «СШОР «Металлург» от 11.09.2020г. №20239017, приложен файл. 6. "к договору на выполнение работ № 7753" Акт приема-передачи МФСУ «СШОР «Металлург» от 08.07.2020г. № 11, приложен файл.
3.4.1	РПП		Закупка оборудования для хоккея	25.12.2020	21.09.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "к договору поставки товара № 488-1704" Акт приема-передачи МФСУ «СШОР «Металлург» от 21.09.2020г. № б/н, приложен файл. 2. "к договору поставки товара №493-1704" Акт приема-передачи МФСУ «СШОР «Металлург» от 17.07.2020г. № б/н, приложен файл. 3. "к договору поставки товара №497-1704" Акт приема-передачи МФСУ «СШОР «Металлург» от 06.07.2020г. №

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							б/н, приложен файл. 4. "к договору №499-1704" Акт приема-передачи МФСУ «СШОР «Металлург» от 24.07.2020г. №б/н, приложен файл. 5. "на поставку ворот" Платежное поручение МФСУ «СШОР «Металлург» от 11.09.2020г. №20239017, приложен файл. 6. "к договору на выполнение работ №7753" Акт приема-передачи МФСУ «СШОР «Металлург» от 08.07.2020г. № 11, приложен файл.
4.			<i>Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Значение: 77,0000 Дата: 25.12.2020</i>	25.12.2020	25.12.2020	Боксгорн А. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "предварительный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет от г. №, приложен файл. 2. "о достижении показателя" Письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 15.12.2020г. №3293/03-02, приложен файл. Прикреплен предварительный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, сформированный в ГИИС «Электронный бюджет». Подписанные отчеты будут сформированы до 15.01.2021 Предоставлена информация : 77 из 77.
4.1.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	15.12.2020	15.12.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о достижении показателя" Письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 15.12.2020г. №3293/03-02, приложен файл.
4.1.1	РРП		Не менее 100% организаций	15.12.2020	15.12.2020	Боксгорн А. А.	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки				Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о достижении показателя" Письмо Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 15.12.2020г. №3293/03-02, приложен файл.
4.2.	ПК		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	25.12.2020	29.01.2020	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету" Соглашение департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 15.01.2020г. №32707000-1-2019-015, приложен файл. 2. "о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету" Соглашение департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 29.01.2020г. №32502000-1-2019-001, приложен файл. 3. "о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету" Соглашение департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 14.01.2020г. №32719000-1-2019-010, приложен файл. 4. "дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области бюджету муниципального образования на софинансирование расходов" Соглашение департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 17.01.2020г. №32725000-1-2019-001/2, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений






Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.2.1	РРП		Заключение соглашений	25.12.2020	29.01.2020	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету" Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса от 29.01.2020г. №32502000-1-2019-001, приложен файл. 2. "дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области бюджету муниципального образования на софинансирование расходов" Соглашение департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 17.01.2020г. №32725000-1-2019-001/2, приложен файл. 3. "о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету" Соглашение департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 14.01.2020г. №32719000-1-2019-010, приложен файл. 4. "о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету" Соглашение департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 15.01.2020г. №32707000-1-2019-015, приложен файл.
4.3.	ПК		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	01.05.2020	14.12.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ" Соглашение Министерства спорта РФ от 14.12.2019г. №777-08-2019-048/4, приложен файл. Отсутствие отклонений
4.3.1	РРП		Формирование соглашения	01.05.2020	14.12.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ" Министерства спорта РФ от 14.12.2019г. №777-08-2019-048/4, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.4.	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	25.12.2020	25.12.2020	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "предварительный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет от г. №, приложен файл. Прикреплен предварительный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, сформированный в ГИИС «Электронный бюджет». Подписанные отчеты будут сформированы до 15.01.2021
4.4.1	РРП		Формирование отчета	25.12.2020	25.12.2020	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "предварительный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет от г. №, приложен файл. Прикреплен предварительный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, сформированный в ГИИС «Электронный бюджет». Подписанные отчеты будут сформированы до 15.01.2021
5.			<i>Поставлены комплекты спортивного оборудования Значение: 4,0000 Дата: 25.12.2020</i>	25.12.2020	14.06.2020	Мещерякова Н. Г.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акт выполненных работ " Иное ГАУ «ЦСП СКК» от 05.06.2020г. №1, приложен файл. 2. "Акт выполненных работ " Иное ГАУ «ЦСП СКК» от 08.06.2020г. №2, приложен файл. 3. "Акт выполненных работ " Иное ГАУ «ЦСП СКК» от 11.06.2020г. №3, приложен файл. 4. "Акт выполненных работ " Иное ГАУ «ЦСП СКК» от 14.06.2020г. №4, приложен файл. Предоставлена информация : 4 из 4.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.1.	ПК		Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей	15.06.2020	06.05.2020	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "на выполнение работ по устройству подстилающего слоя и прослойки из нетканого синтетического материала на площадке" Договор МБУДО "Чебулинская ДЮСШ" от 06.05.2020г. №504/20, приложен файл. 2. "на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия и установка бортовых камней на площадке " Договор МБУДО "Чебулинская ДЮСШ" от 06.05.2020г. №503/20, приложен файл. Остальные площадки подготовлены муниципальными образованиями самостоятельно. Отсутствие отклонений.
5.2.	ПК		Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей	30.09.2020	06.05.2020	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия и установка бортовых камней на площадке " Иное МБУДО "Чебулинская ДЮСШ" от 06.05.2020г. №503/20, приложен файл. 2. "на выполнение работ по устройству подстилающего слоя и прослойки из нетканого синтетического материала на площадке" Иное МБУДО "Чебулинская ДЮСШ" от 06.05.2020г. №504/20, приложен файл. Отсутствие отклонений.
5.3.	ПК		Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования	01.11.2020	14.06.2020	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт выполненных работ " Иное ГАУ «ЦСП СКК» от 14.06.2020г. №4, приложен файл. 2. "Акт выполненных работ " Иное ГАУ «ЦСП СКК» от 11.06.2020г. №3, приложен файл. 3. "Акт выполненных работ " Иное ГАУ «ЦСП СКК» от 08.06.2020г. №2, приложен файл. 4. "Акт выполненных работ " Иное ГАУ «ЦСП СКК» от

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							05.06.2020г. №1, приложен файл. Отсутствие отклонений.
5.4.	ПК		Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования	15.06.2020	30.04.2020	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "на поставку и монтаж оборудования" Договор ГАУКО «Центр подготовки спортивных сборных команд» (ГАУ КО «ЦП ССК») от 30.04.2020г. №73, приложен файл.
5.5.	ПК		Оборудование приобретено	25.12.2020	14.06.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт выполненных работ " Иное ГАУ «ЦСП ССК» от 05.06.2020г. №1, приложен файл. 2. "Акт выполненных работ " Иное ГАУ «ЦСП ССК» от 08.06.2020г. №2, приложен файл. 3. "Акт выполненных работ " Иное ГАУ «ЦСП ССК» от 11.06.2020г. №3, приложен файл. 4. "Акт выполненных работ " Иное ГАУ «ЦСП ССК» от 14.06.2020г. №4, приложен файл.
5.5.1	РРП		Закупка спортивно технологического оборудования для создания малых спортивных площадок	25.12.2020	14.06.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт выполненных работ " Иное ГАУ «ЦСП ССК» от 05.06.2020г. №1, приложен файл. 2. "Акт выполненных работ " Иное ГАУ «ЦСП ССК» от 08.06.2020г. №2, приложен файл. 3. "Акт выполненных работ " Иное ГАУ «ЦСП ССК» от 11.06.2020г. №3, приложен файл. 4. "Акт выполненных работ " Иное ГАУ «ЦСП ССК» от 14.06.2020г. №4, приложен файл.
5.6.	ПК		С субъектами Российской Федерации	01.05.2020	20.03.2020	Мещерякова Н. Г.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений




 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*				Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ" Соглашение Министерства спорта РФ от 20.03.2020г. №777-08-2019-154/4, приложен файл.
5.6.1	РРП		Формирование соглашения	01.05.2020	20.03.2020	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ" Министерства спорта РФ от 20.03.2020г. №777-08-2019-154/4, приложен файл.
6.			<i>Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы" Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020</i>	25.12.2020	25.12.2020	Печеркина И. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "предварительный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет от г. №, приложен файл. 2. "разрешение на ввод объекта в эксплуатацию " Иное УКС администрации г. Новокузнецка от 25.11.2020г. № 42-RU 42310000-28-2020, приложен файл. Прикреплен предварительный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, сформированный в ГИИС «Электронный бюджет». Подписанные отчеты будут сформированы до 15.01.2021. Объект введен в эксплуатацию 25.11.2020 Предоставлена информация : 1 из 1.
6.1.	ПК		Строительно-монтажные работы завершены	01.11.2020	06.10.2020	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "за 3 квартал 2020 года о расходах бюджета Новокузнецкого городского округа по строительству

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							объекта" Отчет УКС администрации г. Новокузнецка от 06.10.2020г. №05/1240, приложен файл. Отсутствие отклонений
6.1.1	РФП		Проведение строительно-монтажных работ	01.11.2020	06.10.2020	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "за 3 квартал 2020 года о расходах бюджета Новокузнецкого городского округа по строительству объекта" Отчет УКС администрации г. Новокузнецка от 06.10.2020г. №05/1240, приложен файл. Отсутствие отклонений
6.2.	ПК		В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	15.11.2020	06.10.2020	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "за 3 квартал 2020 года о расходах бюджета Новокузнецкого городского округа по строительству объекта" Отчет УКС администрации г. Новокузнецка от 06.10.2020г. №05/1240, приложен файл. Отсутствие отклонений
6.2.1	РРП		Проведение в субъектах Российской Федерации конкурсных процедур для приобретения технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального строительства	15.11.2020	06.10.2020	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "за 3 квартал 2020 года о расходах бюджета Новокузнецкого городского округа по строительству объекта" Отчет УКС администрации г. Новокузнецка от 06.10.2020г. №05/1240, приложен файл. Отсутствие отклонений
6.3.	ПК		Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	25.11.2020	06.10.2020	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "за 3 квартал 2020 года о расходах бюджета Новокузнецкого городского округа по строительству объекта" Отчет УКС администрации г. Новокузнецка от 06.10.2020г. №05/1240, приложен файл. Отсутствие отклонений

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений







Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.3.1	РРП		Установка технологического оборудования	25.11.2020	06.10.2020	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "за 3 квартал 2020 года о расходах бюджета Новокузнецкого городского округа по строительству объекта" Отчет УКС администрации г. Новокузнецка от 06.10.2020г. №05/1240, приложен файл. Отсутствие отклонений
6.4.	ПК		Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	30.11.2020	25.11.2020	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "разрешение на ввод объекта в эксплуатацию " Иное Управление капитального строительства Администрации города Новокузнецка от 25.11.2020г. №42-RU 42310000-28-2020, приложен файл. Введение объекта в эксплуатацию подразумевает под собой завершение всех работ на объекте, уровень технической готовности 100%, а также введение оборудования в эксплуатацию.
6.4.1	РРП		Введение в эксплуатацию технологического оборудования	30.11.2020	25.11.2020	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "разрешение на ввод объекта в эксплуатацию " Иное Управление капитального строительства Администрации города Новокузнецка от 25.11.2020г. №42-RU 42310000-28-2020, приложен файл. Введение объекта в эксплуатацию подразумевает под собой завершение всех работ на объекте, уровень технической готовности 100%, а также введение оборудования в эксплуатацию.
6.5.	ПК		Техническая готовность объектов спорта 100%	01.12.2020	25.11.2020	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "разрешение на ввод объекта в эксплуатацию " Иное Управление капитального строительства Администрации

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							города Новокузнецка от 25.11.2020г. №42-RU 42310000-28-2020, приложен файл. Введение объекта в эксплуатацию подразумевает под собой завершение всех работ на объекте, уровень технической готовности 100%, а также введение оборудования в эксплуатацию.
6.5.1	РРП		Техническая готовность объекта спорта 100%	01.12.2020	25.11.2020	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "разрешение на ввод объекта в эксплуатацию " Иное Управление капитального строительства Администрации города Новокузнецка от 25.11.2020г. №42-RU 42310000-28-2020, приложен файл. Введение объекта в эксплуатацию подразумевает под собой завершение всех работ на объекте, уровень технической готовности 100%, а также введение оборудования в эксплуатацию.
6.6.	ПК		Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)	15.12.2020	24.11.2020	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации" Иное Управление капитального строительства Администрации города Новокузнецка от 24.11.2020г. №484/02-ОС, приложен файл.
6.6.1	РРП		Представление субъектами Российской Федерации заключений о соответствии (ЗОС) в Минспорт России	15.12.2020	24.11.2020	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации" Иное Управление капитального строительства Администрации города Новокузнецка от 24.11.2020г. №484/02-ОС, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.7.	ПК		Объекты спорта введены в эксплуатацию	25.12.2020	25.11.2020	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "разрешение на ввод объекта в эксплуатацию " Иное Управление капитального строительства Администрации города Новокузнецка от 25.11.2020г. №42-RU 42310000-28-2020, приложен файл.
6.7.1	РРП		Введение объекта спорта в эксплуатацию	25.12.2020	25.11.2020	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "разрешение на ввод объекта в эксплуатацию " Иное Управление капитального строительства Администрации города Новокузнецка от 25.11.2020г. №42-RU 42310000-28-2020, приложен файл.
6.8.	ПК		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	25.12.2020	30.06.2020	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии в 2019-2020 годах бюджету муниципального образования" Соглашение Министерства строительства Кузбасса от 30.06.2020г. № 32731000-1-2019-001/3, приложен файл.
6.8.1	РРП		Заключение соглашений	25.12.2020	30.06.2020	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии в 2019-2020 годах бюджету муниципального образования" Соглашение Министерства строительства Кузбасса от 30.06.2020г. № 32731000-1-2019-001/3, приложен файл. Отсутствие отклонений
6.9.	ПК		С субъектами Российской Федерации	01.05.2020	19.12.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*				Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ" Соглашение Министерства спорта РФ от 19.12.2019г. №777-09-2019-085/1, приложен файл. Отсутствие отклонений
6.9.1	РРП		Заключение соглашения	01.05.2020	19.12.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ" Министерства спорта РФ от 19.12.2019г. №777-09-2019-085/1, приложен файл.
6.10.	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	25.12.2020	25.12.2020	Мещерякова Н. Г.	В работе. Подтверждающие документы: 1. "предварительный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет от г. №, приложен файл. Прикреплен предварительный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, сформированный в ГИИС «Электронный бюджет». Подписанные отчеты будут сформированы до 15.01.2021
6.10.1	РРП		Формирование отчета	25.12.2020	25.12.2020	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "предварительный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет от г. №, приложен файл. Прикреплен предварительный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, сформированный в ГИИС «Электронный бюджет». Подписанные отчеты будут сформированы до 15.01.2021
7.			Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной	25.12.2020	25.12.2020	Печеркина И. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>собственности Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2020</i>				1. "конъюнктурный обзор по строительству объекта" Иное МП «Городское управление капитального строительства города Кемерово» от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл. В новой версии паспорта значение результата будет изменено на «2» согласно заключенному соглашению. Предоставлена информация : 0 из 0.
7.1.	ПК		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	25.12.2020	23.01.2020	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии бюджету города Кемерово на финансовое обеспечение мероприятия на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом (строительство и реконструкция крытых катков с искусственным льдом для организаций спортивной подготовки)" Соглашение департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 23.01.2020г. №32701000-1-2020-008, приложен файл.
7.1.1	РРП		Заключение соглашений	25.12.2020	23.01.2020	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии бюджету города Кемерово на финансовое обеспечение мероприятия на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом (строительство и реконструкция крытых катков с искусственным льдом для организаций спортивной подготовки)" Соглашение департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 23.01.2020г. №32701000-1-2020-008, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.2.	ПК		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	01.05.2020	23.12.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ" Соглашение Министерства спорта РФ от 23.12.2019г. №777-09-2020-089, приложен файл. Отсутствие отклонений
7.2.1	РРП		Формирование соглашения	01.05.2020	23.12.2019	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ" Министерства спорта РФ от 23.12.2019г. №777-09-2020-089, приложен файл.
7.3.	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	25.12.2020	25.12.2020	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "предварительный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет от г. №, приложен файл. Прикреплен предварительный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, сформированный в ГИИС «Электронный бюджет». Подписанные отчеты будут сформированы до 15.01.2021
7.3.1	РРП		Формирование отчета	25.12.2020	25.12.2020	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "предварительный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет от г. №, приложен файл. Прикреплен предварительный отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, сформированный в ГИИС «Электронный бюджет». Подписанные отчеты будут сформированы до 15.01.2021
8.			В организации спортивной	25.12.2020	14.07.2020	Мещерякова Н. Г.	Информация по значению результата:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020				Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "на закупку товара" Платежное поручение МБФСУ "СШОР № 3" от 14.07.2020г. №10698, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
8.1.	ПК		Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря	15.06.2020	18.05.2020	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "на поставку оборудования" Контракт МБФСУ «Спортивная школа олимпийского резерва №3» от 16.03.2020г. №Ф.2020.15, приложен файл. 2. "поставки" Договор МБФСУ «Спортивная школа олимпийского резерва №3» от 13.04.2020г. №6/2020, приложен файл. 3. "поставки" Договор МБФСУ «Спортивная школа олимпийского резерва №3» от 14.05.2020г. №7/2020, приложен файл. 4. "поставки" Договор МБФСУ «Спортивная школа олимпийского резерва №3» от 18.05.2020г. №10/20, приложен файл. 5. "поставки" Договор МБФСУ «Спортивная школа олимпийского резерва №3» от 22.04.2020г. №10-М, приложен файл.
8.2.	ПК		Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем	01.11.2020	14.07.2020	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "на закупку товара" Платежное поручение МБФСУ "СШОР № 3" от 27.04.2020г. №123213, приложен файл. 2. "на закупку товара" Платежное поручение МБФСУ "СШОР № 3" от 15.05.2020г. №452797, приложен файл. 3. "на закупку товара" Платежное поручение МБФСУ

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							"СШОР № 3" от 19.05.2020г. №514008, приложен файл. 4. "на закупку товара" Платежное поручение МБФСУ "СШОР № 3" от 21.05.2020г. №589104, приложен файл. 5. "на закупку товара" Платежное поручение МБФСУ "СШОР № 3" от 08.06.2020г. №93653, приложен файл. 6. "на закупку товара" Платежное поручение МБФСУ "СШОР № 3" от 11.06.2020г. №193942, приложен файл. 7. "на закупку товара" Платежное поручение МБФСУ "СШОР № 3" от 16.06.2020г. №259643, приложен файл. 8. "на закупку товара" Платежное поручение МБФСУ "СШОР № 3" от 24.04.2020г. №94860, приложен файл. 9. "на закупку товара" Платежное поручение МБФСУ "СШОР № 3" от 14.07.2020г. №10698, приложен файл. Отсутствие отклонений.
9.			<i>В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020</i>	25.12.2020	09.10.2020	Мещерякова Н. Г.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "искусственного покрытия для футбольного поля" Акт приема-передачи МБФСУ «КСШ» от 09.10.2020г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
9.1.	ПК		Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей	15.06.2020	15.06.2020	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "-" Прочий тип документа - от 15.06.2020г. №-, приложен файл. В паспорте федерального проекта "Спорт - норма жизни" внесена дублирующая контрольная точка «Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей» со сроком исполнения 30.09.2020. Паспорт регионального проекта «Спорт – норма жизни» синхронизирован с паспортом

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							федерального проекта и также имеет данную дублирующую контрольную точку. В связи с вышеизложенным данная контрольная точка не актуальна, а срок исполнения перенесен с 15.06.2020 на 30.09.2020.
9.2.	ПК		Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования	15.06.2020	27.06.2020	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "на закупку комплекта искусственного покрытия для футбольного поля для спортивной школы, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Калтан, пр. Мира, 55а " Контракт МБФСУ "Комплексная спортивная школа" от 27.06.2020г. № 0139300001420000095, приложен файл.
9.3.	ПК		Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей	30.09.2020	27.08.2020	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "контракт на реконструкцию футбольного поля с четырьмя беговыми дорожками, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Калтан, пр. Мира, 55а" Иное Муниципальное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение «Комплексная спортивная школа» от 27.08.2020г. №0139300001420000204_114527, приложен файл.
9.4.	ПК		Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования	01.11.2020	27.06.2020	Мещерякова Н. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "контракт на закупку комплекта искусственного покрытия для футбольного поля для спортивной школы" Иное МБФСУ "КСШ" от 27.06.2020г. № 0139300001420000095, приложен файл. Отсутствие отклонений.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
10.			Проведены областные мероприятия и изготовлена медиапродукция по пропаганде физической культуры и спорта Значение: 5,0000 Дата: 25.12.2020	25.12.2020	25.12.2020	Боксгорн А. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о работе журнала и сайта "Кузбасс спортивный" за 2020 год" Отчет ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Кузбасса» от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "отчет работы музея физической культуры и спорта Кузбасса за 2020 год" Отчет ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Кузбасса» от 25.12.2020г. № б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 5 из 5.
10.1.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	25.12.2020	25.12.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о работе журнала и сайта "Кузбасс спортивный" за 2020 год" Отчет ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Кузбасса» от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений
10.1.1	РРП		Осуществление издательской деятельности регионального специализированного журнала «Кузбасс спортивный»	25.12.2020	25.12.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о работе журнала и сайта "Кузбасс спортивный" за 2020 год" Отчет ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Кузбасса» от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений
10.2.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	25.12.2020	25.12.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет работы музея физической культуры и спорта Кузбасса за 2020 год" Отчет ГАУ «Центр спортивной

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений






Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							подготовки сборных команд Кузбасса» от 25.12.2020г. № б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений
10.2.1	РРП		Создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок музея физической культуры и спорта Кузбасса	25.12.2020	25.12.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет работы музея физической культуры и спорта Кузбасса за 2020 год" Отчет ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Кузбасса» от 25.12.2020г. № б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений
11.			<i>Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты Значение: 510,0000 Дата: 31.12.2020</i>	31.12.2020	25.12.2020	Боксгорн А. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 10.03.2020 № 348 «О назначении мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорт, высокие спортивные результаты на 2020 год» (в ред. приказов Минспорта Кузбасса от 13.04.2020 № 523, от 26.05.2020 № 601, 19.08.2020 № 818, 30.09.2020 № 967)" Приказ Министерство физической культуры и спорта Кузбасса от 26.10.2020г. №1106, приложен файл. меры социальной защиты выплачиваются ежемесячно. Единый файл всех изменяющих документов. Предоставлена информация : 510 из 510.
11.1.	ПК		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	25.02.2020	12.02.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об утверждении персонального состава комиссии по назначению мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта,

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							высокие спортивные результаты на 2020 год" Приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 12.02.2020г. №202, приложен файл.
11.1.1	РРП		Формирование комиссии по назначению мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения	25.02.2020	12.02.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об утверждении персонального состава комиссии по назначению мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты на 2020 год" Приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 12.02.2020г. №202, приложен файл.
11.2.	ПК		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	01.05.2020	10.03.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о назначении мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты на 2020 год" Приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 10.03.2020г. №348, приложен файл.
11.2.1	РРП		Разработка проекта приказа Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об определении перечня лиц на оказание мер поощрения и социальной защиты	01.05.2020	10.03.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о назначении мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты на 2020 год" Приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 10.03.2020г. №348, приложен

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							файл.
11.3.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	25.12.2020	25.12.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 10.03.2020 № 348 «О назначении мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорт, высокие спортивные результаты на 2020 год» (в ред. приказов Минспорта Кузбасса от 13.04.2020 № 523, от 26.05.2020 № 601, 19.08.2020 № 818, 30.09.2020 № 967)" Приказ Министерство физической культуры и спорта Кузбасса от 26.10.2020г. №1106, приложен файл. Единый файл всех изменяющих документов.
11.3.1	РРП		Оказаны меры поощрения и социальной защиты 510 спортсменам, тренерам и заслуженным работникам физической культуры и спорта	25.12.2020	25.12.2020	Боксгорн А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 10.03.2020 № 348 «О назначении мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорт, высокие спортивные результаты на 2020 год» (в ред. приказов Минспорта Кузбасса от 13.04.2020 № 523, от 26.05.2020 № 601, 19.08.2020 № 818, 30.09.2020 № 967)" Приказ Министерство физической культуры и спорта Кузбасса от 26.10.2020г. №1106, приложен файл. Единый файл всех изменяющих документов.
12.			Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты	31.12.2021	25.02.2021	Боксгорн А. А.	Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>Значение: 510,0000 Дата: 31.12.2021</i>				Предоставлена информация : 0 из 510.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений




Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек

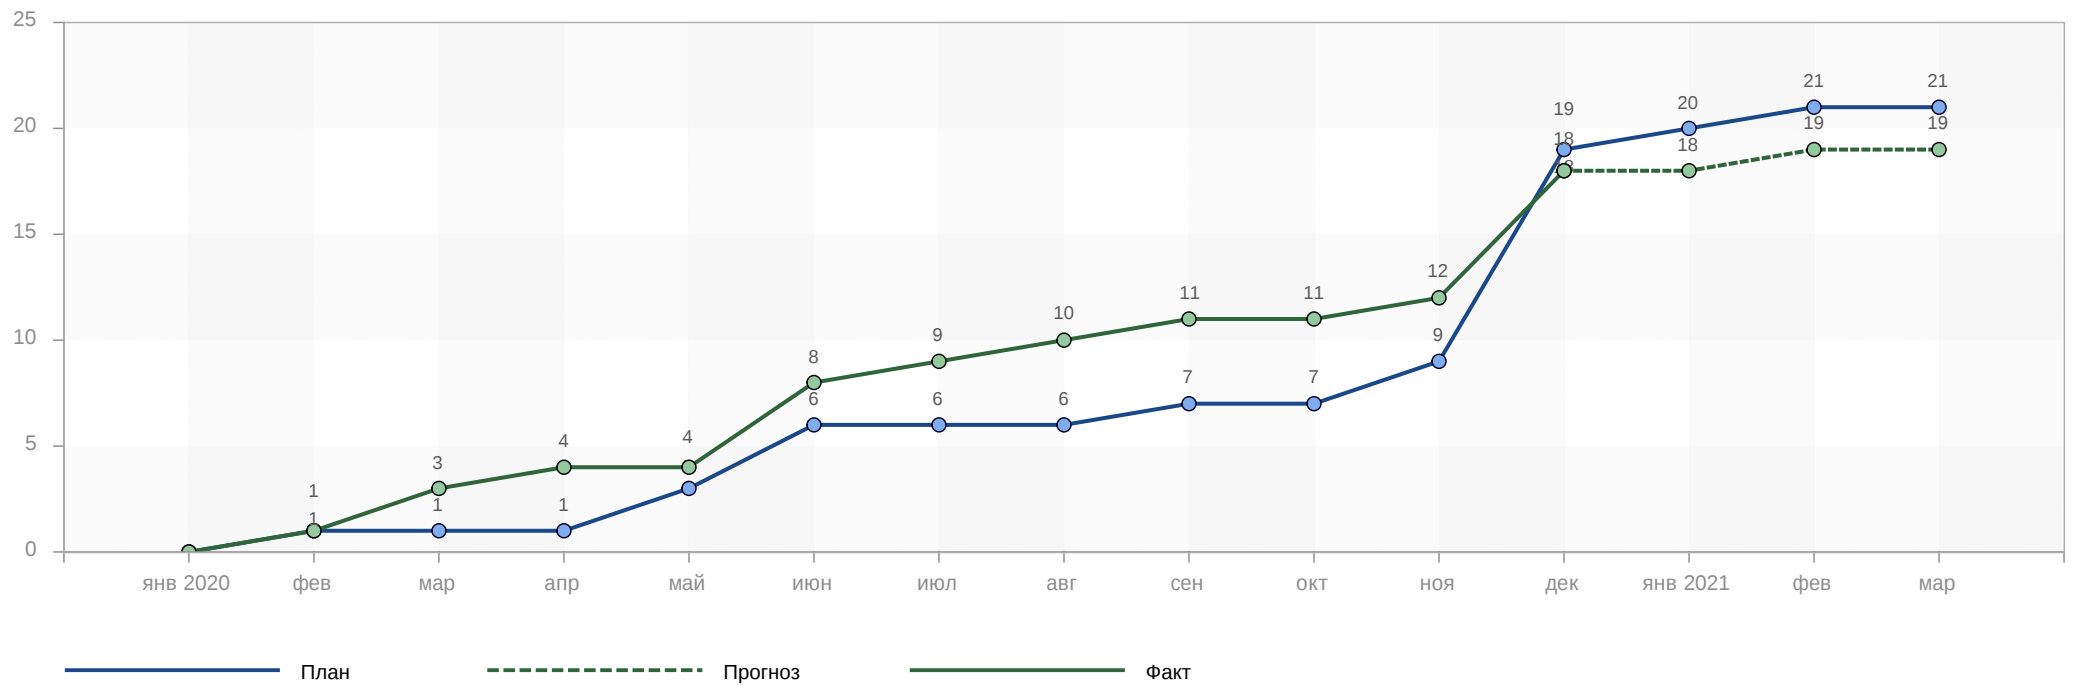

пп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подгото

График достижения показателя

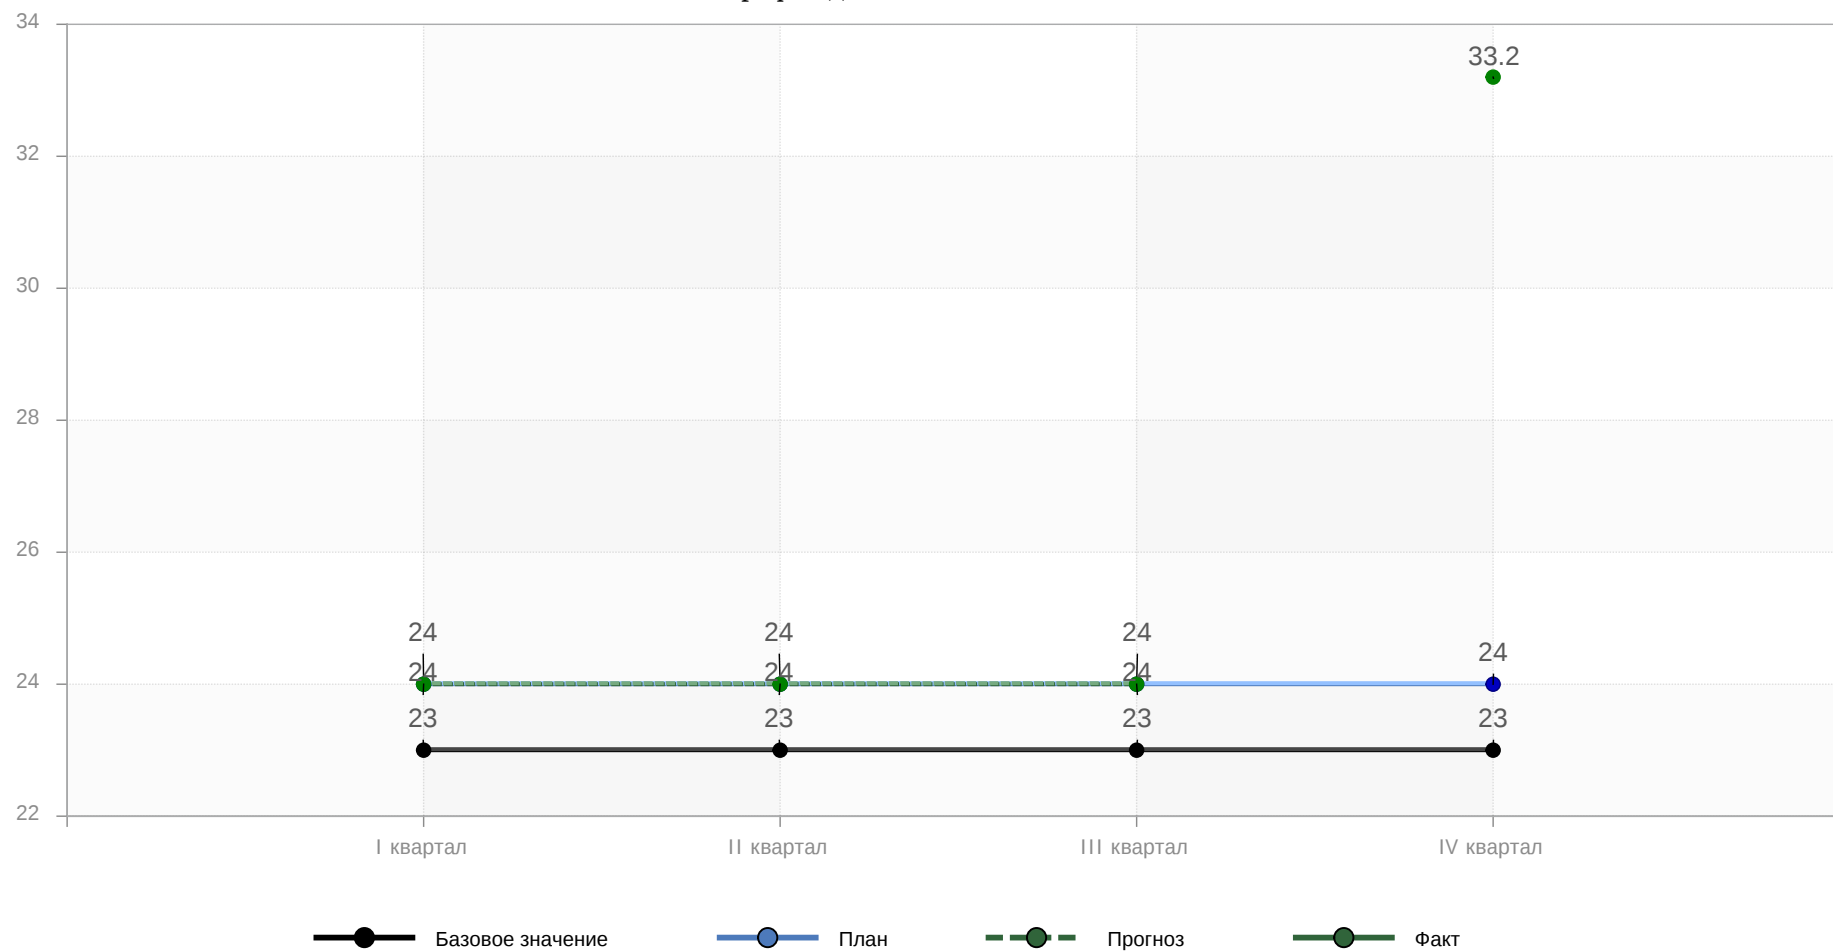


Рис. 1. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

Диаграмма достижения показателя

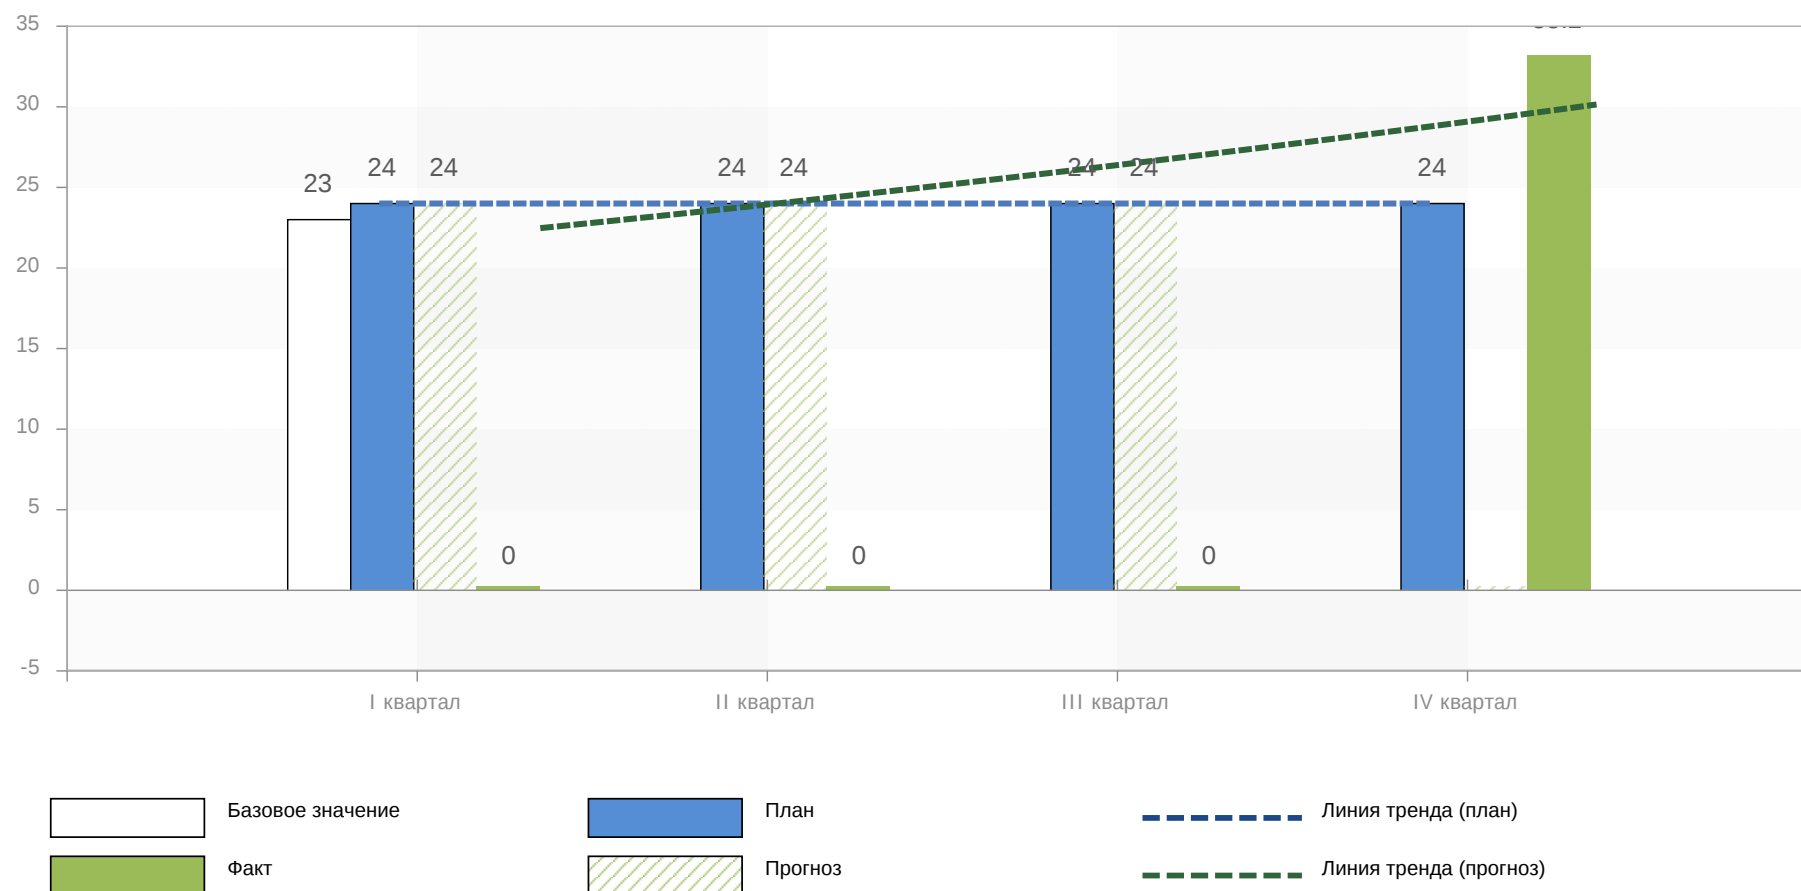


Рис. 2. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

График достижения показателя

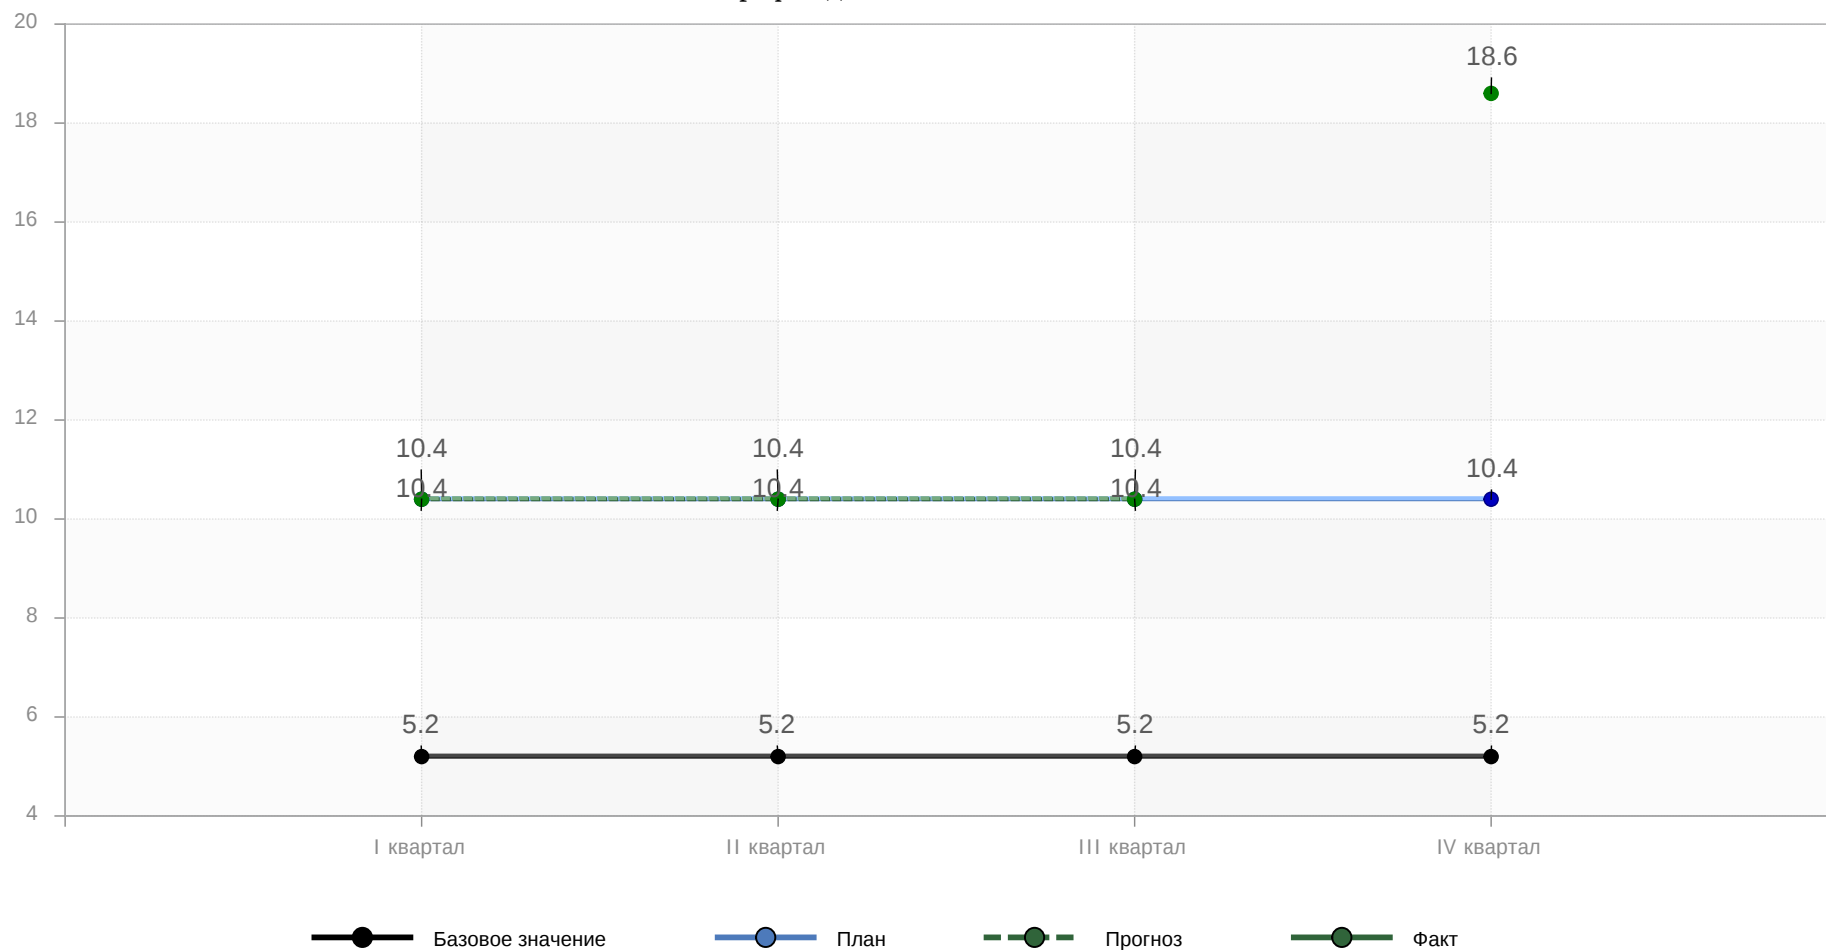


Рис. 3. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

Диаграмма достижения показателя

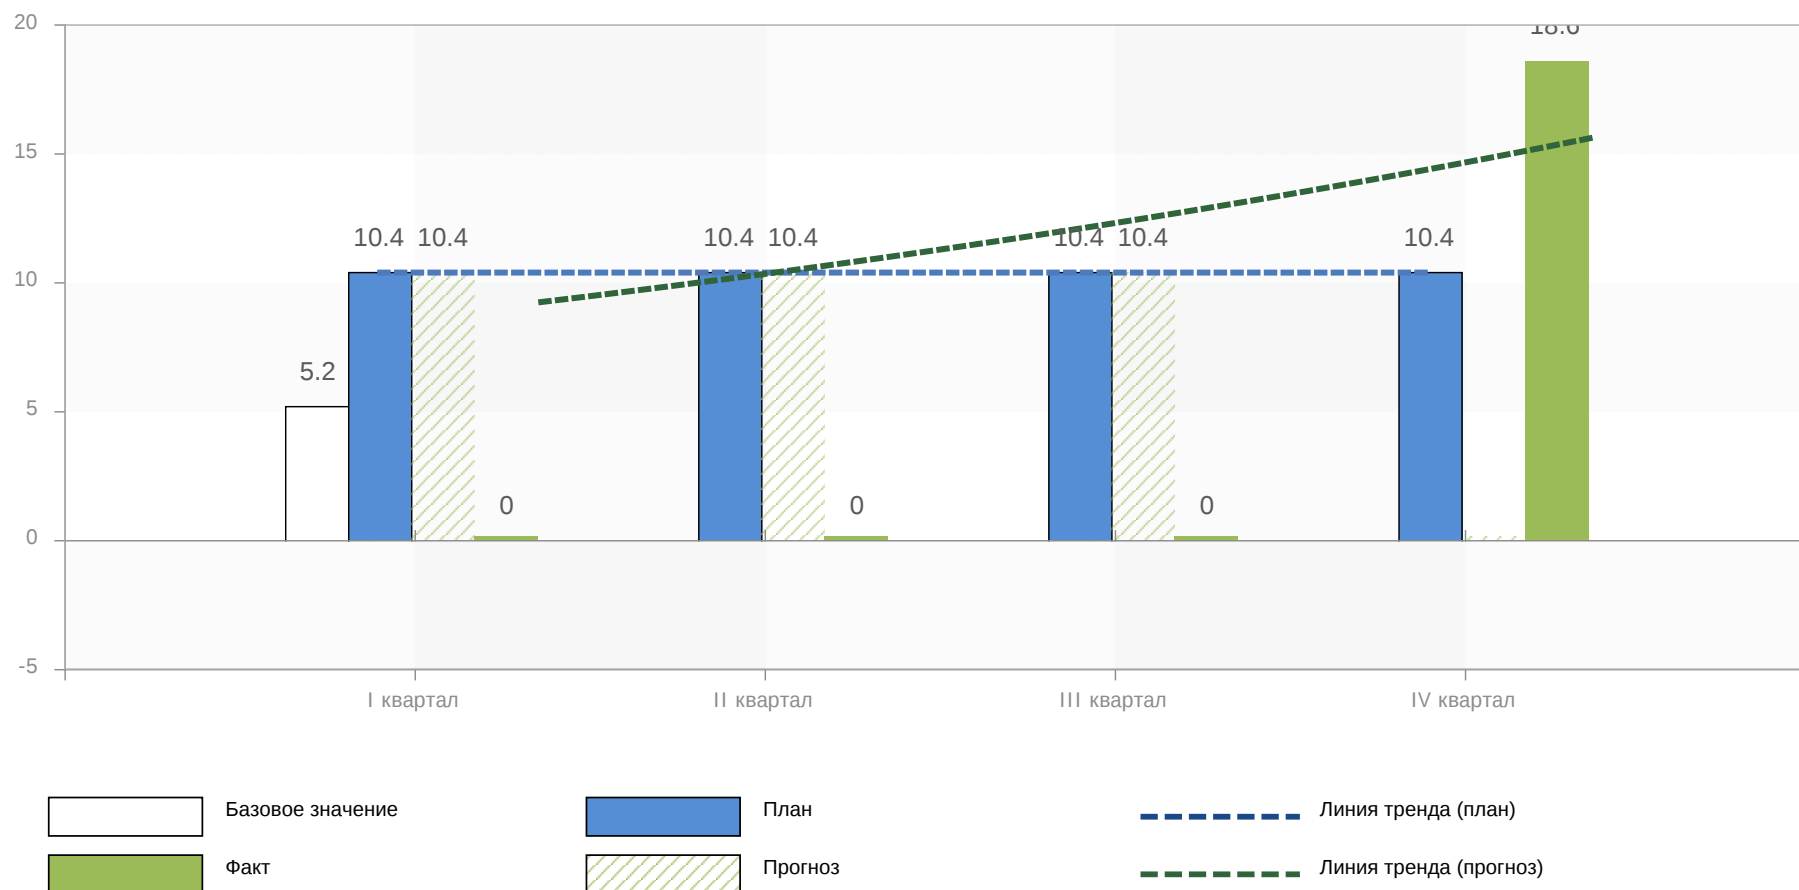


Рис. 4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

График достижения показателя

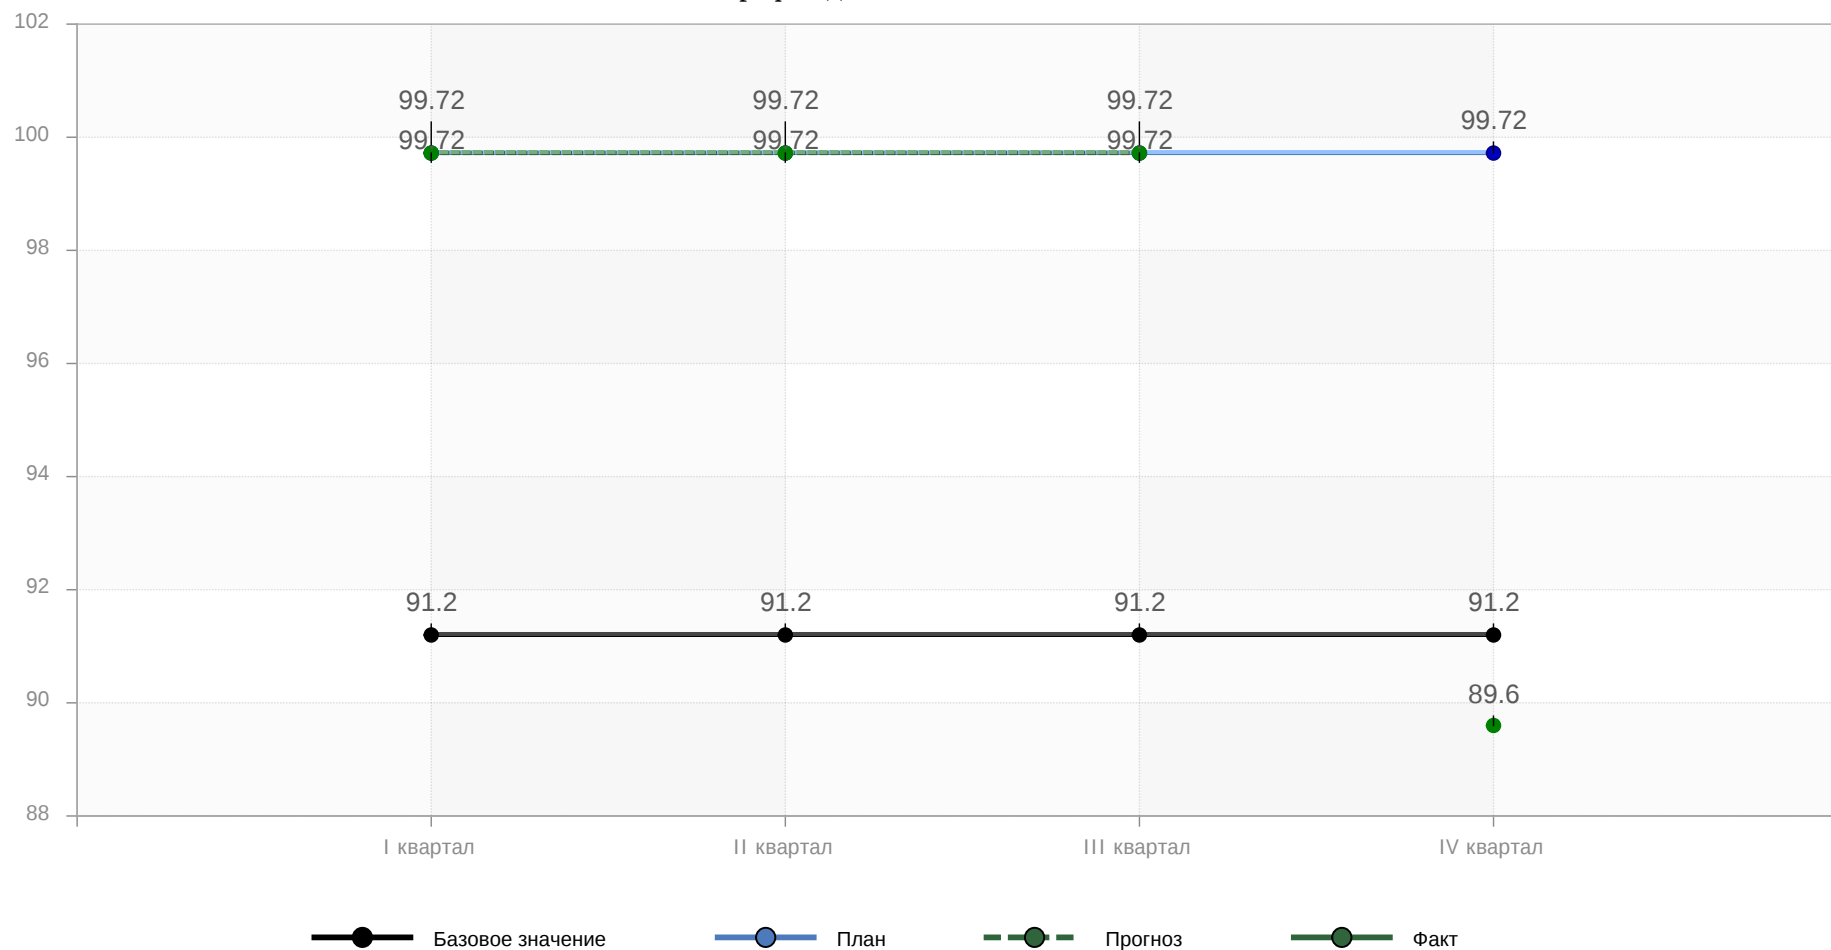


Рис. 5. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

Диаграмма достижения показателя

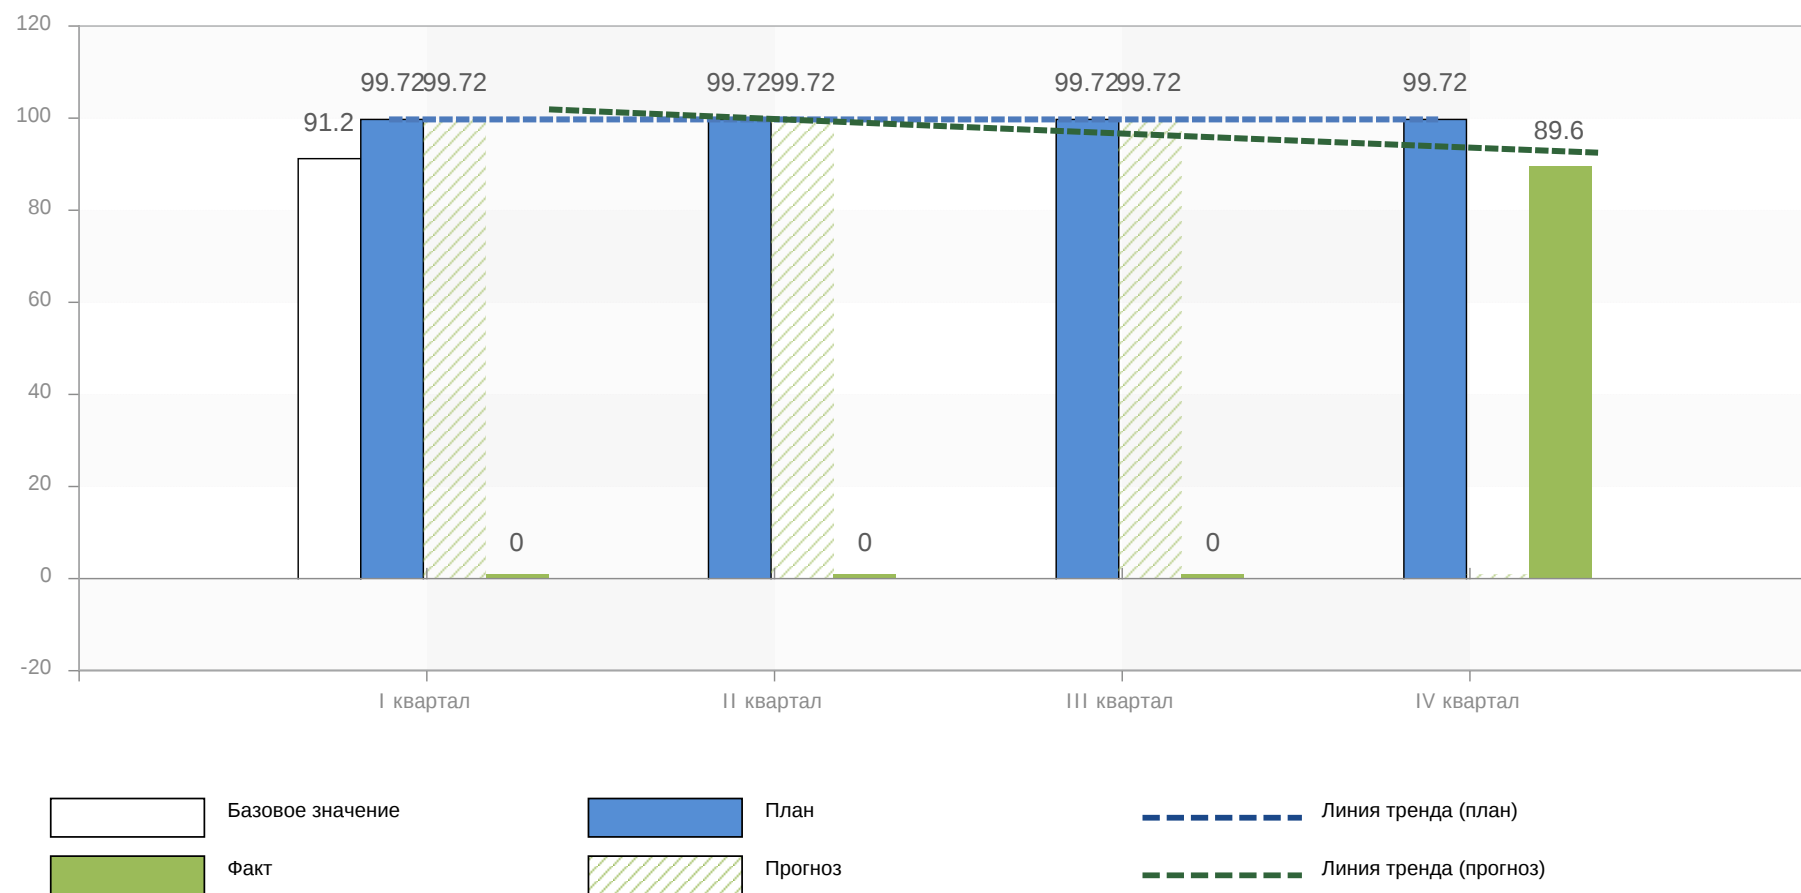


Рис. 6. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

График достижения показателя

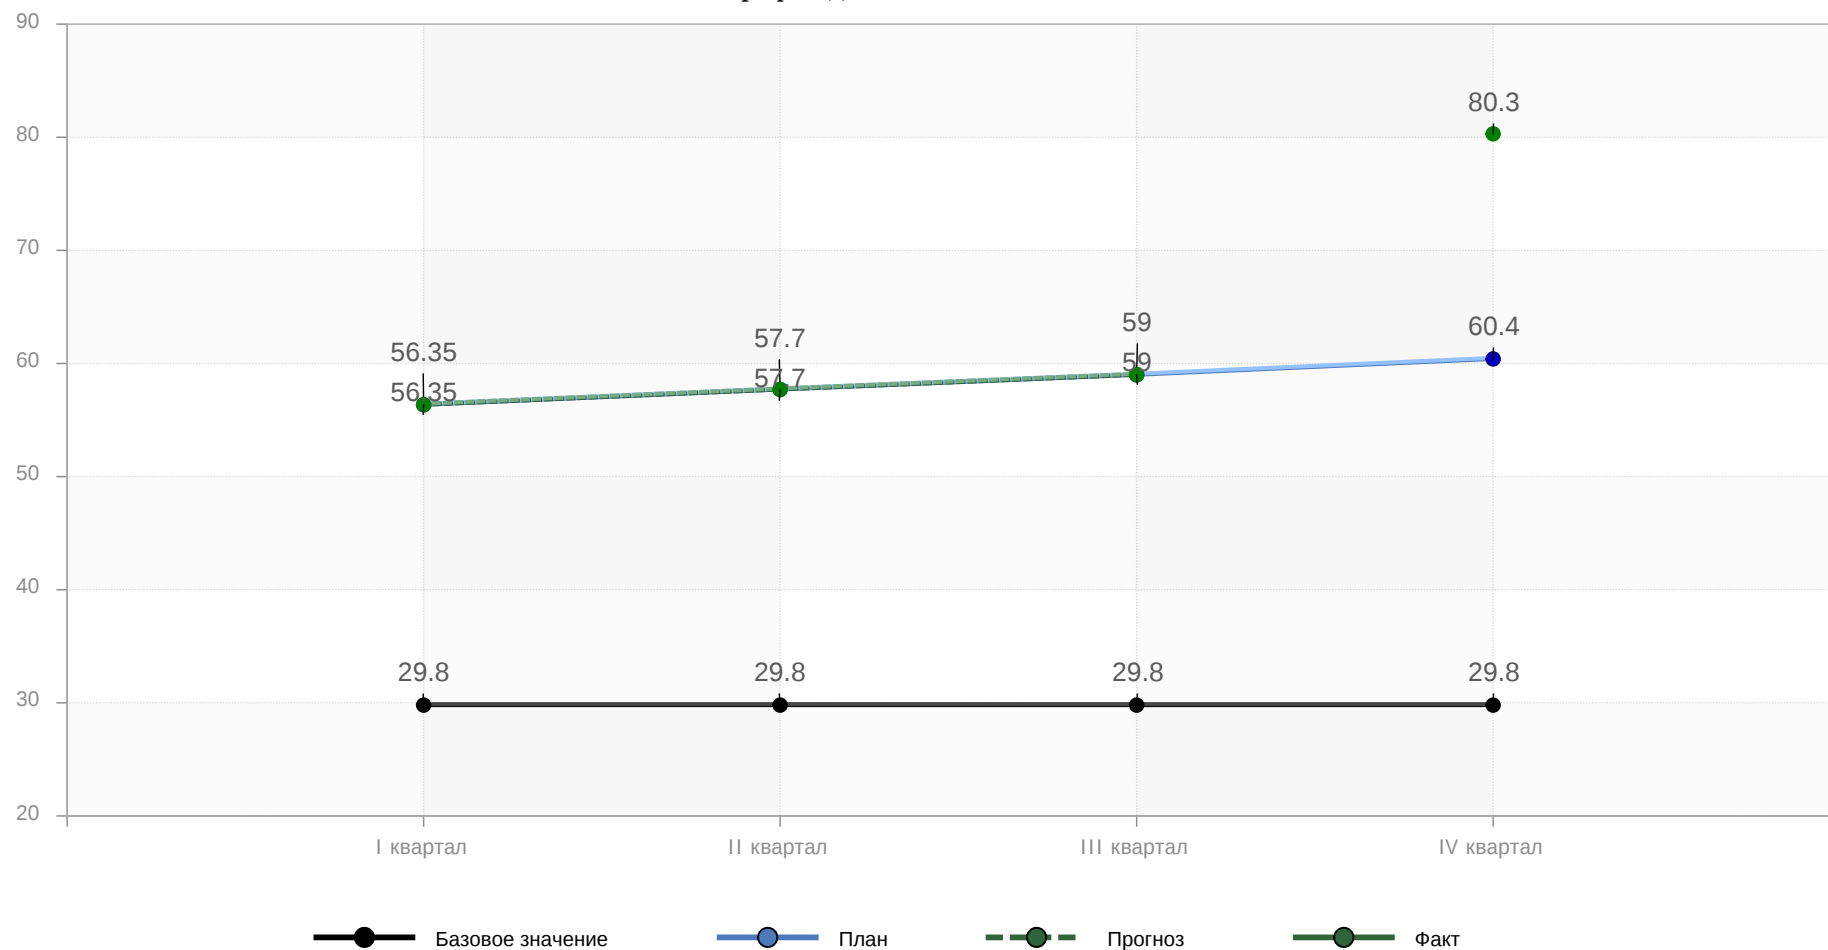


Рис. 7. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

Диаграмма достижения показателя

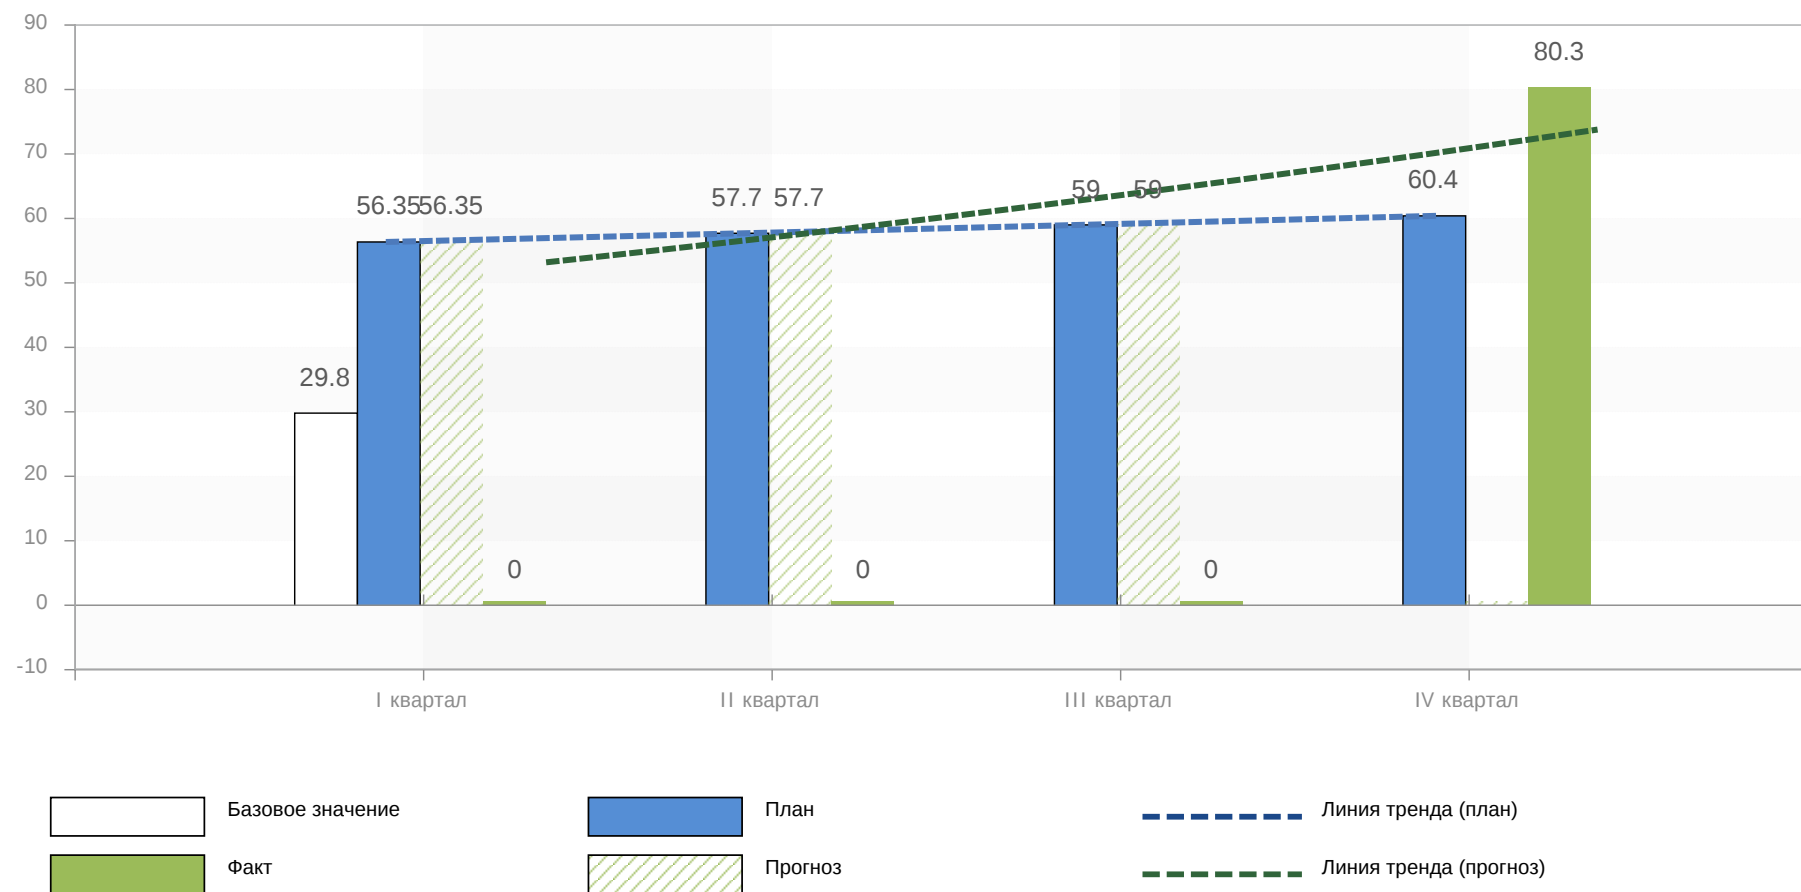


Рис. 8. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

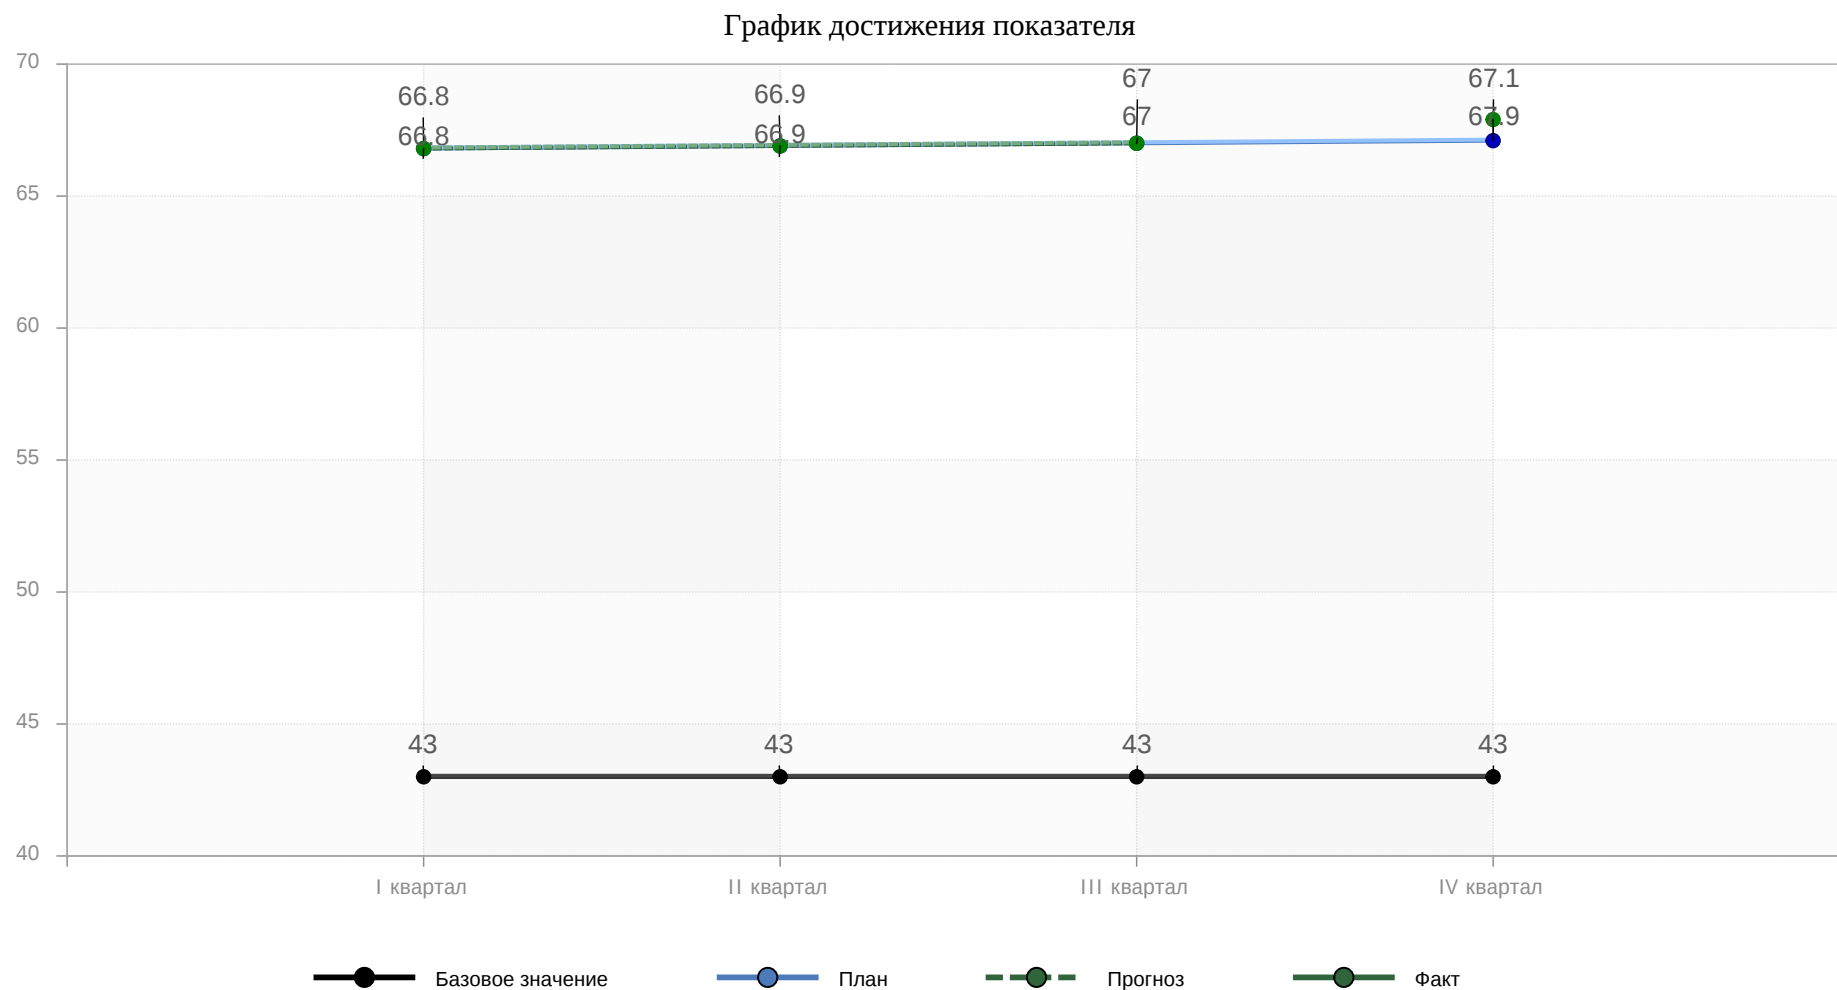


Рис. 9. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

Диаграмма достижения показателя

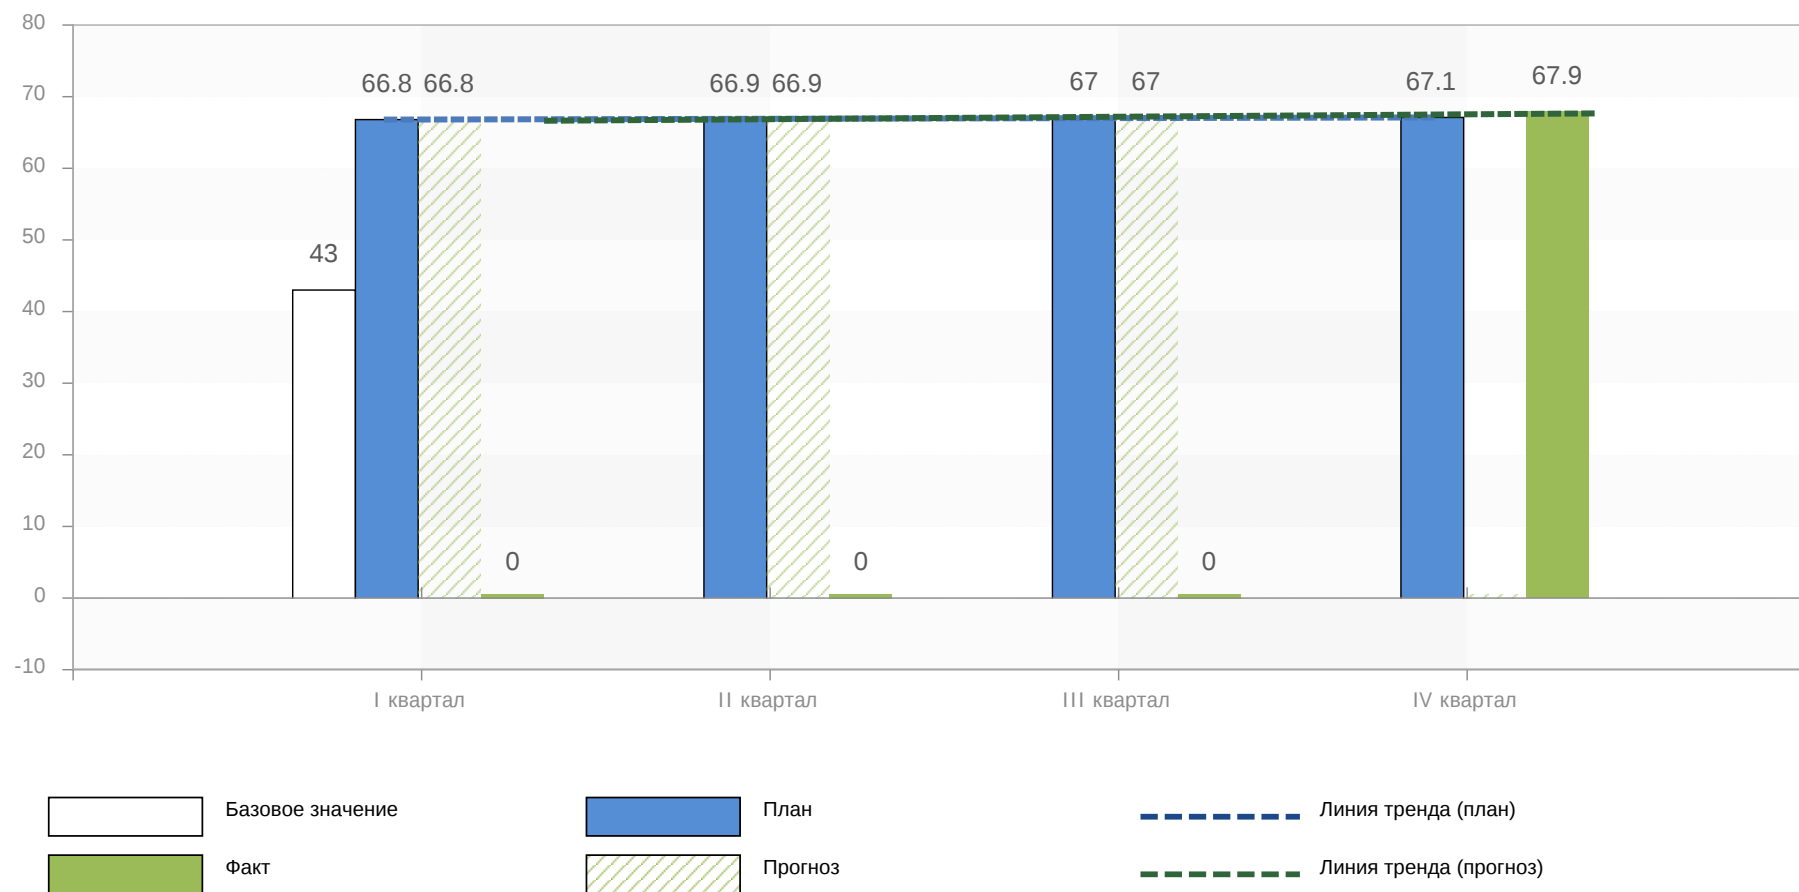


Рис. 10. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
