

Руководитель
регионального проекта —
Садиков Максим Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

21.01.2020

Сертификат:

209E77DF83F221F7B3B98842C16EF062C485DA6E

Владелец: САДИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Действителен: с 13.01.2020 по 13.04.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(D2-32) Информационная инфраструктура (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля государственных образовательных организаций Кемеровской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»	Процент	0	0	0	0	15.74	15.12	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Перечень СЗО, подключенных к сети Интернет в 2019 году" Перечень - от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.
2		Доля органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет»	Процент	0	0	0	0	17.2	15.05	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Перечень СЗО, подключенных к сети Интернет в 2019 году" Перечень - от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.
3		Доля государственных фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Кемеровской области, подключенных к сети «Интернет»	Процент	0	0	0	0	26.35	26.35	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Перечень СЗО, подключенных к сети Интернет в 2019 году" Перечень - от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
4		Доля государственных медицинских организаций Кемеровской области (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет»	Процент	0	0	0	0	100	100	100,00%	


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

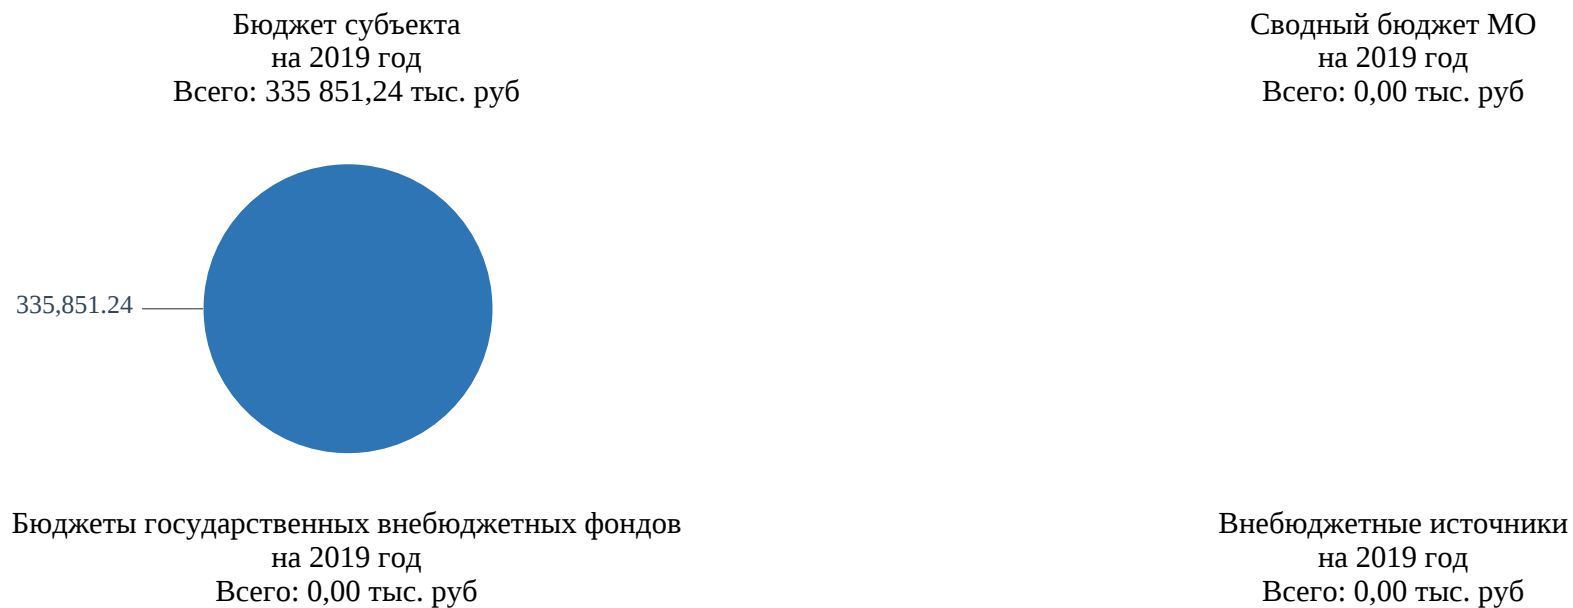3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклоненийСведения не
представленыПрогнозные
сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Оказано содействие подключению к сети «Интернет» фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(88) Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций	335 851,24	335 851,24	335 851,24	335 772,49	0,00	0,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	335 851,24	335 851,24	335 851,24	335 772,49	0,00	0,00	Условиями контракта предусмотрено казначейское сопровождение. Оплата не осуществлена в связи с отсутствием у исполнителя счета в УФК по Кемеровской области
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	335 851,24	335 851,24	335 851,24	335 772,49	0,00	0,00	Условиями контракта предусмотрено казначейское сопровождение. Оплата не осуществлена в связи с отсутствием у исполнителя счета в УФК по Кемеровской области

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			335 851,24	335 851,24	335 851,24	335 772,49	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			335 851,24	335 851,24	335 851,24	335 772,49	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			335 851,24	335 851,24	335 851,24	335 772,49	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций	
2		Оказано содействие подключению к сети «Интернет» фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Оказано содействие подключению к сети «Интернет» фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области Значение: 175, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Садиков М. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Доклад к заседанию координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области об итогах реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 2019 году " Отчет департамент информационных технологий Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 180 из 175. Информация по результату: Выполнено.
1.1	ПК		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.11.2019	28.10.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет по контрольной точке" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 28.10.2019г. №б/н, приложен файл.
1.1.1	РРП		Представление результатов обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов	01.06.2019	30.04.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Перечень фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, которым необходимо обеспечить широкополосный доступ к сети «Интернет»" Первый заместитель Губернатора Кемеровской области от 30.04.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.2	РРП		Представление результатов обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи государственных образовательных организаций Кемеровской области и муниципальных образовательных организаций	01.06.2019	30.04.2019	Пфетцер С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Перечень государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования, которым необходимо обеспечить широкополосный доступ к сети «Интернет»" И.о. Губернатора Кузбасса от 30.04.2019г. №б/н, приложен файл. Перечень государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования, которым необходимо обеспечить широкополосный доступ к сети «Интернет» направлен в Минпросвещения России 30.04.2019
1.1.3	РРП		Представление результатов обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления	01.06.2019	11.03.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Перечень органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления, подлежащих подключению к сети «Интернет»" Губернатор Кемеровской области от 11.03.2019г. №б/н, приложен файл. Перечень органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления, подлежащих подключению к сети «Интернет» направлен в Минкомсвязь России 11.03.2019
1.1.4	РРП		Представление результатов обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи пожарных частей и пожарных постов Кемеровской области	01.06.2019	11.03.2019	Стефанский К. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Перечень пожарных частей и пожарных постов Кемеровской области, подлежащих подключению к сети «Интернет»" Губернатор Кемеровской области от 11.03.2019г. №б/н, приложен файл. Перечень пожарных частей и пожарных постов Кемеровской области, подлежащих подключению к сети «Интернет» направлен в Минкомсвязь России 11.03.2019

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены






Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.5	РРП		Обоснование контрактной скорости доступа к сети «Интернет» фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов	01.06.2019	31.01.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо ДОЗН КО" Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области от 31.01.2019г. №555, приложен файл. Обоснование направлено в Минздрав России
1.1.6	РРП		Обоснование контрактной скорости доступа к сети «Интернет» органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления	01.06.2019	11.03.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приложение к перечню б/н от 11.03.2019, утвержденному Губернатором Кемеровской области" Губернатор Кемеровской области от 11.03.2019г. №б/н, приложен файл. Обоснование направлено в Минкомсвязь России в рамках направления перечня органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления, подлежащих подключению к сети «Интернет»
1.1.7	РРП		Представление в Минкомсвязь России обоснования объемов финансирования в соответствии с методическими рекомендациями «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура образовательных организаций Российской Федерации», разработанными Минкомсвязью России	01.11.2019	28.10.2019	Пфетцер С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация об обосновании объемов финансирования" Письмо Администрации Кемеровской области от 28.10.2019г. №И26-18/8920, приложен файл. 2. "приложение к информации об обосновании объемов финансирования" Иное Администрации Кемеровской области от 28.10.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.8	РРП		Представление на утверждение в Минкомсвязь России согласованных с оператором связи, с которым заключен государственный контракт на подключение социально-значимых объектов к сети «Интернет» в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» (далее – Государственный контракт, СЗО), плана поэтапного подключения СЗО с указанием типа подключения каждого СЗО и (или) плана подключения узлов связи на территории Кемеровской области	18.09.2019	18.09.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо от 18.09.2019г. №10/00251и, приложен файл. 2. "План поэтапного подключения СЗО" План от 18.09.2019г. №б/н, приложен файл. ПАО "МТС" направлен в Минкомсвязь России согласованный план поэтапного подключения СЗО
1.2	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доклад к заседанию координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области об итогах реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 2019 году " Отчет департамент информационных технологий Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
1.2.1	РРП		Участие в приемке работ (услуг) у поставщиков (подрядчиков), выполнявших мероприятия федерального проекта на основании государственных контрактов (договоров), заключенных участниками федерального проекта	31.12.2019	31.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Перечень социально значимых объектов, подключенных к сети интернет и передачи данных в 2019 году по государственному контракту от 08.08.2019 № 0173100007519000037_144316" Акт департамент информационных технологий Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2			Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций Значение: 172, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Пфетцер С. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт № 0139200000119009616_255640 на поставку оборудования для образовательных организаций" Контракт между департаментом образования и науки Кемеровской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Национальный Центр Информатизации» от 17.12.2019г. № 0139200000119009616_255640, приложен файл. 2. "Государственный контракт № 0139200000119009619_255640 на поставку оборудования для образовательных организаций" Контракт между департаментом образования и науки Кемеровской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Национальный Центр Информатизации» от 19.12.2019г. № 0139200000119009619_255640, приложен файл. Предоставлена информация : 172 из 172. Информация по результату: Выполнено.
2.1	ПК		Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций	31.12.2019	31.12.2019	Пфетцер С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет «Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций» Региональный проект «Информационная инфраструктура»" Иной вид документа Информационно-аналитический отчет департамента образования и науки Кемеровской области от 31.12.2019г. №-, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.1	РРП		Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций	31.12.2019	31.12.2019	Пфетцер С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет «Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций» Региональный проект «Информационная инфраструктура»" Иной вид документа Информационно-аналитический отчет департамента образования и науки Кемеровской области от 31.12.2019г. №-, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек

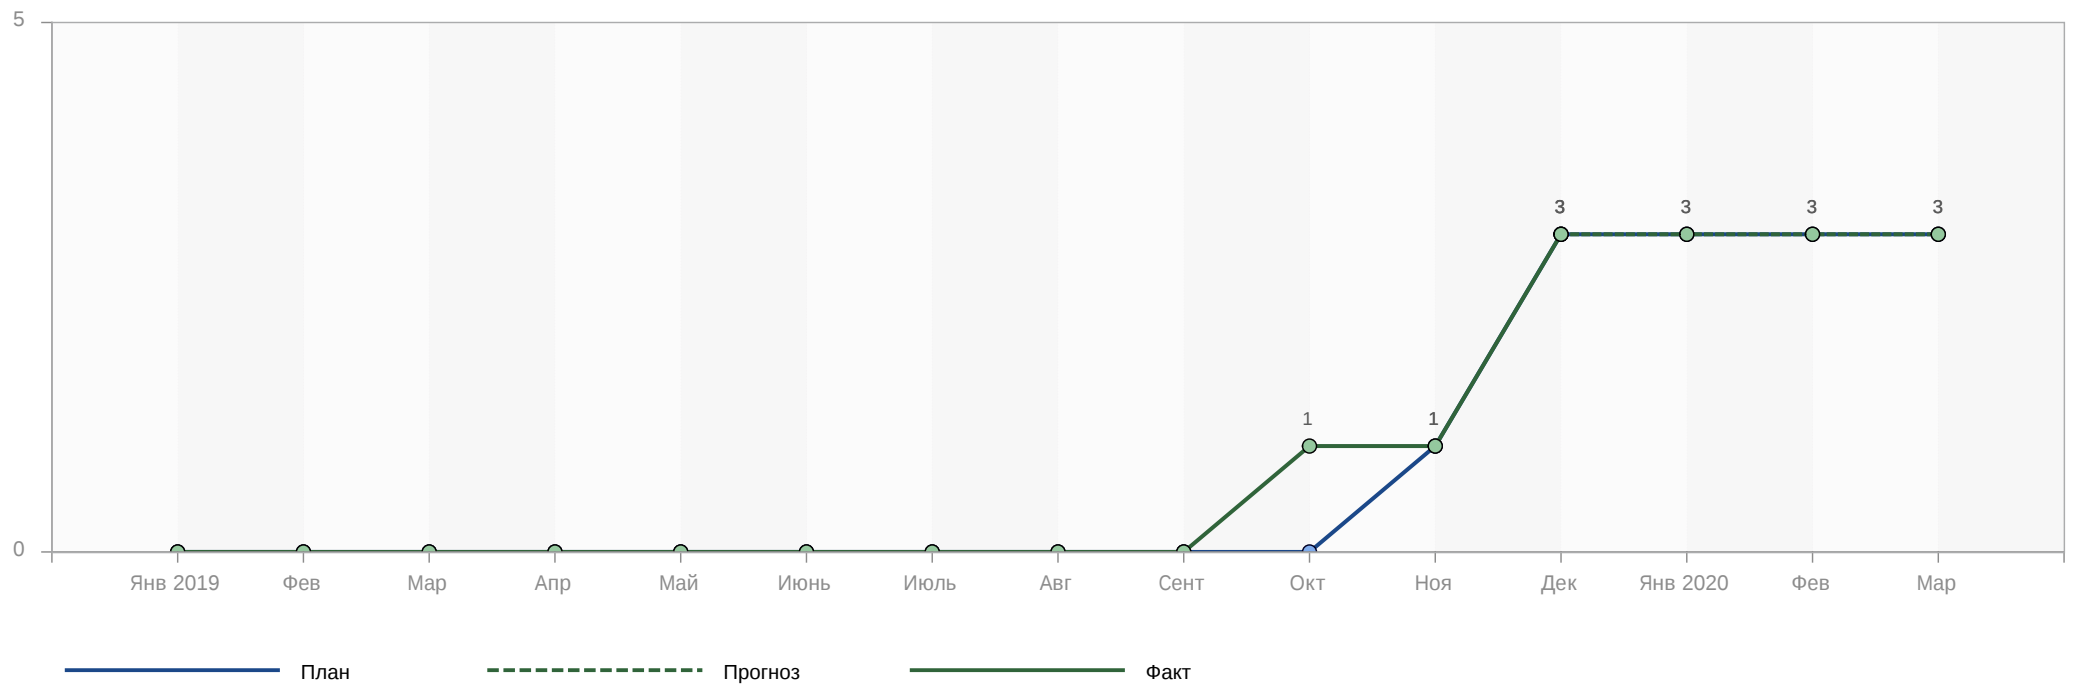


Рис. 1. "(D2-32) Информационная инфраструктура (Кемеровская область - Кузбасс)"




График достижения показателя

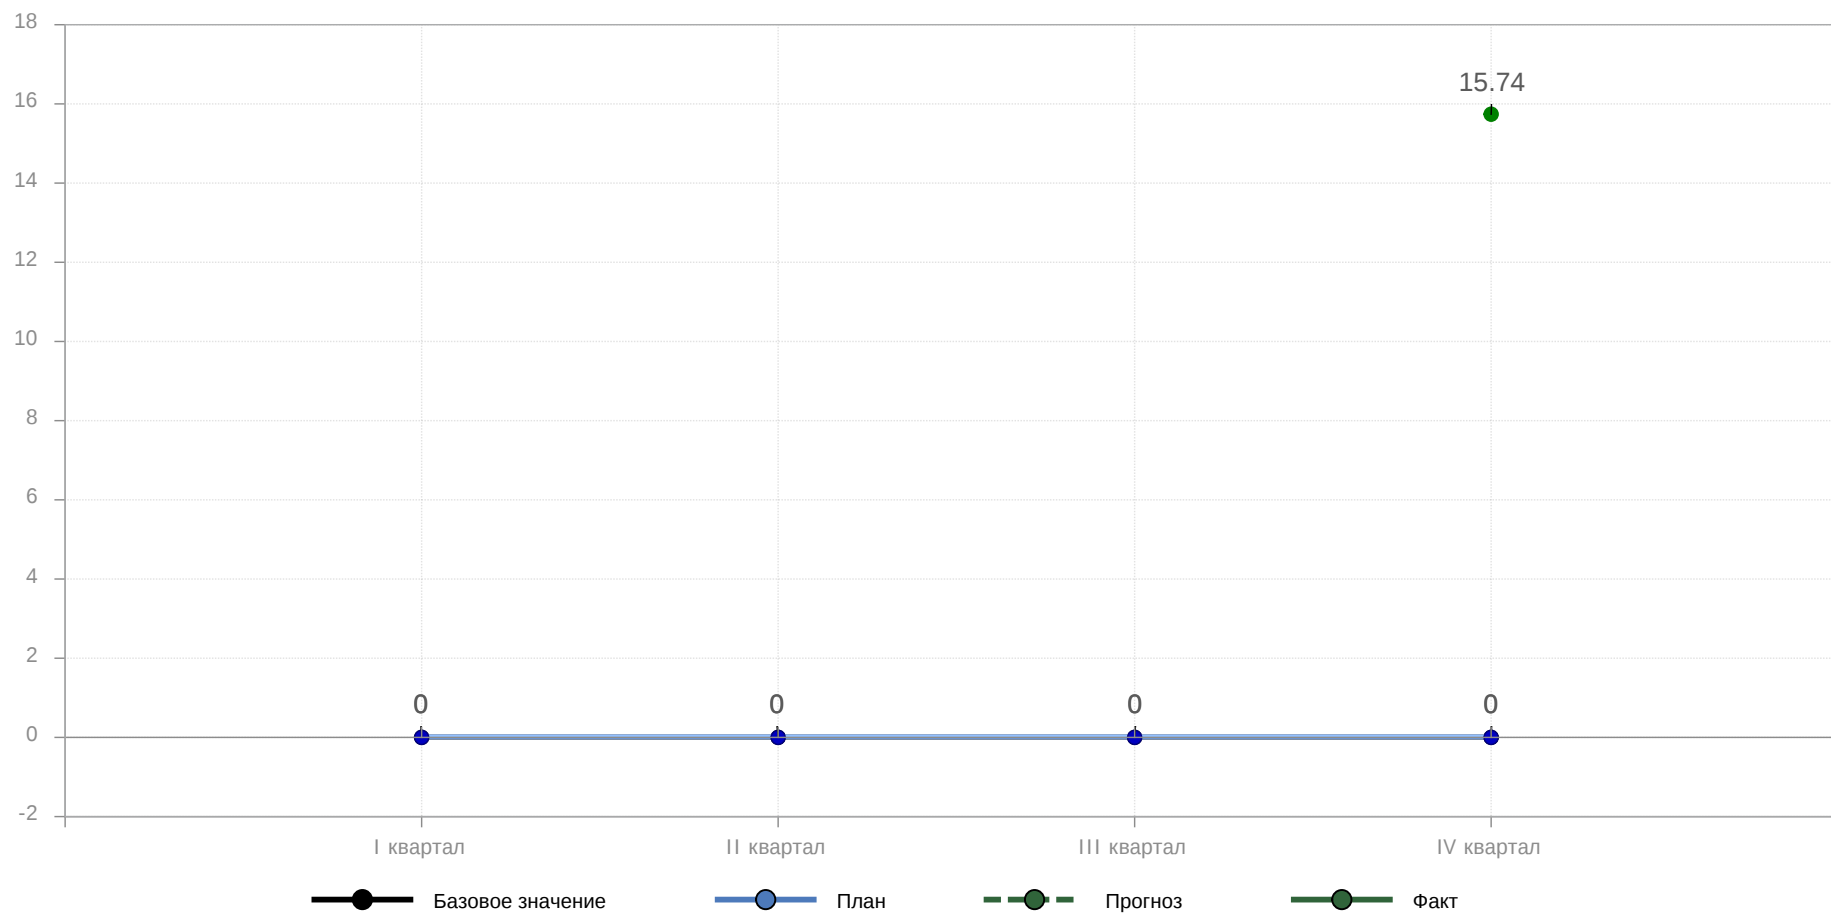


Рис. 1. Доля государственных образовательных организаций Кемеровской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

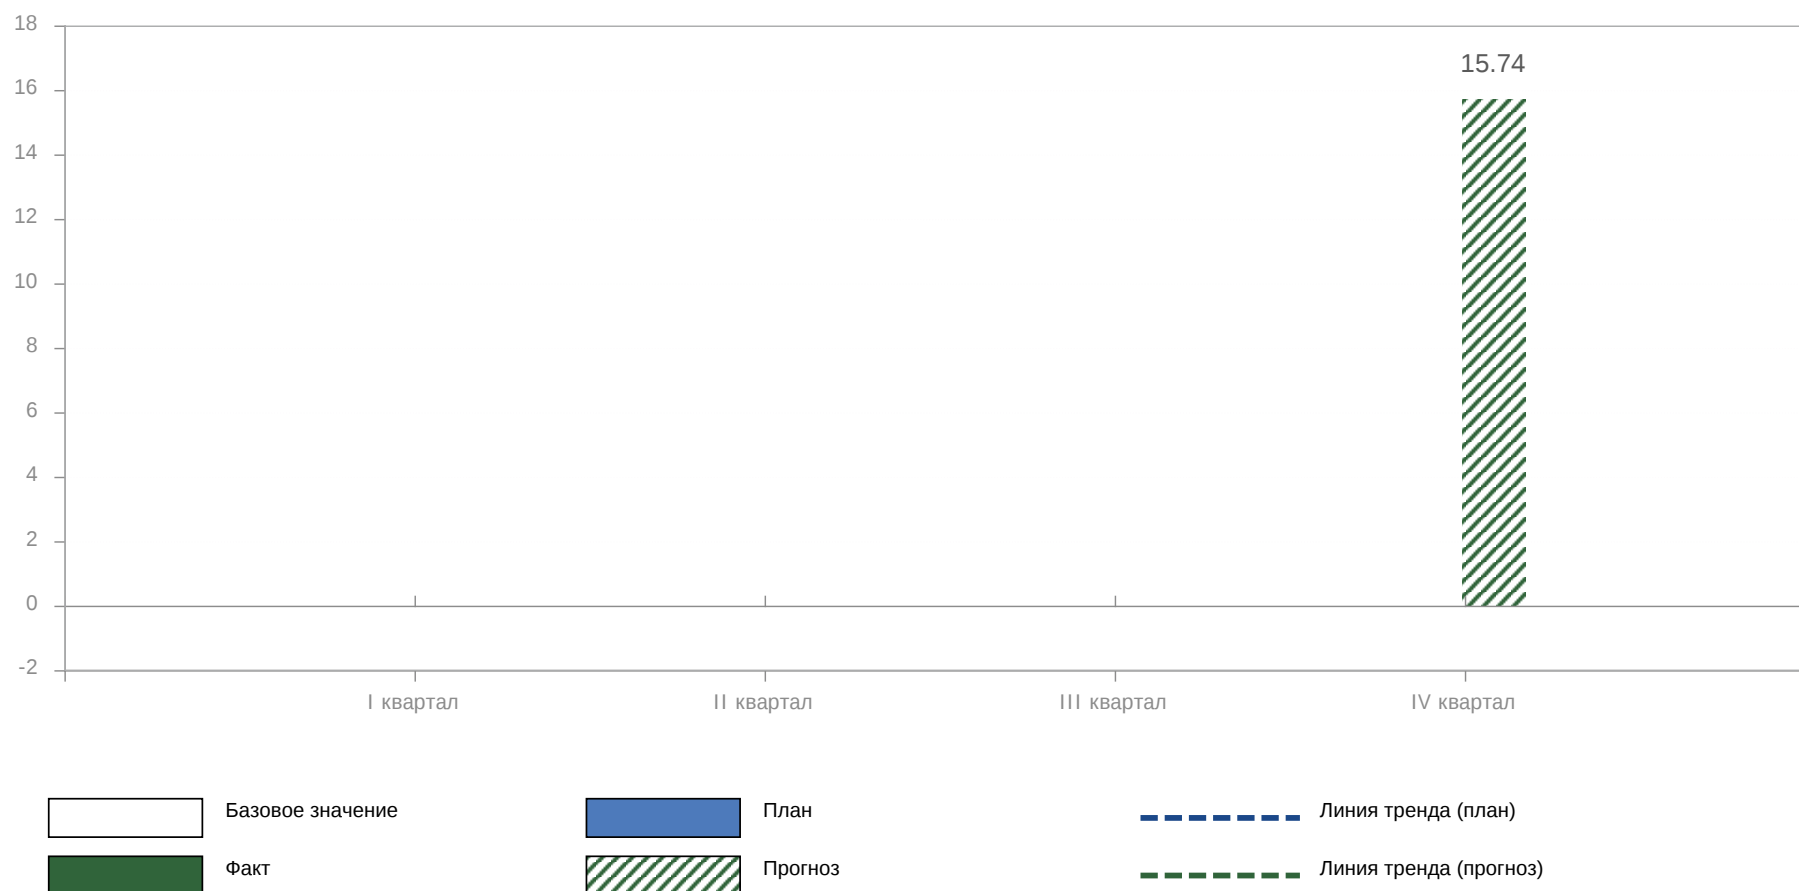


Рис. 2. Доля государственных образовательных организаций Кемеровской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»

График достижения показателя

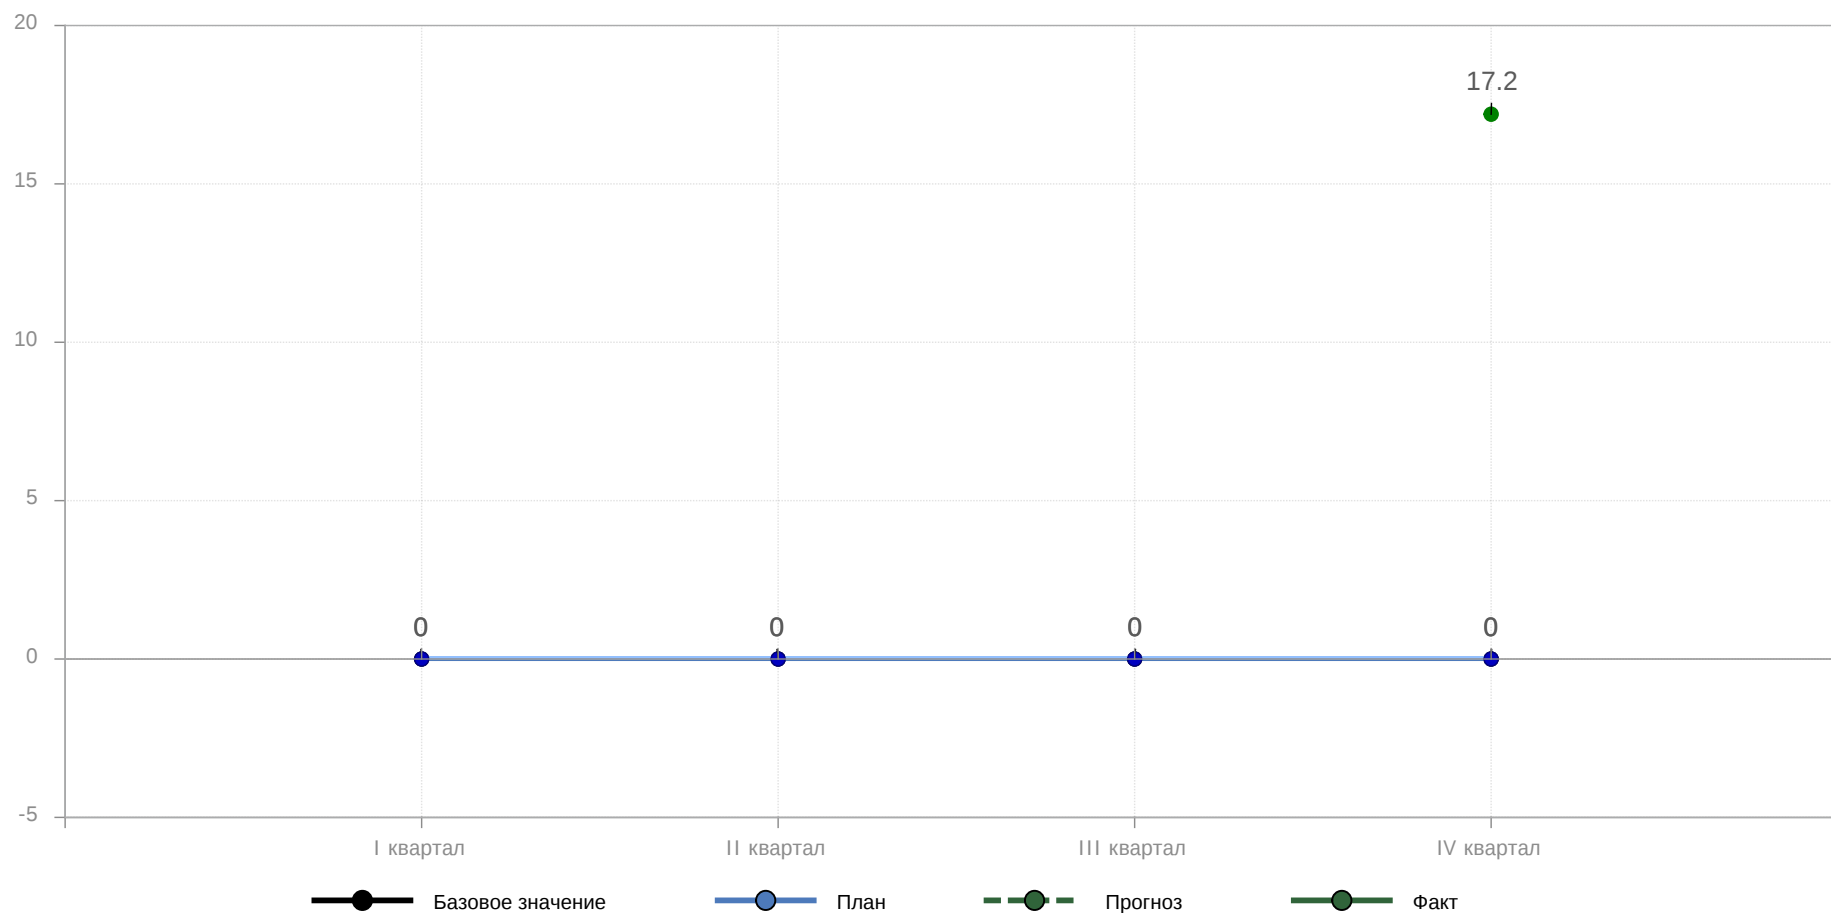


Рис. 3. Доля органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет»

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

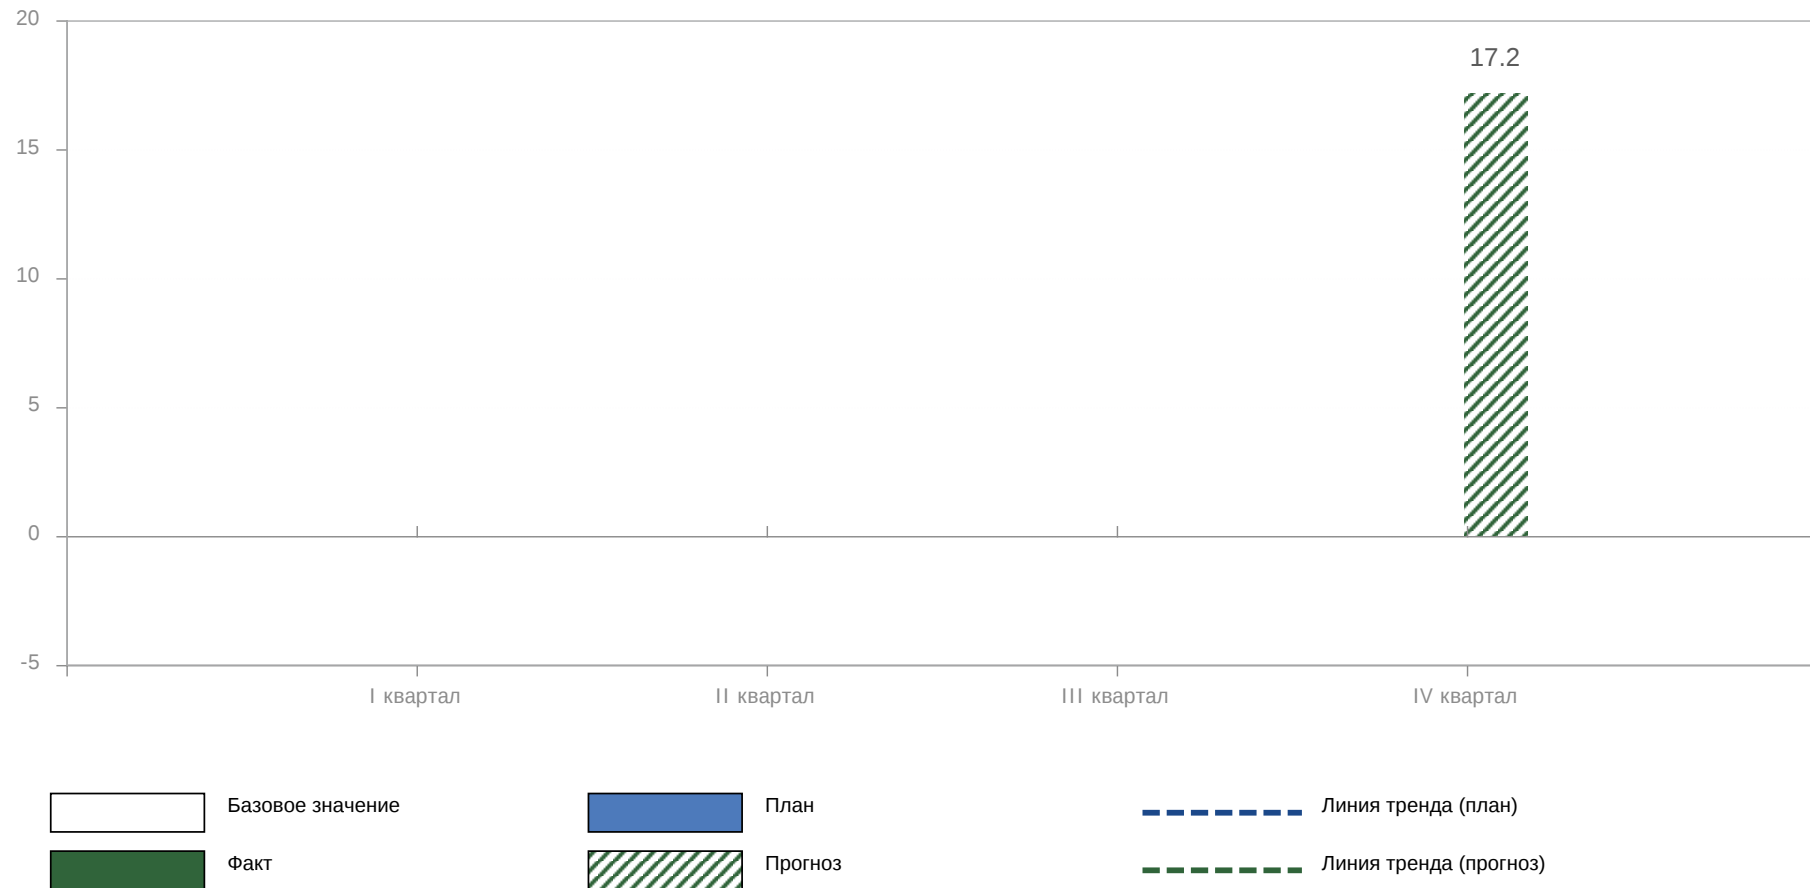


Рис. 4. Доля органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет»

График достижения показателя

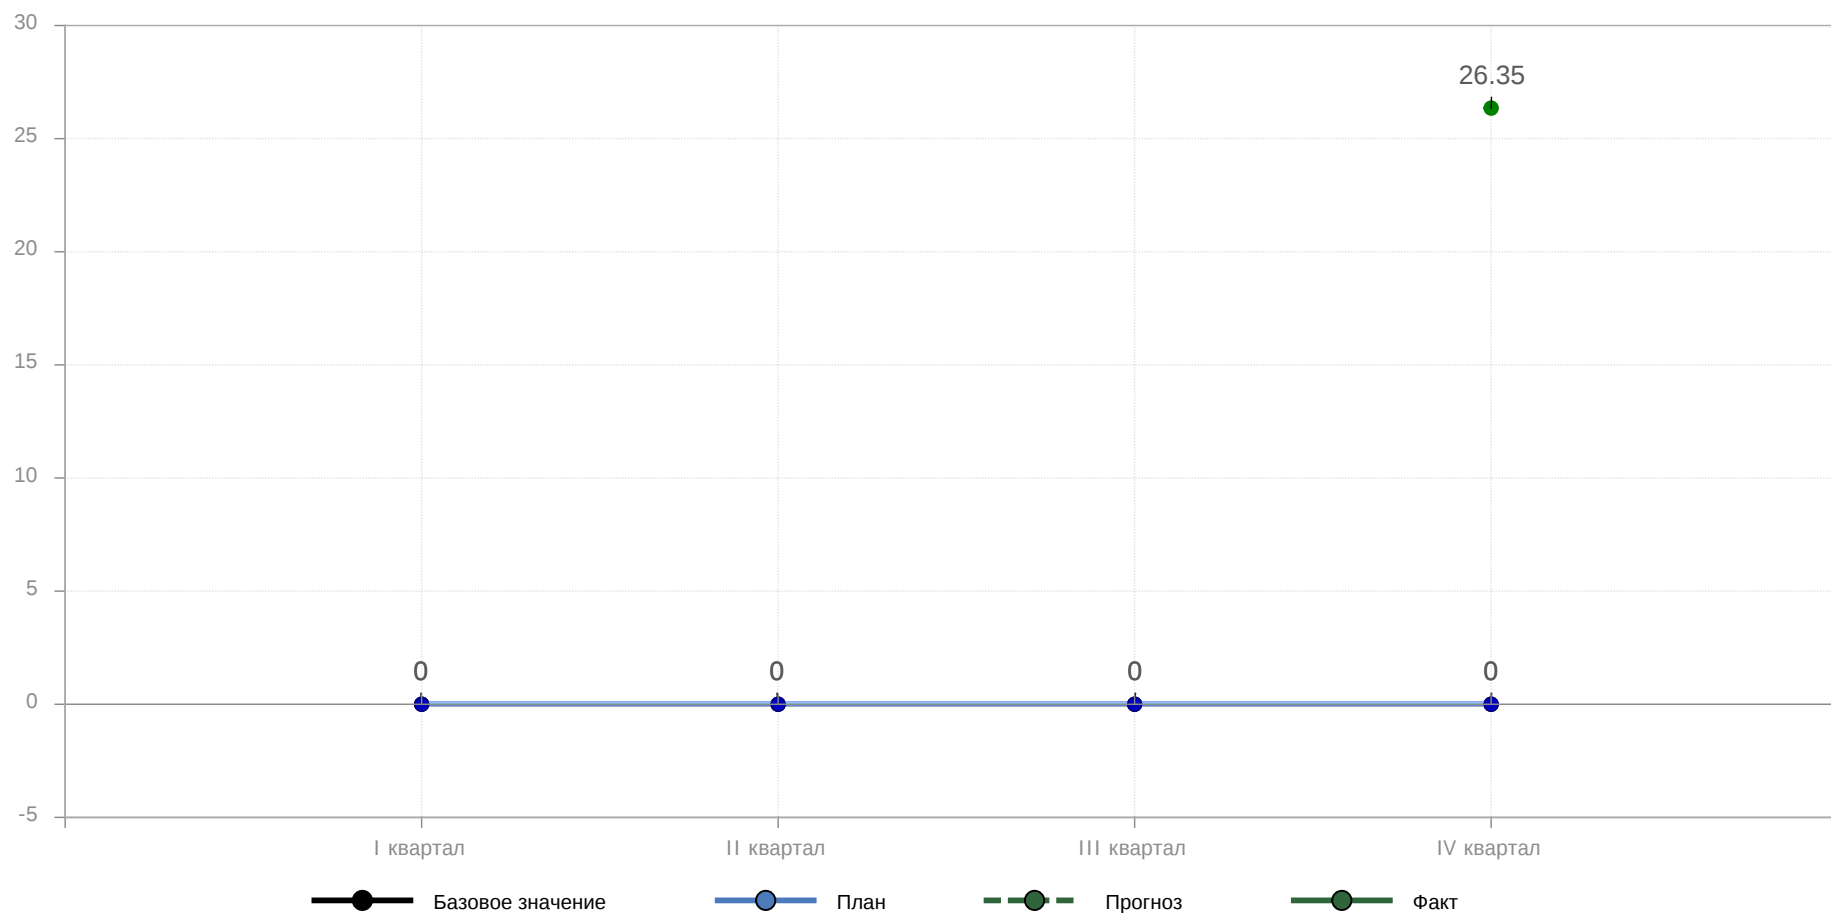


Рис. 5. Доля государственных фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Кемеровской области, подключенных к сети «Интернет»

Диаграмма достижения показателя

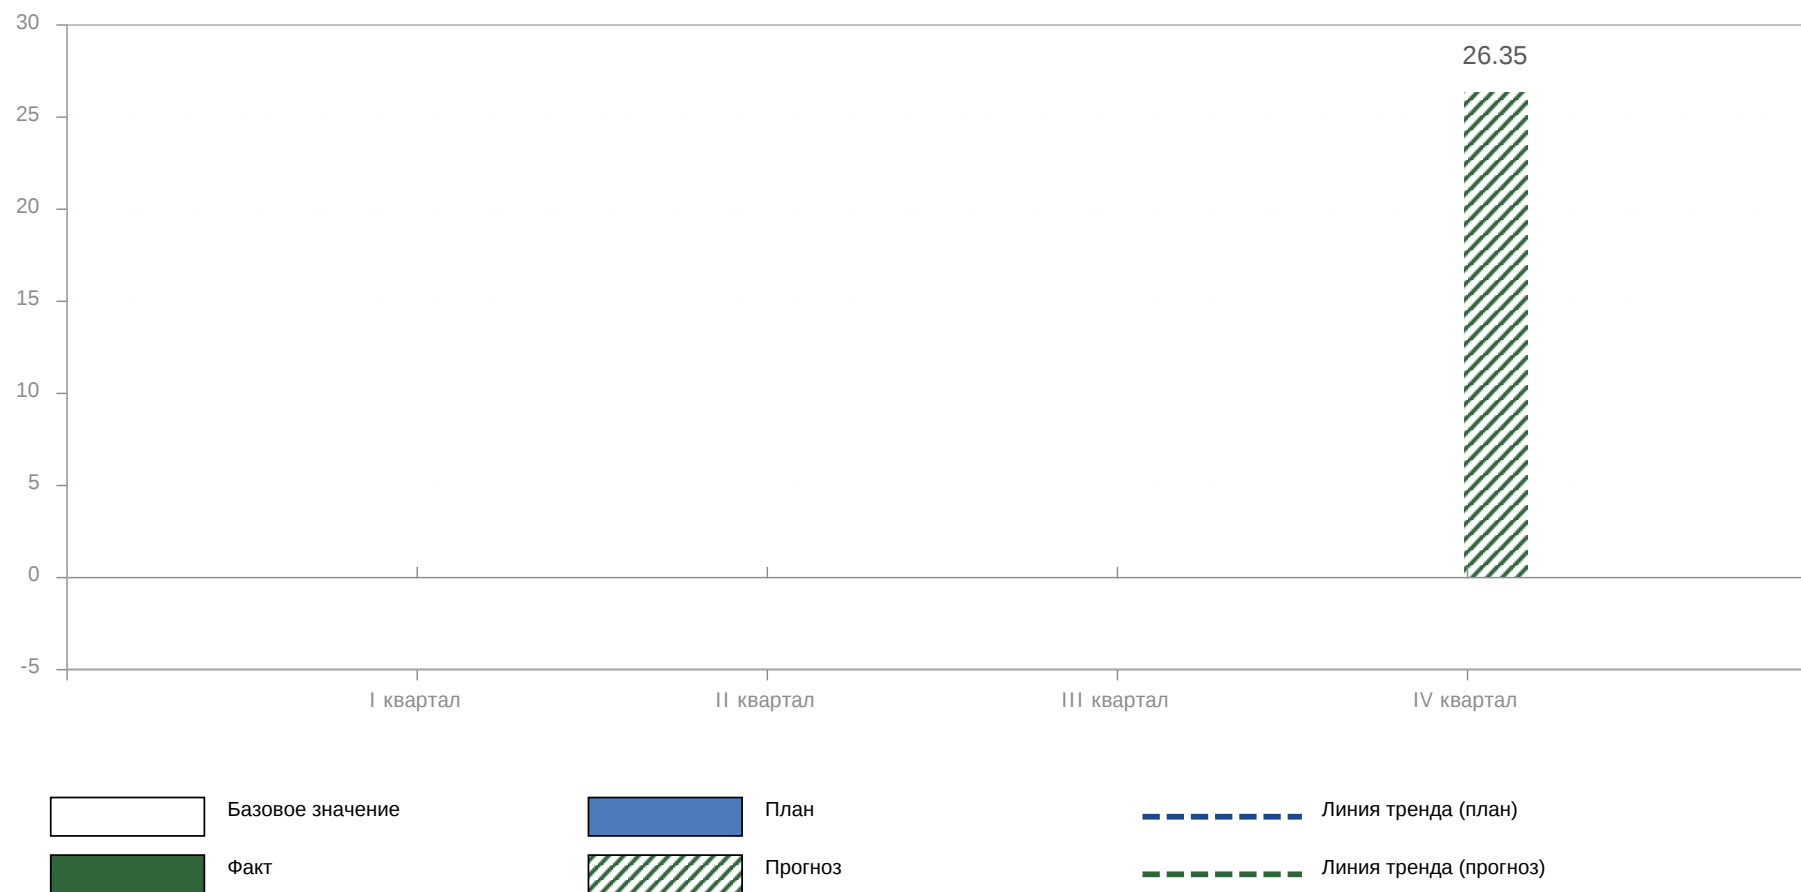


Рис. 6. Доля государственных фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Кемеровской области, подключенных к сети «Интернет»

График достижения показателя

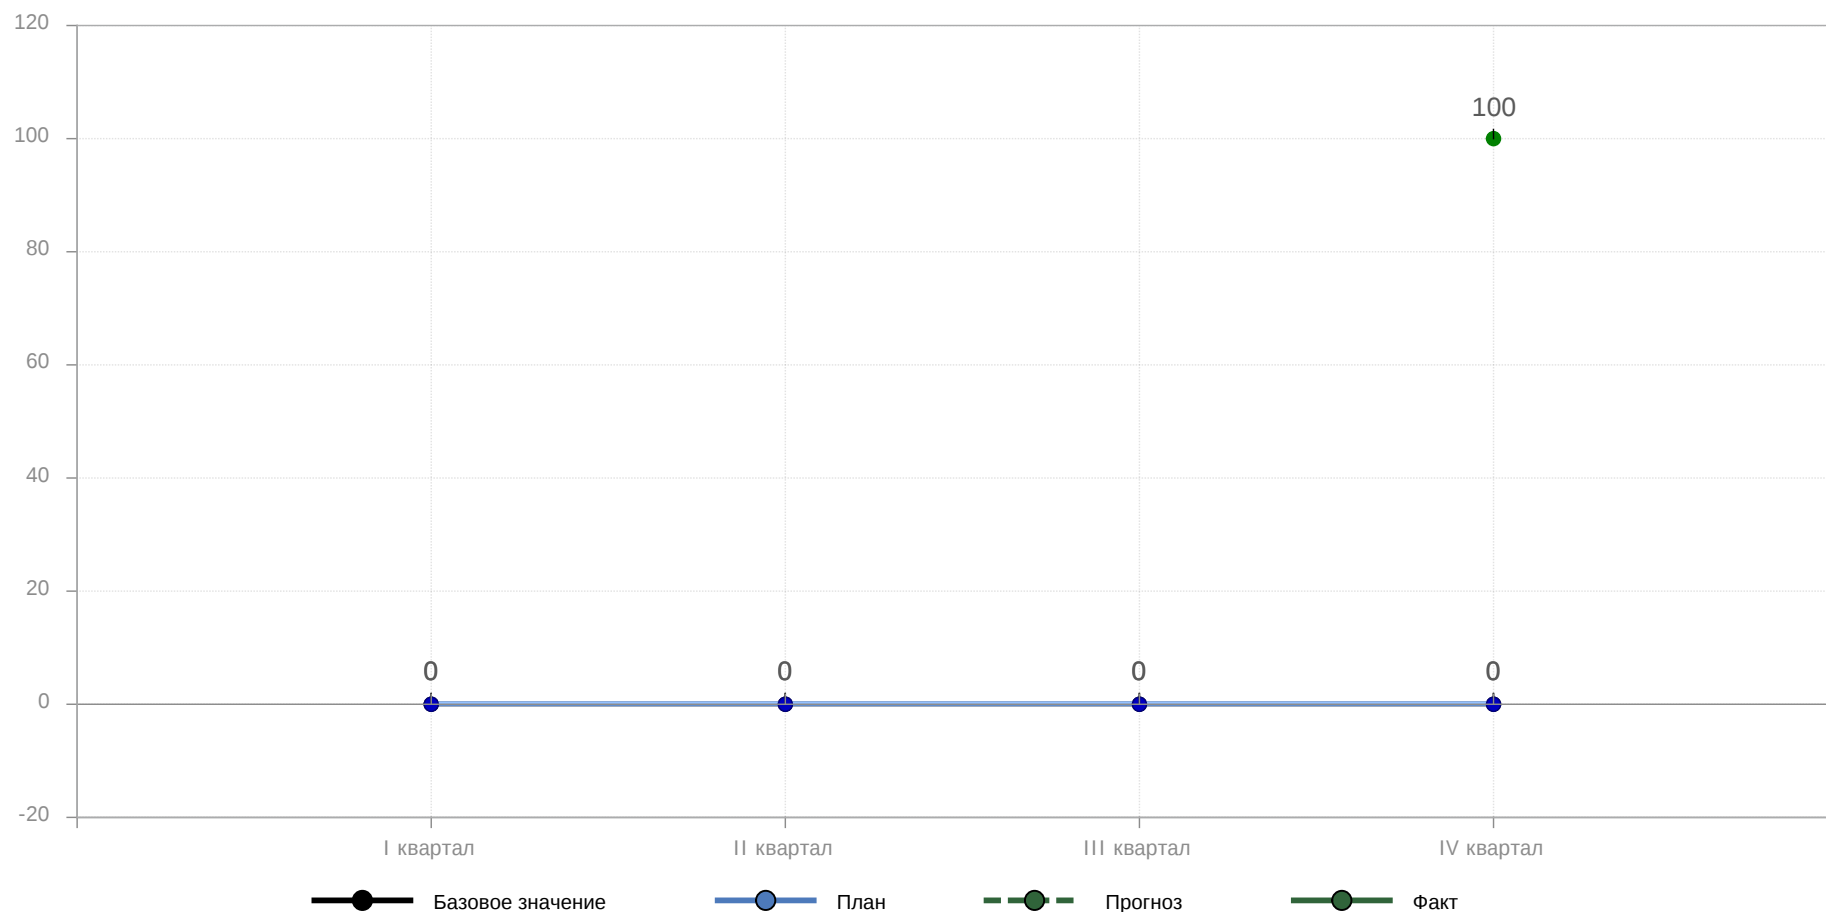


Рис. 7. Доля государственных медицинских организаций Кемеровской области (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет»

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

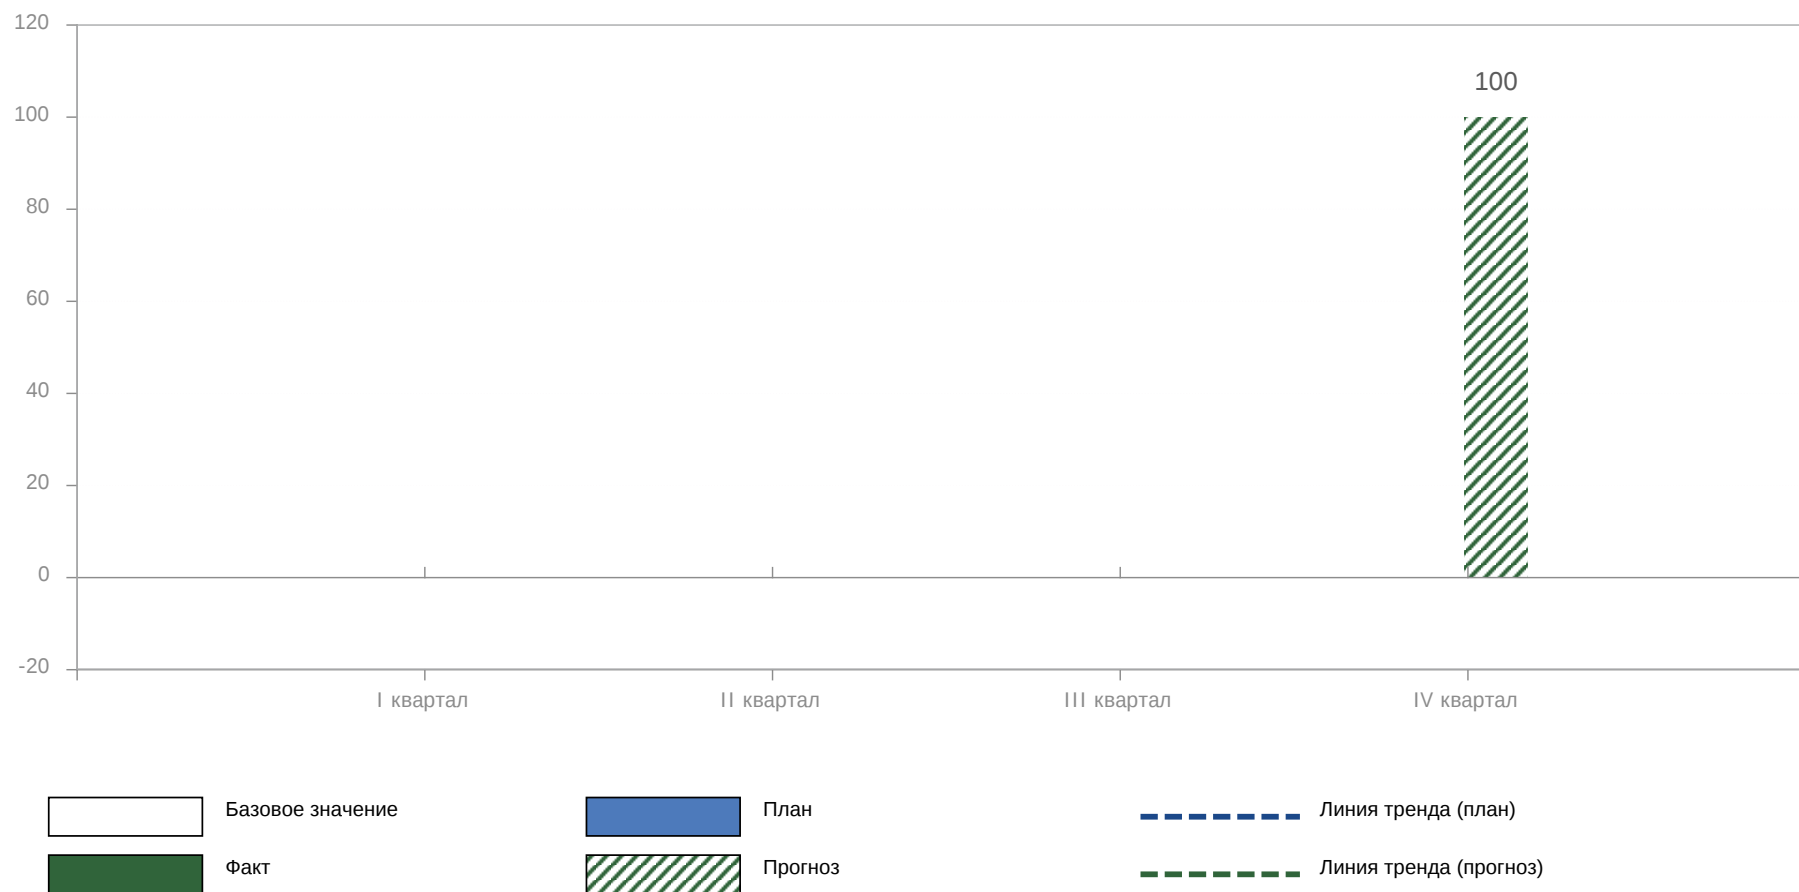


Рис. 8. Доля государственных медицинских организаций Кемеровской области (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет»
