

Руководитель
регионального проекта —
Ваганов Владимир Михайлович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

26.02.2021

Сертификат:

152140CB0C89CC1FF65A58FA96F6EDAD82FF0E9B

Владелец: Ваганов Владимир Михайлович

Действителен: с 09.11.2020 по 09.02.2022

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(Т4-32) Экспорт услуг"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
		—		
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	--	Наличие отклонений	Наличие критических отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1		6. План мероприятий	разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки». Некритический риск выполнения , Причина риска: Органами исполнительной власти будет подготовлен комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Поездки", Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти подготовить комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Поездки", срок исполнения 31.01.2021;
2		6. План мероприятий	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство». Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируется комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство» , Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса сформировать комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство» , срок исполнения 31.01.2021;
3		6. План мероприятий	Контрольная точка:разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта страховых услуг. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируется комплекс мер по увеличению объема экспорта страховых услуг. , Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса сформировать комплекс мер по увеличению объема экспорта страховых услуг. , срок исполнения 31.01.2021;
4		6. План мероприятий	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируется комплекс мер на очередной год по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса сформировать комплекс мер на очередной год по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха, срок исполнения 31.01.2021;
5		6. План мероприятий	Контрольная точка: разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта деловых услуг. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органы исполнительной власти формируют комплекс мер по увеличению объема экспорта деловых услуг., Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти сформировать комплекс мер по увеличению объема экспорта деловых услуг., срок исполнения 31.01.2021;
6		6. План мероприятий	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной	1. Органам исполнительной власти сформировать комплекс мер по увеличению объема платы за

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
			собственностью. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти формируется комплекс мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	пользование интеллектуальной собственностью, срок исполнения 31.01.2021;
7		6. План мероприятий	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируется комплекс мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса сформировать комплекс мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг, срок исполнения 31.01.2021;
8		6. План мероприятий	Контрольная точка: разработка и реализация комплекса мер по увеличению экспорта транспортных услуг. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти формируется комплекс мер по увеличению экспорта транспортных услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти сформировать комплекс мер по увеличению экспорта транспортных услуг, срок исполнения 31.01.2021;
9		6. План мероприятий	Контрольная точка: разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам». Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируется комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам», Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса сформировать комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам», срок исполнения 31.01.2021;
10		6. План мероприятий	Контрольная точка: разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров». Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти формируется комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров», Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти сформировать комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров», срок исполнения 31.01.2021;
11		4. Результаты	Дальнейшее выполнение результата не предусмотрено, Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено. , Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г.	1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено. , срок исполнения 01.12.2021;



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

[illegible]

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
18		4. Результаты	Дальнейшее выполнение результата не предусмотрено. , Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено. , Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г.	1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено. , срок исполнения 01.12.2021;
19		4. Результаты	В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г.	1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., срок исполнения 01.12.2021;
20		4. Результаты	Дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г.	1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., срок исполнения 01.12.2021;
21		4. Результаты	Дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г.	1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., срок исполнения 01.12.2021;
22		4. Результаты	Дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г.	1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., срок исполнения 01.12.2021;
23		6. План мероприятий	Мероприятие: анализ структуры экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируются отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса направить отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, срок исполнения 31.01.2021;

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
24		6. План мероприятий	Мероприятие: формирование предложений по направлениям развития экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируются отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса направить отчеты по анализу состояния и предложения по развитию экспорта отдельных видов услуг, срок исполнения 31.01.2021;
25		6. План мероприятий	Мероприятие: мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируются отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса направить отчеты по анализу состояния развития экспорта отдельных видов услуг, срок исполнения 31.01.2021;
26		6. План мероприятий	Мероприятие: подготовка предложений по преодолению барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируются отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса направить отчеты по анализу состояния и предложения по развитию экспорта отдельных видов услуг, срок исполнения 31.01.2021;
27		6. План мероприятий	Мероприятие: анализ структуры экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируются отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса направить отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, срок исполнения 31.01.2021;
28		6. План мероприятий	Мероприятие: формирование предложений по направлениям развития экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируются отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса направить отчеты по анализу состояния и предложения по развитию экспорта отдельных видов услуг, срок исполнения 31.01.2021;
29		6. План мероприятий	Мероприятие: мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируются отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса направить отчеты по анализу состояния развития экспорта отдельных видов услуг, срок исполнения 31.01.2021;
30		6. План мероприятий	Мероприятие: подготовка предложений по преодолению барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе. Некритический риск	1. Органам исполнительной власти Кузбасса направить отчеты по анализу состояния и

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
			невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируются отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	предложения по развитию экспорта отдельных видов услуг, срок исполнения 31.01.2021;
31		6. План мероприятий	Мероприятие: анализ структуры экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируются отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса направить отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, срок исполнения 31.12.2021;
32		6. План мероприятий	Мероприятие: формирование предложений по направлениям развития экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируются отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса направить отчеты по анализу состояния и предложения по развитию экспорта отдельных видов услуг, срок исполнения 31.01.2021;
33		6. План мероприятий	Мероприятие: мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируются отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса направить отчеты по анализу состояния развития экспорта отдельных видов услуг, срок исполнения 31.12.2021;
34		6. План мероприятий	Мероприятие: подготовка предложений по преодолению барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируются отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса направить отчеты по анализу состояния и предложения по развитию экспорта отдельных видов услуг, срок исполнения 31.01.2021;
35		6. План мероприятий	Мероприятие: анализ структуры экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируются отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса направить отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, срок исполнения 31.01.2021;
36		6. План мероприятий	Мероприятие: формирование предложений по направлениям развития экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируются отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая	1. Органам исполнительной власти Кузбасса направить отчеты по анализу состояния и предложения по развитию экспорта отдельных видов услуг, срок исполнения 31.01.2021;



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
			дата наступления: 31.01.2021г.	
37		6. План мероприятий	Мероприятие: мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируются отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса направить отчеты по анализу состояния развития экспорта отдельных видов услуг, срок исполнения 31.01.2021;
38		6. План мероприятий	Мероприятие: подготовка предложений по преодолению барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируются отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса направить отчеты по анализу состояния и предложения по развитию экспорта отдельных видов услуг, срок исполнения 31.01.2021;
39		6. План мероприятий	Мероприятие: анализ структуры экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируются отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса направить отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, срок исполнения 31.01.2021;
40		6. План мероприятий	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги». Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти будет подготовлен комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги", Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти подготовить комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги", срок исполнения 31.01.2021;
41		6. План мероприятий	Мероприятие: формирование предложений по направлениям развития экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируются отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса направить отчеты по анализу состояния и предложения по развитию экспорта отдельных видов услуг, срок исполнения 31.01.2021;
42		6. План мероприятий	Мероприятие: мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируются отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса направить отчеты по анализу состояния развития экспорта отдельных видов услуг, срок исполнения 31.01.2021;

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
			наступления: 31.01.2021г.	
43		6. План мероприятий	Мероприятие: подготовка предложений по преодолению барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируются отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса направить отчеты по анализу состояния и предложения по развитию экспорта отдельных видов услуг, срок исполнения 31.01.2021;
44		6. План мероприятий	Мероприятие: разработка комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» на предстоящий год:- расширение туристской инфраструктуры;- формирование системы туристской навигации в Кемеровской области - Кузбасса;- организация информирования зарубежных партнеров о предприятиях Кемеровской области - Кузбасса, оказывающих туристические услуги;- формирование и размещение на специализированных интернет-порталах блока информации о предприятиях туристической и турпродуктах Кемеровской области - Кузбасса;- обеспечение высокого уровня качества сервиса и безопасности в процессе оказания туристских услуг;- повышение квалификации специалистов индустрии туризма со знанием иностранных языков на базе лицензированных учебных заведений;- адаптация туристического портала Кемеровской области - Кузбасса под требования иностранных туристов;- продвижение турпродукта Кемеровской области - Кузбасса, ориентированного на въездной туризм, в рамках международных выставок;- организация и проведение информационных туров для представителей туроператоров, блогеров. Некритический риск невыполнения. , Причина риска: Органы исполнительной власти разработают комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Поездки" на предстоящий год, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти подготовить комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Поездки" на предстоящий год, срок исполнения 31.01.2021;
45		6. План мероприятий	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство». Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируются отчеты по разработке комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории "Строительство", Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органами исполнительной власти Кузбасса направить отчеты и предложения по разработке комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Строительство", срок исполнения 31.01.2021;
46		6. План мероприятий	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта деловых услуг. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти	1. Органам исполнительной власти Кузбасса подготовить комплекс мер на очередной год по увеличению объема экспорта деловых услуг, срок

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
			Кузбасса формируется комплекс мер на очередной год по увеличению объема экспорта деловых услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	исполнения 31.01.2021;
47		6. План мероприятий	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта страховых услуг. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируется комплекс мер на очередной год по увеличению объема экспорта страховых услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса сформировать комплекс мер на очередной год по увеличению объема экспорта страховых услуг, срок исполнения 31.01.2021;
48		6. План мероприятий	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха:- информирование зарубежных партнеров об учреждениях области, оказывающих услуги в сфере культуры и отдыха;- формирование и размещение информации о театрально-зрелищных и музейно-выставочных организациях на специализированных интернет-порталах. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируется комплекс мер на очередной год по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса разработать комплекс мер на очередной год по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха, срок исполнения 31.01.2021;
49		6. План мероприятий	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируется комплекс мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью в 2024 году в объеме 0,00089 млрд. долл. США, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса сформировать комплекс мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью в 2024 году в объеме 0,00089 млрд. долл. США, срок исполнения 31.01.2021;
50		6. План мероприятий	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта финансовых услуг. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируется комплекс мер на очередной год по увеличению объема экспорта финансовых услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса сформировать комплекс мер на очередной год по увеличению объема экспорта финансовых услуг, срок исполнения 31.01.2021;
51		6. План мероприятий	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта транспортных услуг. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти	1. Органам исполнительной власти Кузбасса сформировать комплекс мер на очередной год по увеличению объема экспорта транспортных услуг.,

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
			Кузбасса формируется комплекс мер на очередной год по увеличению объема экспорта транспортных услуг., Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	срок исполнения 31.01.2021;
52		6. План мероприятий	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам». Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти формируется комплекс мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам», Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти сформировать комплекс мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам», срок исполнения 31.01.2021;
53		6. План мероприятий	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров». Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируется комплекс мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров», Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти Кузбасса сформировать комплекс мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров», срок исполнения 31.01.2021;
54		6. План мероприятий	Контрольная точка: разработан и реализован комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги». Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти будет подготовлен комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги", Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органам исполнительной власти подготовить комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги", срок исполнения 31.01.2021;
55		6. План мероприятий	Контрольная точка: проведен анализ структуры экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе и существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области, сформированы предложения по направлениям развития экспорта услуг и по преодолению существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируются отчёты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Органами исполнительной власти Кузбасса формируются отчёты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, срок исполнения 31.01.2021;



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Объем экспорта услуг	Миллиард долларов	0.034	0.0014	0.0014	0.0269	0.0369	0.0369	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Экспорт отдельных видов услуг по субъектам Российской Федерации" Иное Банка России от 12.01.2021г. №б/н, указана ссылка.Значения показателя представлены нарастающим итогом. Фактическое значение за IV квартал дано ориентировочно в силу отсутствия статистики за указанный период
2		Объем экспорта транспортных услуг	Миллиард долларов	0.0162	0.0025	0.0025	0.0074	0.0171	0.0171	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Экспорт отдельных видов услуг по субъектам Российской Федерации" Иное Банка России от 12.01.2021г. №б/н, указана ссылка.Значения показателя представлены нарастающим итогом. Фактическое значение за IV квартал дано ориентировочно в силу отсутствия статистики за указанный период
3		Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг	Миллиард долларов	0.0123	0.0003	0.0003	0.0005	0.0138	0.0138	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Экспорт отдельных видов услуг по субъектам Российской Федерации" Иное Банка России от 12.01.2021г. №б/н, указана ссылка.Значения показателя представлены нарастающим итогом. Фактическое значение за IV квартал дано ориентировочно в силу отсутствия статистики за указанный период
4		Объем экспорта услуг категории "Поездки"	Миллиард долларов	0.0094	0.0078	0.0078	0.01	0.01	0	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Экспорт отдельных видов услуг по субъектам Российской Федерации" Иное Банка России от 12.01.2021г. №б/н, указана ссылка.Значения показателя представлены нарастающим итогом. Фактическое значение за IV квартал дано ориентировочно в силу отсутствия статистики за указанный период

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
5		Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг	Миллиард долларов	0.0009	0.0009	0.0009	0.0017	0.0017	0.001	170,00%	Подтверждающие документы:1. "Экспорт отдельных видов услуг по субъектам Российской Федерации" Иное Банка России от 12.01.2021г. №б/н, указана ссылка.Значения показателя представлены нарастающим итогом. Фактическое значение за IV квартал дано ориентировочно в силу отсутствия статистики за указанный период
6		Объем экспорта услуг категории "Строительство"	Миллиард долларов	0.0018	0.0003	0.0003	0.003	0.003	0	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Экспорт отдельных видов услуг по субъектам Российской Федерации" Иное Банка России от 12.01.2021г. №б/н, указана ссылка.Значения представлены нарастающим итогом. Фактическое значение за IV квартал дано ориентировочно в силу отсутствия статистики за указанный период
7		Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции	Миллиард долларов	0.0029	0.0008	0.0008	0.0014	0.0031	0.0031	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Экспорт отдельных видов услуг по субъектам Российской Федерации" Иное Банка России от 12.01.2021г. №б/н, указана ссылка.Значения показателя представлены нарастающим итогом. Фактическое значение за IV квартал дано ориентировочно в силу отсутствия статистики за указанный период
8		Объем экспорта финансовых и страховых услуг	Миллиард долларов	0	0	0	0.001	0.001	0	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Экспорт отдельных видов услуг по субъектам Российской Федерации" Иное Банка России от 12.01.2021г. №б/н, указана ссылка.Фактическое значение за IV квартал дано ориентировочно в силу отсутствия статистики за указанный период
9		Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха	Миллиард долларов	0.0002	0	0	0	0	0	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Экспорт отдельных видов услуг по субъектам Российской Федерации" Иное Банка России от 12.01.2021г. №б/н, указана ссылка.Фактическое значение за IV квартал



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
											дано ориентировочно в силу отсутствия статистики за указанный период

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Проведен мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	
2		Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,012 млрд. долл. США Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	
3		Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0017 млрд. долл. США Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	
4		Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0012 млрд. долл. США Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	
5		Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта деловых услуг в 2024 году в объеме 0,01691млрд. долл. США Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	
6		Разработан комплекс мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью в 2024 году в объеме 0,00089 млрд. долл. США Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	
7		Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг в 2024 году в объеме 0,001575 млрд. долл. США Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	
8		Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта страховых услуг в 2024 году в объеме 0,000525 млрд. долл. США Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	
9		Разработан комплекс мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха в 2024 году в объеме 0,0001 млрд. долл. США Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
10		Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг в 2024 году в объеме 0,0212 млрд. долл. США Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	
11		Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам» в 2024 году в объеме 0,00202 млрд. долл. США Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	
12		Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров» в 2024 году в объеме 0,00198 млрд. долл. США Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Проведен мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Кириллов В. В.	Информация по значению результата: Завершено.Риск снят: Дальнейшее выполнение результата не предусмотрено, Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139 -2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. Дальнейшее выполнение результата не предусмотрено, срок исполнения 01.12.2021. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.	РРП		проведен анализ структуры экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе и существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области, сформированы предложения по направлениям развития экспорта услуг и по преодолению существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе	31.12.2020	31.12.2021	Кириллов В. В.	Не выполнено. Просрочка 365 дней. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение контрольной точки не предусмотрено.
1.1.1	РРП		анализ структуры экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе	30.09.2020	31.12.2021	Кириллов В. В.	Не выполнено. Просрочка 457 дней. Снятые риски: Мероприятие: анализ структуры экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе. Некритический риск

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							невыполнения, Причина риска: Органами исполнительной власти Кузбасса формируются отчеты по анализу состояния экспорта отдельных видов услуг, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г. Дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-T40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-T40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , срок исполнения 01.12.2021.
1.1.2	РРП		формирование предложений по направлениям развития экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе	30.09.2020	31.12.2021	Кириллов В. В.	Не выполнено. Просрочка 457 дней. Риск снят: Дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-T40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-T40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. ,

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							срок исполнения 01.12.2021.
1.1.3	РРП		мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе	30.09.2020	31.12.2021	Кириллов В. В.	Не выполнено. Просрочка 457 дней. Риск снят: Дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139 -2019-T40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-T40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , срок исполнения 01.12.2021.
1.1.4	РРП		подготовка предложений по преодолению барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе	30.09.2020	31.12.2021	Кириллов В. В.	Не выполнено. Просрочка 457 дней. Риск снят: Дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139 -2019-T40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-T40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. ,

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							срок исполнения 01.12.2021.
2.			Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,012 млрд. долл. США Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Пятовский А. А.	Информация по значению результата: Завершено.Существует риск: Дальнейшее выполнение результата не предусмотрено. , Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено. , срок исполнения 01.12.2021. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено. Предоставлена информация : 0 из 1.
2.1.	РРП		разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	31.12.2020	31.12.2021	Пятовский А. А.	Не выполнено. Просрочка 365 дней. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение контрольной точки не предусмотрено.
2.1.1	РРП		Мероприятие: разработка комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» на	31.12.2020	31.12.2021	Пятовский А. А.	Не выполнено. Просрочка 365 дней. Риск снят:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			предстоящий год: - расширение туристской инфраструктуры; - формирование системы туристской навигации в Кемеровской области - Кузбасса; - организация информирования зарубежных партнеров о предприятиях Кемеровской области - Кузбасса, оказывающих туристические услуги; - формирование и размещение на специализированных интернет-порталах блока информации о предприятиях туриндустрии и турпродуктах Кемеровской области - Кузбасса; - обеспечение высокого уровня качества сервиса и безопасности в процессе оказания туристских услуг; - повышение квалификации специалистов индустрии туризма со знанием иностранных языков на базе лицензированных учебных заведений; - адаптация туристического портала Кемеровской области - Кузбасса под требования иностранных туристов; - продвижение турпродукта Кемеровской области - Кузбасса, ориентированного на въездной туризм, в рамках международных выставок; - организация и проведение информационных туров для представителей туроператоров, блогеров				Дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено., Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено., срок исполнения 01.12.2021. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено.
3.			Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные,	31.12.2024	31.12.2024	Садиков М. В.	Информация по значению результата: Завершено.Существует риск: Дальнейшее выполнение результата не предусмотрено.,

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>компьютерные и информационные услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0017 млрд. долл. США Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024</i>				Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., срок исполнения 01.12.2021. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. Предоставлена информация : 0 из 1.
3.1.	РРП		разработан и реализован комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	31.12.2020	31.12.2021	Садиков М. В.	Не выполнено. Просрочка 365 дней. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение контрольной точки не предусмотрено.
3.1.1	РРП		разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	31.12.2020	31.12.2021	Садиков М. В.	Не выполнено. Просрочка 365 дней. Риск снят: Дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							не предусмотрено. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , срок исполнения 01.12.2021.
4.			<i>Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0012 млрд. долл. США Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024</i>	31.12.2024	31.12.2024	Печеркина И. А.	Информация по значению результата: Завершено.Существует риск: Дальнейшее выполнение результата не предусмотрено. , Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено. , срок исполнения 01.12.2021. Предоставлена информация : 0 из 1.
4.1.	РРП		разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	31.12.2020	31.12.2021	Печеркина И. А.	Не выполнено. Просрочка 365 дней. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение контрольной точки не предусмотрено.
4.1.1	РРП		разработка комплекса мер на	31.12.2020	31.12.2021	Печеркина И. А.	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»				Не выполнено. Просрочка 365 дней. Риск снят: Дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139 -2019-T40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-T40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , срок исполнения 01.12.2021.
5.			<i>Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта деловых услуг в 2024 году в объеме 0,01691млрд. долл. США Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024</i>	31.12.2024	31.12.2024	Кириллов В. В.	Информация по значению результата: Завершено.Существует риск: Дальнейшее выполнение результата не предусмотрено. , Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139 -2019-T40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-T40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено. , срок исполнения 01.12.2021. Предоставлена информация : 0 из 1.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.1.	РРП		разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта деловых услуг	31.12.2020	31.12.2021	Кириллов В. В.	Не выполнено. Просрочка 365 дней. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-T40056-1/1 дальнейшее выполнение контрольной точки не предусмотрено.
5.1.1	РРП		разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта деловых услуг	31.12.2020	31.12.2021	Кириллов В. В.	Не выполнено. Просрочка 365 дней. Риск снят: Дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-T40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-T40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , срок исполнения 01.12.2021г.
6.			Разработан комплекс мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью в 2024 году в объеме 0,00089 млрд. долл. США Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Кириллов В. В.	Информация по значению результата: Завершено.Существует риск: Дальнейшее выполнение результата не предусмотрено, Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-T40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено. , срок исполнения 01.12.2021. Предоставлена информация : 0 из 1.
6.1.	РРП		разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью	31.12.2020	31.12.2021	Кириллов В. В.	Не выполнено. Просрочка 365 дней. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение контрольной точки не предусмотрено.
6.1.1	РРП		разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью	31.12.2020	31.12.2021	Кириллов В. В.	Не выполнено. Просрочка 365 дней. Риск снят: Дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , срок исполнения 01.12.2021.
7.			Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг в 2024 году в объеме	31.12.2024	31.12.2024	Гончарова В. И.	Информация по значению результата: Завершено.Существует риск:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			0,001575 млрд. долл. США Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024				Дальнейшее выполнение результата не предусмотрено. , Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139 -2019-T40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-T40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено. , срок исполнения 01.12.2021. Предоставлена информация : 0 из 1.
7.1.	РРП		разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг	31.12.2020	31.12.2021	Гончарова В. И.	Не выполнено. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-T40056-1/1 дальнейшее выполнение контрольной точки не предусмотрено.
7.1.1	РРП		разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта финансовых услуг	31.12.2020	31.12.2021	Гончарова В. И.	Не выполнено. Просрочка 365 дней. Риск снят: Дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139 -2019-T40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							"Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , срок исполнения 01.12.2021.
8.			<i>Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта страховых услуг в 2024 году в объеме 0,000525 млрд. долл. США Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024</i>	31.12.2024	31.12.2024	Гончарова В. И.	Информация по значению результата: Завершено.Существует риск: Дальнейшее выполнение результата не предусмотрено. , Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено. , срок исполнения 01.12.2021. Предоставлена информация : 0 из 1.
8.1.	РРП		разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта страховых услуг	31.12.2020	31.12.2021	Гончарова В. И.	Не выполнено. Просрочка 365 дней. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение контрольной точки не предусмотрено.
8.1.1	РРП		разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта страховых услуг	31.12.2020	31.12.2021	Гончарова В. И.	Не выполнено. Просрочка 365 дней. Риск снят: Дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							, Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-T40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-T40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено. , срок исполнения 01.12.2021.
9.			<i>Разработан комплекс мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха в 2024 году в объеме 0,0001 млрд. долл. США Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024</i>	31.12.2024	31.12.2021	Евса М. А.	Информация по значению результата: Завершено.Существует риск: Дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-T40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-T40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., срок исполнения 01.12.2021. Предоставлена информация : 0 из 1.
9.1.	РРП		разработан и реализован комплекс мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха	31.12.2020	31.12.2021	Евса М. А.	Не выполнено. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение контрольной точки не предусмотрено.
9.1.1	РРП		разработка комплекса мер на очередной год по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха: - информирование зарубежных партнеров об учреждениях области, оказывающих услуги в сфере культуры и отдыха; - формирование и размещение информации о театрально-зрелищных и музейно-выставочных организациях на специализированных интернет-порталах	31.12.2020	31.12.2021	Евса М. А.	Не выполнено. Просрочка 365 дней. Риск снят: Дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено., Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено., срок исполнения 01.12.2021.
10.			<i>Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг в 2024 году в объеме 0,0212 млрд. долл. США Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024</i>	31.12.2024	31.12.2024	Рубан С. В.	Информация по значению результата: Завершено.Существует риск: Дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено.,

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							срок исполнения 01.12.2021. Предоставлена информация : 0 из 1.
10.1.	РРП		разработка и реализация комплекса мер по увеличению экспорта транспортных услуг	31.12.2020	31.12.2021	Рубан С. В.	Не выполнено. Просрочка 365 дней. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение контрольной точки не предусмотрено.
10.1.1	РРП		разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта транспортных услуг	31.12.2020	31.12.2021	Рубан С. В.	Не выполнено. Просрочка 365 дней. Риск снят: Дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено., Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено., срок исполнения 01.12.2021.
11.			Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам» в 2024 году в объеме 0,00202 млрд. долл. США Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Старосвет Л. В.	Информация по значению результата: Завершено.Существует риск: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., Причина

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., срок исполнения 01.12.2021. Предоставлена информация : 0 из 1.
11.1.	РРП		разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»	31.12.2020	31.12.2021	Старосвет Л. В.	Не выполнено. Просрочка 365 дней. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение контрольной точки не предусмотрено.
11.1.1	РРП		разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»	31.12.2020	31.12.2021	Старосвет Л. В.	Не выполнено. Просрочка 365 дней. Риск снят: Дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено., Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							"Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено., срок исполнения 01.12.2021.
12.			Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров» в 2024 году в объеме 0,00198 млрд. долл. США Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Старосвет Л. В.	Информация по значению результата: Завершено.Существует риск: Дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение результата не предусмотрено., срок исполнения 01.12.2021. Предоставлена информация : 0 из 1.
12.1.	КРП		разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»	31.12.2020	31.12.2021	Старосвет Л. В.	Не выполнено. Просрочка 365 дней. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение контрольной точки не предусмотрено.
12.1.1	РРП		разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»	31.12.2020	31.12.2021	Старосвет Л. В.	Не выполнено. Просрочка 365 дней. Риск снят: Дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено.,

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Причина риска: В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. В связи с прекращением федерального проекта "Экспорт услуг" и на основании Дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 г. №139-2019-Т40056-1/1 дальнейшее выполнение мероприятия не предусмотрено., срок исполнения 01.12.2021.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек

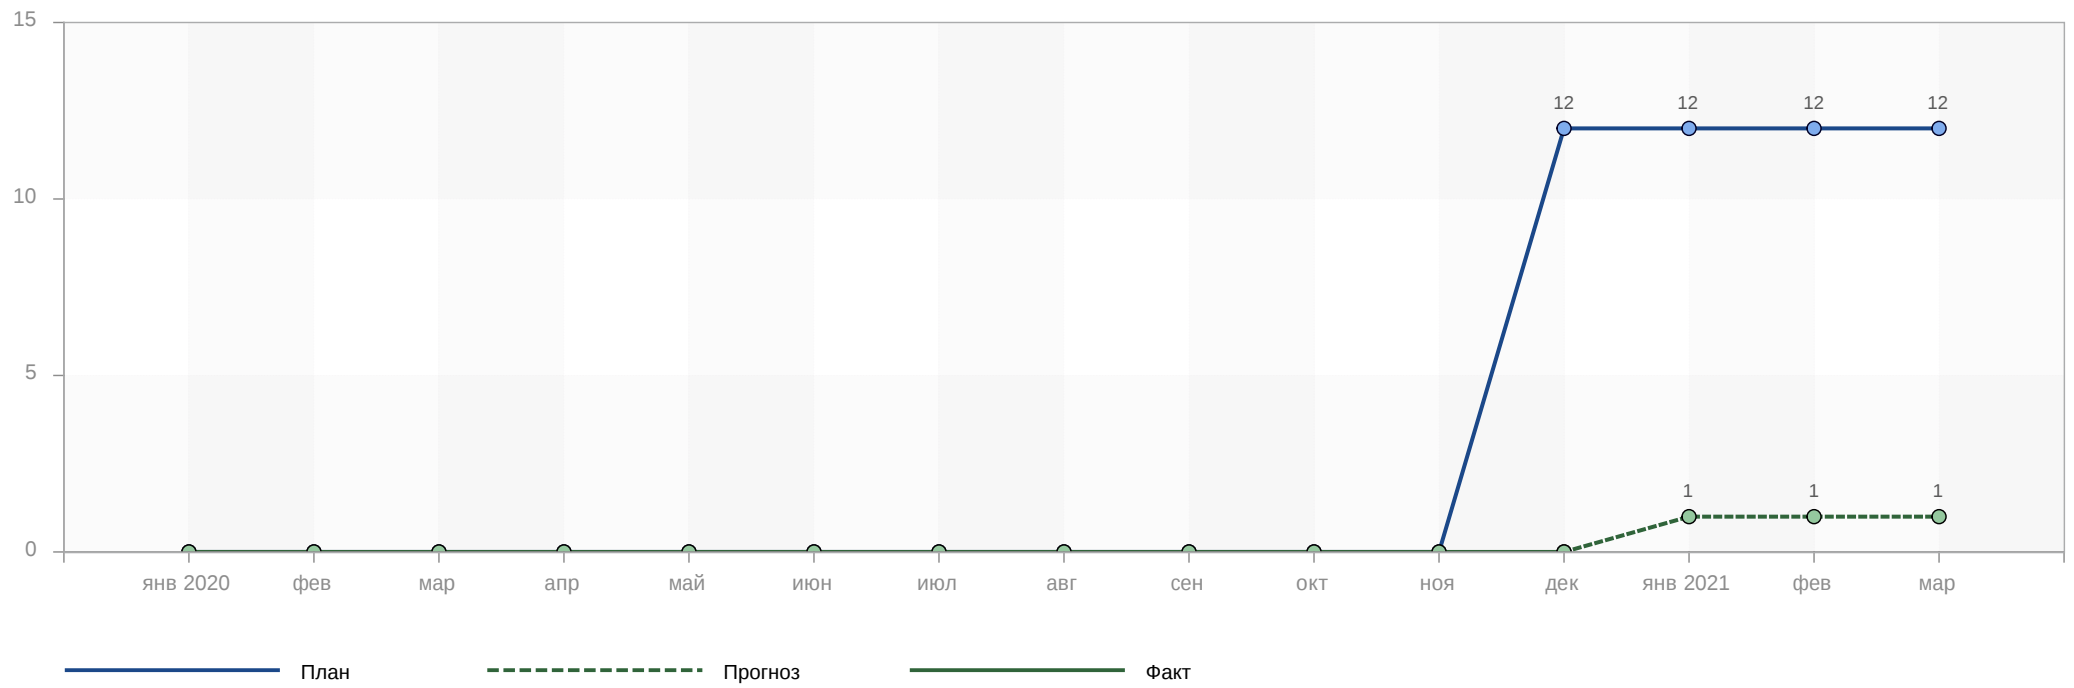


Рис. 1. "(Т4-32) Экспорт услуг"

График достижения показателя

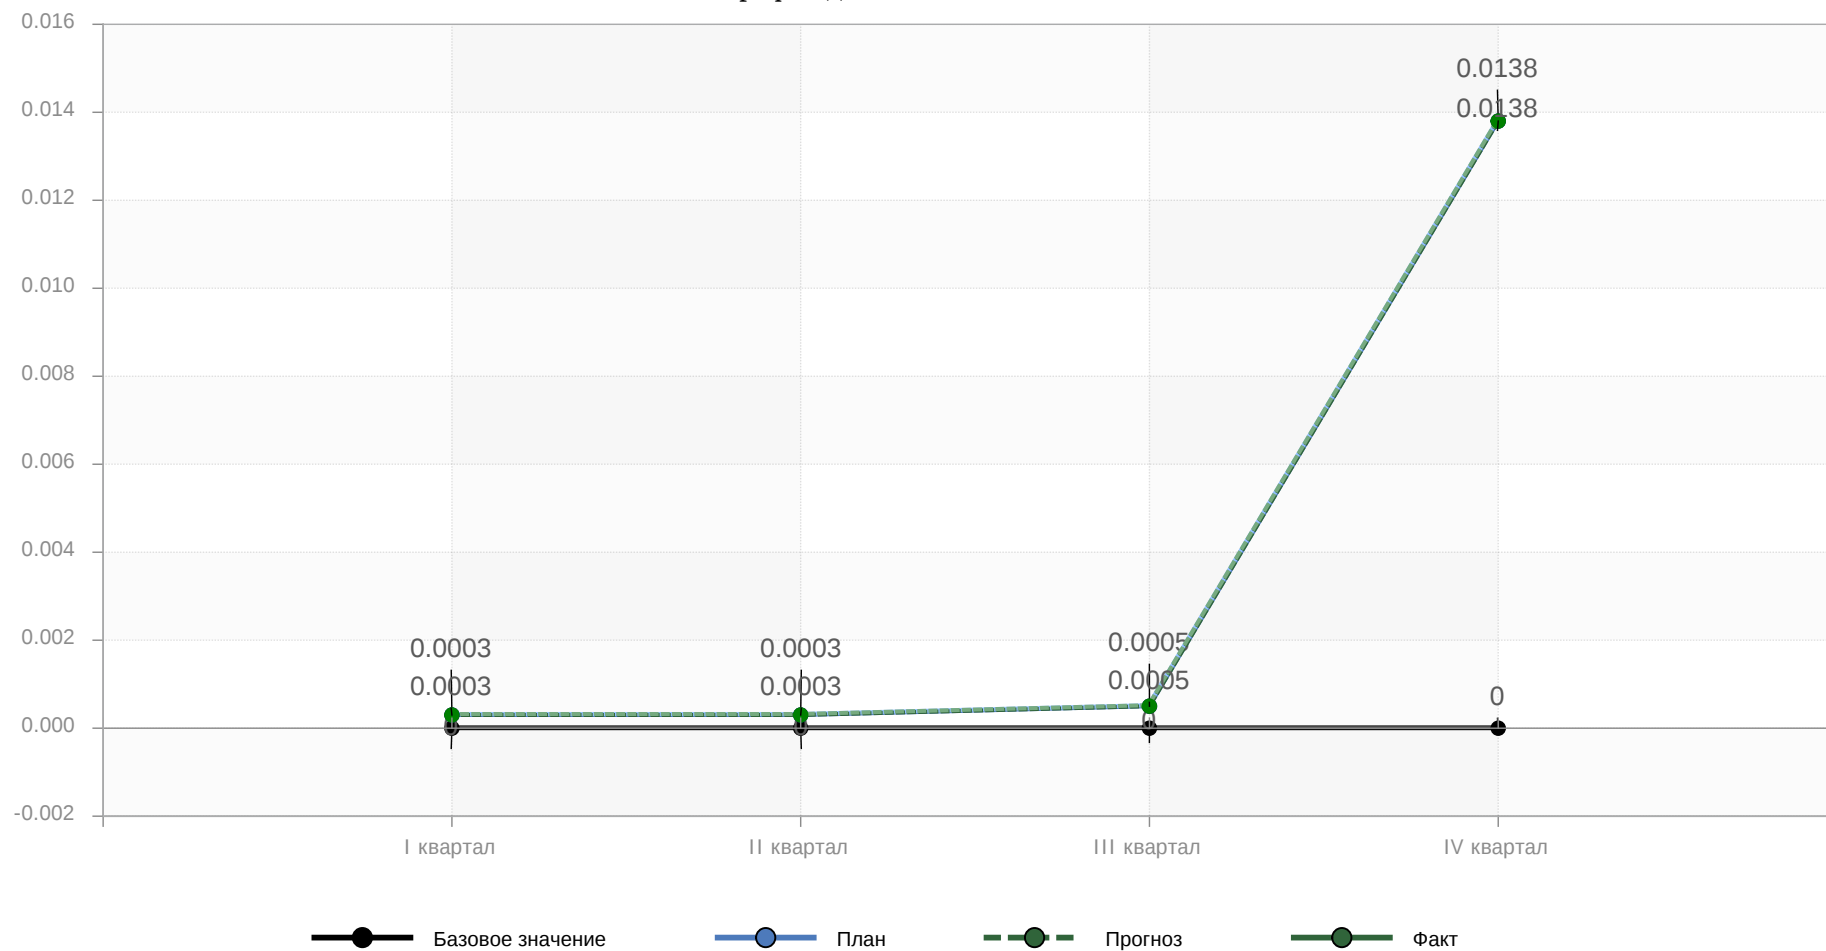


Рис. 1. Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг

Диаграмма достижения показателя

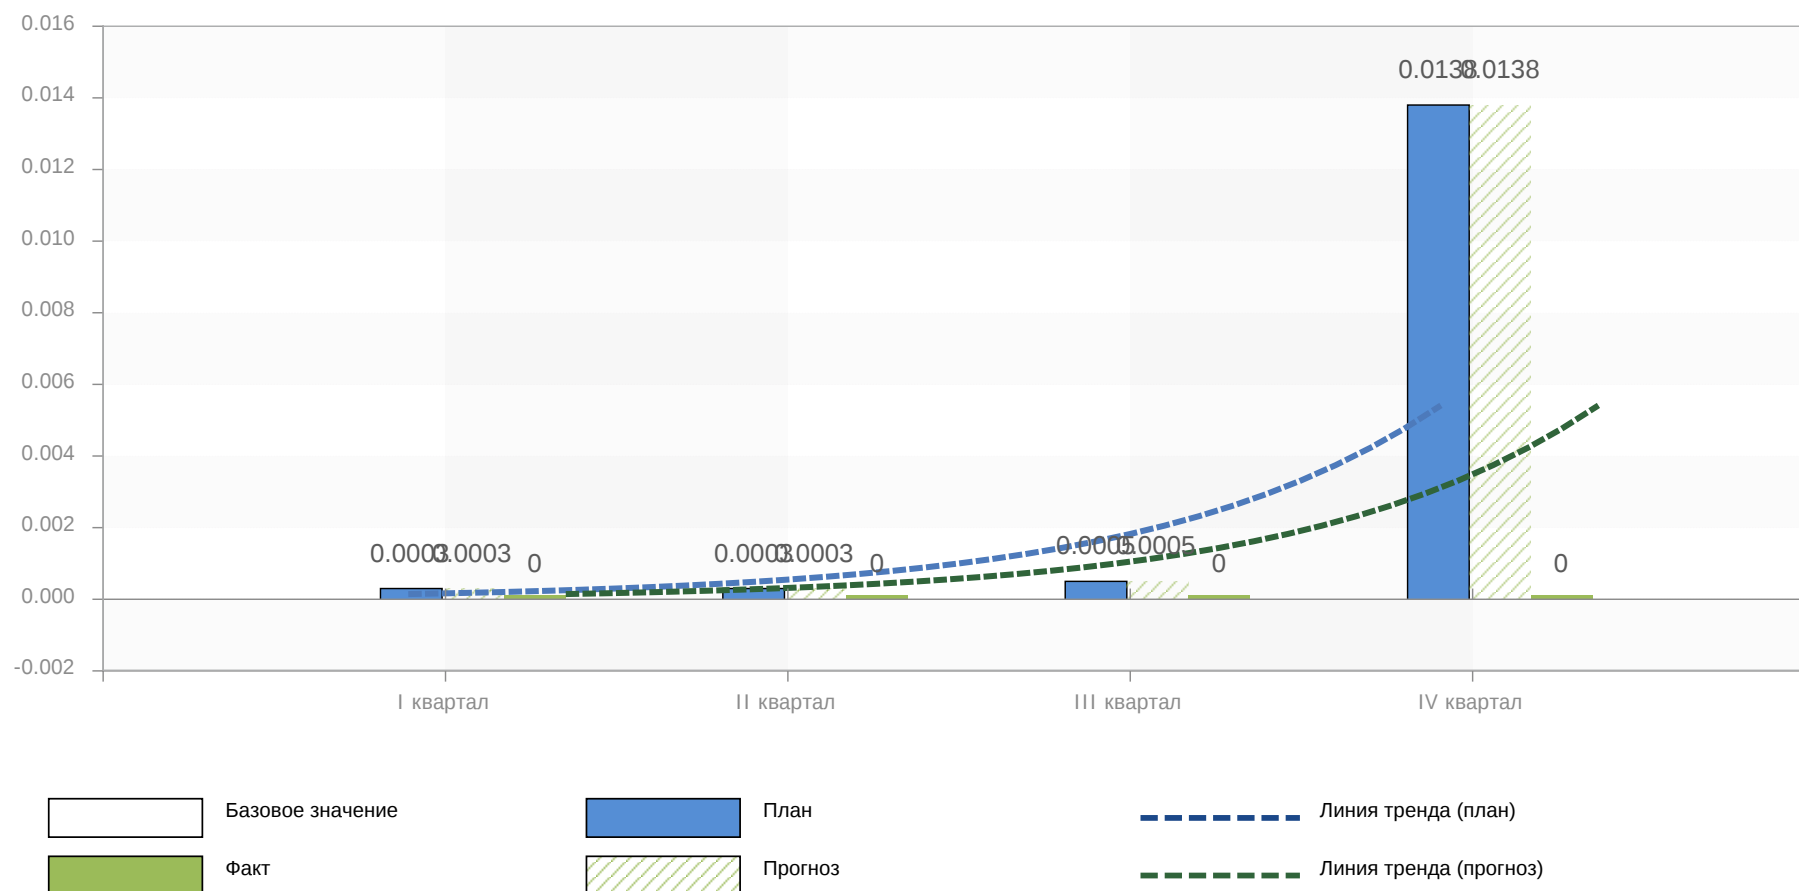


Рис. 2. Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг



Рис. 3. Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг

Диаграмма достижения показателя

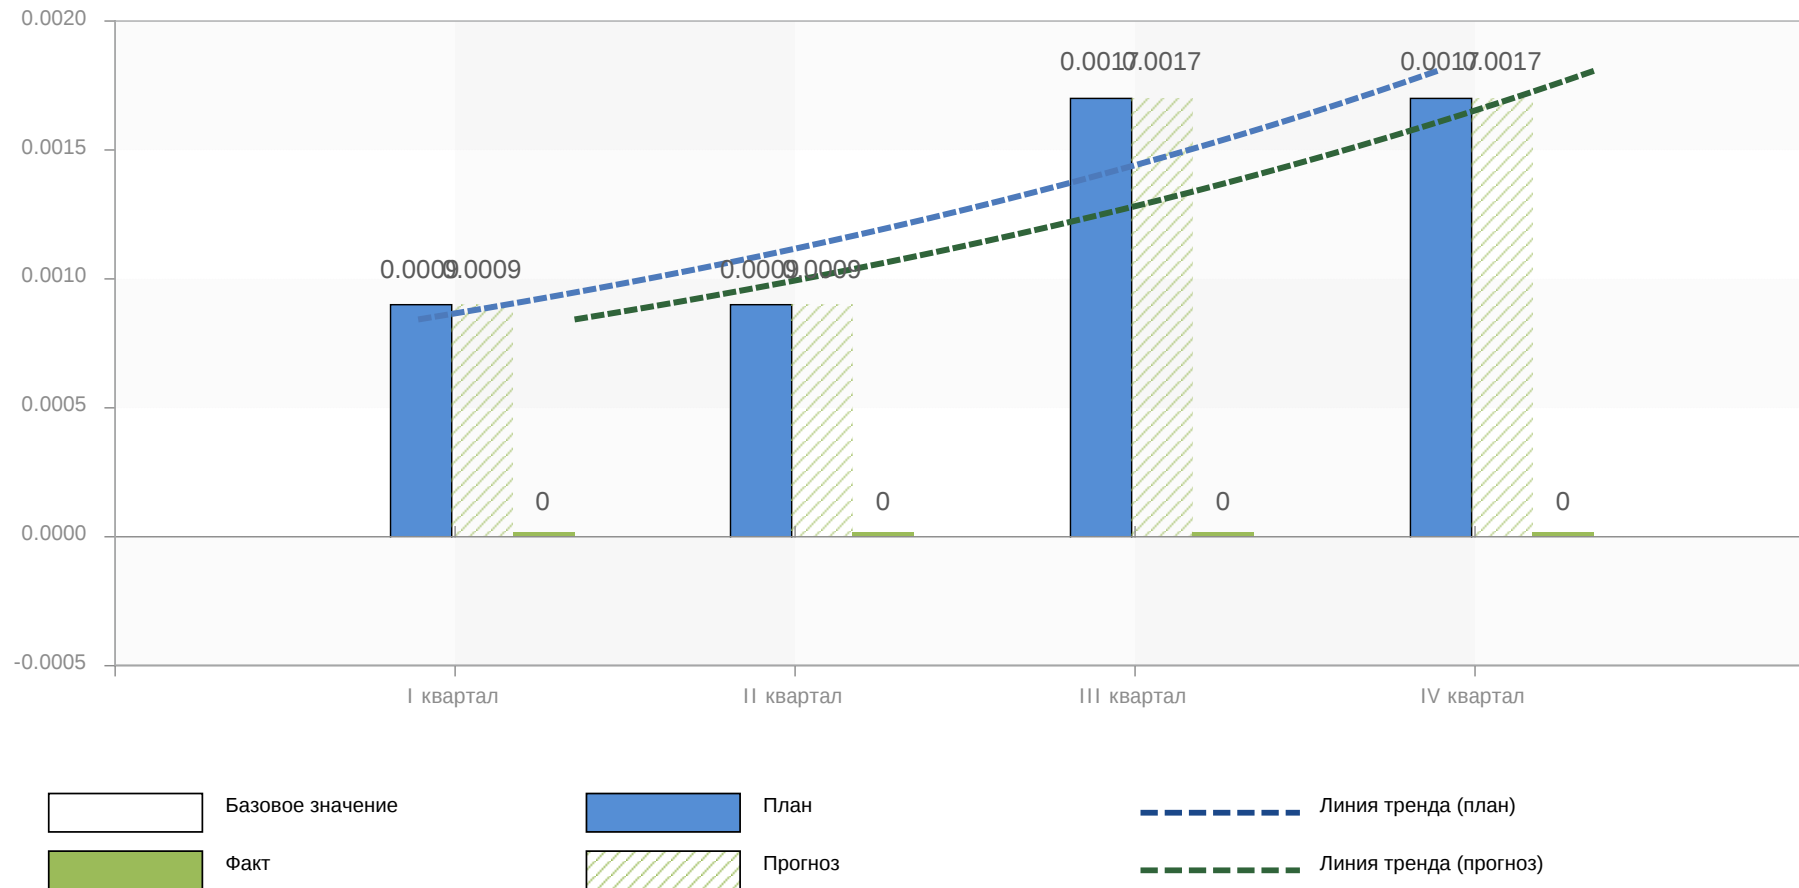


Рис. 4. Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг

График достижения показателя

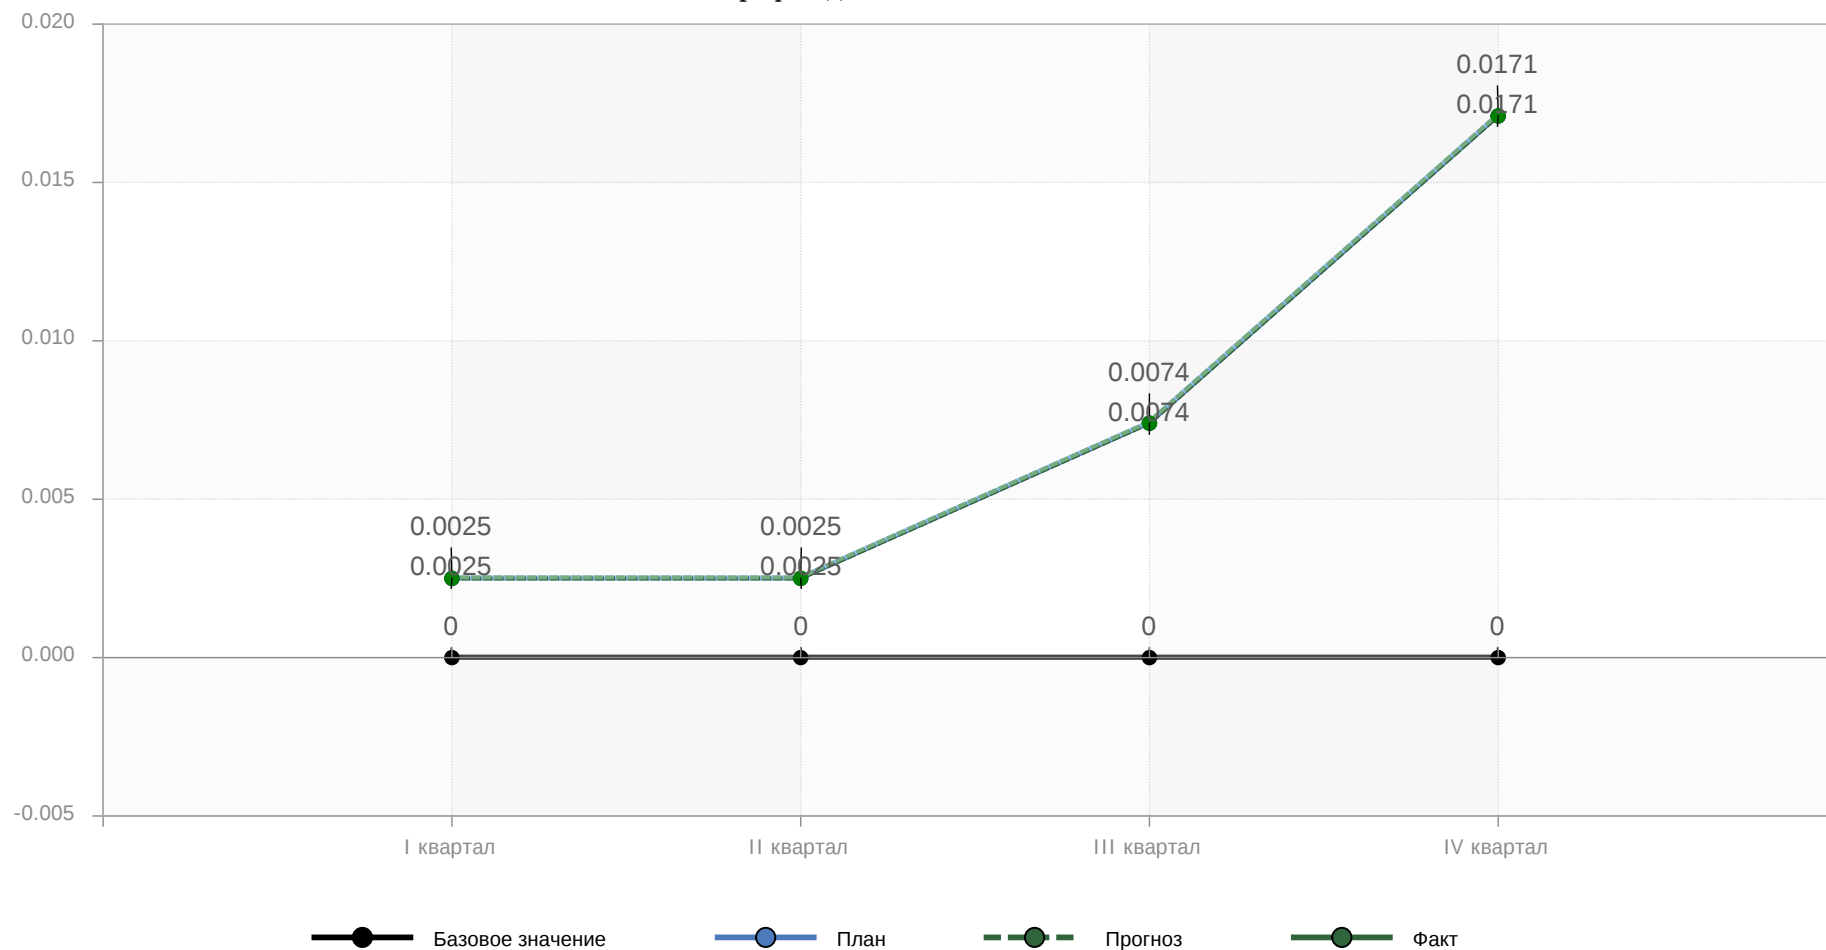


Рис. 5. Объем экспорта транспортных услуг

Диаграмма достижения показателя

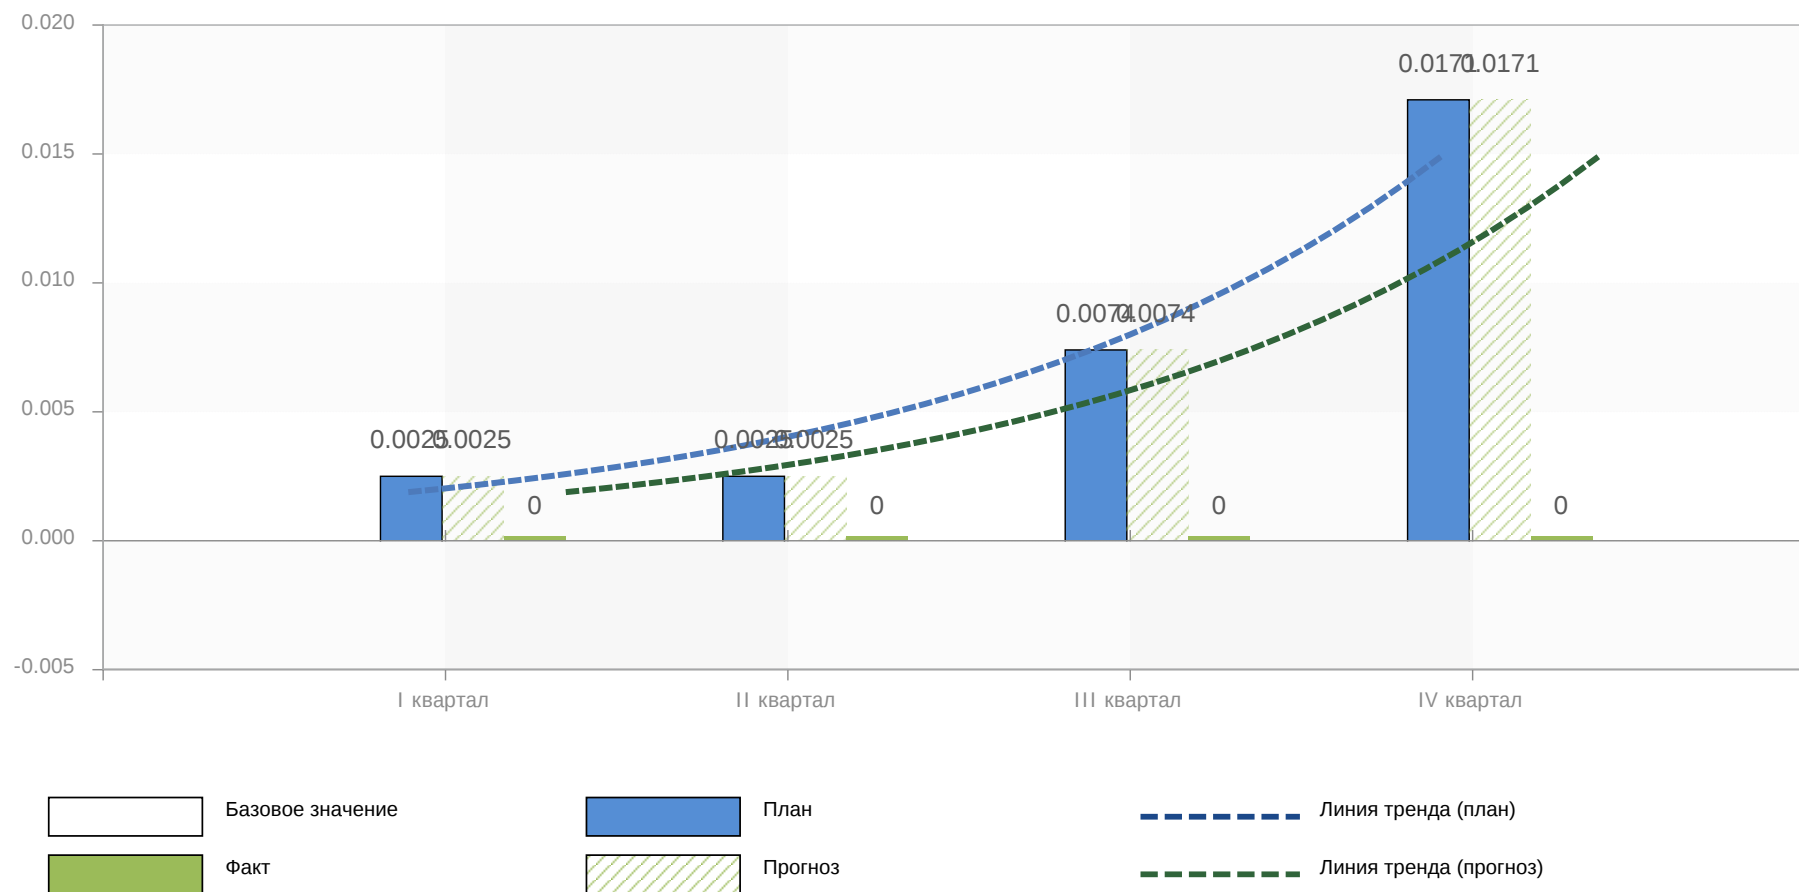


Рис. 6. Объем экспорта транспортных услуг

График достижения показателя

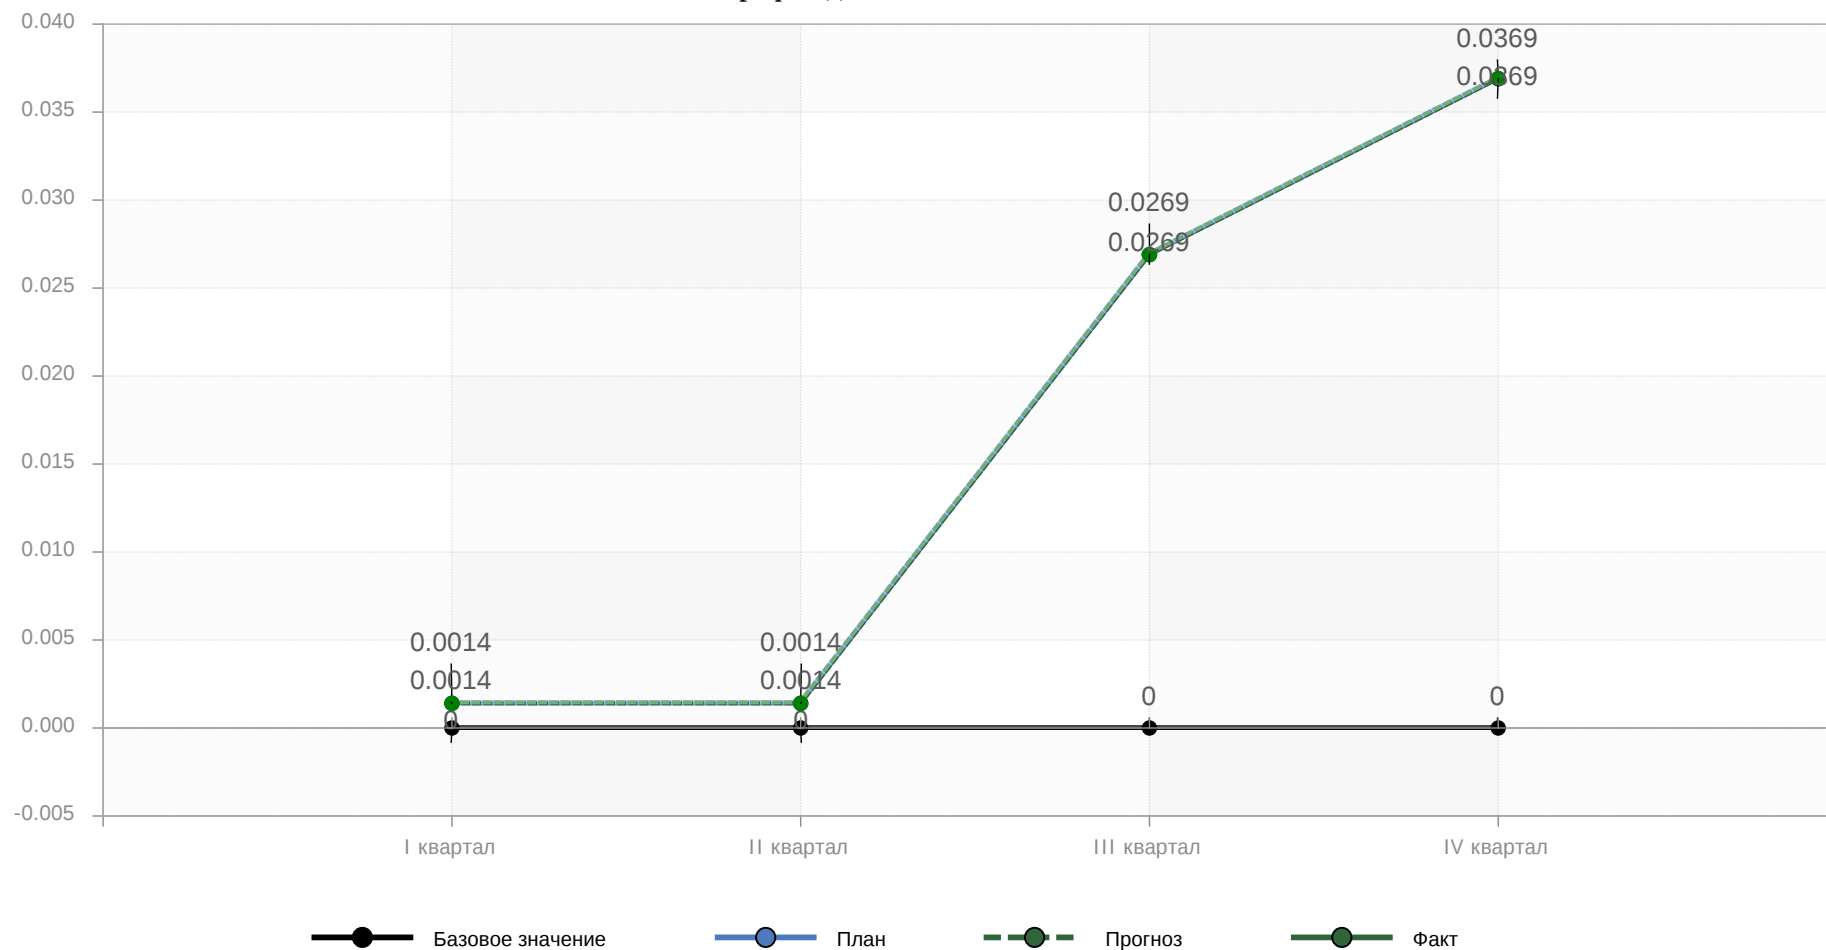


Рис. 7. Объем экспорта услуг

Диаграмма достижения показателя

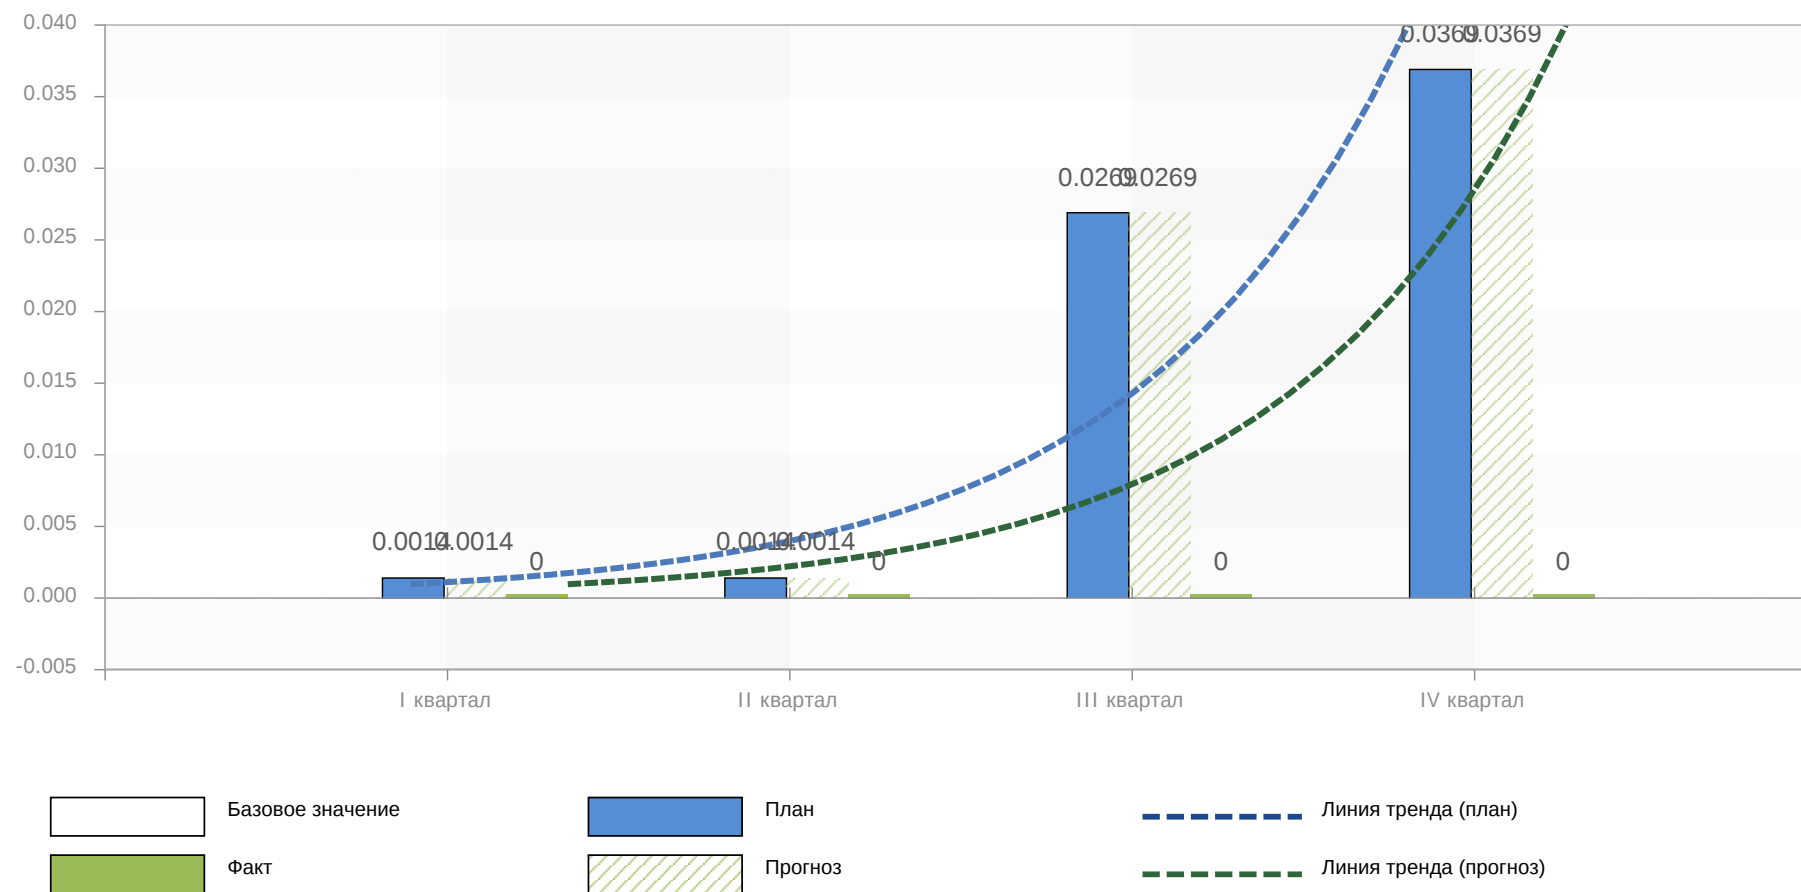


Рис. 8. Объем экспорта услуг

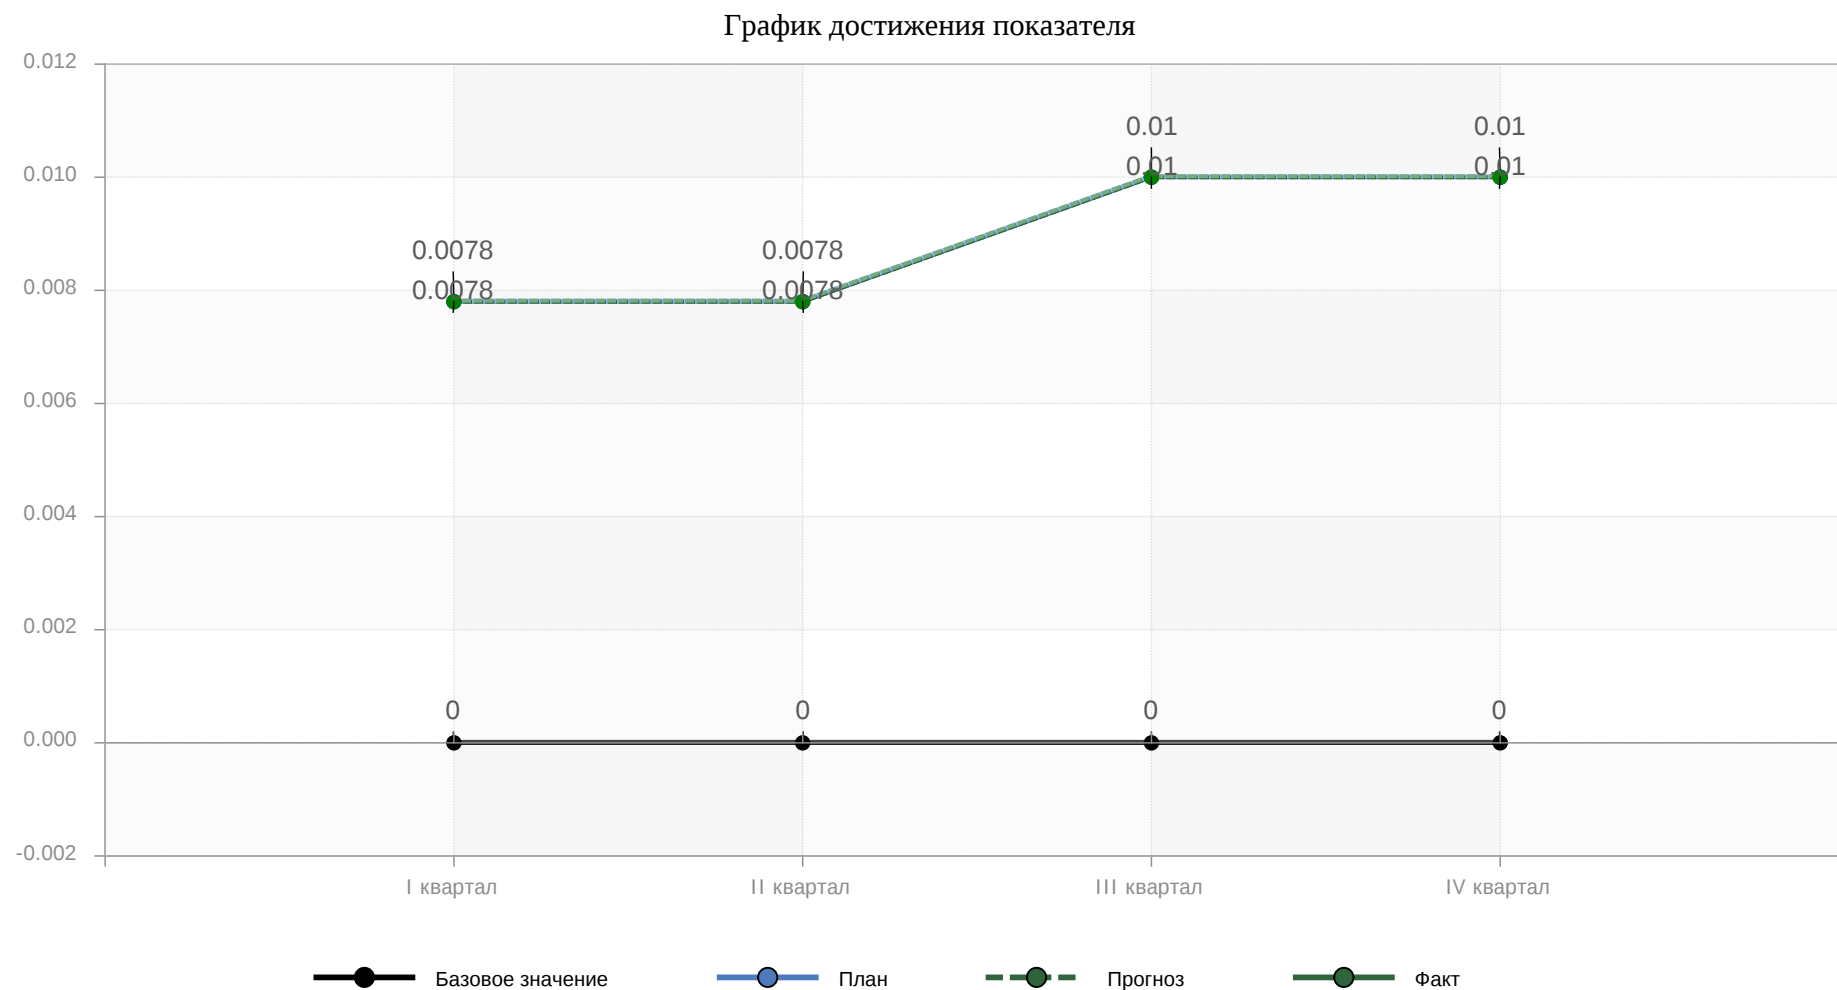


Рис. 9. Объем экспорта услуг категории "Поездки"

Диаграмма достижения показателя

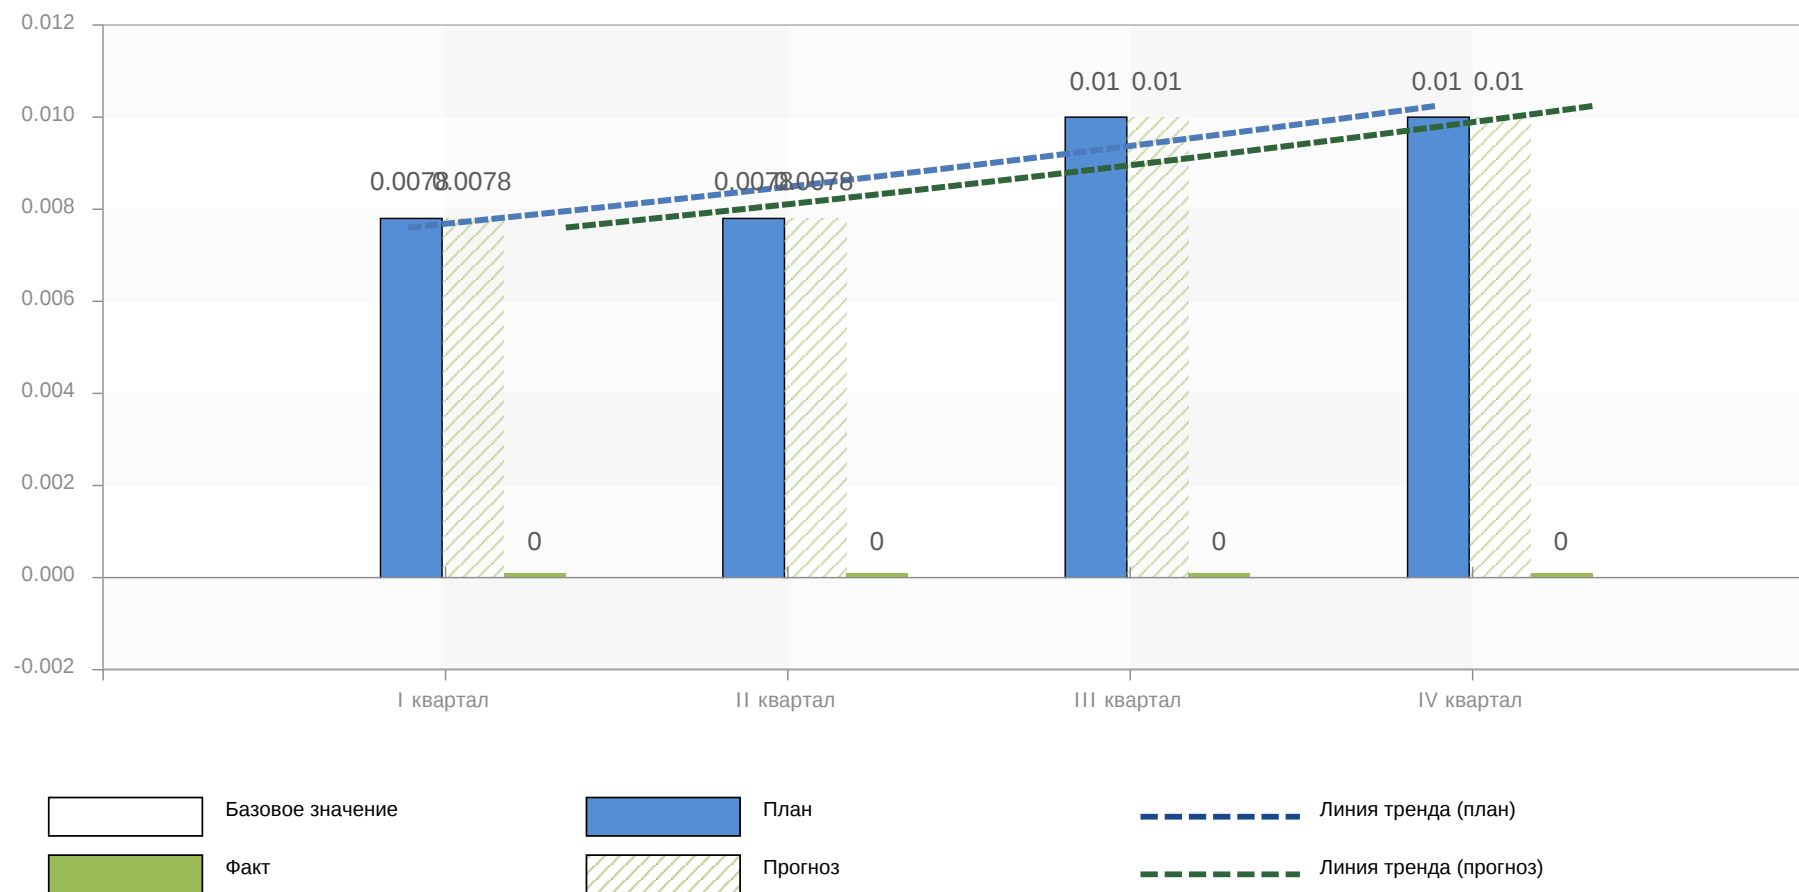


Рис. 10. Объем экспорта услуг категории "Поездки"

График достижения показателя

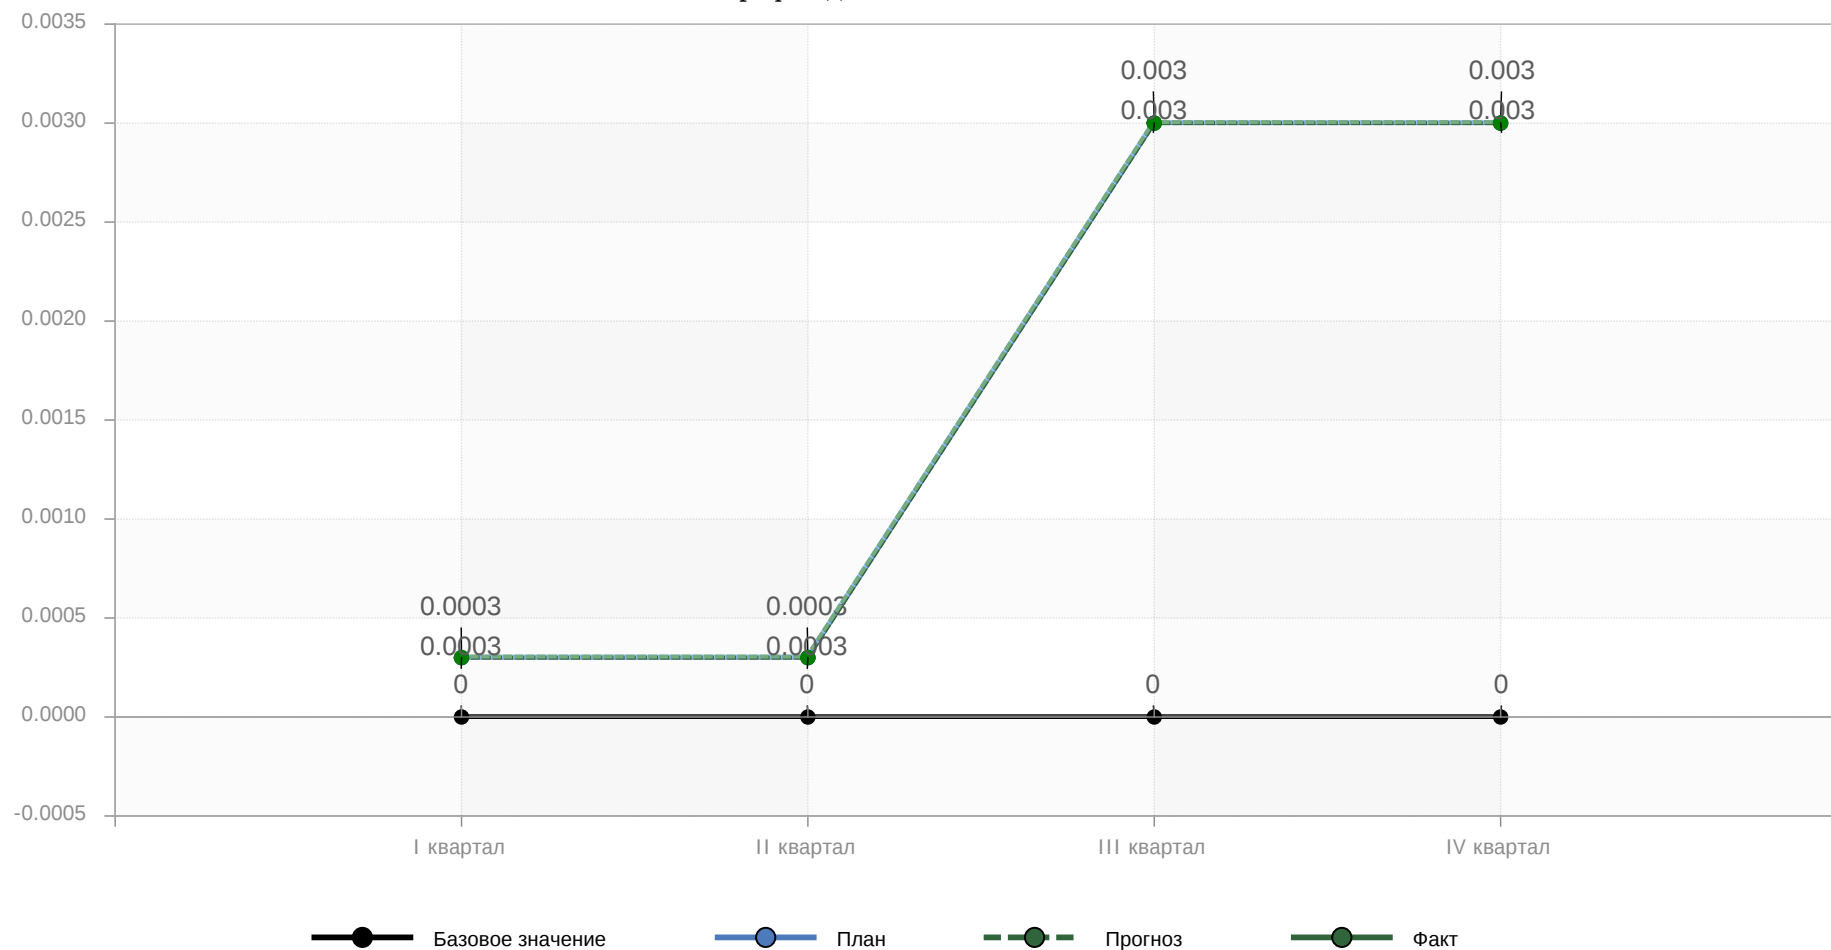


Рис. 11. Объем экспорта услуг категории "Строительство"

Диаграмма достижения показателя

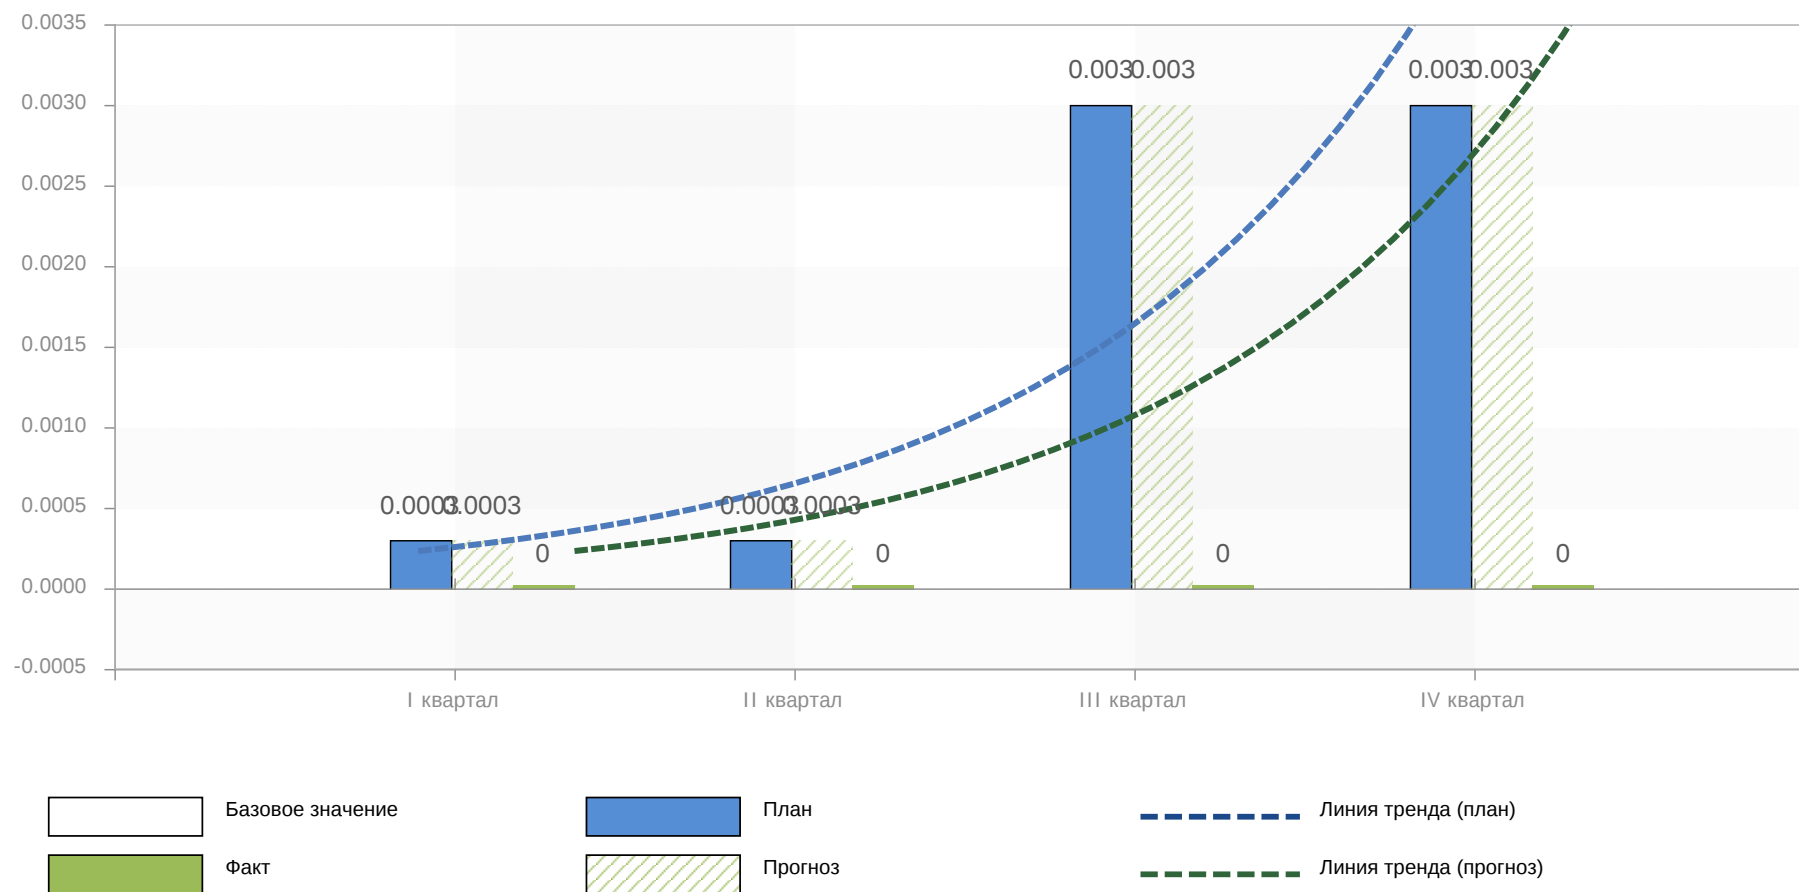


Рис. 12. Объем экспорта услуг категории "Строительство"

График достижения показателя

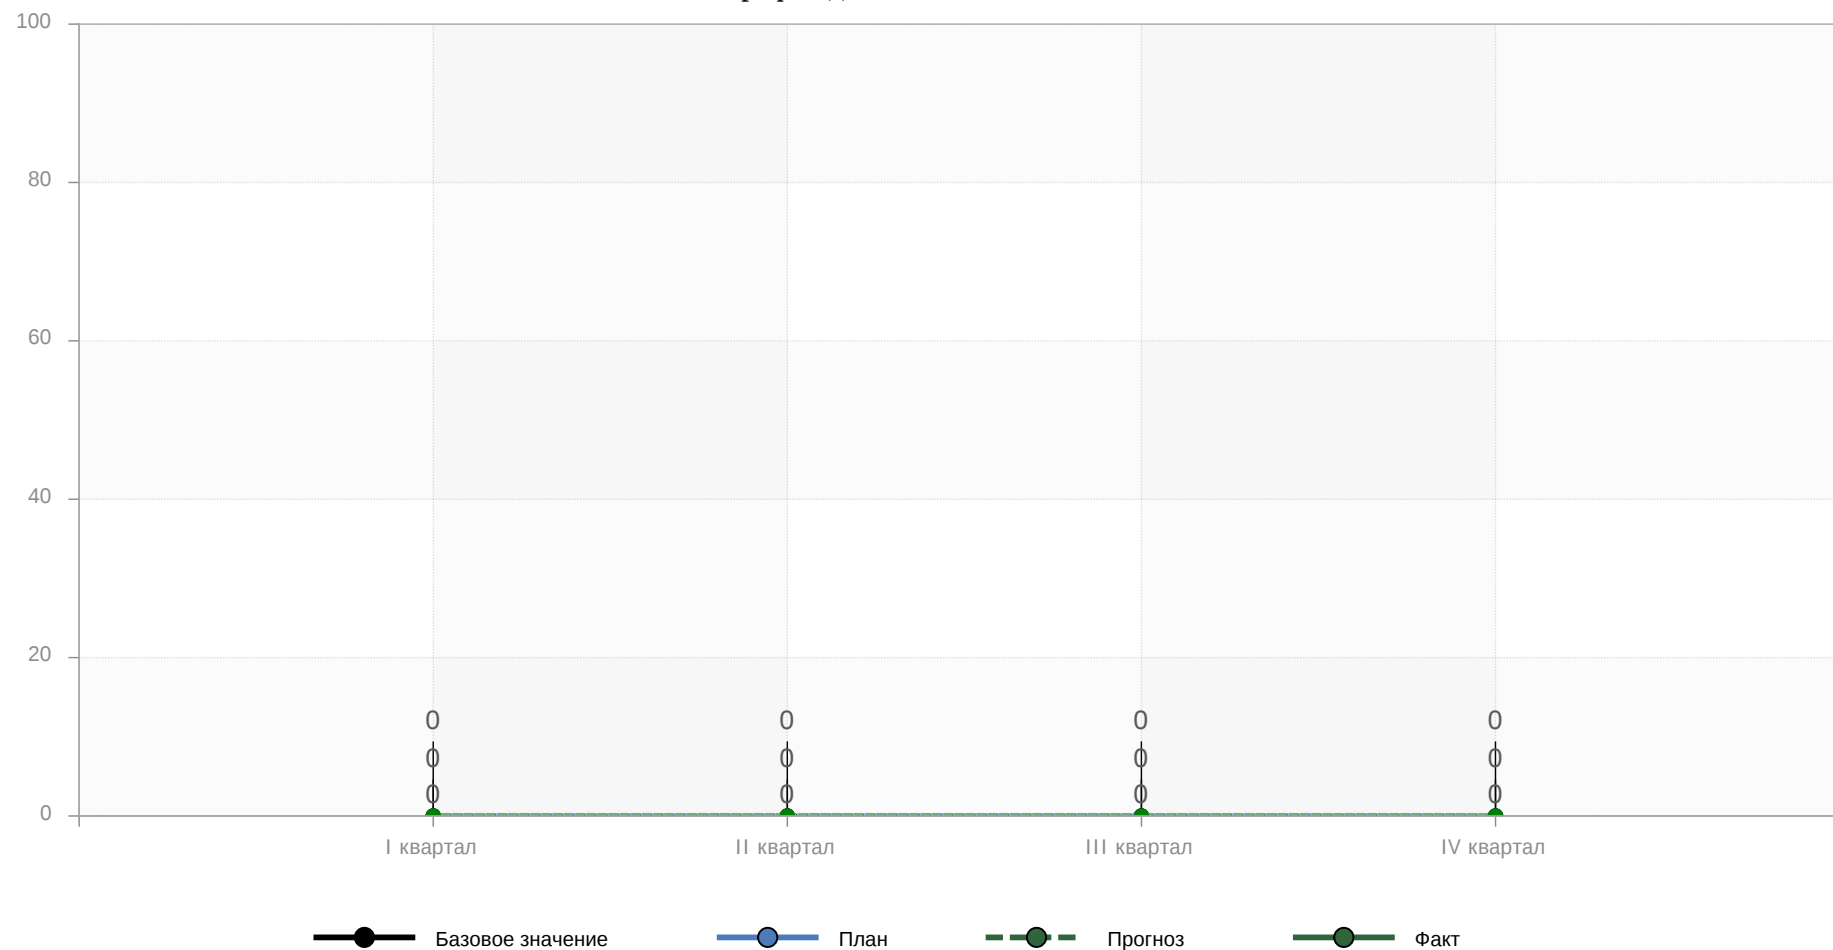


Рис. 13. Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха

Диаграмма достижения показателя

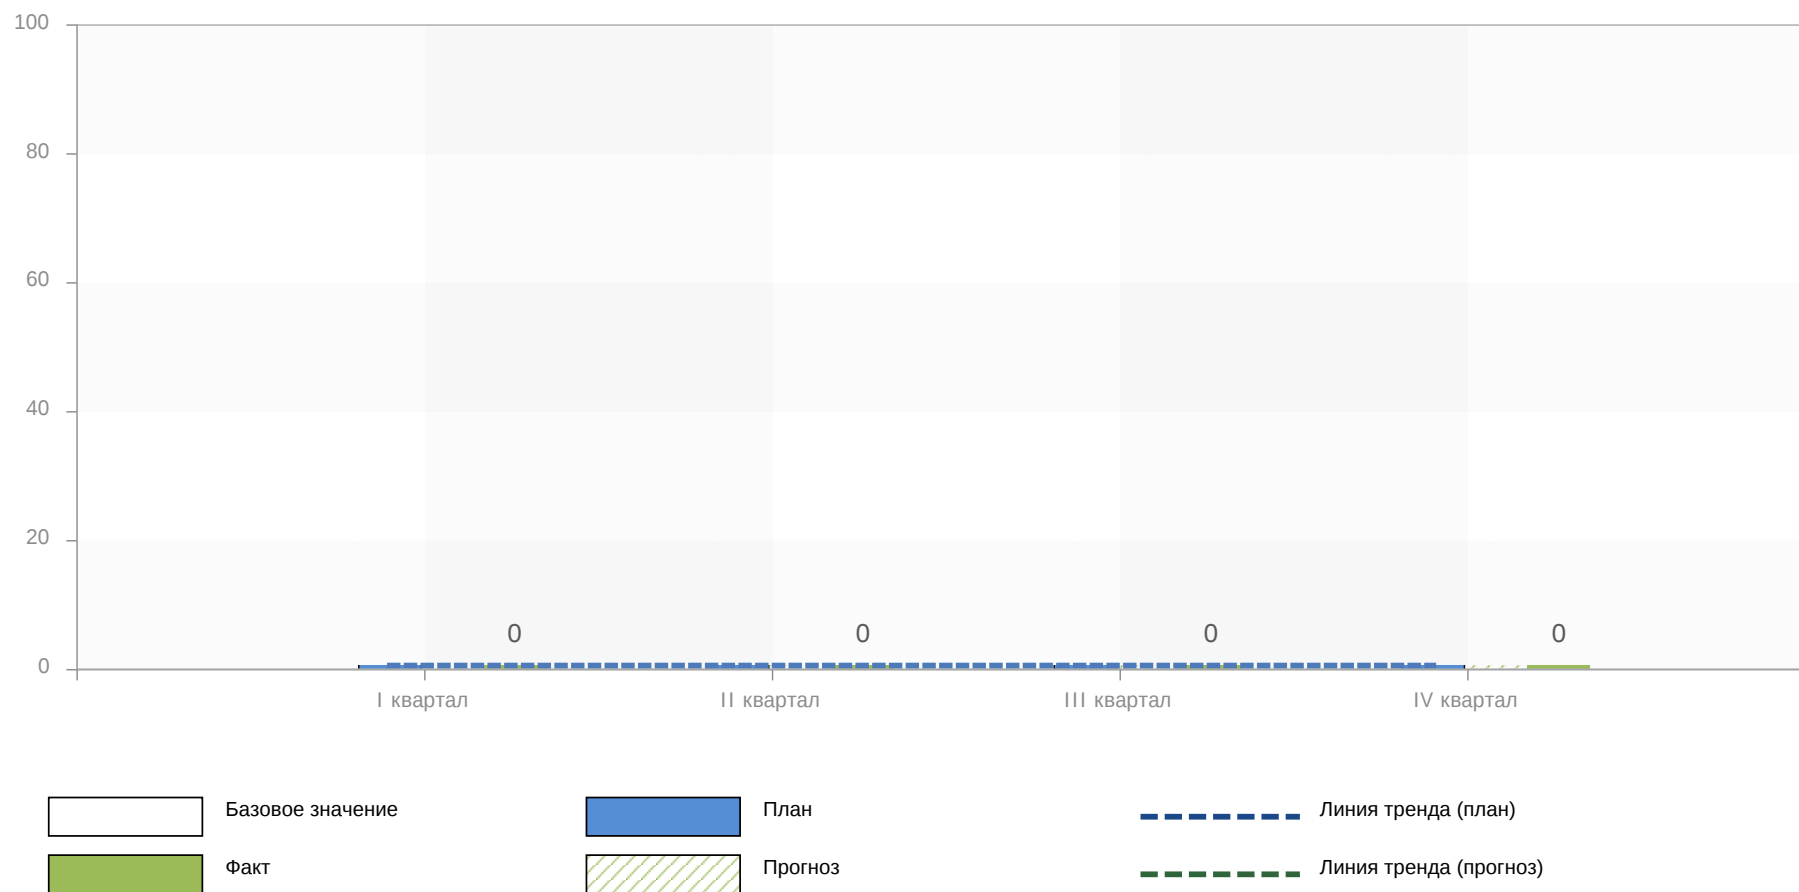


Рис. 14. Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха

График достижения показателя

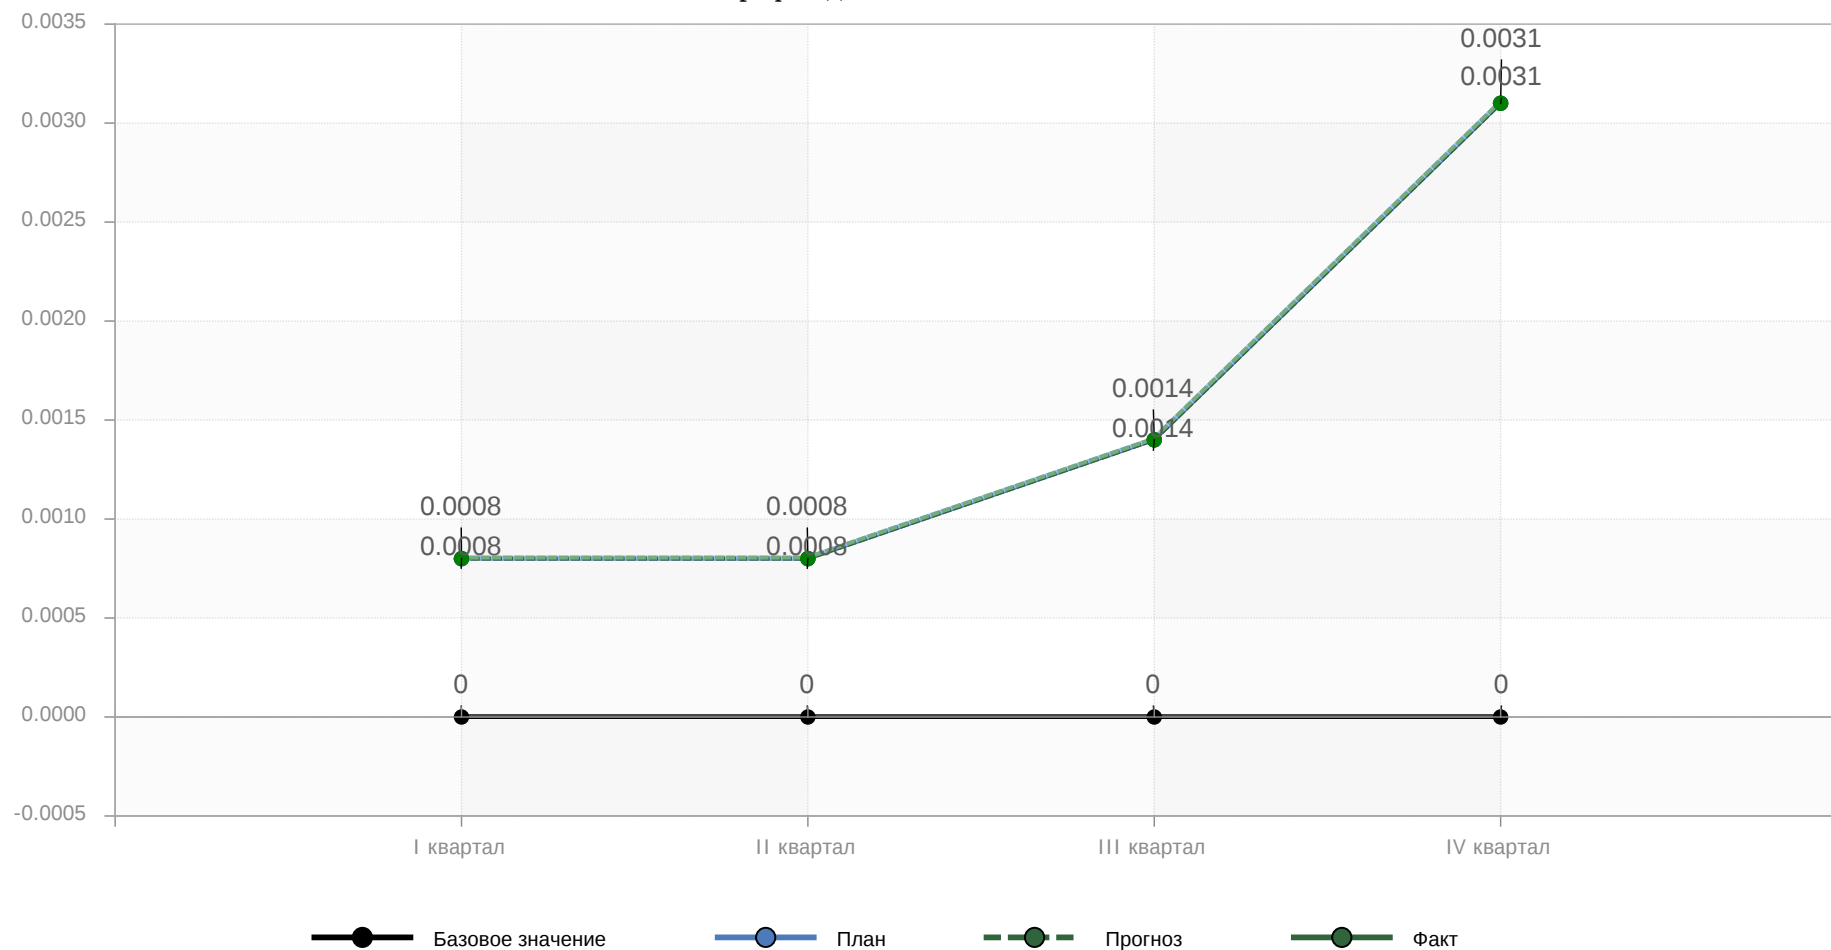


Рис. 15. Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции

Диаграмма достижения показателя

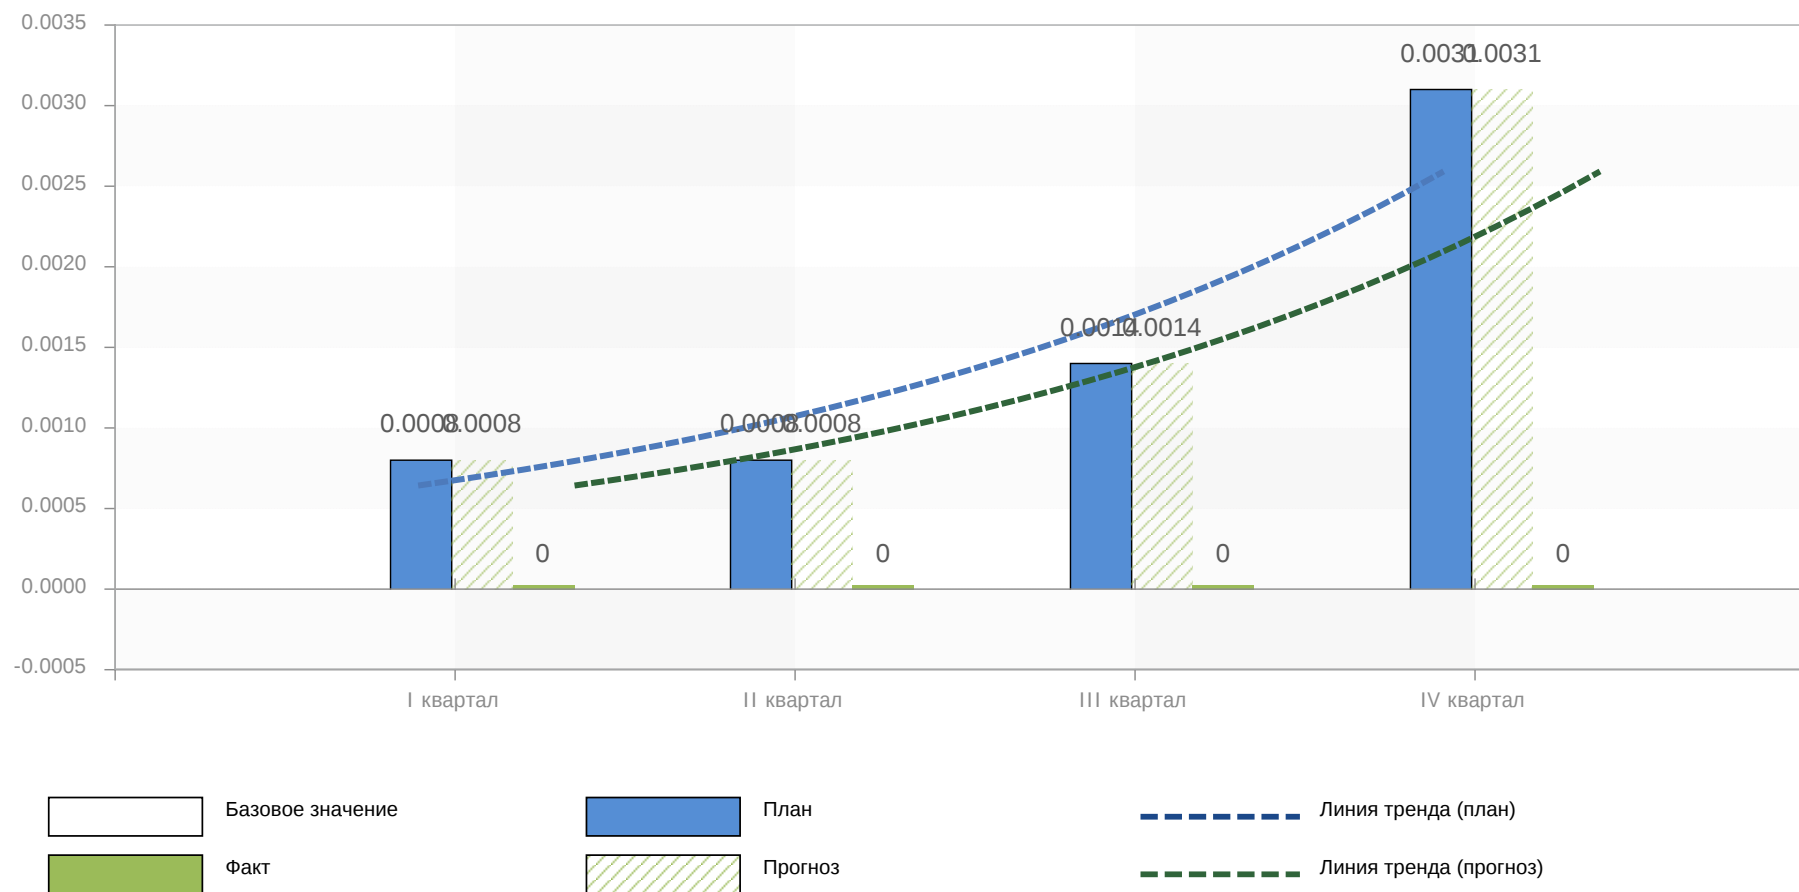


Рис. 16. Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции

График достижения показателя

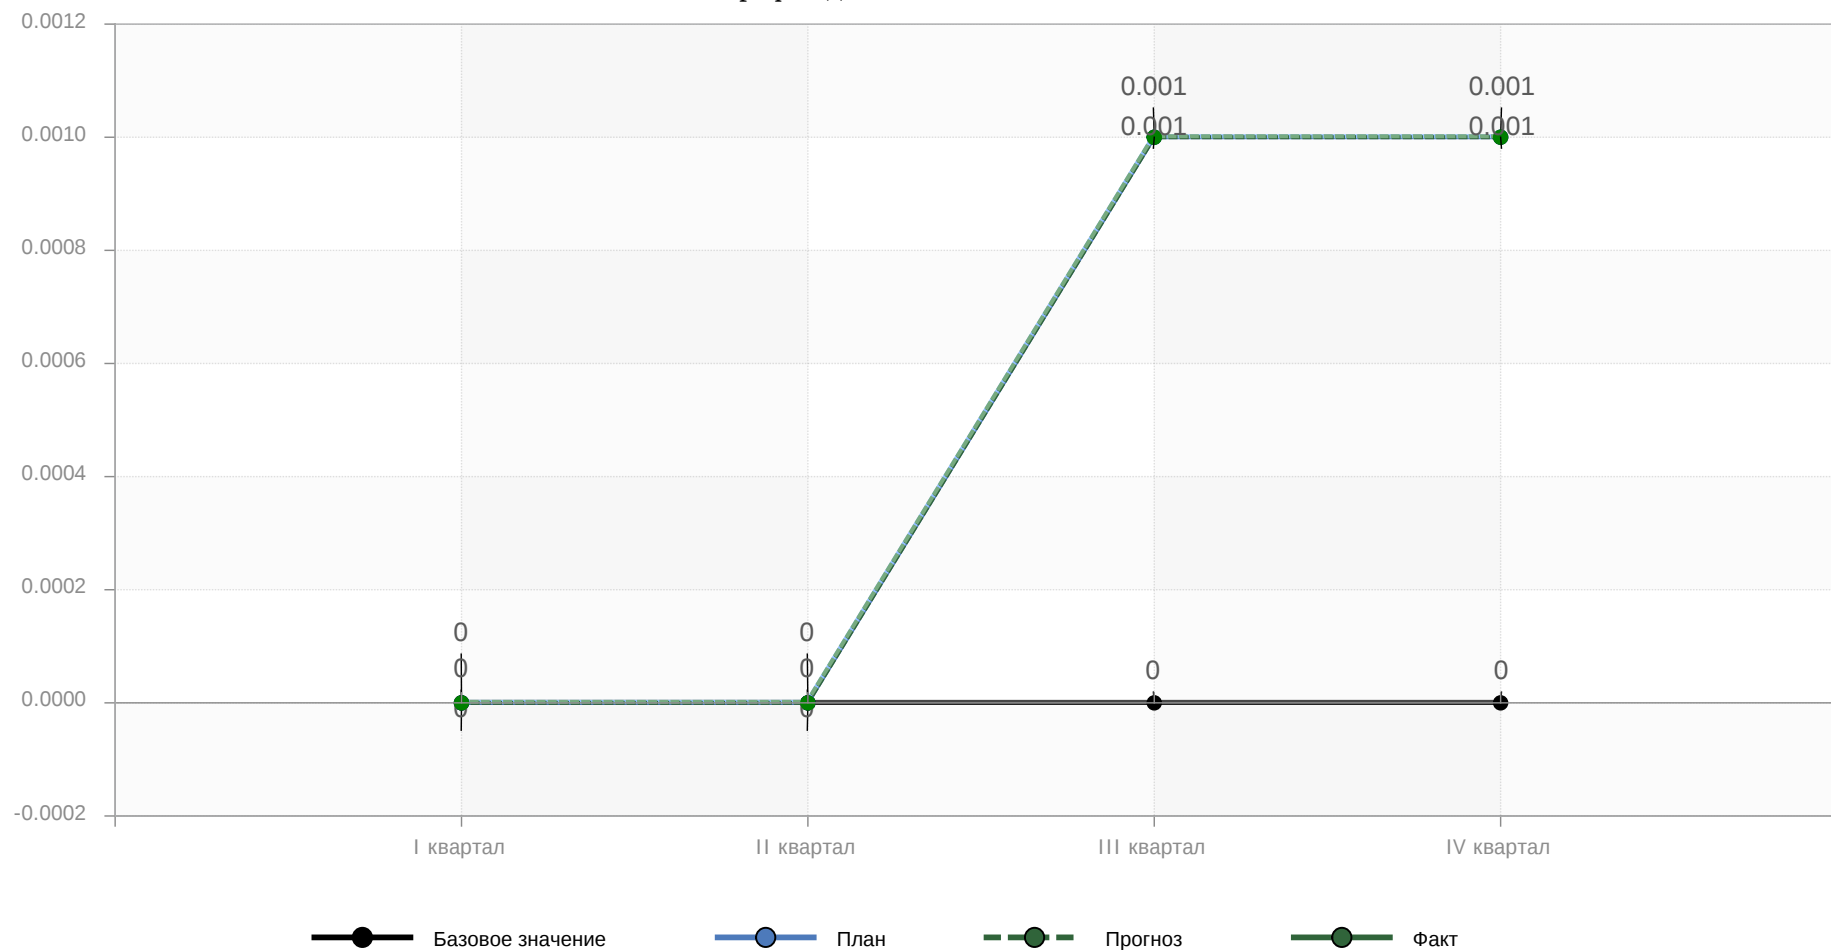


Рис. 17. Объем экспорта финансовых и страховых услуг

Диаграмма достижения показателя

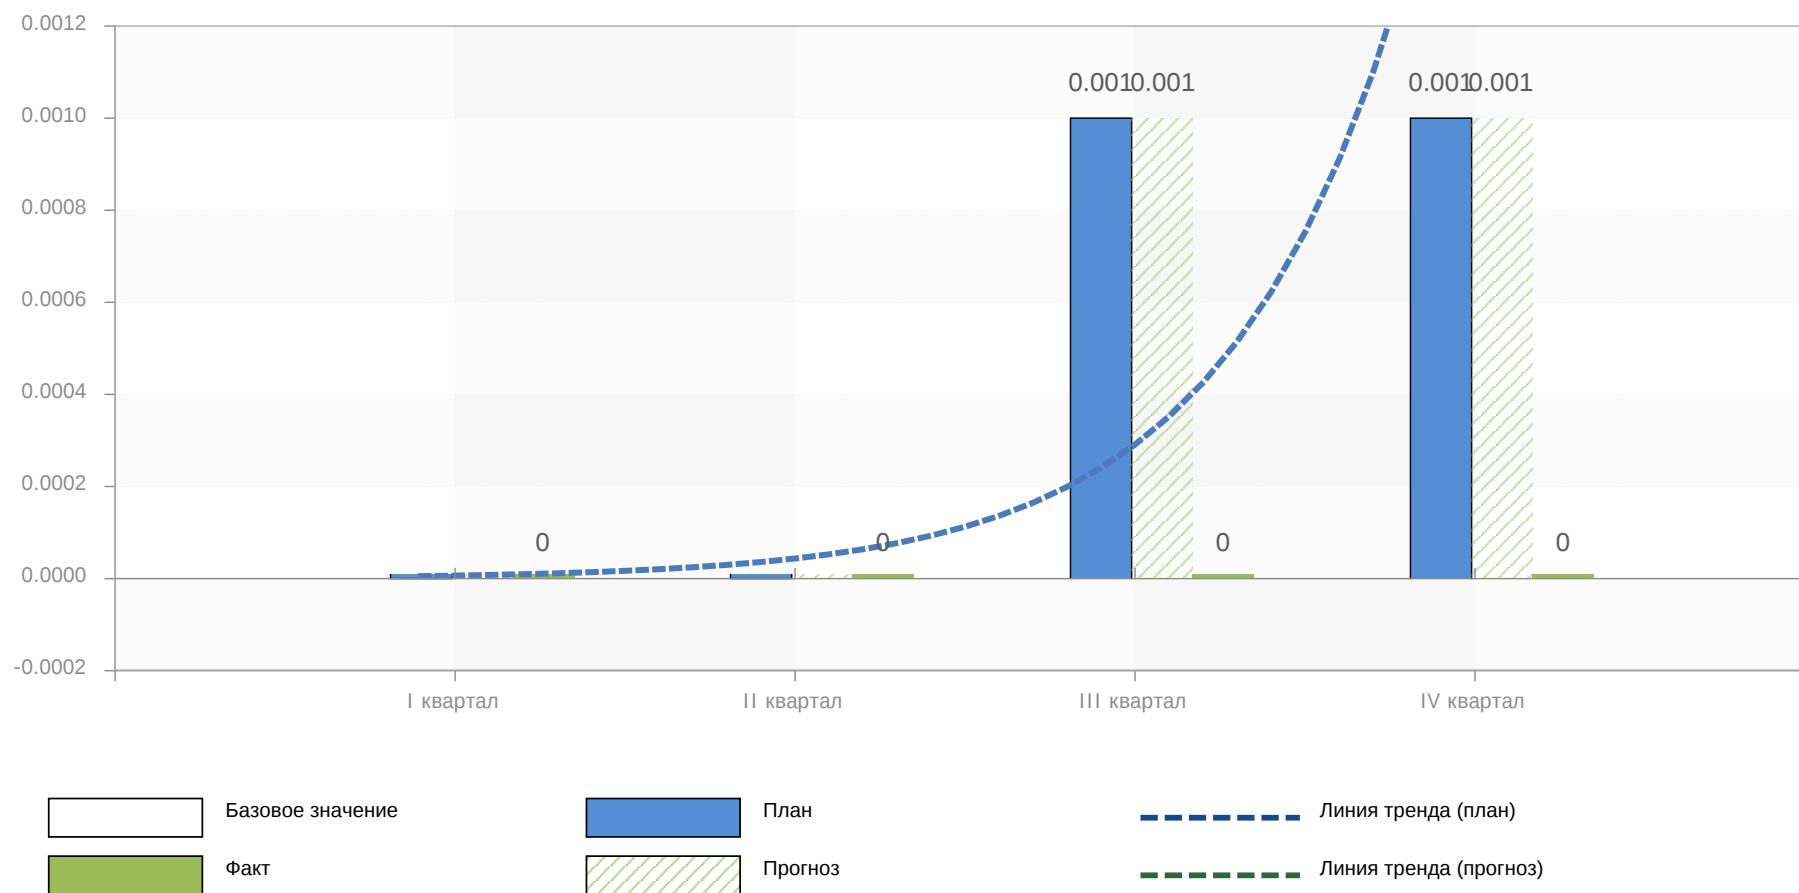


Рис. 18. Объем экспорта финансовых и страховых услуг
