

Документ подписан  
электронной подписью  
Малин Михаил Васильевич

ОДОБРЕН

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: (подпись)  
1F7FC854C8A924C7BBE5DCAB555803E968D04FCD  
Владелец: Малин Михаил Васильевич

Действителен: с 07.04.2020 по 07.07.2021

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД**

*"(N8-32) Развитие экспорта медицинских услуг (Кемеровская область)"*

**Общий статус реализации**

| 1. Риски                                                                          | 2. Показатели                                                                     | 3. Бюджет                                                                           | 4. Результаты                                                                       | 5. Контрольные точки                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Наличие отклонений                                                                | Наличие отклонений                                                                | Отсутствие отклонений                                                               | Наличие отклонений                                                                  | Наличие отклонений                                                                  |

## 1. Ключевые риски

| № п/п | Статус                                                                            | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Предлагаемые решения                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |  | 4. Результаты                                          | Результат: Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг., Причина риска: В 2020 году по данному результату снято финансирование, Вероятность: 70%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г. | 1. Начать разработку и распространение информационных мероприятий в 2021 году после возобновления финансирования, срок исполнения 30.12.2021;                                            |
| 2     |  | 6. План мероприятий                                    | КТ: Услуга оказана (работы выполнены), Причина риска: В 2020 году по данному результату снято финансирование, Вероятность: 70%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.                                                                                                                                                                                    | 1. Начать разработку и распространение информационных материалов в 2021 году с возобновлением финансирования, срок исполнения 31.12.2021;                                                |
| 3     |  | 6. План мероприятий                                    | Мероприятие: В Кемеровской области разработаны и распространены информационные материалы по повышению уровня информированности иностранных граждан, Причина риска: В 2020 году по данному результату снято финансирование., Вероятность: 70%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.                                                                      | 1. Начать разработку и распространение информационных материалов в 2021 году с возобновлением финансирования, срок исполнения 30.12.2021;                                                |
| 4     |  | 3. Цели и показатели                                   | Показатель: Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), Причина риска: Сокращение количества пролеченных иностранных граждан, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 28.02.2021г.                                                                                                                                                        | 1. Значение показателя в соответствии с доп. соглашением № 056-2019-N80047-1/3 на 2020 год 18 тыс. чел. Повысить количества пролеченных иностранных граждан, срок исполнения 28.02.2021; |

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

| № п/п | Статус                                                                              | Наименование целей и показателей                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |       |      |        | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------|------|--------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                     |                                                        |                             |                                        | I                     | II    | III  | IV     |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1     |  | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | Тысяча человек              | 39.195                                 | 9.317                 | 10.64 | 14.4 | 16.962 | 18                              | 44,06%             | Существует риск: Показатель: Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), Причина риска: Сокращение количества пролеченных иностранных граждан, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 28.02.2021г. Предлагаемые решения: 1. Значение показателя в соответствии с доп. соглашением № 056-2019 |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус                                                                            | Наименование целей и показателей | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Фактическое<br>значение за<br>предыдущий<br>год | Значения по кварталам |    |     |    | Плановое<br>значение<br>на конец<br>года | Процент<br>достиже<br>ния | Комментарий                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----|-----|----|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                   |                                  |                                   |                                                 | I                     | II | III | IV |                                          |                           |                                                                                                                       |
|          |  |                                  |                                   |                                                 |                       |    |     |    |                                          |                           | -N80047-1/3 на 2020 год 18 тыс. чел. Повысить количества пролеченных иностранных граждан, срок исполнения 28.02.2021. |

 Отсутствие  
отклонений

 Наличие  
отклонений

 Наличие критических  
отклонений

 Сведения не  
представлены

 Прогнозные  
сведения

3. Статус исполнения бюджета<sup>2</sup>

Бюджет субъекта  
на 2020 год  
Всего: 0,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО  
на 2020 год  
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов  
на 2020 год  
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники  
на 2020 год  
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

<sup>2</sup> При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

## Сведения об исполнении бюджета

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения                                                                                                                                  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей    |                           |                               | Исполнение, тыс. рублей          |                     | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
|          |        |                                                                                                                                                                                                                    | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |             |
| 1        | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4                                             | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                              | 10          |
| 1        |        | (03) Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг. | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |             |
| 1.1      |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |             |
| 1.1.1    |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                               | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |             |
| 1.1.2    |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |             |
| 1.2.3    |        | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |             |
| 1.2      |        | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |             |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п                                                                                         | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент исполнения<br>(8)/(5)*100 | Комментарий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|
|                                                                                                  |        |                                                                                   | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                   |             |
| 1                                                                                                | 2      | 3                                                                                 | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                 | 10          |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:                             |        |                                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                              |             |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                  |        |                                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                              |             |
| бюджет субъекта Российской Федерации                                                             |        |                                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                              |             |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |        |                                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                              |             |
| бюджеты муниципальных образований                                                                |        |                                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                              |             |
| внебюджетные источники                                                                           |        |                                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                              |             |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

## 4. Статус достижения результатов

| №<br>п/п | Статус                                                                            | Наименование результата                                                                                                                                                                                                                            | Достижение контрольных точек                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        |  | Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг.<br>Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020 |  <b>1</b> |
| 2        |  | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам<br>Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020                                                                         |  <b>4</b> |

-----  
<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

## 5. Динамика достижения контрольных точек

## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                       | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                               | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.    |                               |        | Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг. Значение: 1, на дату 31.12.2020 | 31.12.2020      | 31.12.2021   | Малин М. В.               | Информация по значению результата: В работе. Существует риск:<br>Результат: Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг., Причина риска: В 2020 году по данному результату снято финансирование, Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.<br>Предлагаемые решения:<br>1. Начать разработку и распространение информационных мероприятий в 2021 году после возобновления финансирования, срок исполнения 30.12.2021.<br><br>Просрочка 365 дней.<br>Предоставлена информация : 0 из 1. |
| 1.1.  | ПК                            |        | Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                             | 31.12.2020      | 31.12.2021   | Зеленина Е. М.            | В работе.<br>Просрочка 365 дней.<br>Существует риск:<br>КТ: Услуга оказана (работы выполнены), Причина риска: В 2020 году по данному результату снято финансирование, Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.<br>Предлагаемые решения:<br>1. Начать разработку и распространение информационных материалов в 2021 году с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                                                                              | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                               |        |                                                                                                                                                                              |                 |              |                           | возобновлением финансирования, срок исполнения 31.12.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.1 | РРП                           |        | В Кемеровской области разработаны и распространены информационные материалы по повышению уровня информированности иностранных граждан                                        | 31.12.2020      | 31.12.2021   | Уфимцев О. Б.             | В работе.<br>Просрочка 365 дней.<br>Существует риск:<br>Мероприятие: В Кемеровской области разработаны и распространены информационные материалы по повышению уровня информированности иностранных граждан, Причина риска: В 2020 году по данному результату снято финансирование., Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.<br>Предлагаемые решения:<br>1. Начать разработку и распространение информационных материалов в 2021 году с возобновлением финансирования, срок исполнения 30.12.2021. |
| 2.    |                               |        | <i>Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам Значение: 1, на дату 31.12.2020</i> | 31.12.2020      | 25.12.2020   | Малин М. В.               | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 25.12.2020г. №П-482, приложен файл.<br><br>Предоставлена информация : 1 из 1.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.1.  | ПК                            |        | Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам                                                 | 20.04.2020      | 29.04.2020   | Зеленина Е. М.            | Выполнено.<br>Просрочка 9 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "о количестве пролеченных иностранных граждан"<br>Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 29.04.2020г. №2759, приложен файл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                              | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                               |        |                                                                                                                              |                 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.1.1 | РРП                           |        | Мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам          | 20.04.2020      | 29.04.2020   | Уфимцев О. Б.             | Выполнено.<br>Просрочка 9 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "о количестве пролеченных иностранных граждан"<br>Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 29.04.2020г. №2759, приложен файл.                                 |
| 2.2.  | ПК                            |        | Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | 20.07.2020      | 28.07.2020   | Зеленина Е. М.            | Выполнено.<br>Просрочка 8 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Об объеме оказания медицинских услуг иностранным гражданам" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 28.07.2020г. №4799, приложен файл.                      |
| 2.2.1 | РРП                           |        | Мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам          | 20.07.2020      | 28.07.2020   | Уфимцев О. Б.             | Выполнено.<br>Просрочка 8 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Об объеме оказания медицинских услуг иностранным гражданам" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 28.07.2020г. №4799, приложен файл.                      |
| 2.3.  | ПК                            |        | Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | 20.10.2020      | 20.10.2020   | Зеленина Е. М.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о проведении мониторинга статистических данных по объему оказания услуг иностранным гражданам" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 20.10.2020г. №П-334, приложен файл. |
| 2.3.1 | РРП                           |        | Мониторинг статистических данных                                                                                             | 20.10.2020      | 20.10.2020   | Уфимцев О. Б.             | Выполнено.                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                            | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                                                                       | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                  |        | медицинских организаций по объему<br>оказания медицинских услуг<br>иностранным гражданам                                              |                 |              |                              | Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о проведении мониторинга статистических<br>данных по объему оказания услуг иностранным<br>гражданам" Отчет Министерства здравоохранения<br>Кузбасса от 20.10.2020г. №П-334, приложен файл. |
| 2.4.     | ПК                               |        | Проведен мониторинг статистических<br>данных медицинских организаций по<br>объему оказания медицинских услуг<br>иностранным гражданам | 31.12.2020      | 25.12.2020   | Зеленина Е. М.               | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о количестве пролеченных иностранных<br>граждан" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса<br>от 25.12.2020г. №П-482, приложен файл.                                       |
| 2.4.1    | РРП                              |        | Мониторинг статистических данных<br>медицинских организаций по объему<br>оказания медицинских услуг<br>иностранным гражданам          | 31.12.2020      | 25.12.2020   | Уфимцев О. Б.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о количестве пролеченных иностранных<br>граждан" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса<br>от 25.12.2020г. №П-482, приложен файл.                                       |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

## Динамика достижения контрольных точек

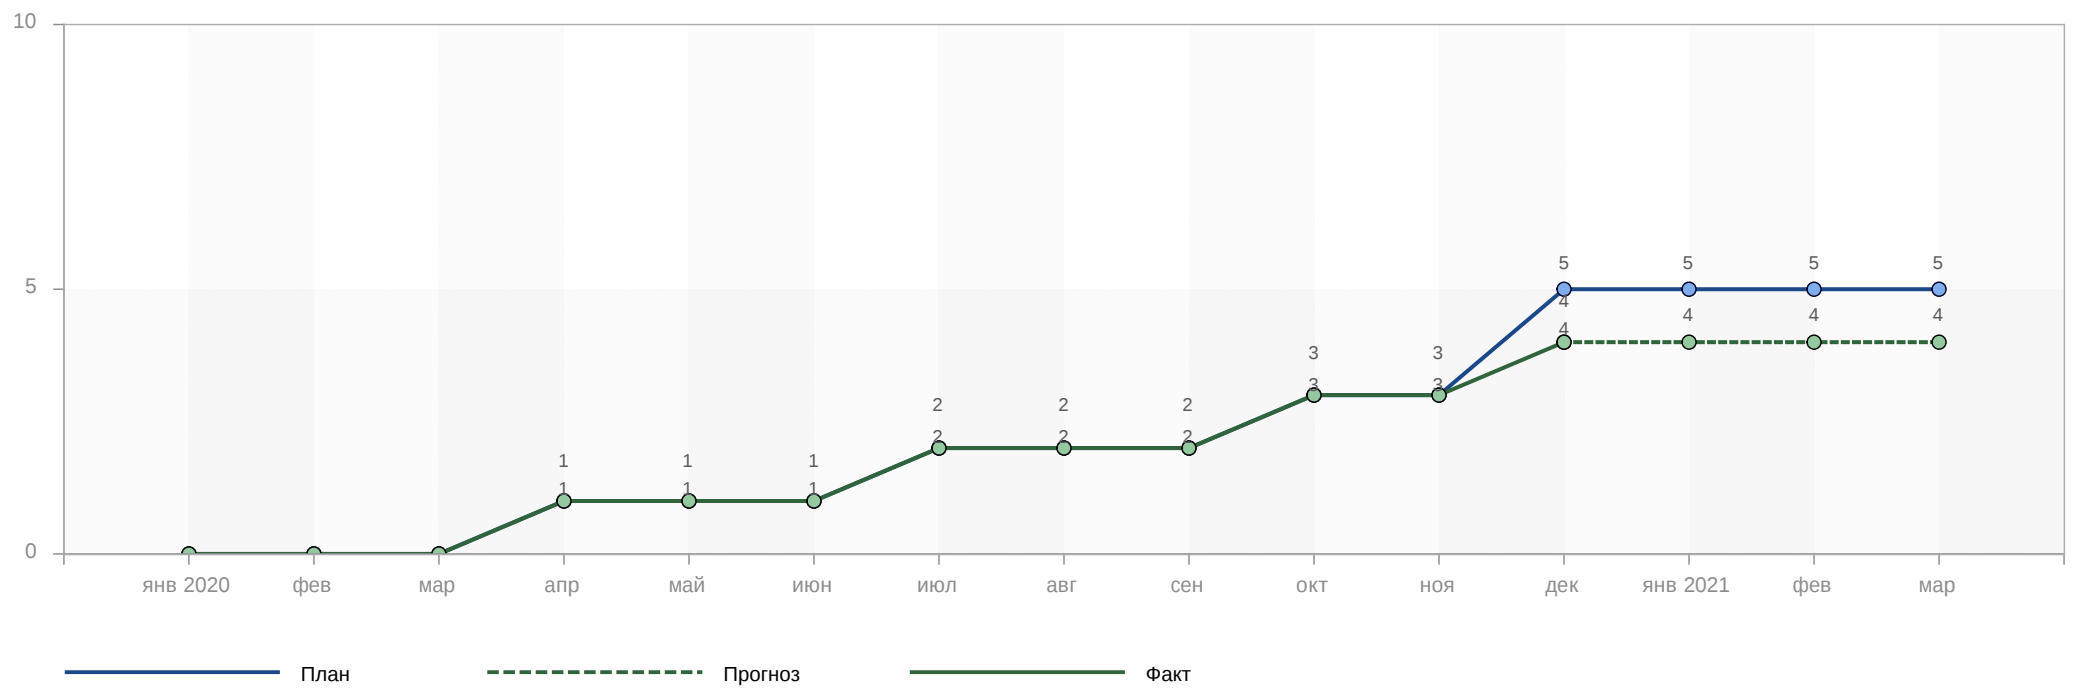


Рис. 1. "(N8-32) Развитие экспорта медицинских услуг (Кемеровская область)"

График достижения показателя

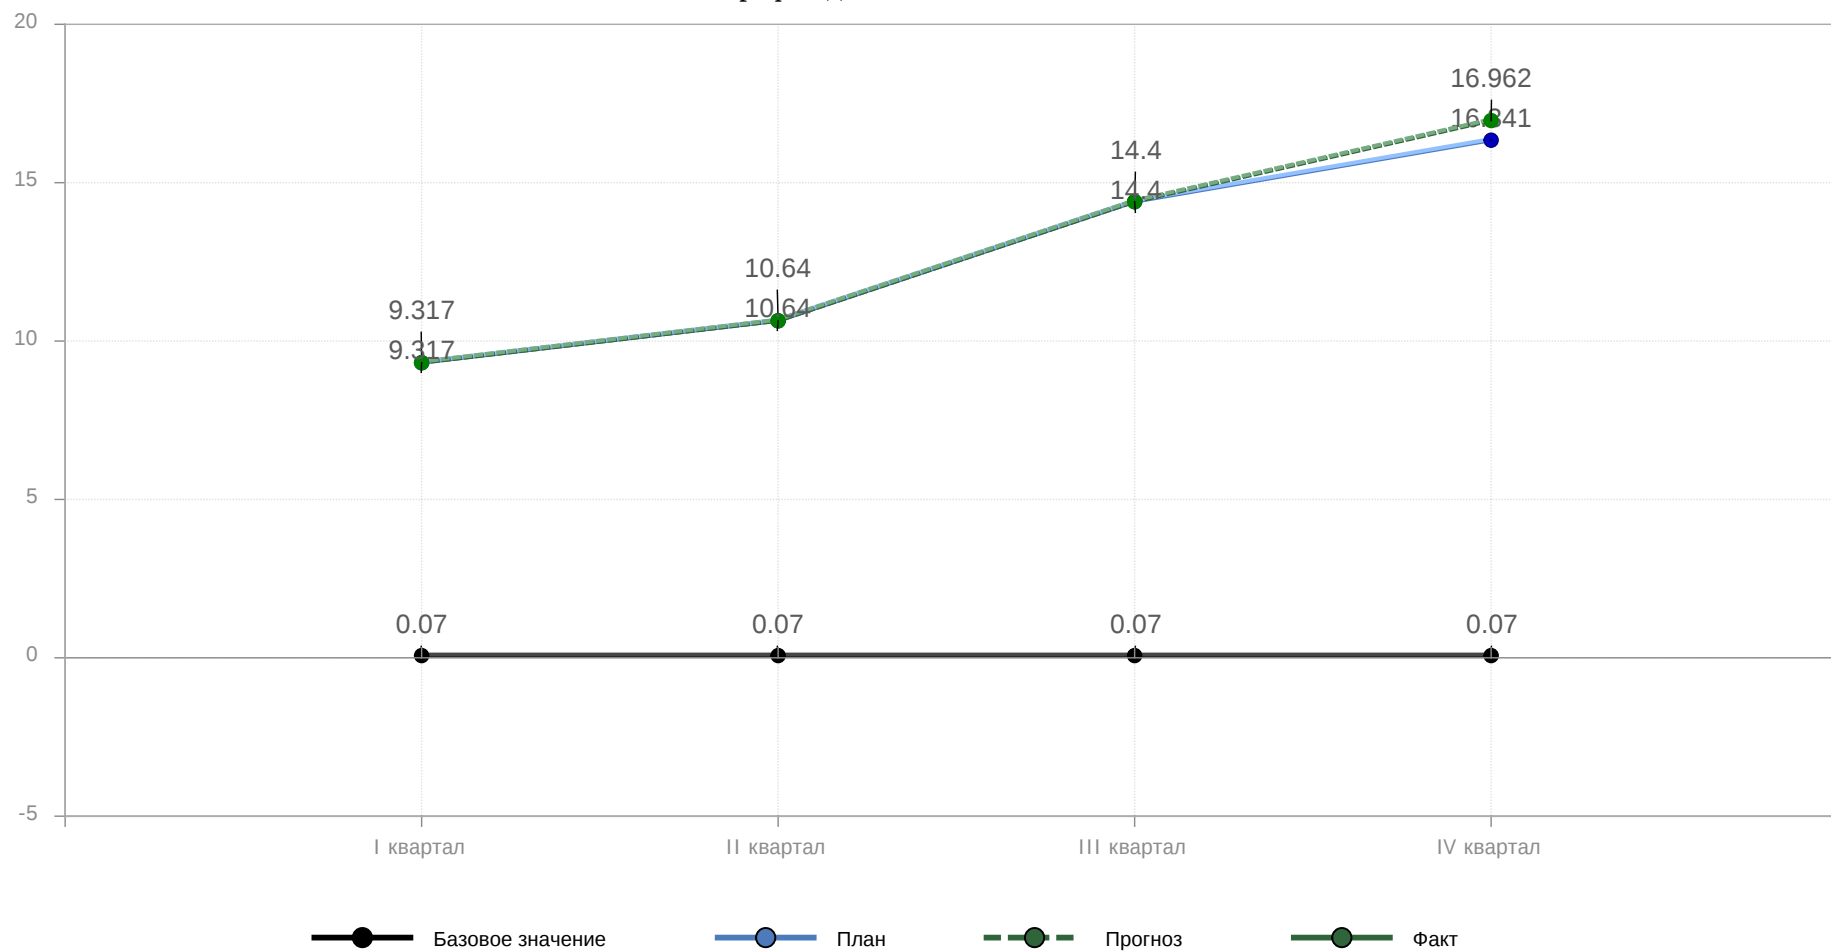


Рис. 1. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

Диаграмма достижения показателя

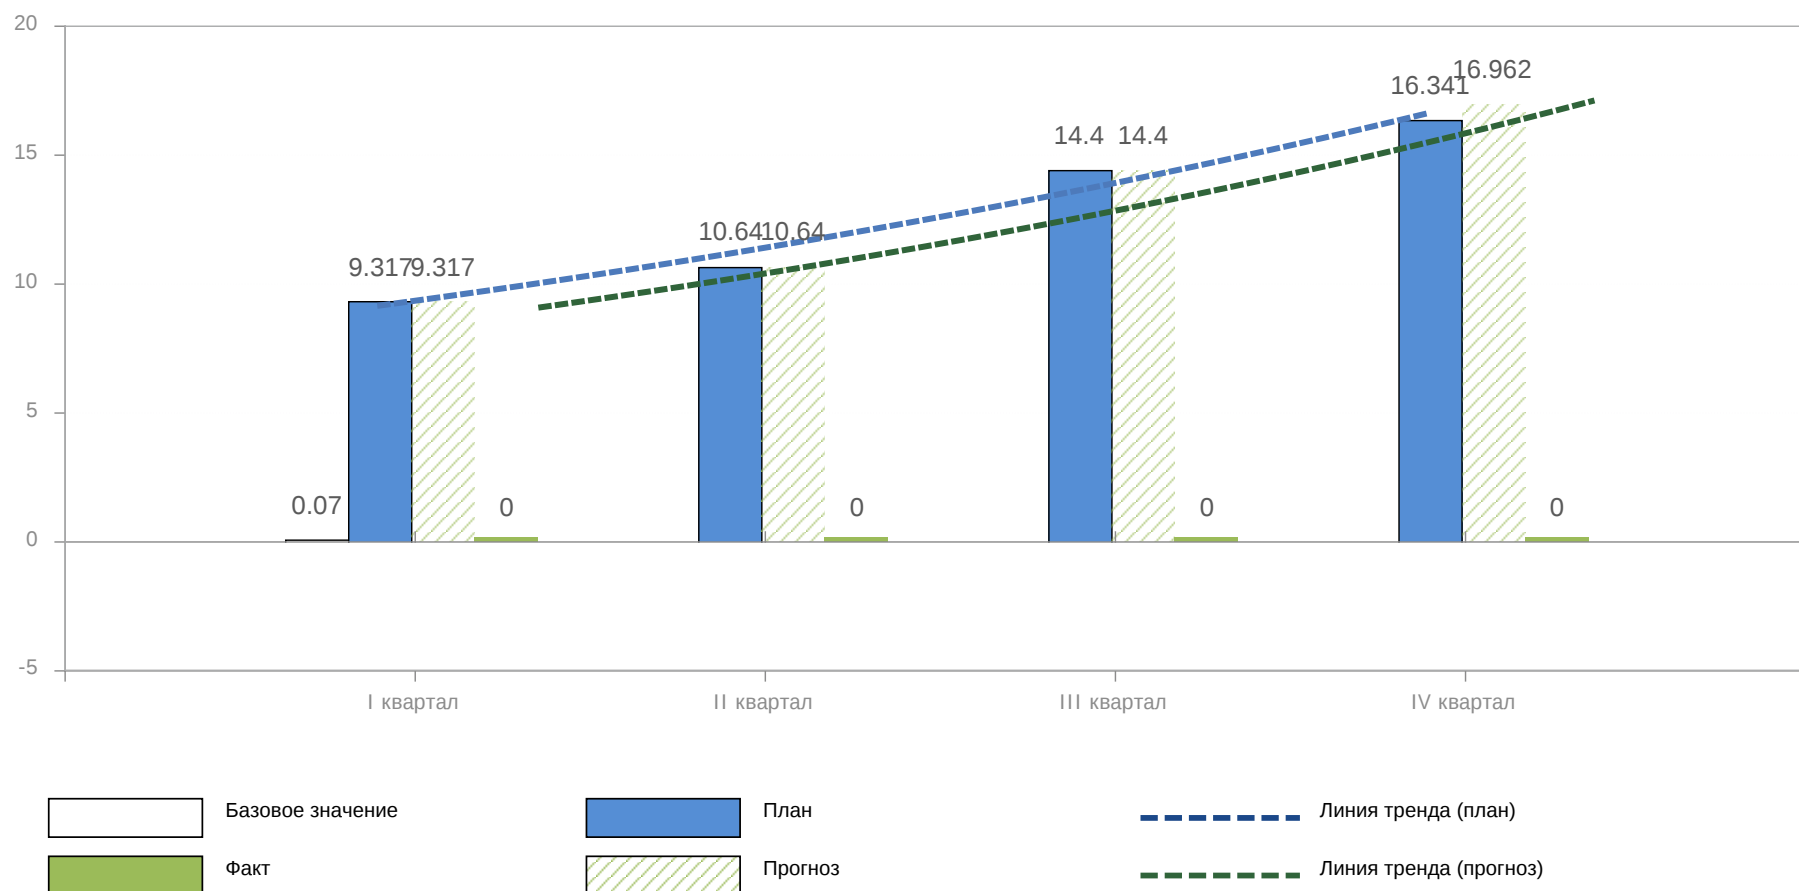


Рис. 2. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)
