

Руководитель
регионального проекта —
Малин Михаил Васильевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

29.05.2020

Сертификат:
2984D417CEE5738F0A816DF1644F734AA10C98E

Владелец: Малин Михаил Васильевич

Действителен: с 30.03.2020 по 30.06.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(N2-32) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Наличие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1		3. Цели и показатели	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, Причина риска: Недостаточное количество проведенных рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, Вероятность: 90%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 28.02.2020г.	1. Увеличить количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, срок исполнения 28.02.2020;
2		3. Цели и показатели	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, Причина риска: Недостаточное снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, Вероятность: 90%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 28.02.2020г.	1. снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, срок исполнения 28.02.2020;
3		3. Цели и показатели	Больничная летальность от инфаркта миокарда, Причина риска: Недостаточное снижение больничной летальности от инфаркта миокарда, Вероятность: 90%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 28.02.2020г.	1. Снижение больничной летальности от инфаркта миокарда, срок исполнения 28.02.2020;
4		3. Цели и показатели	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %, Причина риска: Недостаточное снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения, %, Вероятность: 90%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 28.02.2020г.	1. Снизить больничную летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, срок исполнения 28.02.2020;
5		3. Цели и показатели	Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, Причина риска: Недостаточное снижение смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, Вероятность: 90%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 28.02.2020г.	1. Обеспечение снижения смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, срок исполнения 28.02.2020;
6		4. Результаты	1Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием РСЦ и ПСО, Причина риска: Не введено в эксплуатацию оборудование, Вероятность: 30%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 25.01.2020г.	1. Будет введено в эксплуатацию поставленное медицинское оборудование, срок исполнения 25.01.2020;
7		3. Цели и показатели	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, Причина риска: Недостаточное количество проведенных рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, Вероятность: 90%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 28.02.2020г.	1. Увеличить количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, срок исполнения 28.02.2020;
8		3. Цели и показатели	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, Причина риска: Недостаточное снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, Вероятность: 90%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 28.02.2020г.	1. снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, срок исполнения 28.02.2020;

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

			наступления: 28.02.2020г.	
9		3. Цели и показатели	Больничная летальность от инфаркта миокарда, Причина риска: Недостаточное снижение больничной летальности от инфаркта миокарда, Вероятность: 90%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 28.02.2020г.	1. Снижение больничной летальности от инфаркта миокарда, срок исполнения 28.02.2020;
10		3. Цели и показатели	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %, Причина риска: Недостаточное снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения, %, Вероятность: 90%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 28.02.2020г.	1. Снизить больничную летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, срок исполнения 28.02.2020;
11		3. Цели и показатели	Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, Причина риска: Недостаточное снижение смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, Вероятность: 90%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 28.02.2020г.	1. Обеспечение снижения смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, срок исполнения 28.02.2020;
12		4. Результаты	1Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием РСЦ и ПСО, Причина риска: Не введено в эксплуатацию оборудование, Вероятность: 30%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 25.01.2020г.	1. Будет введено в эксплуатацию поставленное медицинское оборудование, срок исполнения 25.01.2020;

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	Человек	47.7	53.3	54.7	50.4	56.8	44.2	77,82%	Существует риск: Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, Причина риска: Недостаточное снижение смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 28.02.2020г. Предлагаемые решения: 1. Обеспечение снижения смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, срок исполнения 28.02.2020. Недостаточное снижение смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения
2		Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения	Человек	118.6	137.7	133.5	125.9	125.9	110	87,37%	Существует риск: Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения , Причина риска: Недостаточное снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения , Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 28.02.2020г. Предлагаемые решения: 1. снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения , срок исполнения 28.02.2020. Недостаточное снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения
3		Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	Процент	15.1	13.6	15.1	13.9	14.6	13.9	95,21%	Существует риск: Больничная летальность от инфаркта миокарда, Причина риска: Недостаточное снижение больничной летальности от инфаркта миокарда, Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 28.02.2020г. Предлагаемые решения: 1. Снижение больничной летальности от

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

											инфаркта миокарда, срок исполнения 28.02.2020. Недостаточное снижение больничной летальности от инфаркта миокарда
4		Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	Процент	20.5	23.2	18.6	19	22.17	19	85,70%	Существует риск: Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %, Причина риска: Недостаточное снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения, %, Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 28.02.2020г. Недостаточное снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения
5		Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %	Процент	31.7	35.7	35.1	37	41.4	38	108,95%	
6		Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	Тысяча единиц	4.489	1.1	2.2	4	4.95	5.381	91,99%	Существует риск: Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, Причина риска: Недостаточное количество проведенных рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 28.02.2020г. Недостаточное количество проведенных рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях
7		Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %	Процент	46.5	72.7	73.3	54.6	84.3	54.6	154,40%	


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

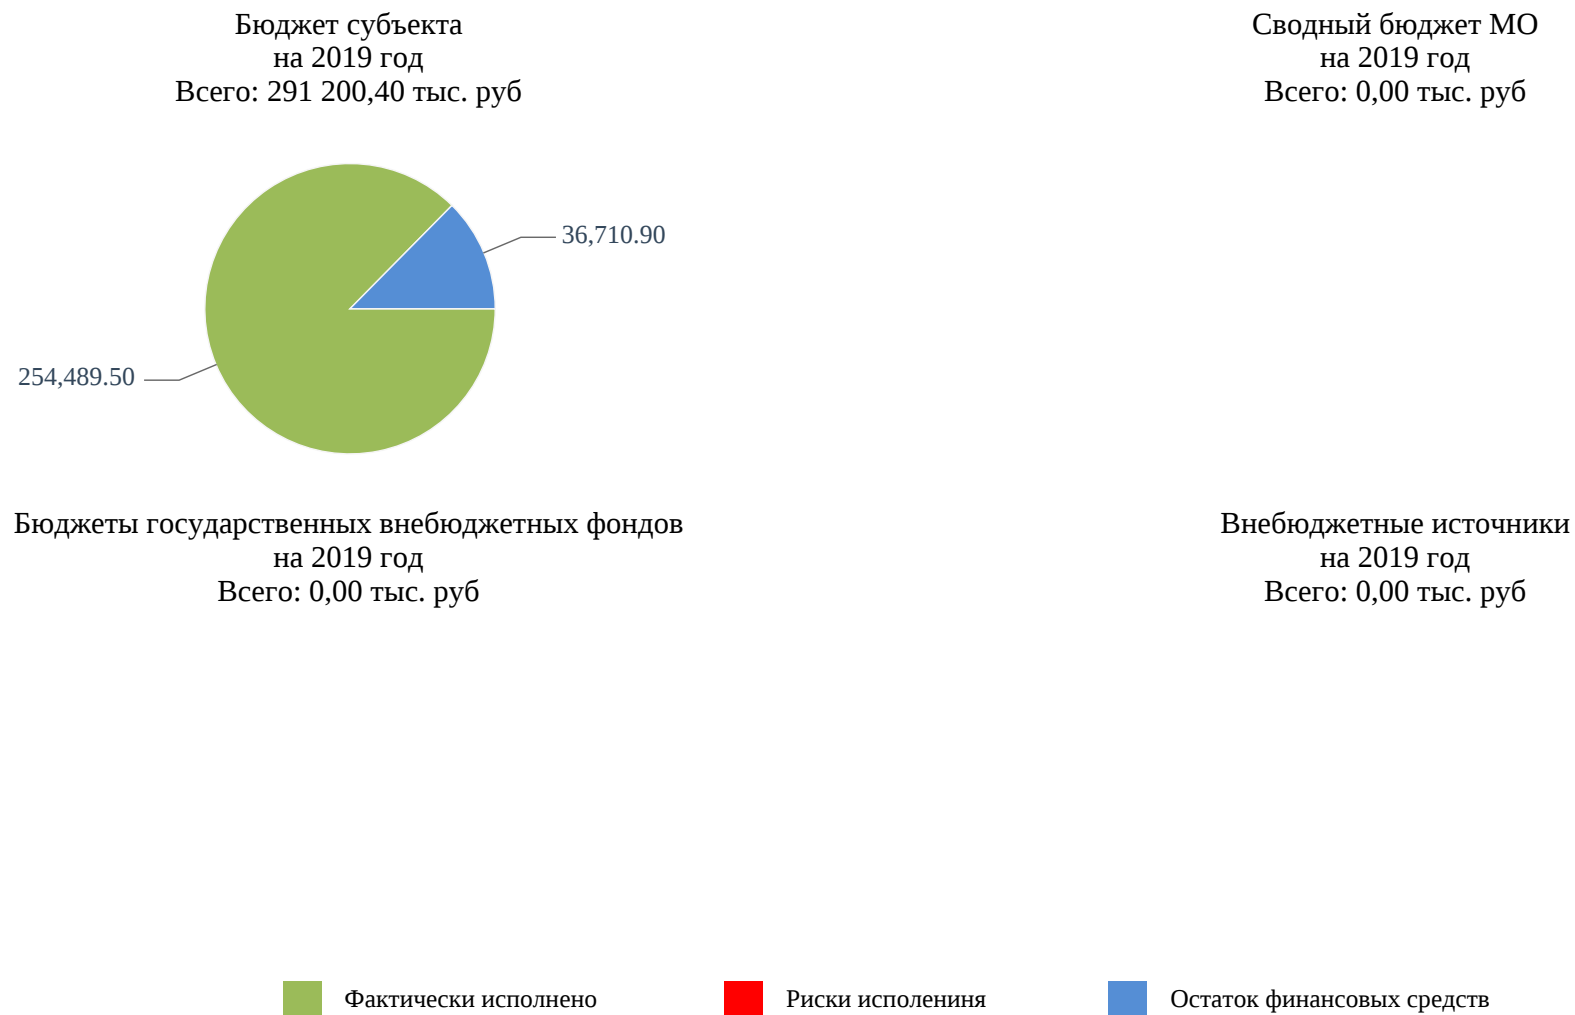3. Статус исполнения бюджета²

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>(01.02.02) Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(01.05.09) Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области	207 200,40	207 200,40	207 200,40	207 197,76	185 466,96	89,51	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	207 200,40	207 200,40	207 200,40	207 197,76	185 466,96	89,51	в работе
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	207 200,40	207 200,40	207 200,40	207 197,76	185 466,96	89,51	в работе
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(01) Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области в 2019 году	84 000,00	84 000,00	84 000,00	83 996,59	69 022,54	82,17	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	84 000,00	84 000,00	84 000,00	83 996,59	69 022,54	82,17	в соответствии с соглашением
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	84 000,00	84 000,00	84 000,00	83 996,59	69 022,54	82,17	в соответствии с соглашением
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		(02) Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			291 200,40	291 200,40	291 200,40	291 194,35	254 489,50	87,39	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			291 200,40	291 200,40	291 200,40	291 194,35	254 489,50	87,39	
бюджет субъекта Российской Федерации			291 200,40	291 200,40	291 200,40	291 194,35	254 489,50	87,39	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области в 2019 году	
2		Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».	
3		Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	
4		Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области	
5		В Кемеровской области разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены




 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий




№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			<i>Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области в 2019 году</i> Значение: 2, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Малин М. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приложение 6 к Соглашению об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет ДОЗН КО от 31.12.2019г. №5, приложен файл. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 2 из 2.
1.1	ПК		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 1 первичное сосудистое отделение в Кемеровской области в 2019 году	31.12.2019	31.12.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приложение 6 к Соглашению об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет ДОЗН КО от 31.12.2019г. №5, приложен файл.
1.1.1	РПП		Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 1 регионального сосудистого центра и 1 первичного сосудистого отделения в Кемеровской области в 2019 году	31.12.2019	31.12.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приложение 6 к Соглашению об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет ДОЗН КО от 31.12.2019г. №5, приложен файл.
2			<i>В Кемеровской области разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"</i> Значение: 1, на дату 01.07.2019	01.07.2019	01.07.2019	Малин М. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении региональной программы" Постановление Правительства Кемеровской области от 27.06.2019г. № 384, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
2.1	ПК		Документ разработан	01.05.2019	23.04.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении проекта региональной программы "Борьба с ССЗ"" Письмо от 23.04.2019г. №2609, приложен файл;

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.1	РРП		Разработка проекта региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	01.05.2019	23.04.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении проекта региональной программы Борьба с ССЗ" Письмо от 23.04.2019г. №2609, приложен файл;
2.2	ПК		Документ утвержден (подписан)	01.07.2019	01.07.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Программа _Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями_, утв. постановлением ПКО" Постановление Администрации Кемеровской области от 27.06.2019г. №384, приложен файл.
2.2.1	РРП		Принятие акта Кемеровской области об утверждении региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	01.07.2019	01.07.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении региональной программы" Постановление Правительства Кемеровской области от 27.06.2019г. № 384, приложен файл.
2.3	ПК		Документ опубликован	01.07.2019	01.07.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении региональной программы" Постановление Правительства Кемеровской области от 27.06.2019г. № 384, приложен файл. 2. "Размещение программы Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями на сайте АКО " Иное Департамента охраны здоровья населения от 27.06.2019г. №б/н, приложен файл.
2.3.1	РРП		Постановление правительства Кемеровской области об утверждении региональной программы "Борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	01.07.2019	01.07.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении региональной программы" Постановление Правительства Кемеровской области от 27.06.2019г. № 384, приложен файл.
3			<i>Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска Значение: 50, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Малин М. В.	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 50.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1	ПК		Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта	15.02.2020	15.02.2020	Зеленина Е. М.	В работе. Отклонения отсутствуют
3.1.1	РПП		Заключение соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта	15.02.2020	15.02.2020	Зеленина Е. М.	В работе.
4			<i>Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области Значение: 2, на дату 31.12.2019</i>	31.12.2019	25.01.2020	Малин М. В.	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Приказ о переоснащении" Приказ ДОЗН КО от 07.03.2019г. №463, приложен файл. Существует риск: Переоснащено/дооснащено , Причина риска: Несвоевременное введение в эксплуатацию поставленного медицинского оборудования, Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 25.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. Поставленное медицинское оборудование будет введено в эксплуатацию, срок исполнения 25.01.2020. Отсутствие отклонений Просрочка 25 дней. Предоставлена информация : 2 из 2. Информация по результату: Существует риск: 1Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием РСЦ и ПСО, Причина риска: Не введено в эксплуатацию оборудование, Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 25.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. Будет введено в эксплуатацию поставленное медицинское оборудование, срок исполнения 25.01.2020.
4.1	ПК		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	01.04.2019	15.02.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта" Соглашение ДОЗН КО от 15.02.2019г. №056 -17-2019-274, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.1.1	РРП		Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	01.04.2019	15.02.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта" Соглашение ДОЗН КО от 15.02.2019г. №056 -17-2019-274, приложен файл.
4.2	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	01.07.2019	28.06.2019	Уфимцев О. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ОТЧЁТ о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов ССЗ " Отчет Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 28.06.2019г. №3974, приложен файл.
4.2.1	РРП		Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта	01.07.2019	28.06.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов" Письмо Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 28.06.2019г. №3974, приложен файл.
4.3	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	01.10.2019	01.10.2019	Уфимцев О. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об использовании межбюджетного трансферта при оснащении оборудованием РСЦ и ПСО" Отчет ДОЗН КО от 01.10.2019г. №6431, приложен файл.
4.3.1	РРП		Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта	01.10.2019	01.10.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об использовании межбюджетного трансферта при оснащении оборудованием РСЦ и ПСО" Отчет ДОЗН КО от 01.10.2019г. №6431, приложен файл.
4.4	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2019	31.12.2019	Уфимцев О. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О количестве приобретенного оборудования" Отчет ДОЗН КО от 01.10.2019г. №6431, приложен файл. 2. "Отчет об использовании межбюджетного трансферта Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями за 2019 год" Отчет ДОЗН КО от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений






Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.4.1	РРП		Предоставление отчета об использовании межбюджетного трансферта	31.12.2019	31.12.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о количестве закупленного оборудования" Отчет ДОЗН КО от 01.10.2019г. №6431, приложен файл. 2. "Отчет об использовании межбюджетного трансферта Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями за 2019 год" Отчет ДОЗН КО от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
4.5	ПК		Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 1 первичное сосудистое отделение	01.02.2019	31.01.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о переоснащении" Приказ ДОЗН КО от 31.01.2019г. №157, приложен файл.
4.5.1	РРП		Определение для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 1 первичное сосудистое отделение	01.02.2019	31.01.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о переоснащении" Приказ ДОЗН КО от 31.01.2019г. №157, приложен файл.
5			<i>Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области Значение: 5, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Малин М. В.	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 5 из 5. Информация по результату: Существует риск: 1Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием РСЦ и ПСО, Причина риска: Не введено в эксплуатацию оборудование, Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 25.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. Будет введено в эксплуатацию поставленное медицинское оборудование, срок исполнения 25.01.2020.
5.1	ПК		Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 3 первичных сосудистых отделения	01.02.2020	01.02.2020	Зеленина Е. М.	В работе. Отклонения отсутствуют

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.1.1	РРП		Определение для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 3 первичных сосудистых отделения	01.02.2020	01.02.2020	Зеленина Е. М.	В работе.
6			Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия». Значение: 1, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Малин М. В.	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 1.
6.1	ПК		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	25.02.2020	25.02.2020	Зеленина Е. М.	В работе. Отсутствие отклонений
6.1.1	РРП		Заключение соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	25.02.2020	25.02.2020	Зеленина Е. М.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек

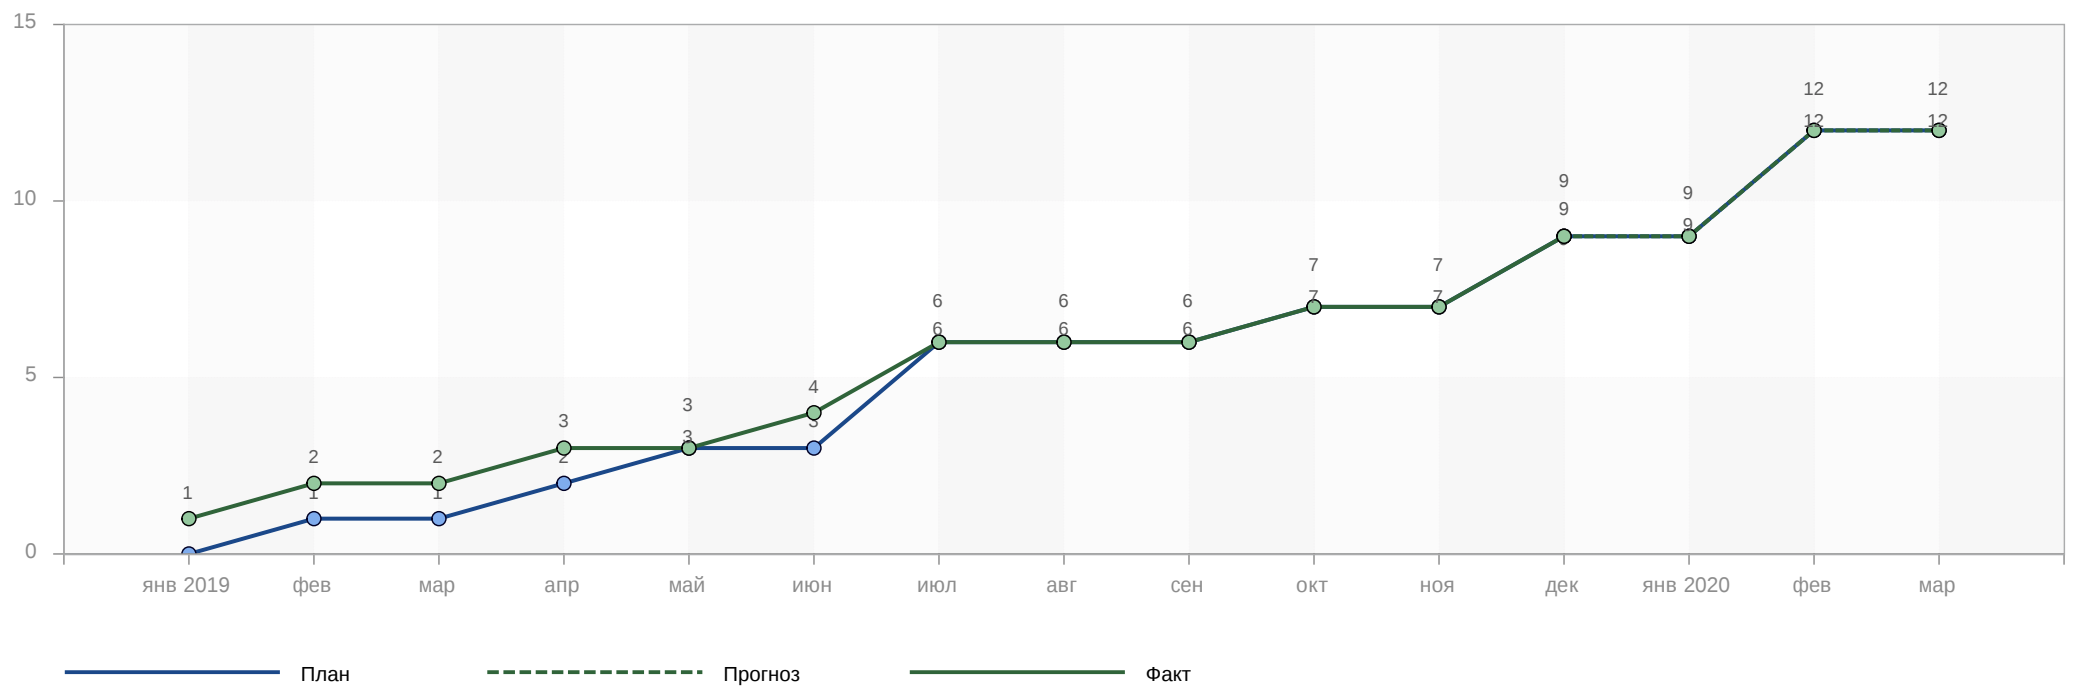


Рис. 1. "(N2-32) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кемеровская область)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

График достижения показателя

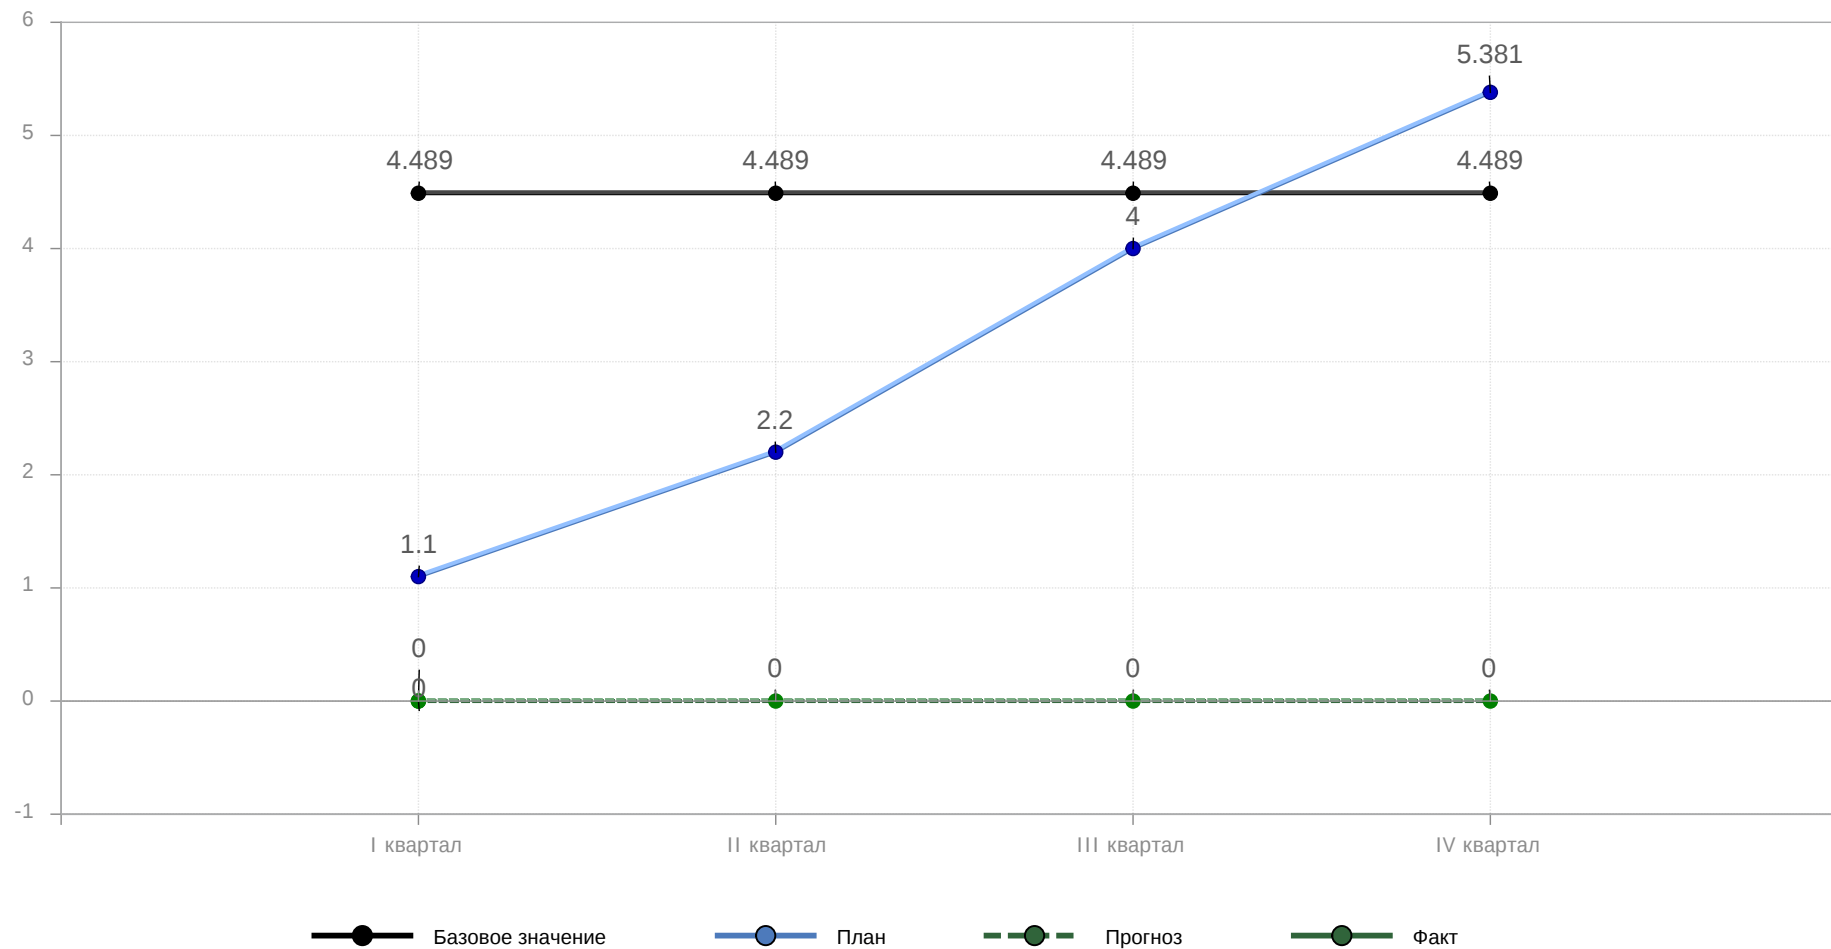


Рис. 1. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

Диаграмма достижения показателя

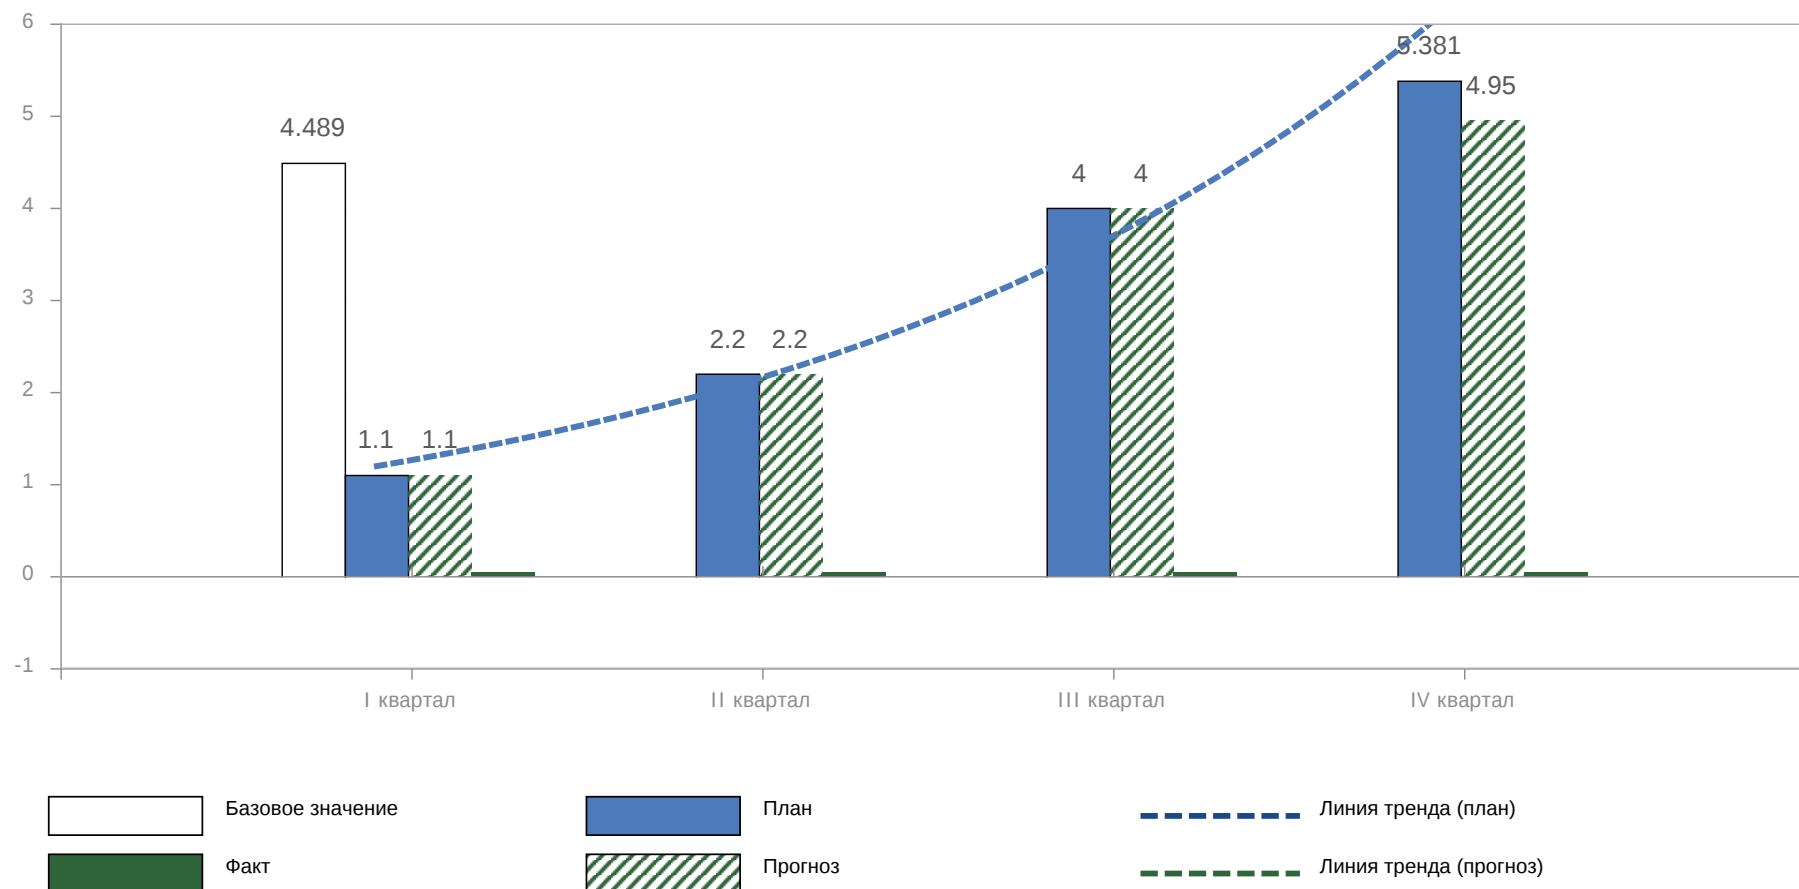


Рис. 2. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

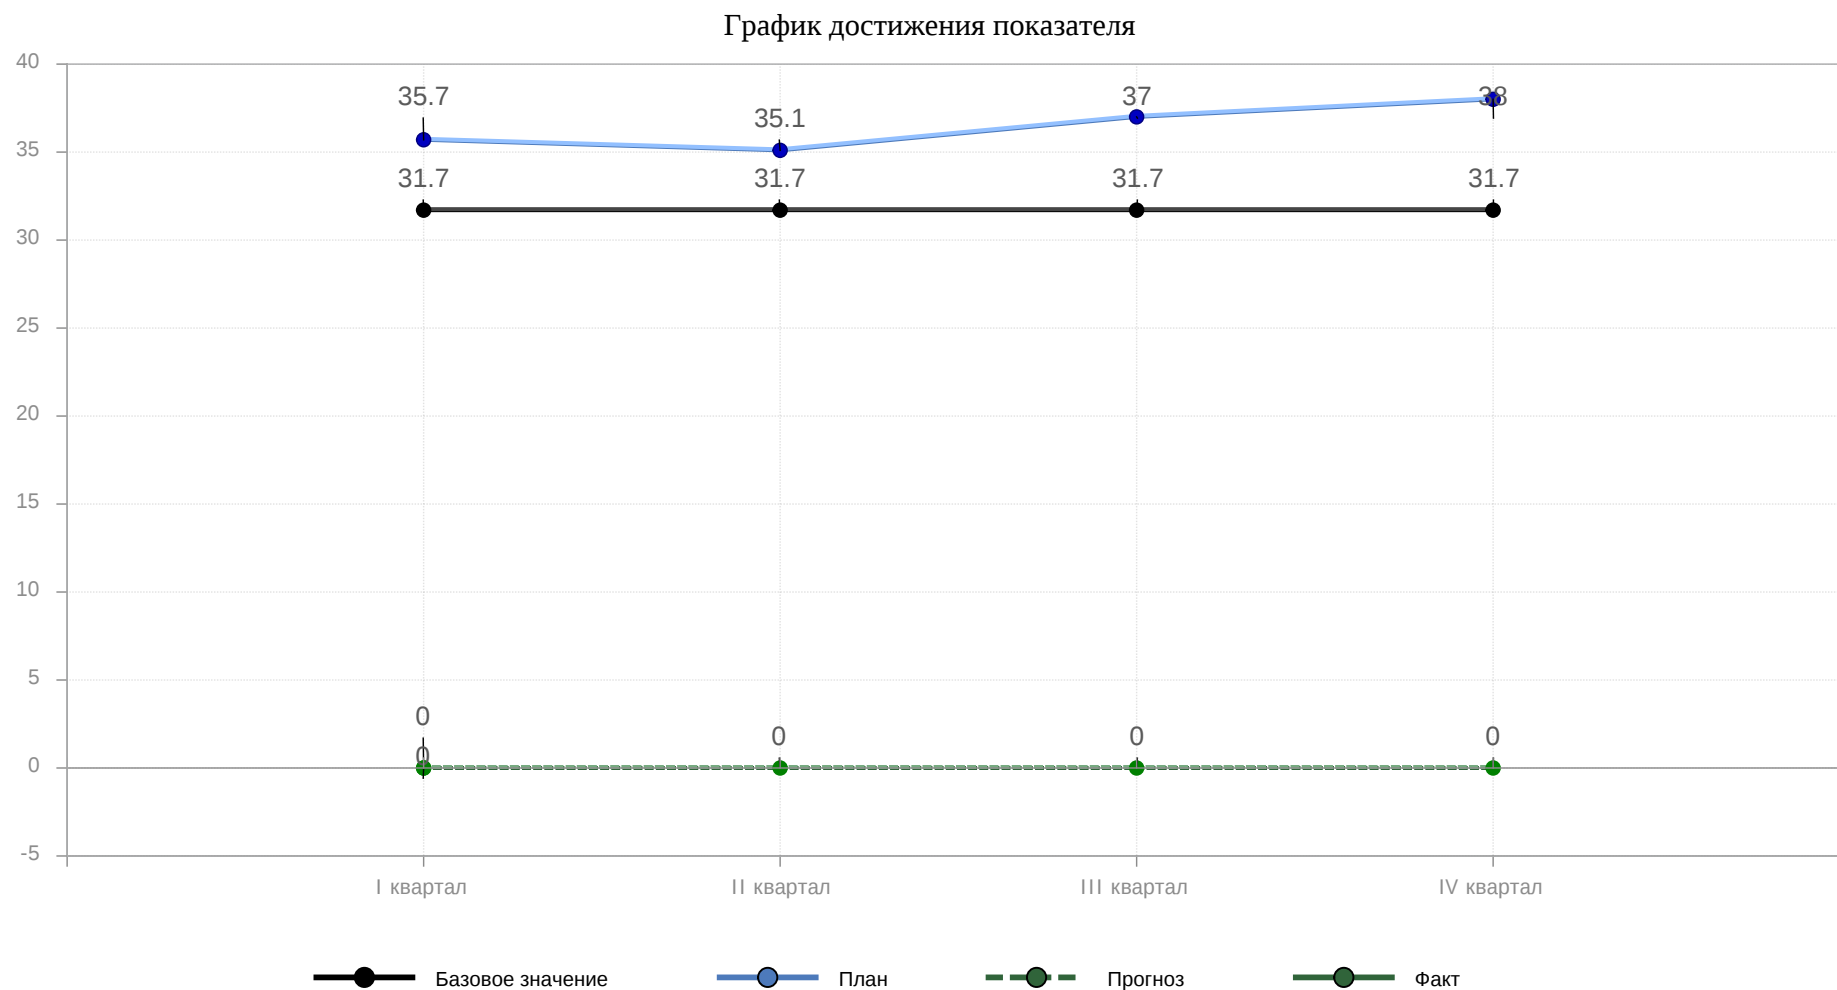


Рис. 3. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %

Диаграмма достижения показателя

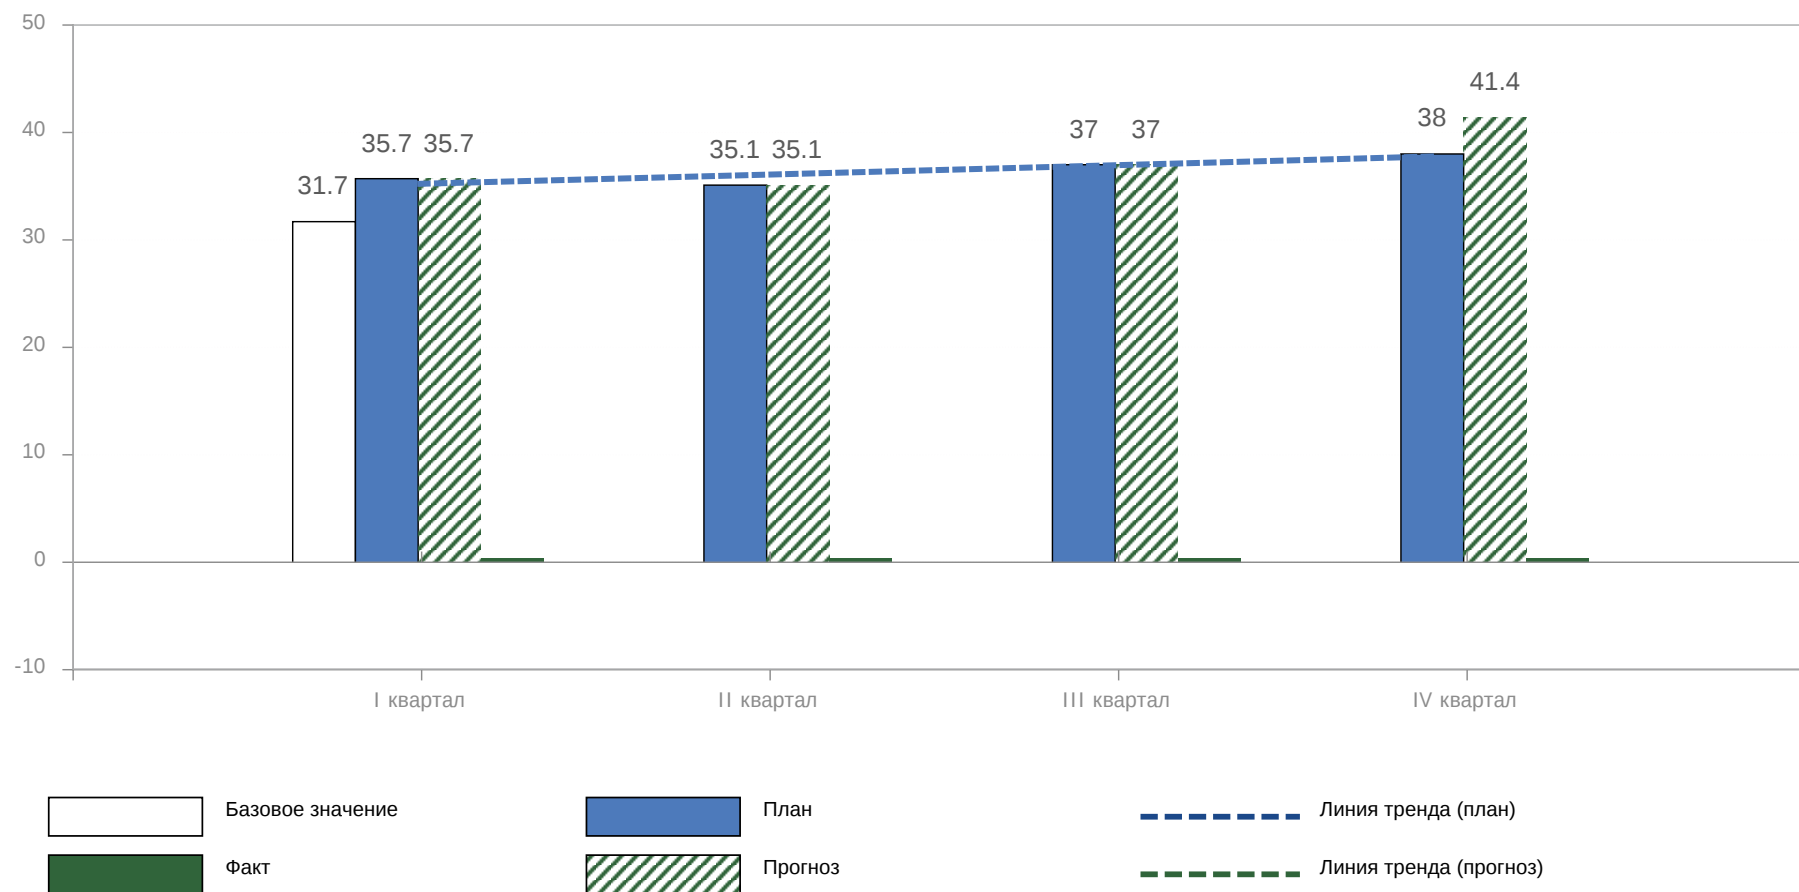


Рис. 4. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %

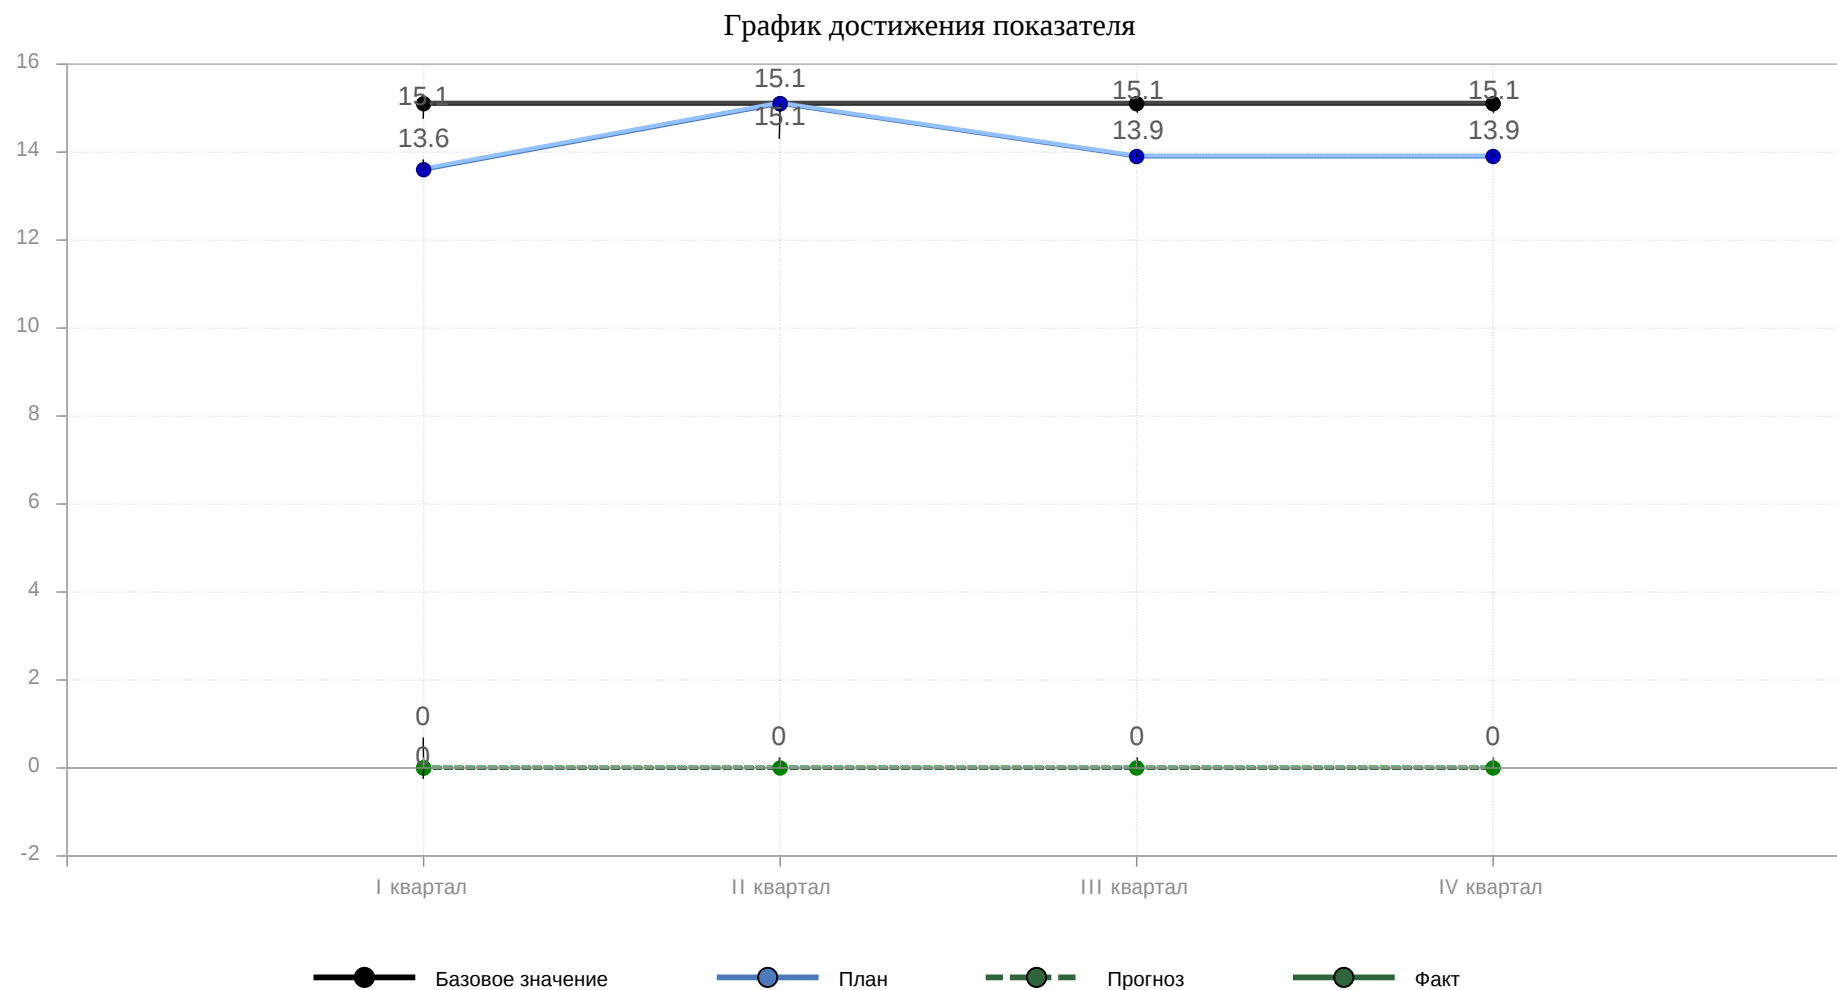


Рис. 5. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

Диаграмма достижения показателя

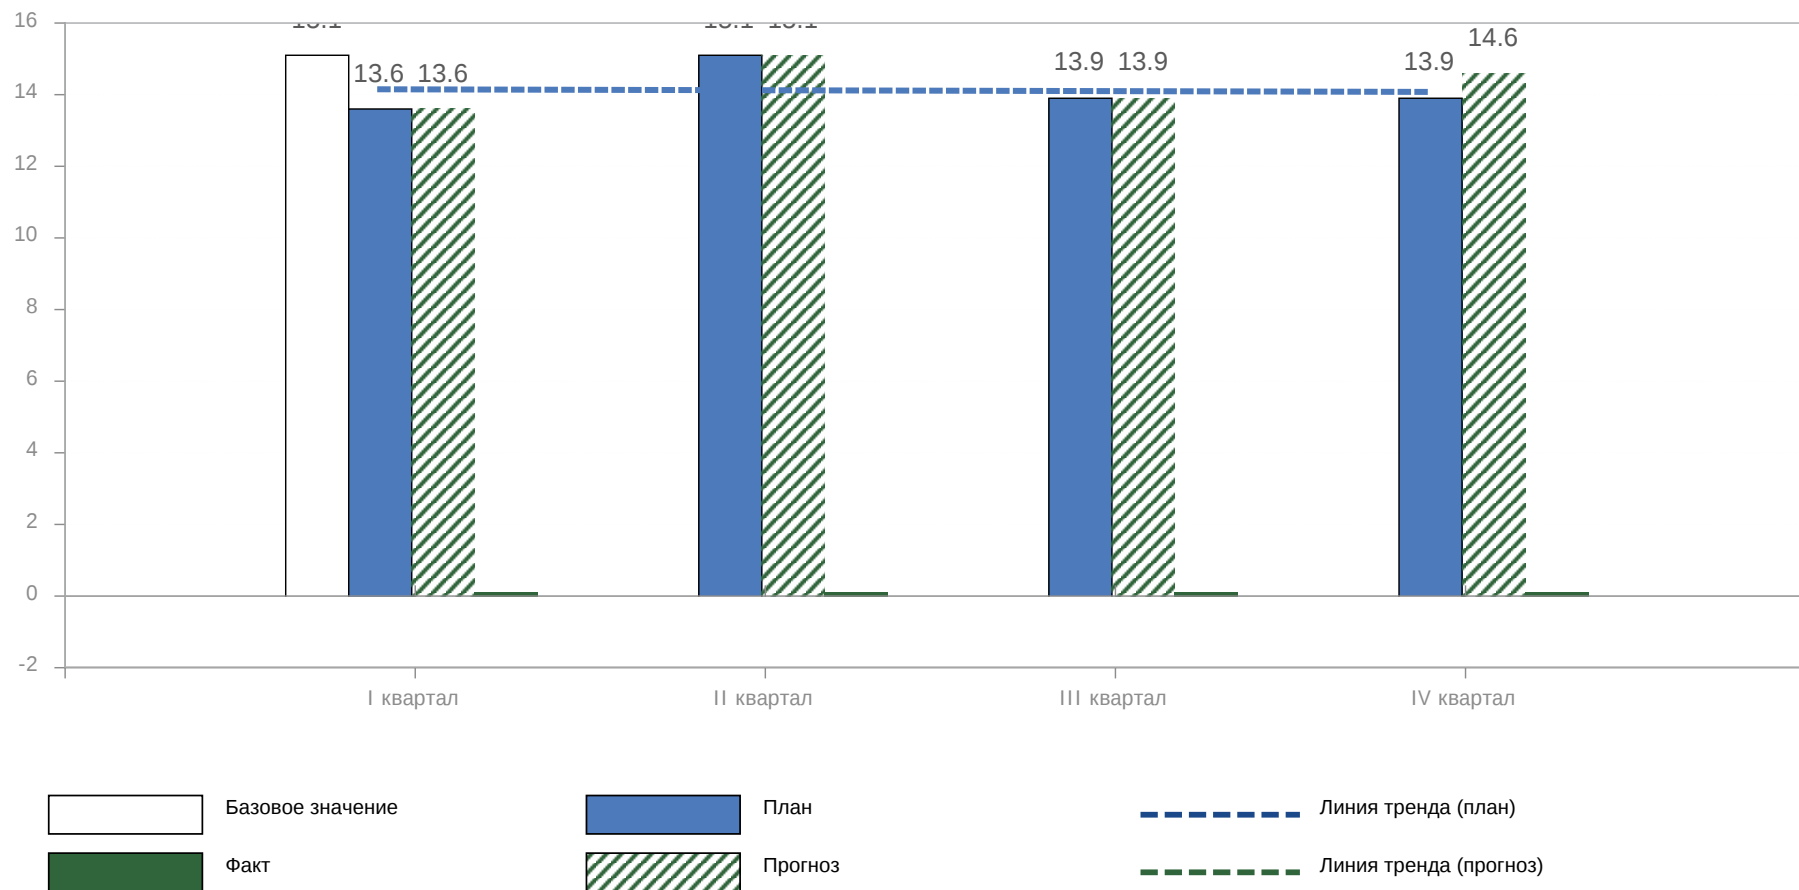


Рис. 6. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

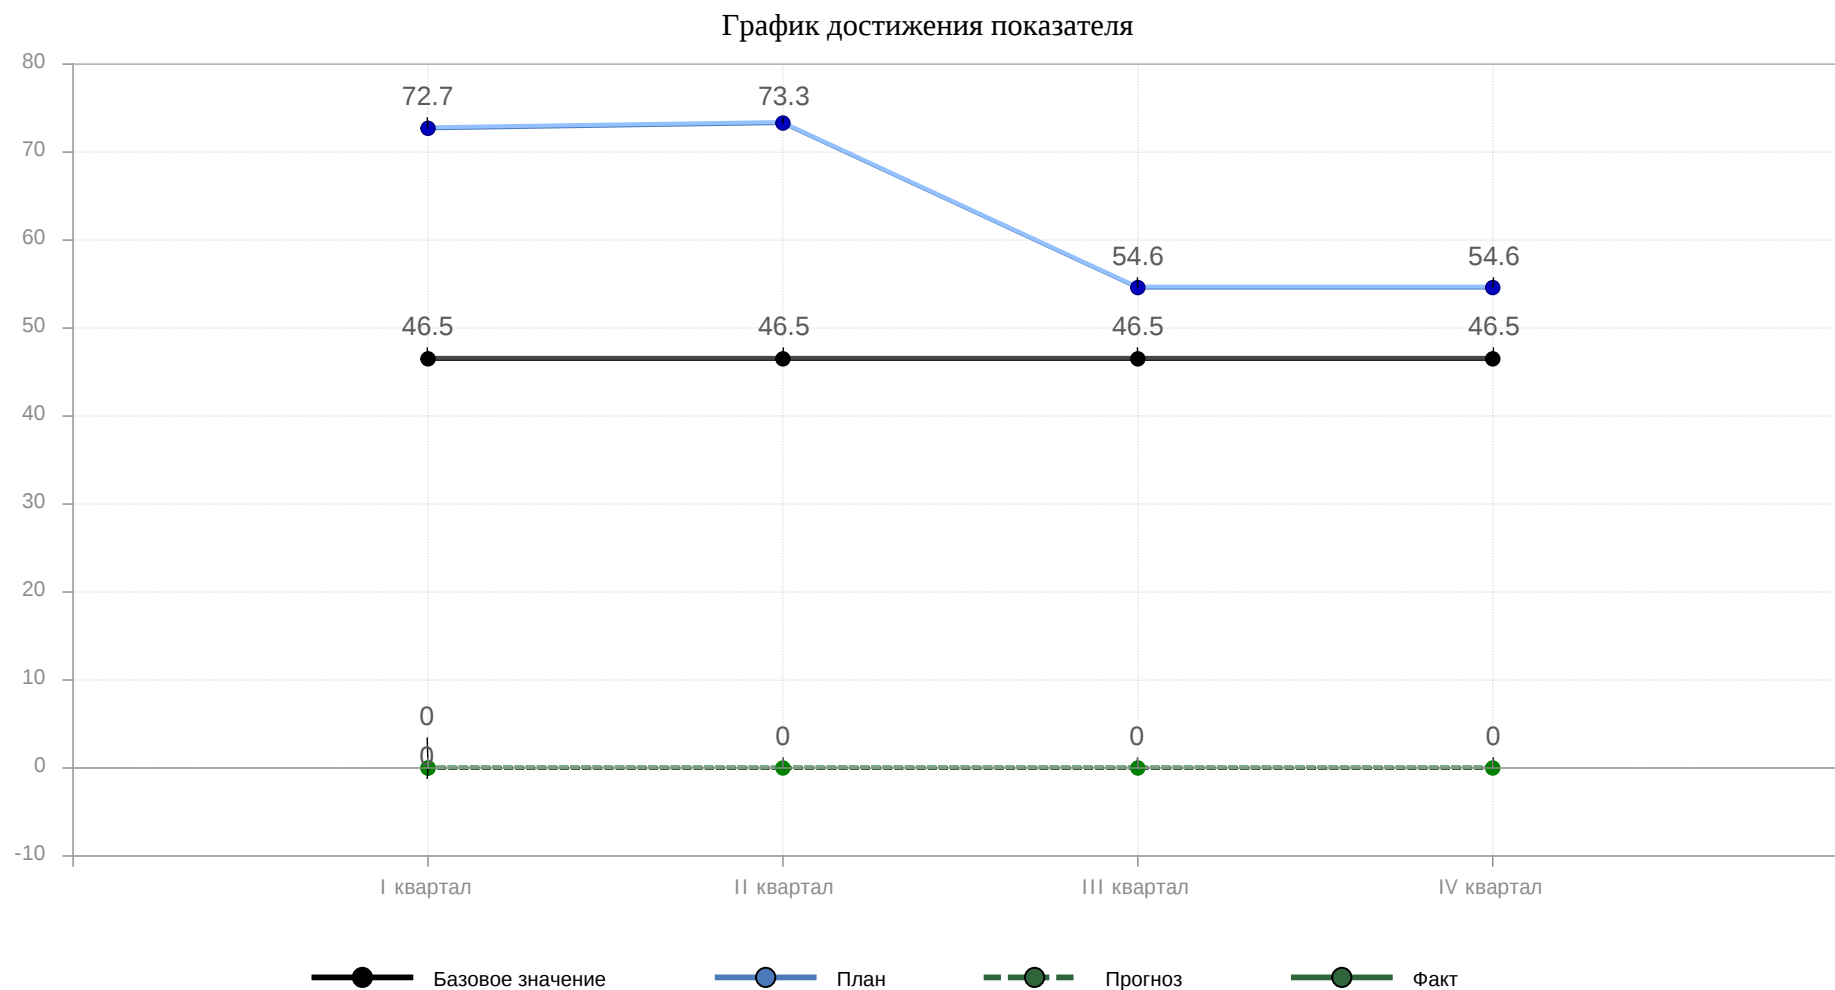


Рис. 7. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %

Диаграмма достижения показателя

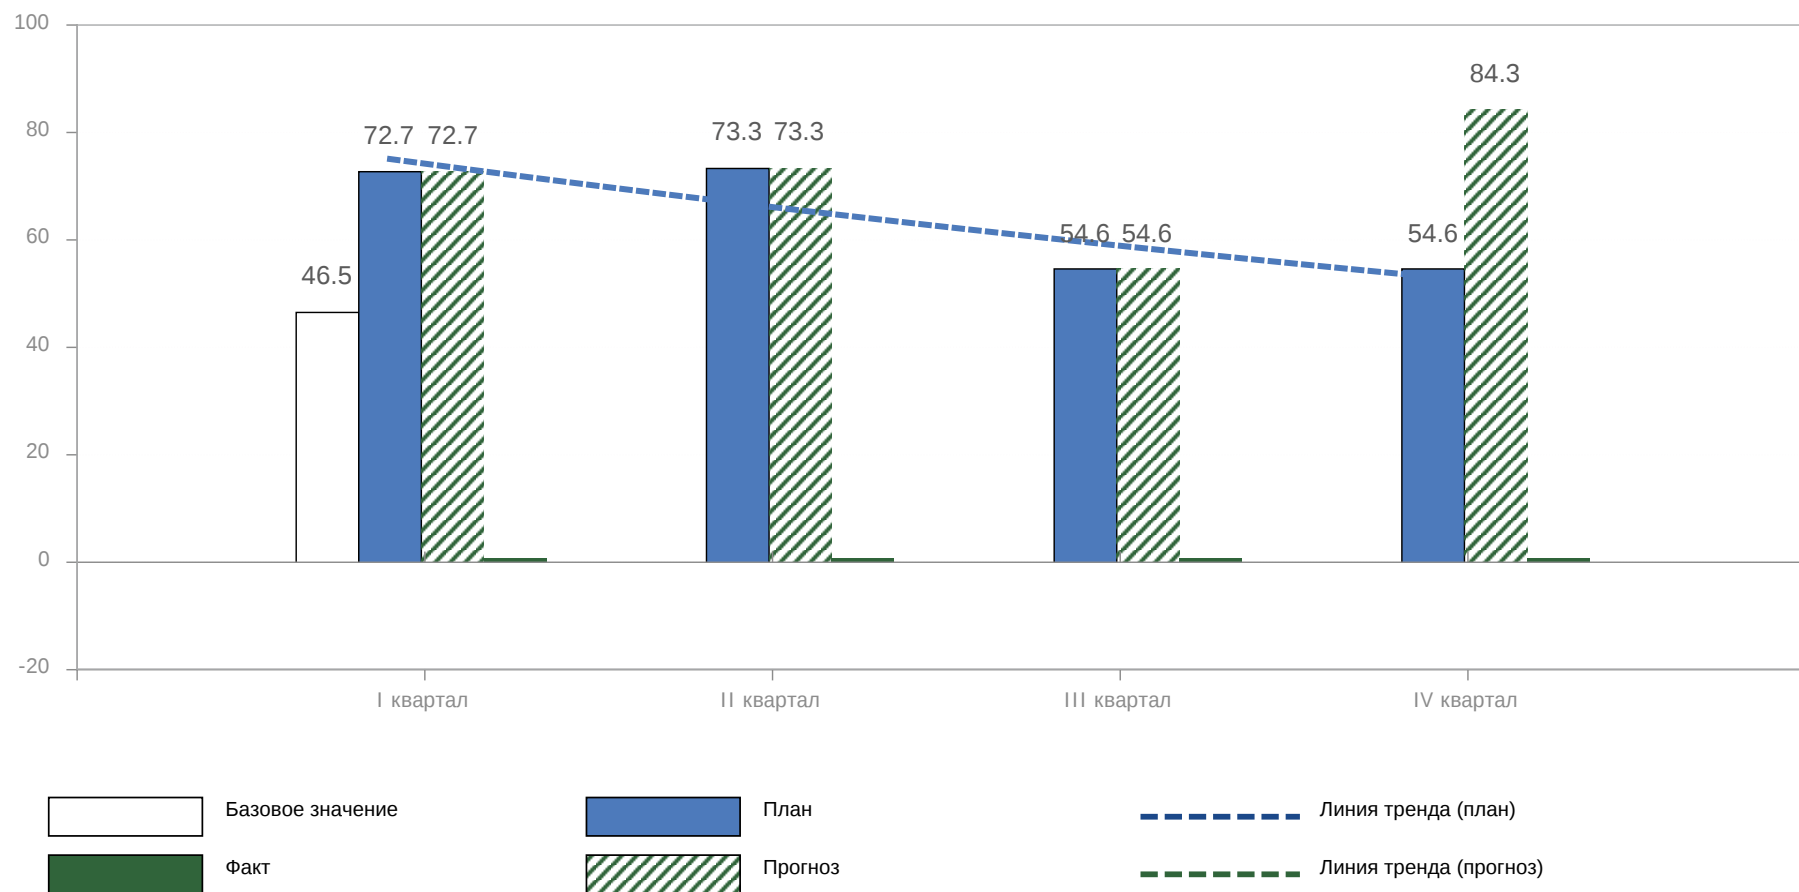


Рис. 8. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %

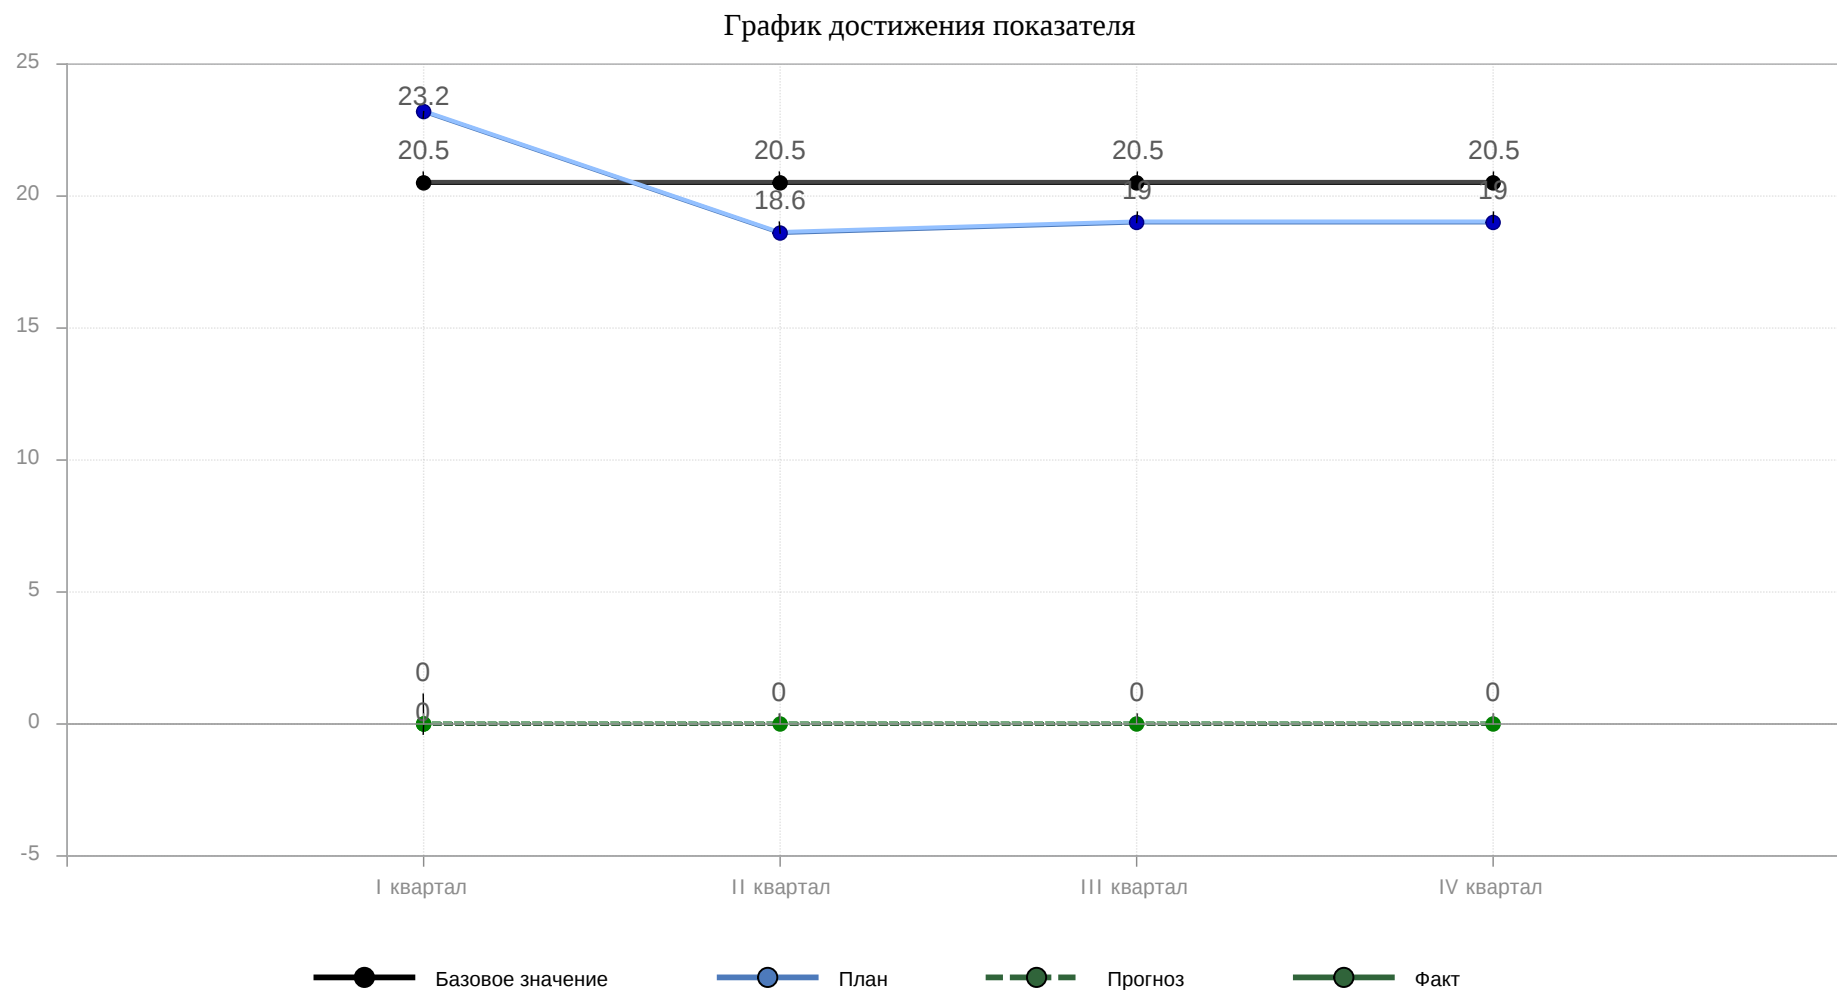


Рис. 9. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

Диаграмма достижения показателя

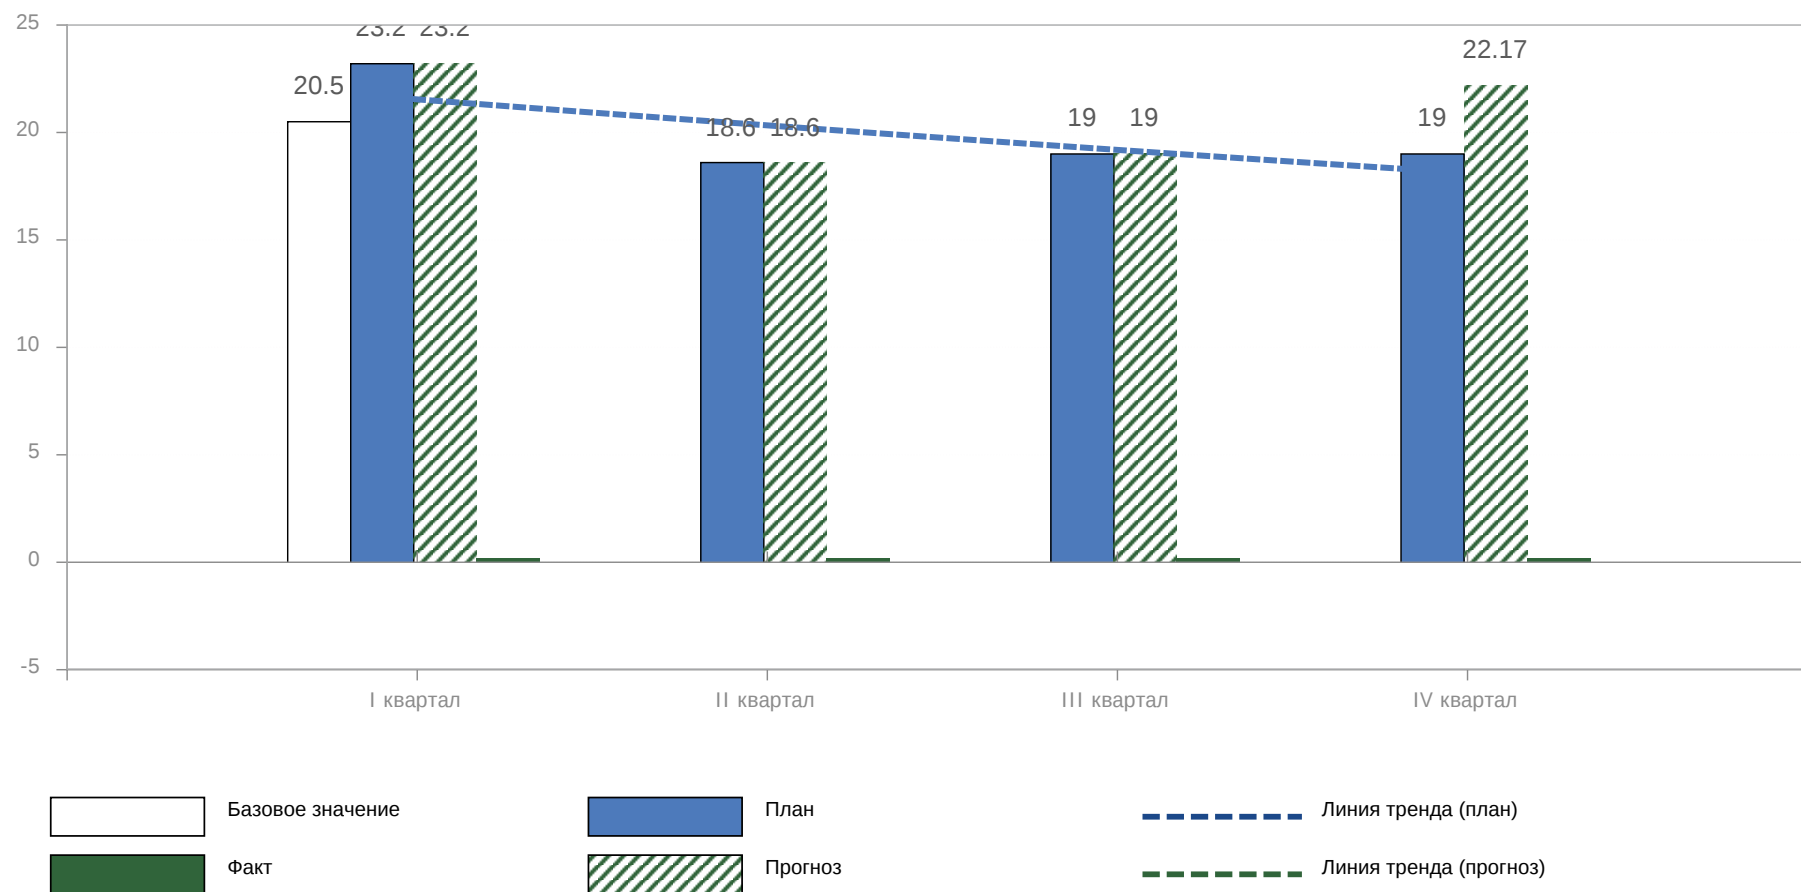


Рис. 10. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

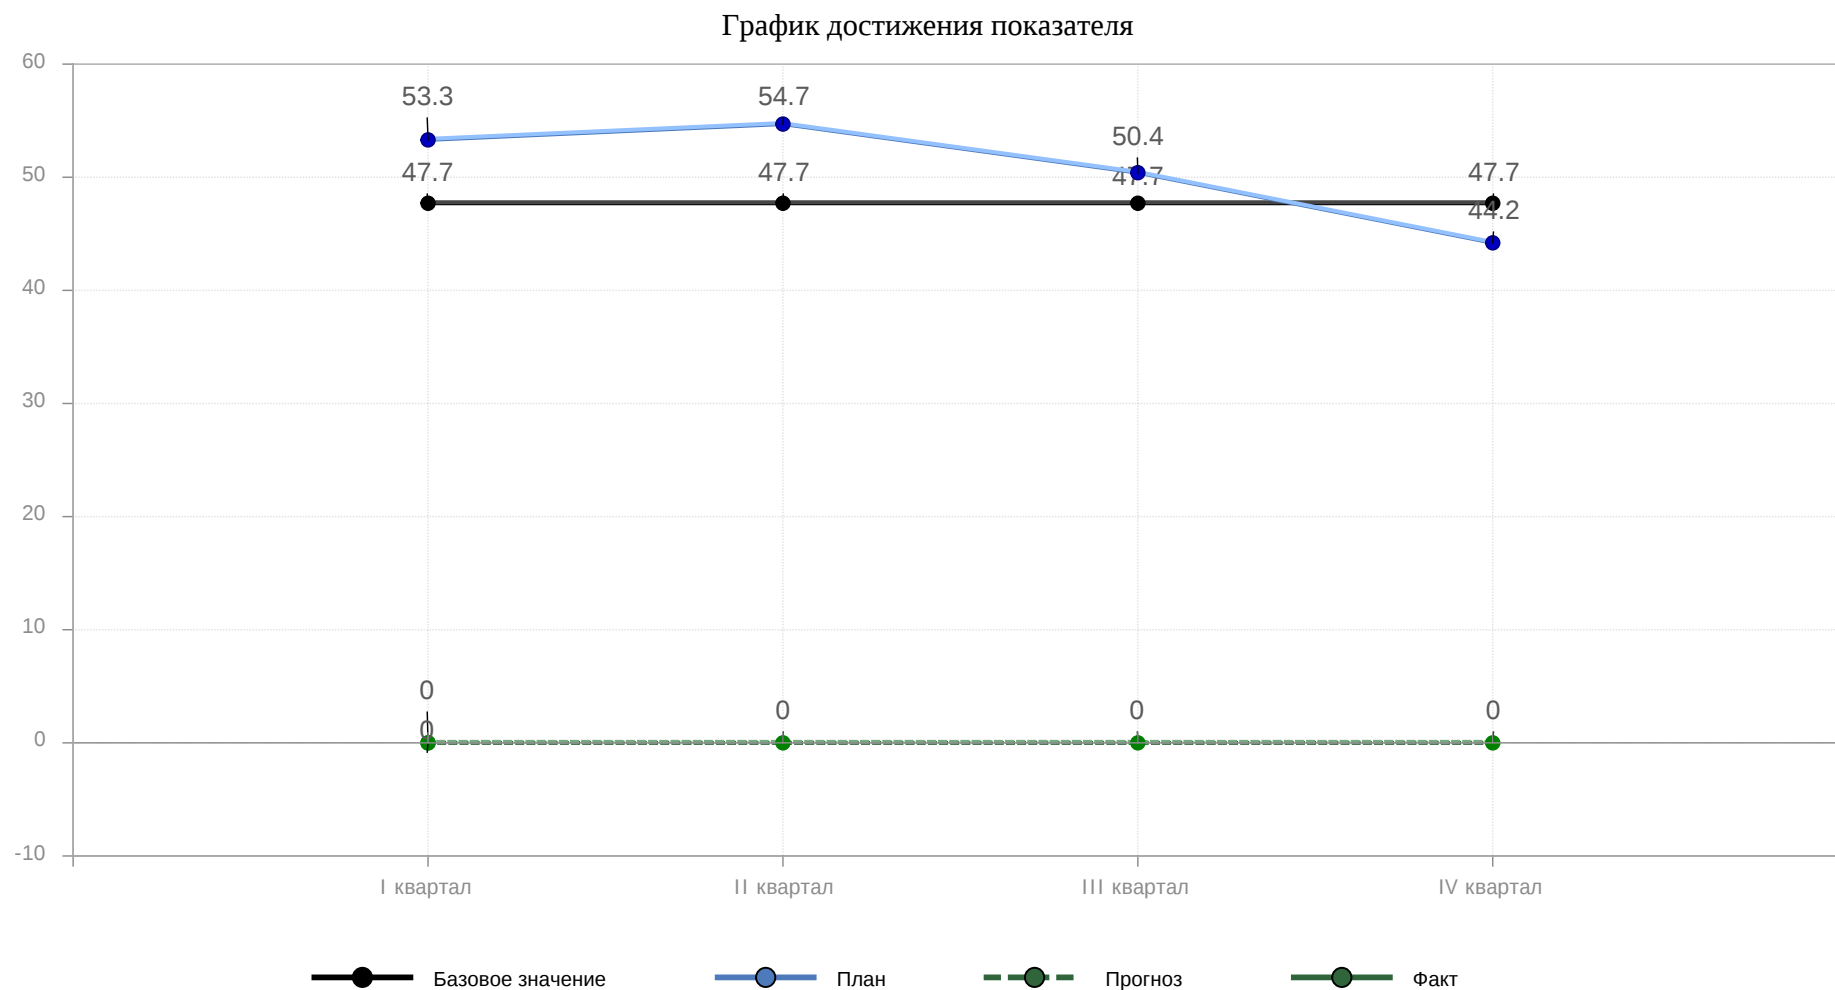


Рис. 11. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

Диаграмма достижения показателя

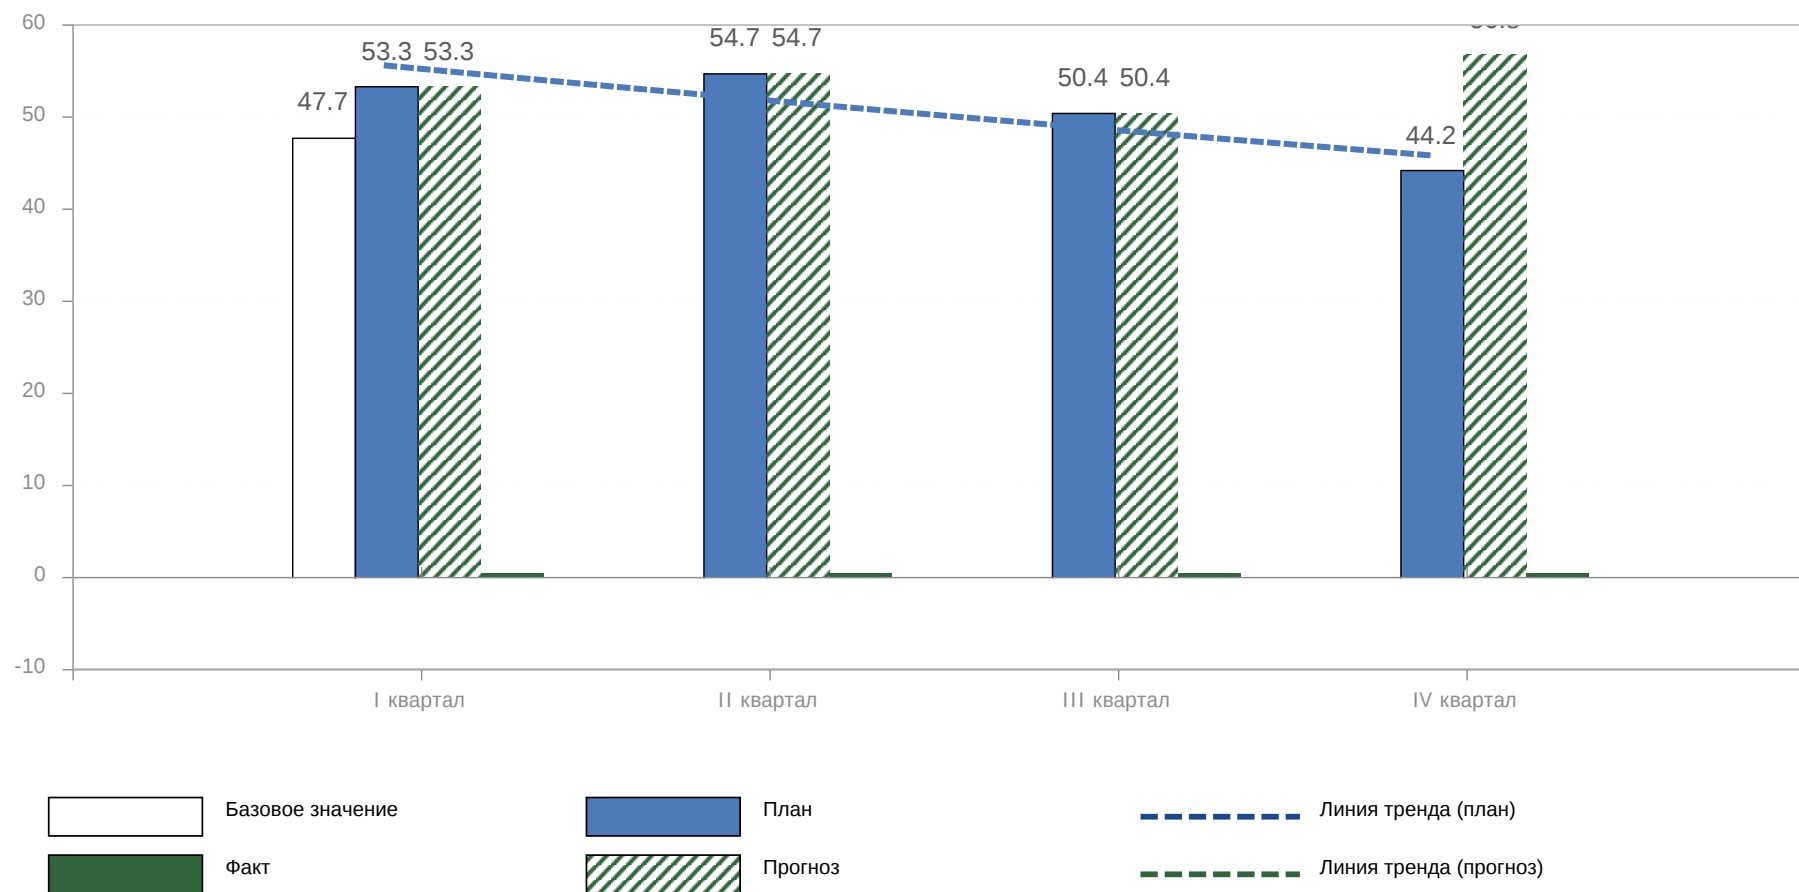


Рис. 12. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

График достижения показателя

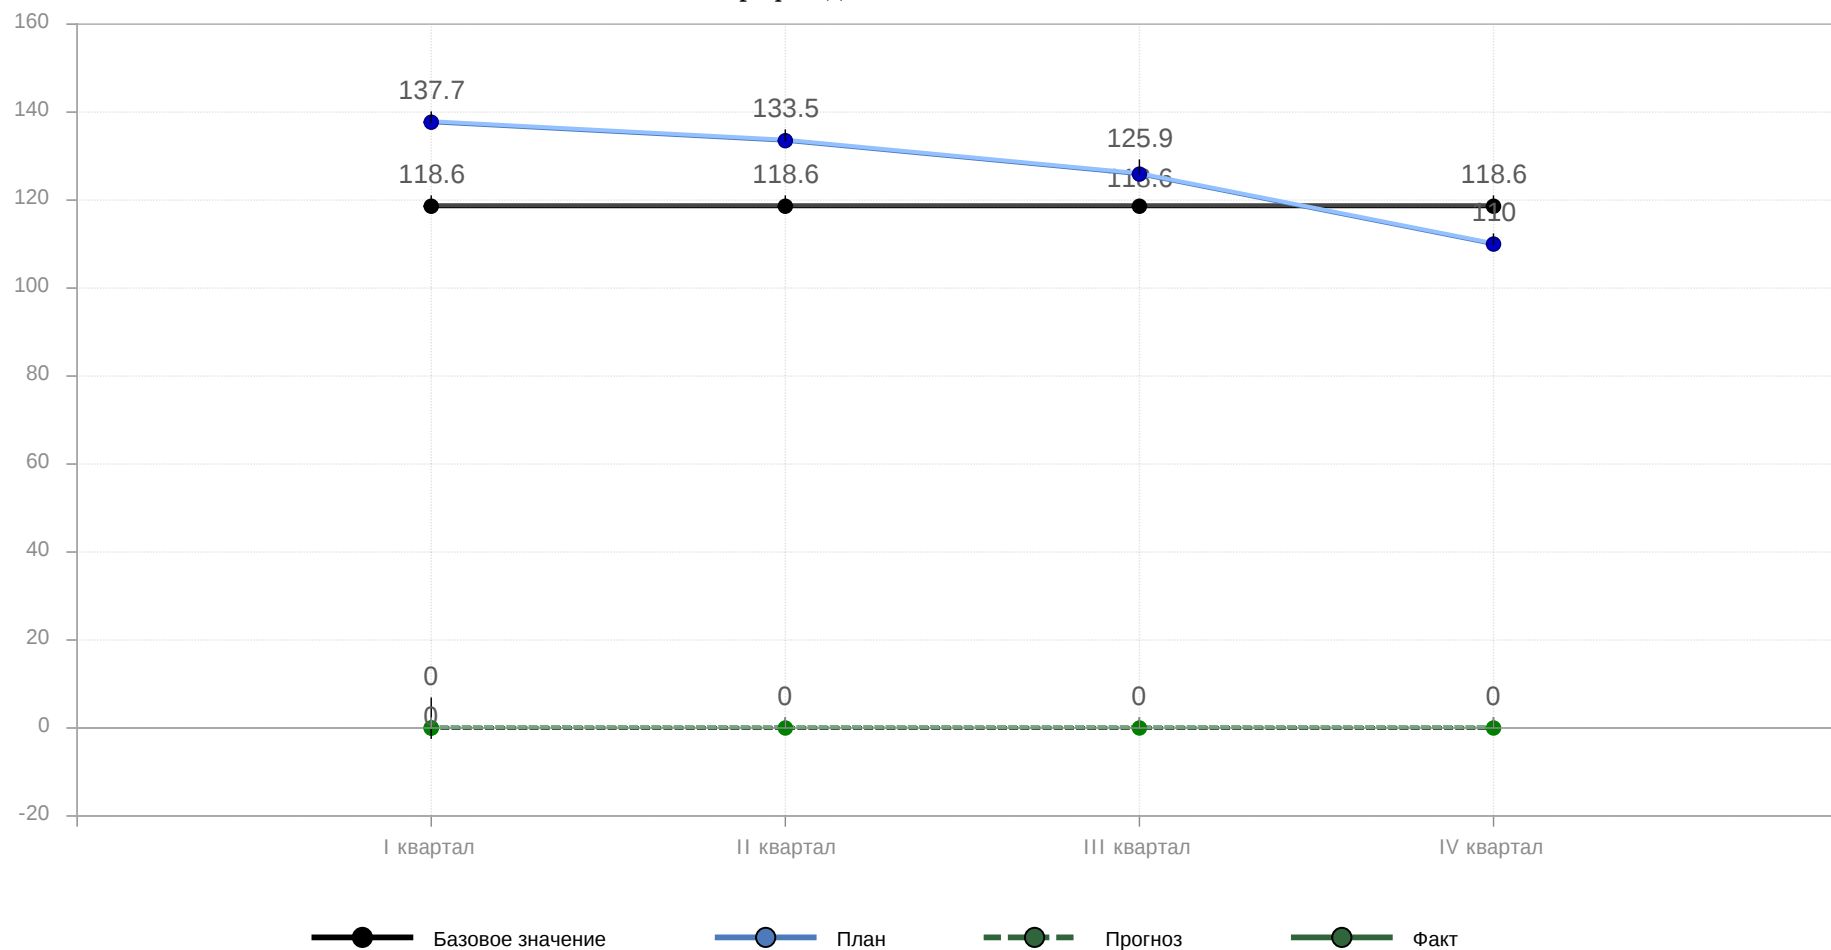


Рис. 13. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

Диаграмма достижения показателя

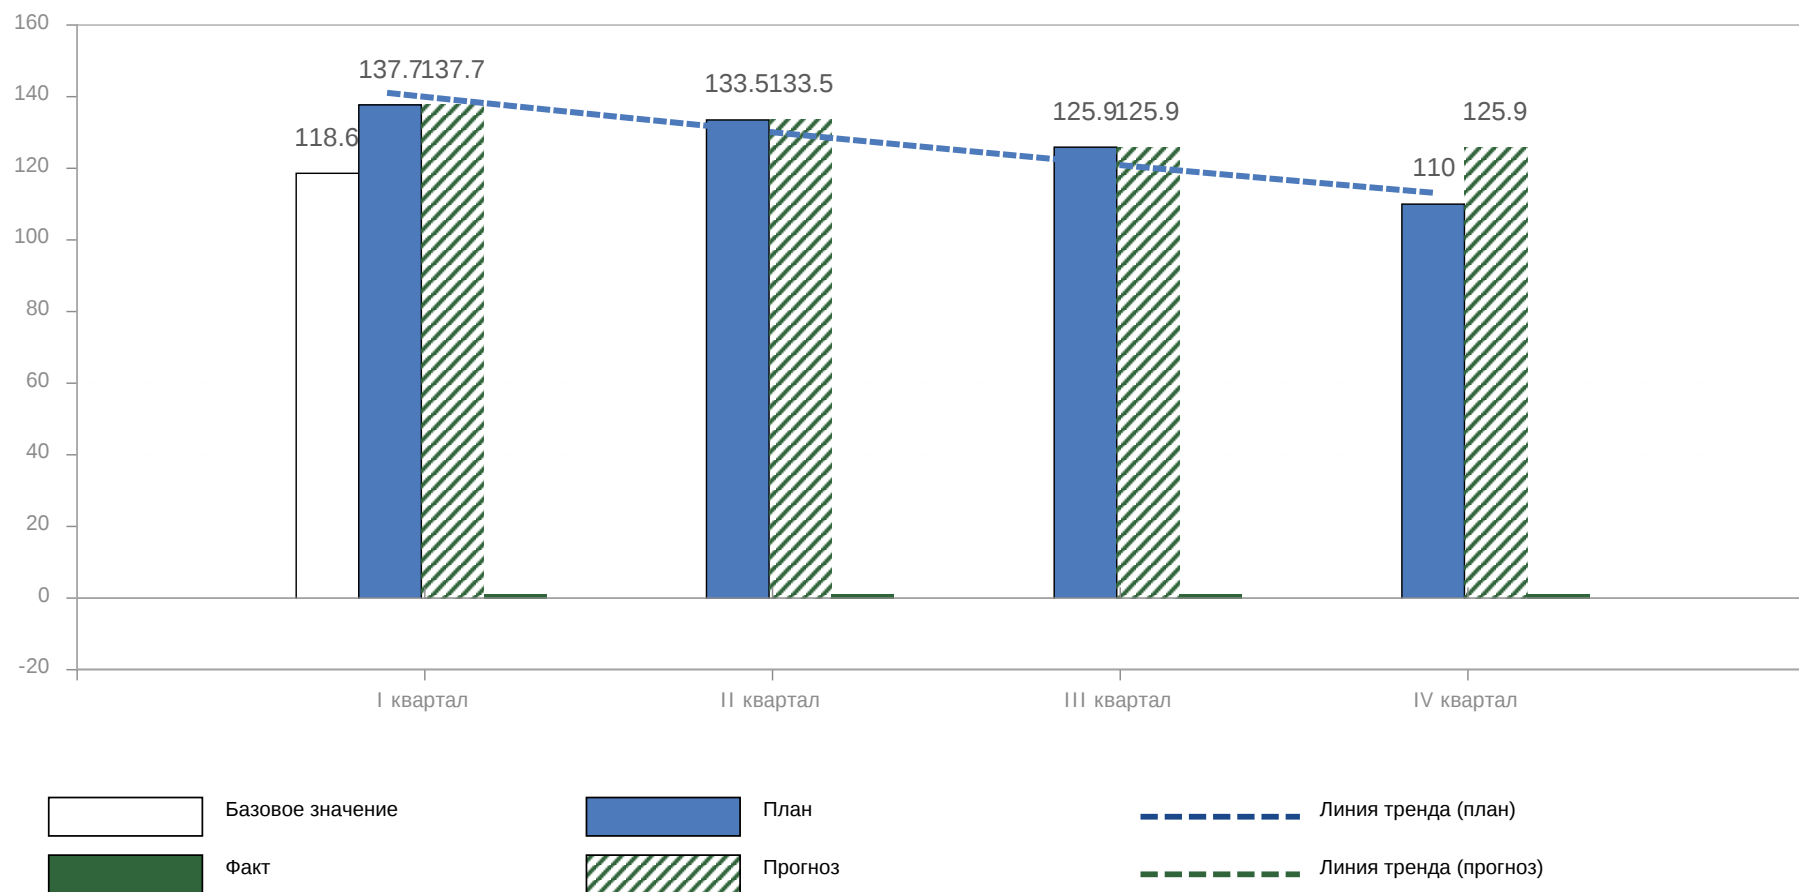


Рис. 14. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения
