
(подпись)

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД
" (GA-32) Сохранение лесов (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Наличие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Уточняющий отчет в части показателей, результатов, контрольных точек и финансового исполнения.

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1		3. Цели и показатели	Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения, Причина риска: В целях обеспечения на территории Кузбасса Федерального закона от 19.07.2018 № 212-ФЗ в осенний лесокультурный период 2019 года высев семян на лесных питомниках Кузбасса был увеличен. , Вероятность: 50%, Последствия наступления: Суточные: В 2019 году закуплено и заготовлено 6,4765 т. семян лесных растений. В рамках исполнения на территории Кузбасса выполнения работ по компенсационному лесовосстановлению и лесоразведению высев семян на лесных питомниках увеличен, что привело к риску формирования 100% исполнения по данному показателю.	1. В 2020 году предусмотреть дополнительное формирование запаса семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения (53,7 кг), срок исполнения 31.12.2020;

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.537	0	0.047	5.822	1.157	1.2107	95,56%	Подтверждающие документы: 1. "Форма отчета 11-ОИП за 2019 год" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 13.02.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по Кемеровской области" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения, Причина риска: В целях обеспечения на территории Кузбасса Федерального закона от 19.07.2018 № 212-ФЗ в осенний лесокультурный период 2019 года высев семян на лесных питомниках Кузбасса был увеличен. , Вероятность: 50%, Суточные: В 2019 году закуплено и заготовлено 6,4765 т.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
											семян лесных растений. В рамках выполнения на территории Кузбасса работ по компенсационному лесовосстановлению и лесоразведению высев семян на лесных питомниках увеличен, что привело к риску формирования 100% исполнения по данному показателю. Предлагаемые решения: 1. В 2020 году предусмотреть дополнительное формирование запаса семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения (53,7 кг), срок исполнения 31.12.2020.
2		Площадь лесовосстановления и лесоразведения	Тысяча гектаров	8.2252	0	1.0565	3.5737	9.0991	7.3483	123,83%	Подтверждающие документы: 1. "Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 24.01.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция Кемеровская область за январь-декабрь 2019 года" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 27.01.2020г. №б/н, приложен файл.
3		Ущерб от лесных пожаров по годам	Миллион рублей	0	0	4.5393	4.5393	4.5393	5.1	112,35%	Подтверждающие документы: 1. "Форма отчета 7-ОИП за январь-декабрь 2019 года" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 09.01.2020г. №б/н, приложен файл.
4		Площадь погибших лесных насаждений	Тысяча гектаров	0.01	0	0	0	0.0015	0.3	20000,00 %	Подтверждающие документы: 1. "Форма отчета 10-ОИП Кемеровская область за январь-декабрь 2019 года" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 23.01.2020г. №б/н, приложен файл.
5		Количество выращенного посадочного материала лесных растений	Миллион штук	2.03	0	0	0	4.9352	4.9352	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "11-ОИП, раздел 3 "Сведения о закладке лесных культур по породам, заготовке семян лесных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
											растений и выращивании посадочного материала"" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 13.02.2020г. №б/н, приложен файл.
6		Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Процент	51.7	0	7.7	26	66.5	53.7	123,84%	Подтверждающие документы:1. "Форма отчета 12-ОИП по Кемеровской области за январь-декабрь 2018 года" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 25.01.2019г. №б/н, приложен файл.2. "Форма отчета 10-ОИП по Кемеровской области за январь-декабрь 2018 года" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 23.01.2019г. №б/н, приложен файл.3. "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция Кемеровская область за январь-декабрь 2019 года" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 27.01.2020г. №б/н, приложен файл.Обращение в службу тех. поддержки УНП по показателям (№ 188513)
7		Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Процент	53.7	0	7.7	26	66.5	53.7	123,84%	Подтверждающие документы:1. "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция Кемеровская область за январь-декабрь 2019 года" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 27.01.2020г. №б/н, приложен файл.2. "Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода " Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 24.01.2020г. №б/н, приложен файл.3. "Форма отчета 12-ОИП по Кемеровской области за январь-декабрь 2018 года" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 25.01.2019г. №б/н, приложен файл.4. "Форма отчета 10-ОИП по Кемеровской области за январь-декабрь 2018



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
											года" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 23.01.2019г. №б/н, приложен файл.
8		Ущерб от лесных пожаров	Миллион рублей	0	0	4.5393	4.5393	4.5393	5.1	112,35%	Подтверждающие документы: 1. "Форма отчета 7-ОИП за январь-декабрь 2019 года" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 09.01.2020г. №б/н, приложен файл. Обращение в службу тех. поддержки УНП по показателям (№ 188513).
9		Площадь погибших лесных насаждений	Тысяча гектаров	0.01	0	0	0	0.0015	0.3	20000,00 %	Подтверждающие документы: 1. "Форма отчета 10-ОИП_Кемеровская область за январь-декабрь 2019 года" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 23.01.2020г. №б/н, приложен файл. Обращение в службу тех. поддержки УНП по показателям (№ 188513).
10		Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0.537	0	0.047	5.822	1.157	1.2107	95,56%	Подтверждающие документы: 1. "Форма отчета 11-ОИП за 2019 год, раздел 4 "Сведения об обороте репродуктивного материала лесных растений, используемого для целей воспроизводства лесов и лесоразведения"" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 13.02.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по Кемеровской области" Иное Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения, Причина риска: В целях обеспечения на территории Кузбасса Федерального закона от 19.07.2018 № 212-ФЗ в осенний лесокультурный период 2019 года высев семян на лесных питомниках Кузбасса был увеличен., Вероятность: 50%, Сутевые: В 2019 году закуплено и заготовлено 6,4765 т. семян лесных растений. В рамках исполнения на территории Кузбасса



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
											выполнения работ по компенсационному лесовосстановлению и лесоразведению высева семян на лесных питомниках увеличен, что привело к риску формирования 100 % исполнения по данному показателю. Предлагаемые решения: 1. В 2020 году предусмотреть дополнительное формирование запаса семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения (53,7 кг), срок исполнения 31.12.2020. Обращение в службу тех. поддержки УНП по показателям (№ 188513).
11		Площадь лесовосстановления и лесоразведения	Тысяча гектаров	8.2252	0	1.0565	3.5737	9.0991	7.3483	123,83%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция Кемеровская область за январь-декабрь 2019 года" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 27.01.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 24.01.2020г. №б/н, приложен файл. Обращение в службу тех. поддержки УНП по показателям (№ 188513).
12		Количество выращенного посадочного материала лесных растений	Миллион штук	2.03	0	0	0	4.9352	4.9352	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Форма отчета 11-ОИП, раздел 3 "Сведения о закладке лесных культур по породам, заготовке семян лесных растений и выращивании посадочного материала" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 13.02.2020г. №б/н, приложен файл. Обращение в службу тех. поддержки УНП по показателям (№ 188513).



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений




Сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²


Бюджет субъекта
на 2019 год
Всего: 162 411,60 тыс. руб

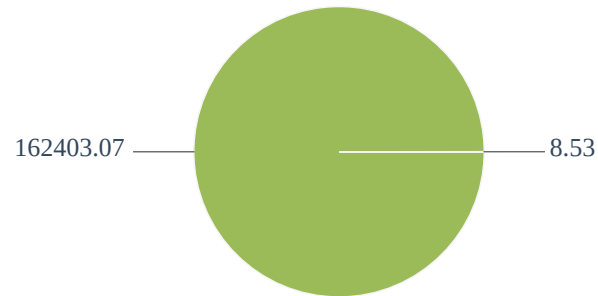

Сводный бюджет МО
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2019 год
Всего: 51 222,80 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	2 263,90	2 263,90	2 263,90	2 261,50	2 261,50	99,89	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 263,90	2 263,90	2 263,90	2 261,50	2 261,50	99,89	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 263,90	2 263,90	2 263,90	2 261,50	2 261,50	99,89	По итогам проведенных в 2019 году торгов сложилась экономия в размере 2,4 тыс. рублей. Денежные средства возвращены в федеральный бюджет.
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(04) Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	36 709,20	0,00	0,00	0,00	36 709,20	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	36 709,20	0,00	0,00	0,00	36 709,20	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(05) Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду	31 370,70	26 599,10	26 599,10	26 599,10	31 370,70	100,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	26 599,10	26 599,10	26 599,10	26 599,10	26 599,10	100,00	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	26 599,10	26 599,10	26 599,10	26 599,10	26 599,10	100,00	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		внебюджетные источники	4 771,60	0,00	0,00	0,00	4 771,60	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		(06) Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	133 548,60	133 548,60	133 548,60	133 542,47	133 542,47	100,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	133 548,60	133 548,60	133 548,60	133 542,47	133 542,47	100,00	
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	133 548,60	133 548,60	133 548,60	133 542,47	133 542,47	100,00	По итогам проведенных в 2019 году торгов сложилась экономия в размере 6,13 тыс. рублей. Денежные средства возвращены в федеральный бюджет. Риск неисполнения бюджета отсутствует
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		(09) Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	9 742,00	0,00	0,00	0,00	9 742,00	100,00	
5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2		внебюджетные источники	9 742,00	0,00	0,00	0,00	9 742,00	100,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			213 634,40	162 411,60	162 411,60	162 403,07	213 625,87	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			162 411,60	162 411,60	162 411,60	162 403,07	162 403,07	99,99	
бюджет субъекта Российской Федерации			162 411,60	162 411,60	162 411,60	162 403,07	162 403,07	99,99	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			51 222,80	0,00	0,00	0,00	51 222,80	100,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021	
2		Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду Значение: 3,6270 Дата: 31.12.2021	
3		Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров Значение: 87,0000 Дата: 31.12.2021	
4		Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений Значение: 1,3350 Дата: 31.12.2021	
5		Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках Значение: 3,8730 Дата: 31.12.2021	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены





Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Яковлев Максим Николаевич	Информация по значению результата: В работе.Прогнозный срок реализации - 31.12.2021 Предоставлена информация : 0 из 50.
1.1.	РРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2019	31.12.2019	Яковлев Максим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Отчет, подтверждающий исполнение по данной контрольной точке, датирован 27.01.2020. Срок формирования отчетной документации утвержден на федеральном уровне. В связи с тем, что система ЭБ не принимает дату документа больше, чем дата исполнения (31.12.2019), то в карточке "Подтверждающие сведения" дата указана 31.12.2019.
1.1.1	РРП		Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	01.04.2019	01.04.2019	Шашкова Дина Викторовна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проект технического задания" Прочий тип документа Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 14.02.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							2. "Проект технического задания" Прочий тип документа Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 14.02.2019г. №б/н, приложен файл. 3. "Проект технического задания" Прочий тип документа Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 14.02.2019г. №б/н, приложен файл.
1.1.2	РРП		Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)	31.12.2019	31.12.2019	Нехорошкова Екатерина Сергеевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Товарная накладная_плуг ПЛ-1_1 шт." Накладная Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 19.12.2019г. №57, приложен файл. 2. "Товарная накладная_КЛБ-1,7_1 шт." Накладная Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 19.11.2019г. №259, приложен файл. 3. "Товарная накладная_труба для сеянцев_20 шт." Накладная Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 25.11.2019г. №021, приложен файл.
2.			<i>Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду Значение: 3,6270 Дата: 31.12.2021</i>	31.12.2021	31.12.2021	Яковлев Максим Николаевич	Информация по значению результата: В работе.Прогнозный срок реализации - 31.12.2021 Предоставлена информация : 0 из 3.627.
2.1.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.03.2019	28.11.2018	Яковлев Максим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания Комиссии Федерального агентства лесного хозяйства по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период о

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок Кемеровской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" Прочий тип документа Федерального агентства лесного хозяйства от 28.11.2018г. №ИВ-13/221-пр, приложен файл.
2.1.1	РНП		Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду (защита бюджетных проектировок)	01.03.2019	28.11.2018	Яковлев Максим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания Комиссии Федерального агентства лесного хозяйства по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок Кемеровской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" Прочий тип документа Федерального агентства лесного хозяйства от 28.11.2018г. №ИВ-13/221-пр, приложен файл.
2.2.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Яковлев Максим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Отчет, подтверждающий исполнение по данной контрольной точке, датирован - 27.01.2020. Срок формирования отчетной документации утвержден на федеральном уровне. В связи с тем, что система ЭБ не принимает дату документа больше, чем дата исполнения 31.12.2019, то в карточке "Подтверждающие сведения" дата указана 31.12.2019.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							
2.2.1	РНП		Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2019	31.12.2019	Яковлев Максим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом" Сводная информация Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 26.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 25.10.2019г. №б/н, приложен файл. Форма отчета 1-субвенции за 2019 год формируется 25.01.2020 года
2.3.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.03.2020	01.03.2020	Яковлев Максим Николаевич	В работе. Отклонения отсутствуют
2.3.1	РНП		Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду (защита бюджетных проектировок)	01.03.2020	01.03.2020	Яковлев Максим Николаевич	В работе. Защита бюджетных проектировок состоялась в ноябре 2019 года. Протокол в ДЛК КО по состоянию на 10.01.2020 не поступил.
3.			Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров Значение: 87,0000 Дата: 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Яковлев Максим Николаевич	Информация по значению результата: В работе. Прогнозный срок реализации - 31.12.2021 Предоставлена информация : 0 из 87.
							

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1.	РРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2019	31.12.2019	Яковлев Максим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Отчет, подтверждающий исполнение по данной контрольной точке, датирован - 27.01.2020. Срок формирования отчетной документации утвержден на федеральном уровне. В связи с тем, что система ЭБ не принимает дату документа больше, чем дата исполнения 31.12.2019, то в карточке "Подтверждающие сведения" дата указана 31.12.2019.
3.1.1	РРП		Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	01.04.2019	01.04.2019	Шашкова Дина Викторовна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проект технического задания" Прочий тип документа Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 18.01.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Проект технического задания" Прочий тип документа Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 18.01.2019г. №б/н, приложен файл. 3. "Проект технического задания" Прочий тип документа Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 18.01.2019г. №б/н, приложен файл. 4. "Проект технического задания" Прочий тип документа Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 18.01.2019г. №б/н, приложен файл. 5. "Проект технического задания" Прочий тип документа Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 18.01.2019г. №б/н, приложен файл. 6. "Проект технического задания" Прочий тип документа

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 18.01.2019г. №б/н, приложен файл. 7. "Проект технического задания" Прочий тип документа Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 15.01.2019г. №б/н, приложен файл. 8. "Проект технического задания" Прочий тип документа Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 18.01.2019г. №б/н, приложен файл. 9. "Проект технического задания" Прочий тип документа Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 18.01.2019г. №б/н, приложен файл. 10. "Проект технического задания" Прочий тип документа Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 18.01.2019г. №б/н, приложен файл. 11. "Проект технического задания" Прочий тип документа Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 15.01.2019г. №б/н, приложен файл.
3.1.2	РРП		Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)	31.12.2019	31.12.2019	Нехорошкова Екатерина Сергеевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Универсальный передаточный документ_МЛПК_6 шт." Прочий тип документа Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 18.11.2019г. №00005, приложен файл. 2. "Универсальный передаточный документ_бензопила_1 шт." Прочий тип документа Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 20.12.2019г. №30, приложен файл. 3. "Товарная накладная_полуприцеп-тяжеловоз_1 шт." Накладная Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 23.12.2019г. №3354, приложен

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							файл. 4. "Универсальный передаточный документ_бензопила_7 шт." Прочий тип документа Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 20.12.2019г. №29, приложен файл. 5. "Товарная накладная_квадроцикл с прицепом_13 шт." Накладная Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 06.12.2019г. №3059, приложен файл. 6. "Универсальный передаточный документ_МЛПК_2 шт." Прочий тип документа Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 12.12.2019г. №00006, приложен файл. 7. "Товарная накладная_трактор колесный_5 шт." Накладная Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 09.12.2019г. №ВЭ00-000322, приложен файл. 8. "Универсальный передаточный документ_ранец противопожарный_26 шт." Прочий тип документа Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 17.12.2019г. №2665, приложен файл. 9. "Универсальный передаточный документ_аппарат зажигательный_11 шт." Прочий тип документа Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 17.12.2019г. №2664, приложен файл. 10. "Товарная накладная_ЛПК_10 шт." Накладная Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 10.12.2019г. №14, приложен файл.
4.			Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений Значение: 1,3350 Дата:	31.12.2021	31.12.2021	Яковлев Максим Николаевич	Информация по значению результата: В работе.Прогнозный срок реализации - 31.12.2021 Предоставлена информация : 0 из 1.335.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений




 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			31.12.2021				
4.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.10.2019	30.09.2019	Яковлев Максим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная ведомость учета урожая семян по Кемеровской области" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 30.09.2019г. №б/н, приложен файл.
4.1.1	РНП		Сбор аналитической информации по хозяйственновозможному сбору семян лесных растений	01.10.2019	30.09.2019	Яковлев Максим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативная отчетность (Сводная ведомость учета урожая семян в Кемеровской области за сентябрь 2019 года от 30.09.2019)" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 30.09.2019г. №б/н, приложен файл.
4.2.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Яковлев Максим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция (форма 1-субвенции)" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Форма отчета 11-ОИП" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. В связи с тем, что система ЭБ не принимает дату документа больше, чем дата исполнения 31.12.2019, то в карточке "Подтверждающие сведения" дата указана 31.12.2019. Фактически отчеты, подтверждающие исполнение по данной контрольной точке, датированы следующим образом: форма отчета 1-субвенция -

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							27.01.2020, форма отчета 11-ОИП - 13.02.2020.
4.2.1	РНП		Закупка и (или) заготовка семян лесных растений	31.12.2019	31.12.2019	Яковлев Максим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по Кемеровской области" Информационная справка Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Формы отчетов 1-субвенции и 11-ОИП за 2019 год формируются 25.01.2020 года
5.			<i>Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках Значение: 3,8730 Дата: 31.12.2021</i>	31.12.2021	31.12.2021	Яковлев Максим Николаевич	Информация по значению результата: В работе. Прогнозный срок реализации - 31.12.2021 Предоставлена информация : 0 из 3.873.
5.1.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.03.2019	28.11.2018	Яковлев Максим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания Комиссии Федерального агентства лесного хозяйства по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок по Кемеровской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" Прочий тип документа Федерального агентства лесного хозяйства от 28.11.2018г. №ИВ-13/221-пр, приложен файл.
5.1.1	РРП		Согласование объемных показателей по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, переданных в	01.03.2019	28.11.2018	Новицкая Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания Комиссии Федерального

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			аренду (защита бюджетных проектировок)				агентства лесного хозяйства по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок по Кемеровской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" Прочий тип документа Федерального агентства лесного хозяйства от 28.11.2018г. №ИВ-13/221-пр, приложен файл.
5.2.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Яковлев Максим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Отчет, подтверждающий исполнение по данной контрольной точке, датирован - 27.01.2020. Срок формирования отчетной документации утвержден на федеральном уровне. В связи с тем, что система ЭБ не принимает дату документа больше, чем дата исполнения 31.12.2019, то в карточке "Подтверждающие сведения" дата указана 31.12.2019.
5.2.1	РРП		Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2019	31.12.2019	Шашкова Дина Викторовна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом" Сводная информация Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 26.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации"

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Федерации, источником обеспечения которого является субвенция" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 25.10.2019г. №б/н, приложен файл. Форма отчета 1-субвенции за 2019 год формируется 25.01.2020 года
5.3.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.03.2020	01.03.2020	Яковлев Максим Николаевич	В работе. Отклонения отсутствуют
5.3.1	РРП		Согласование объемных показателей по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, переданных в аренду (защита бюджетных проектировок)	01.03.2020	01.03.2020	Новицкая Ирина Михайловна	В работе. Защита бюджетных проектировок состоялась в ноябре 2019 года. Протокол в ДЛК КО по состоянию на 10.01.2020 не поступил.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек

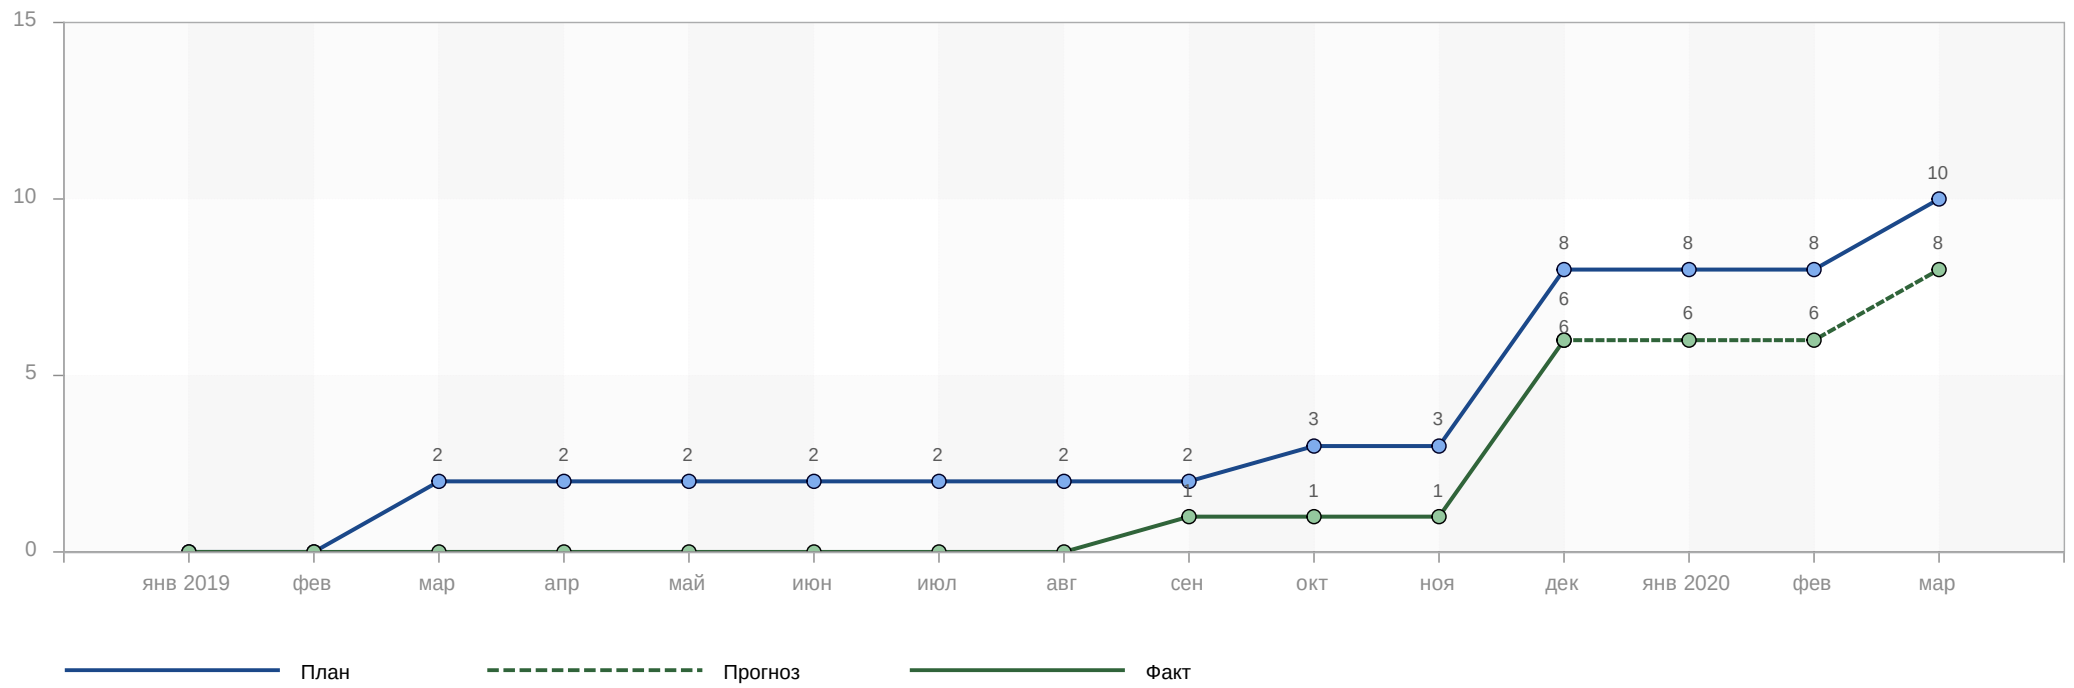


Рис. 1. " (GA-32) Сохранение лесов (Кемеровская область)"

График достижения показателя

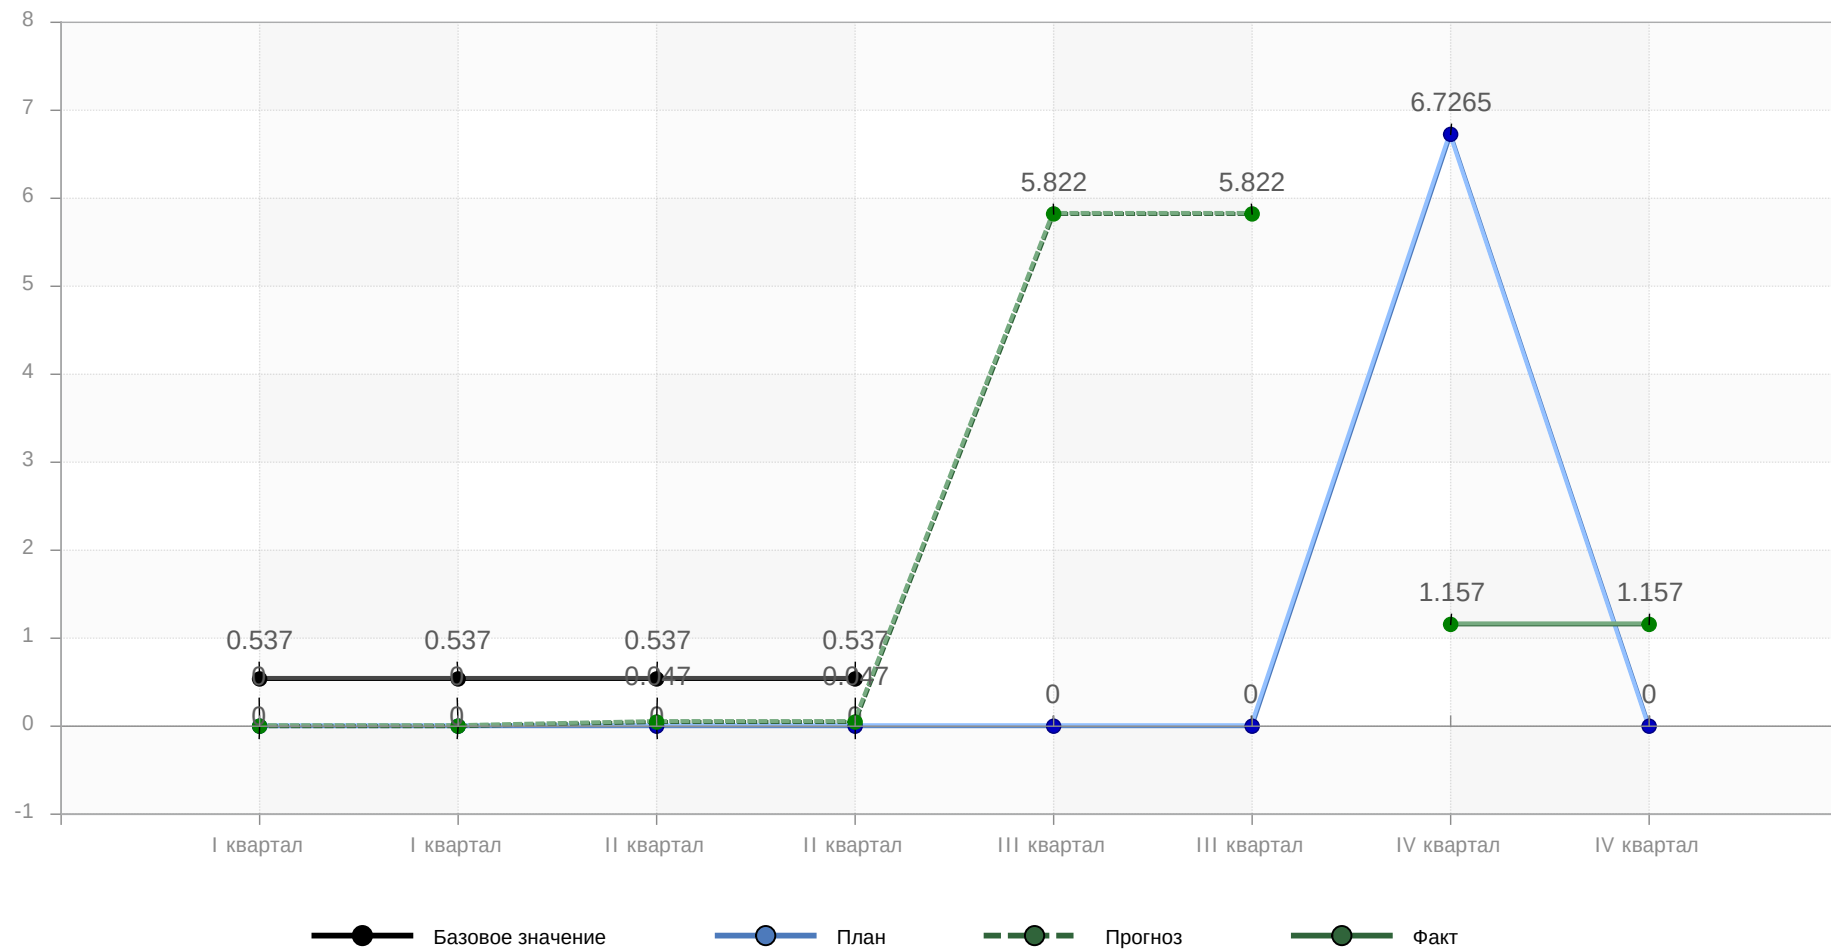


Рис. 1. Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения

Диаграмма достижения показателя

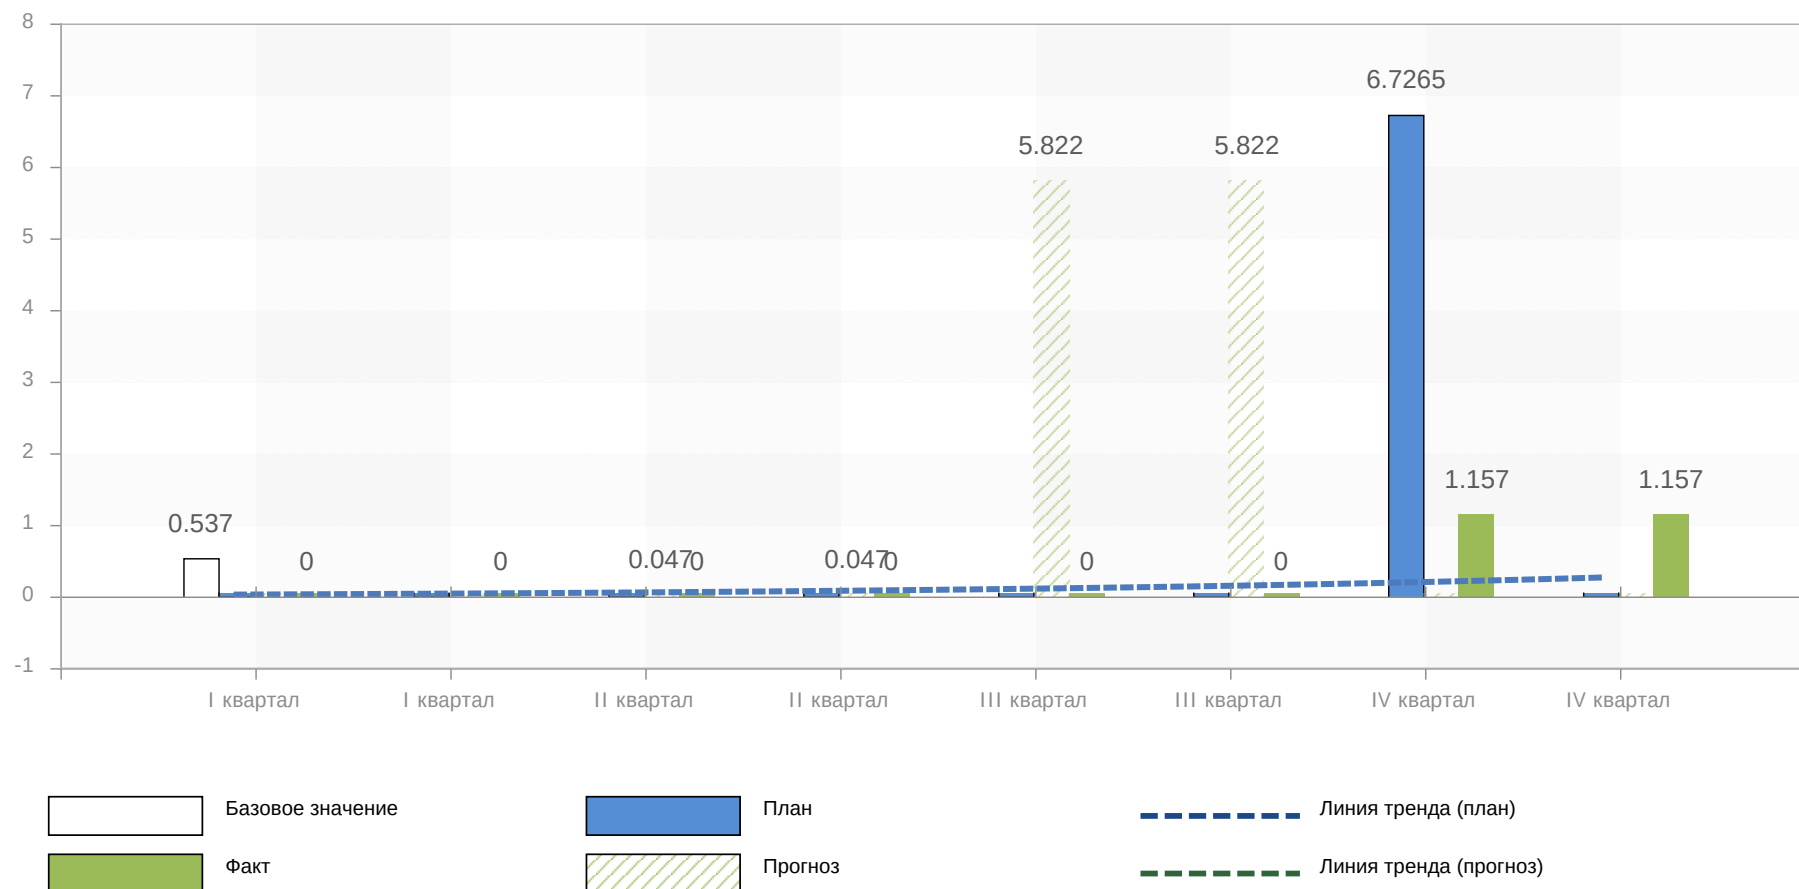


Рис. 2. Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения

График достижения показателя

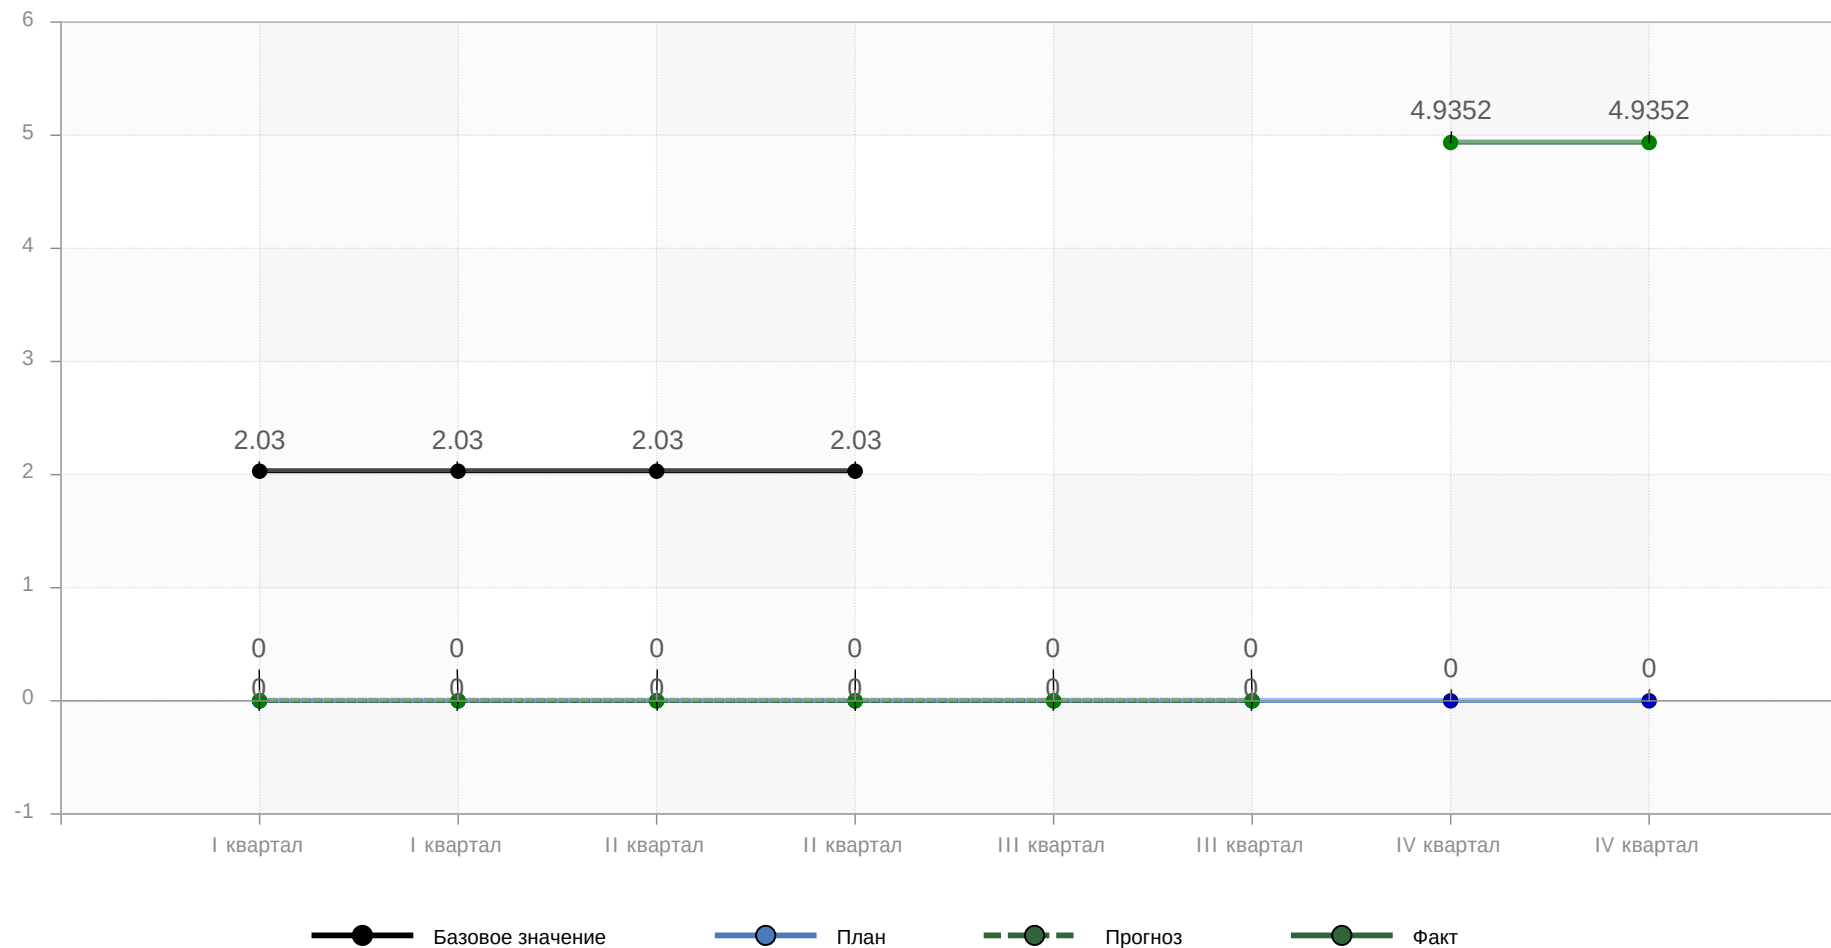


Рис. 3. Количество выращенного посадочного материала лесных растений

Диаграмма достижения показателя



Рис. 4. Количество выращенного посадочного материала лесных растений

График достижения показателя

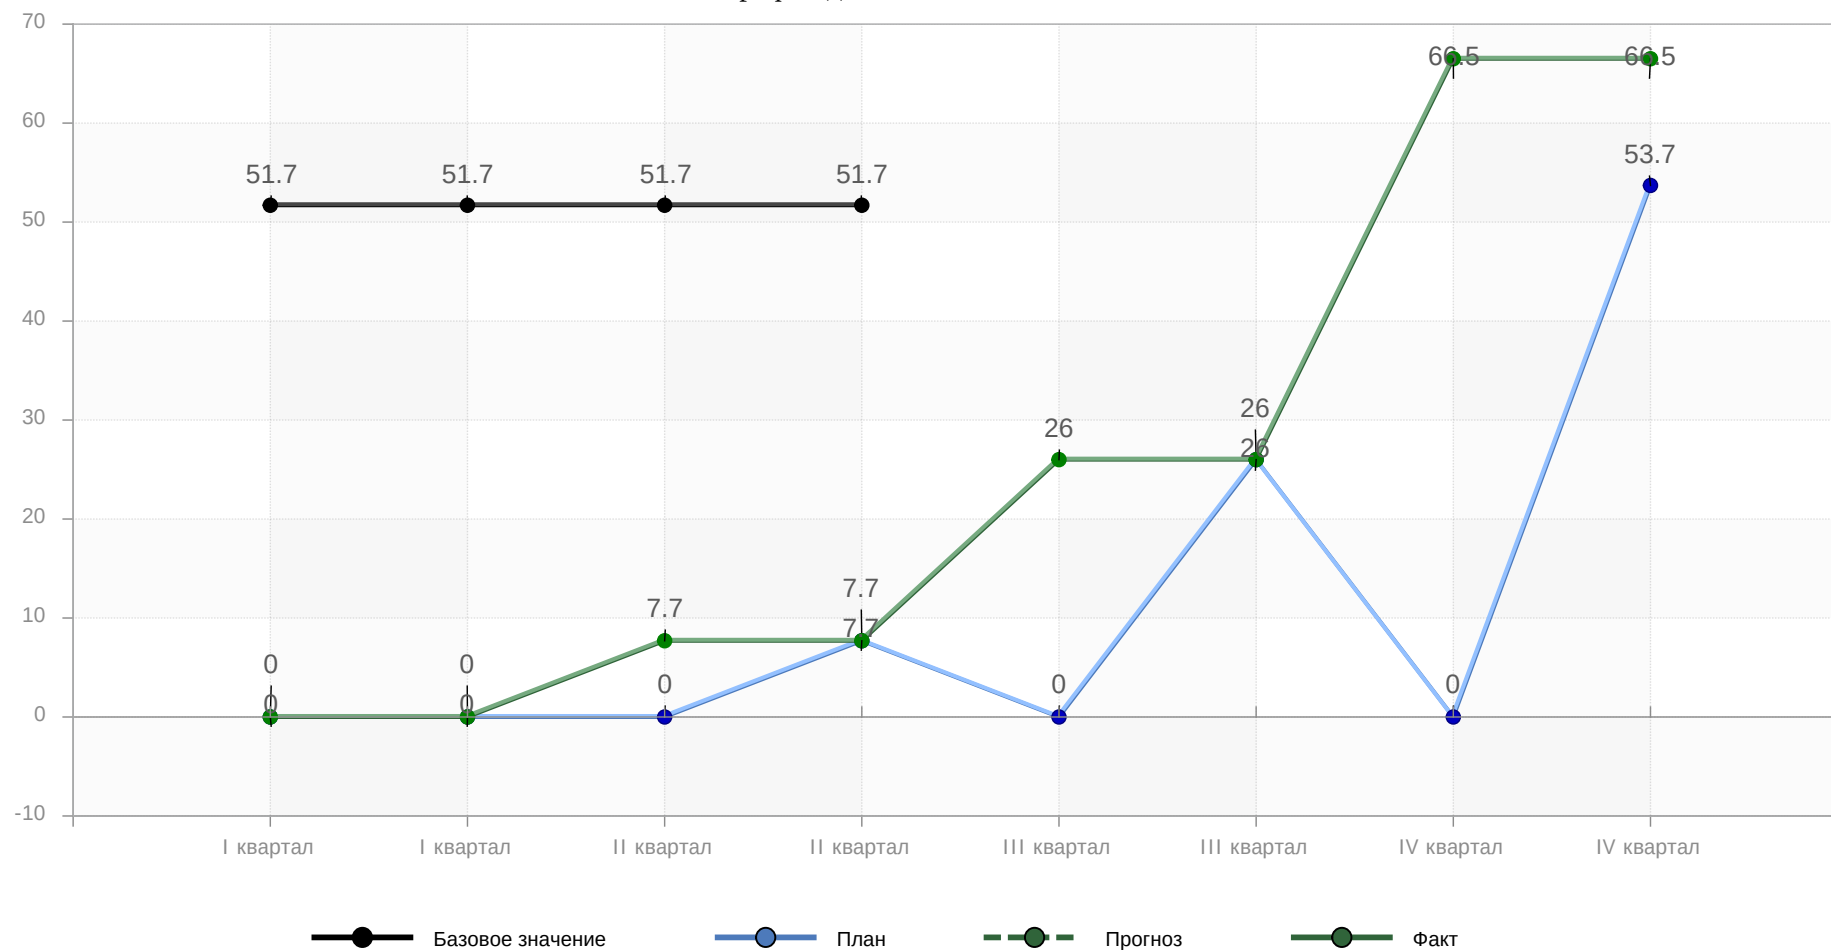


Рис. 5. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

Диаграмма достижения показателя

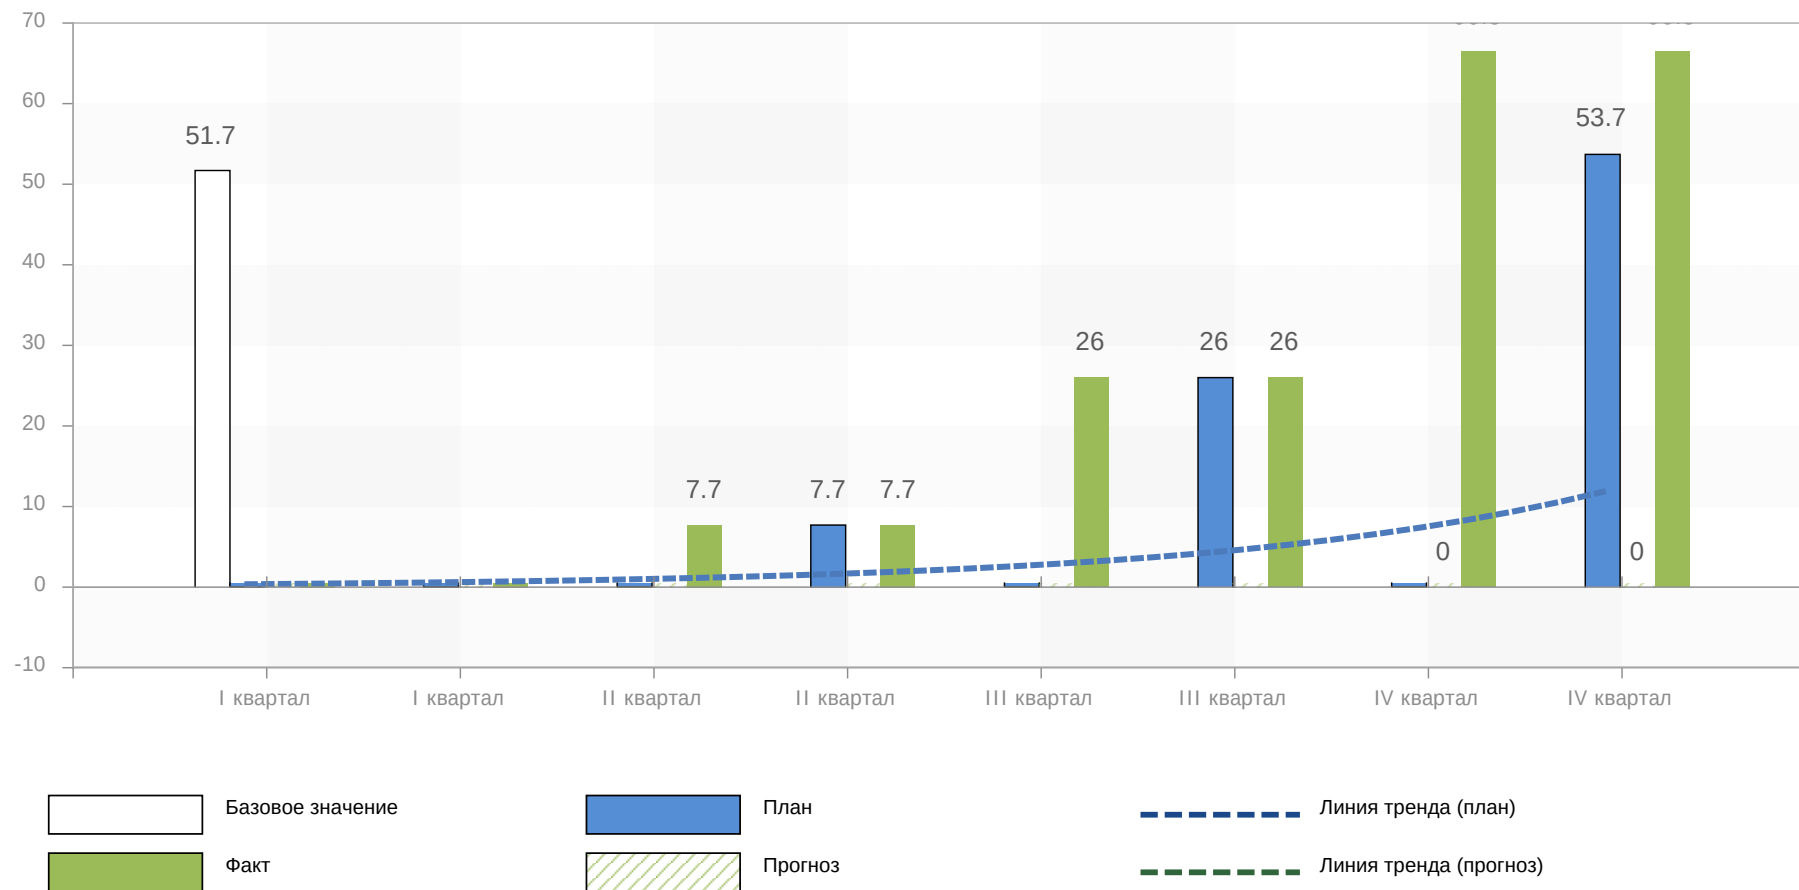


Рис. 6. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

График достижения показателя

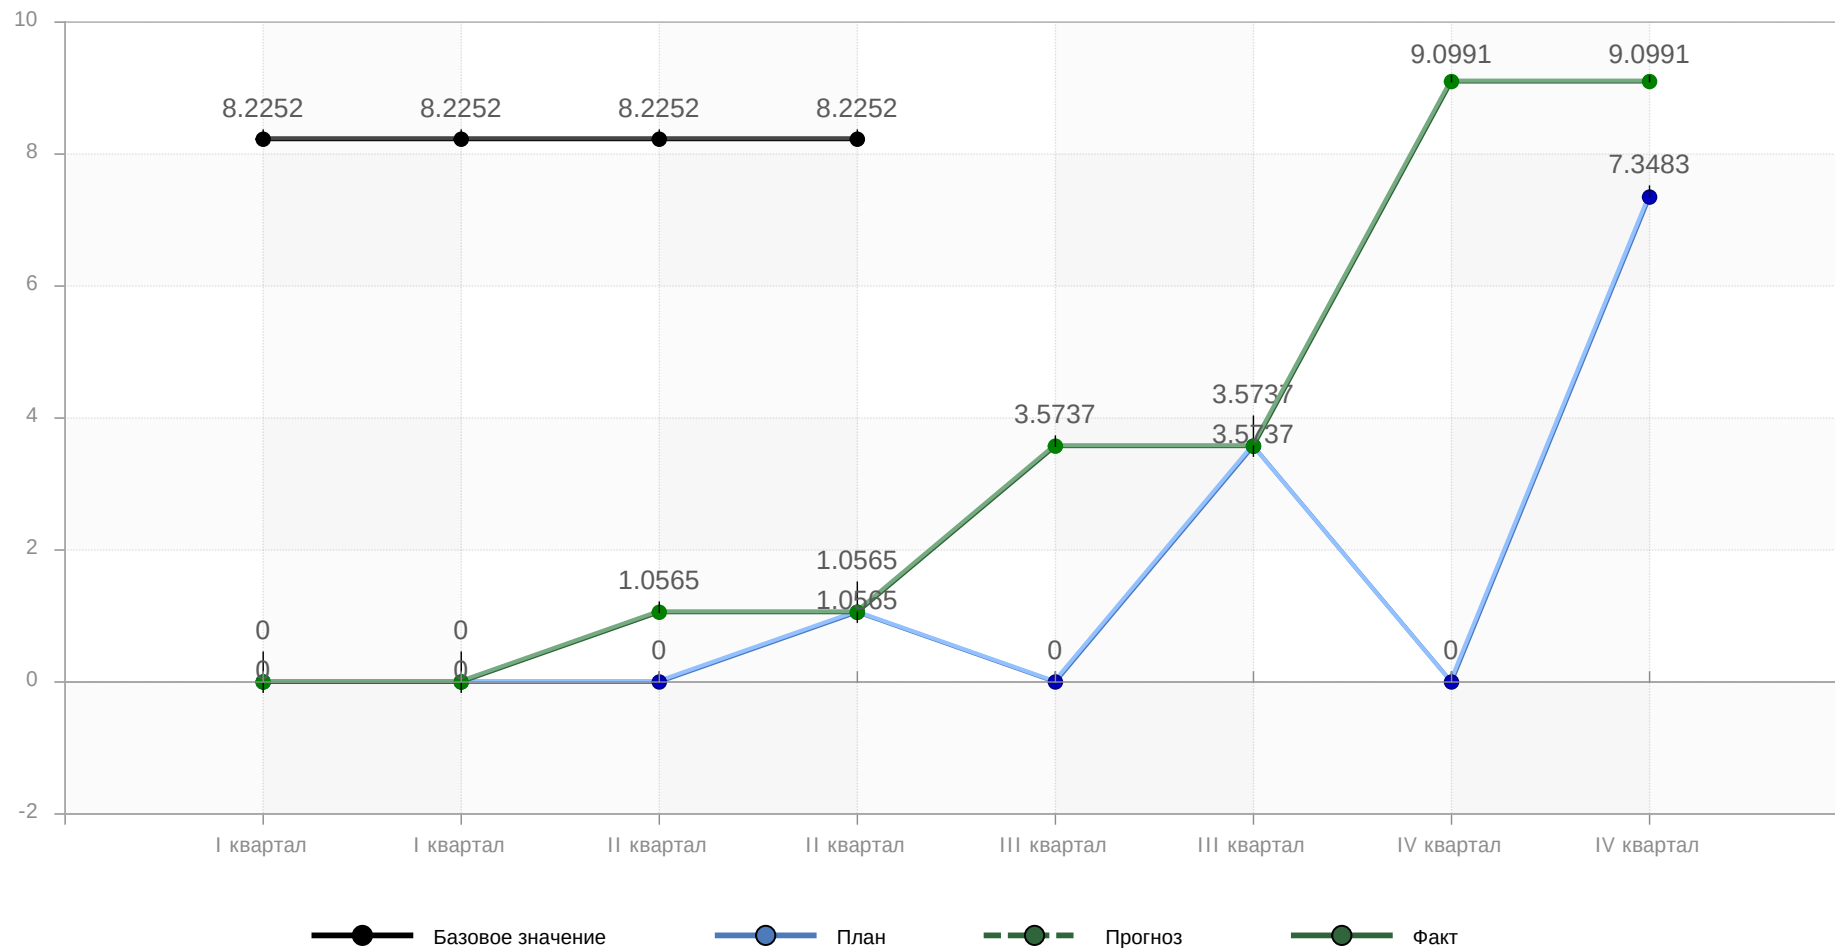


Рис. 7. Площадь лесовосстановления и лесоразведения

Диаграмма достижения показателя

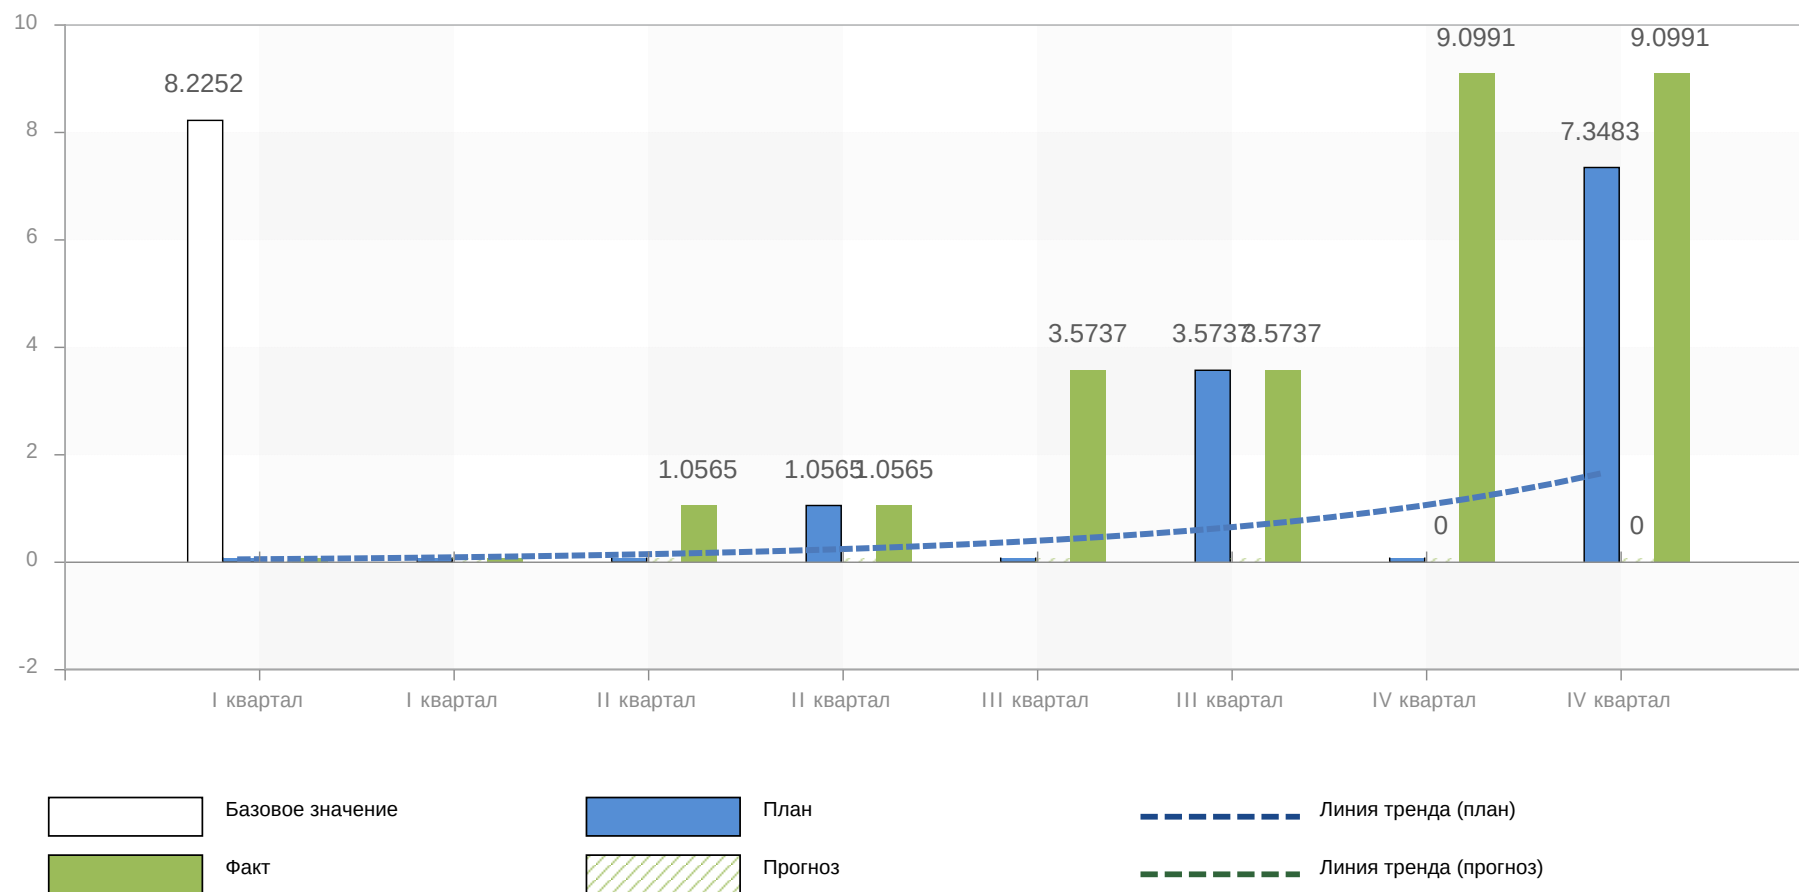


Рис. 8. Площадь лесовосстановления и лесоразведения

График достижения показателя

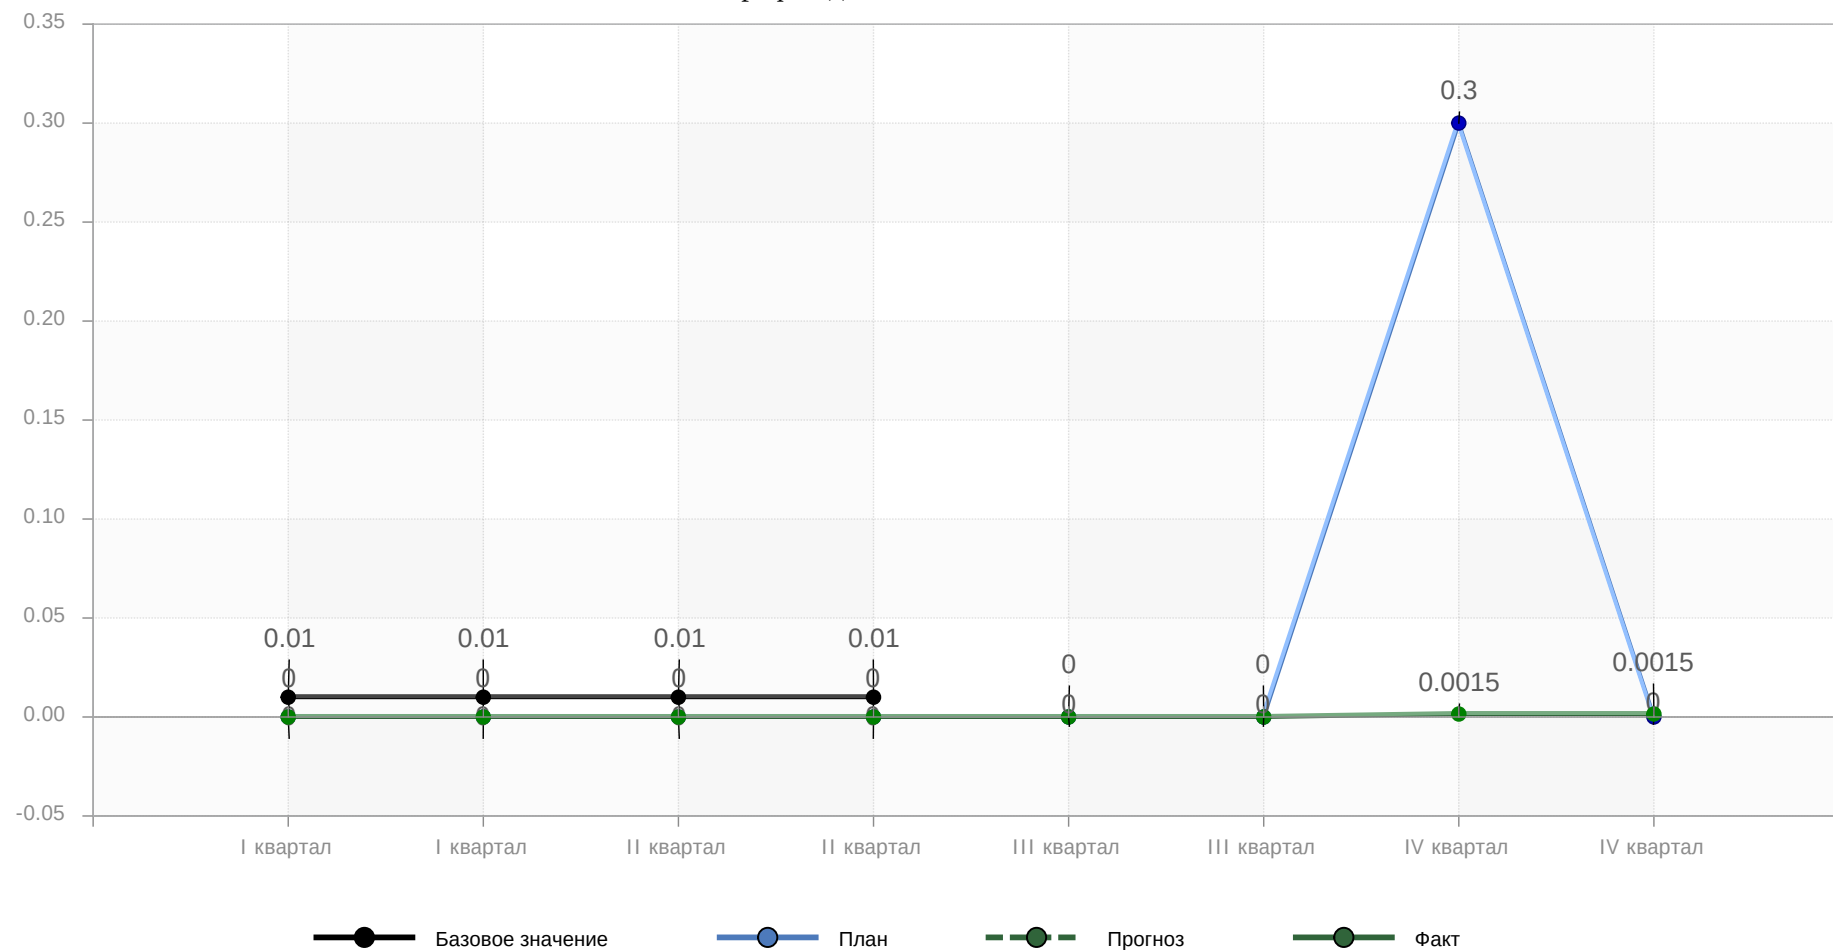


Рис. 9. Площадь погибших лесных насаждений

Диаграмма достижения показателя

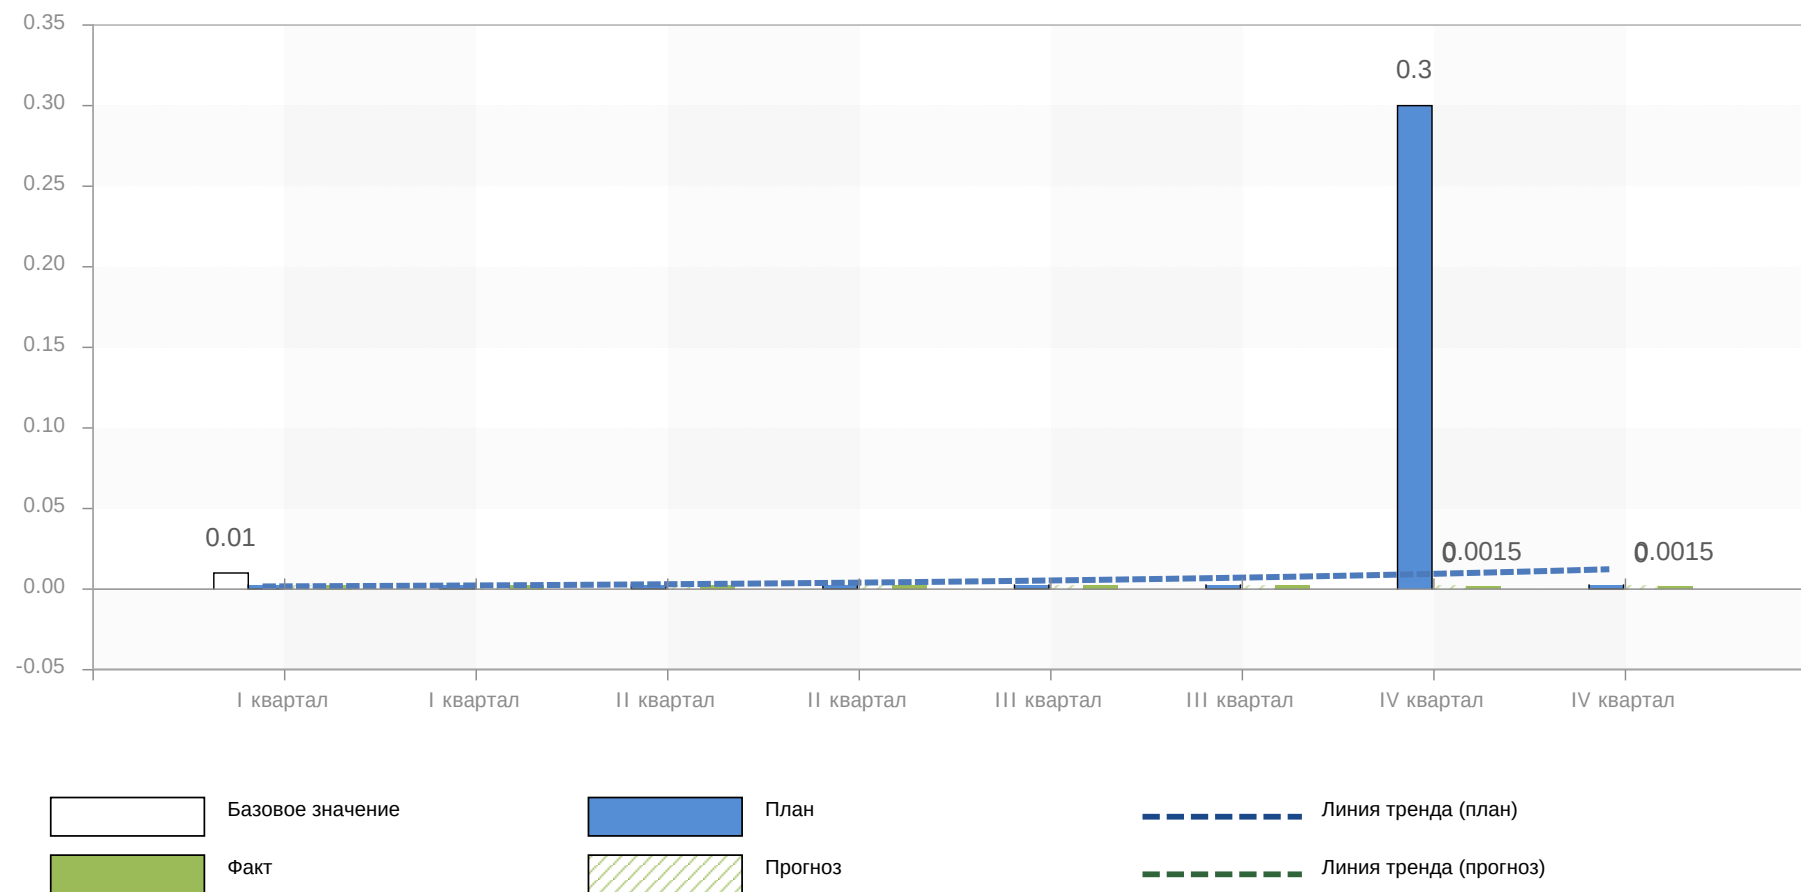


Рис. 10. Площадь погибших лесных насаждений

График достижения показателя

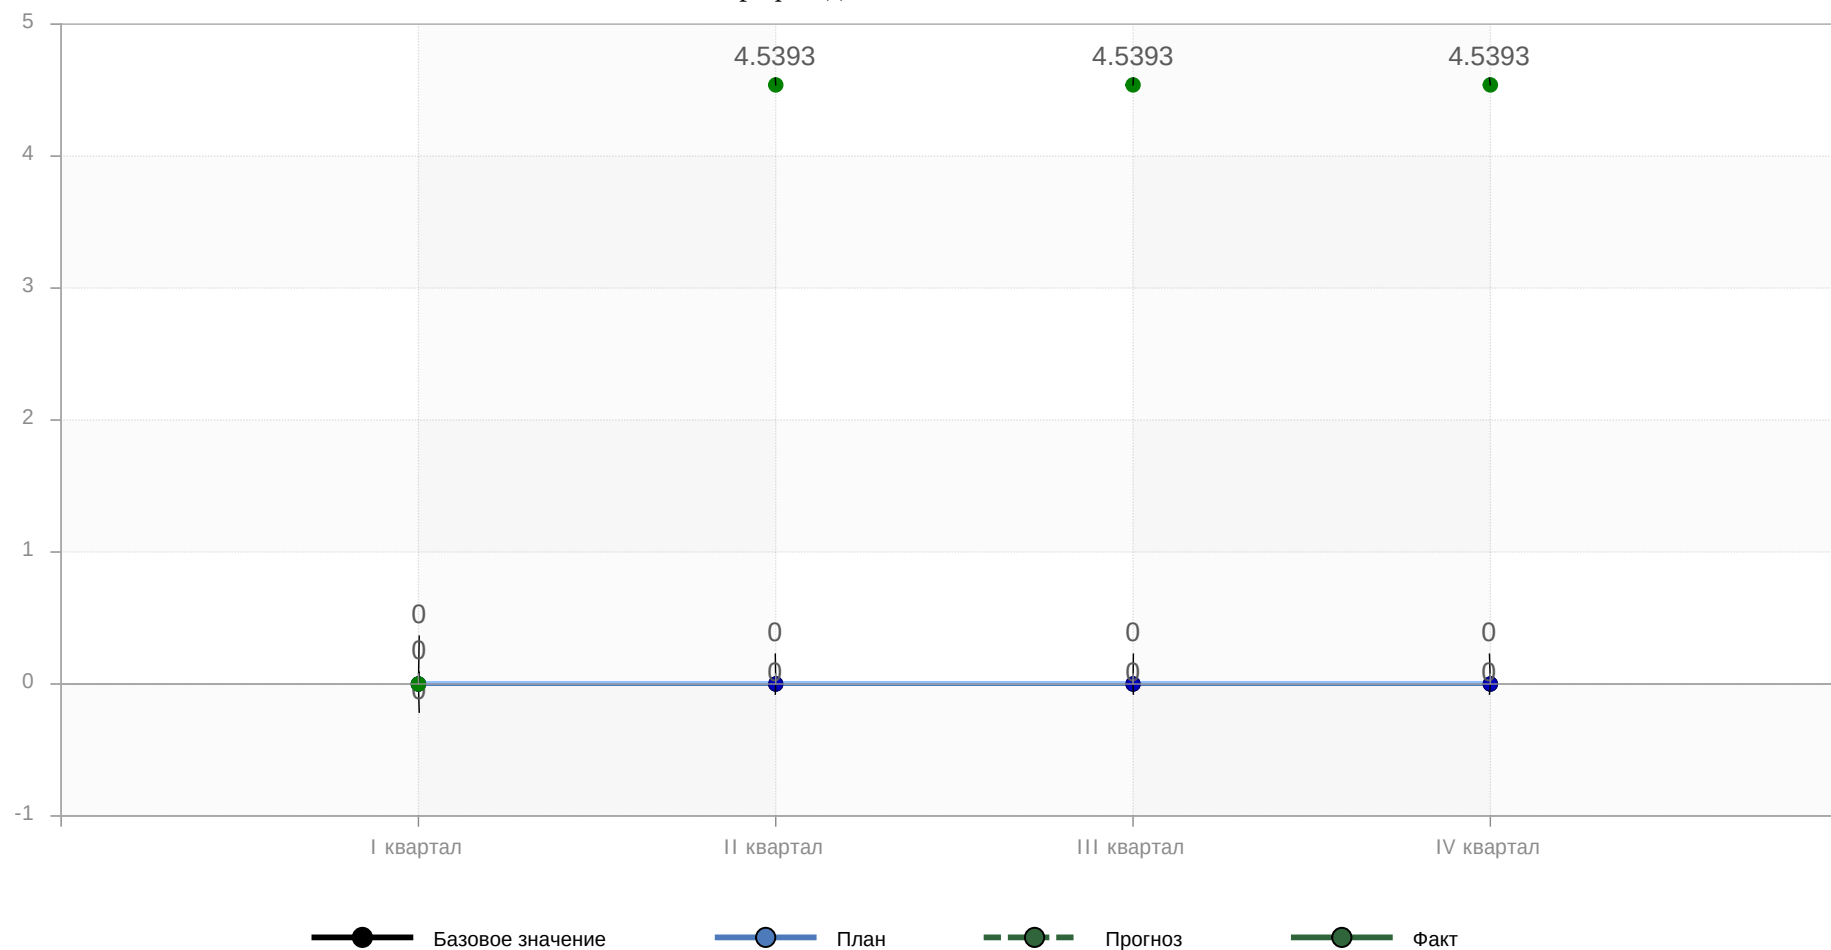


Рис. 11. Ущерб от лесных пожаров

Диаграмма достижения показателя

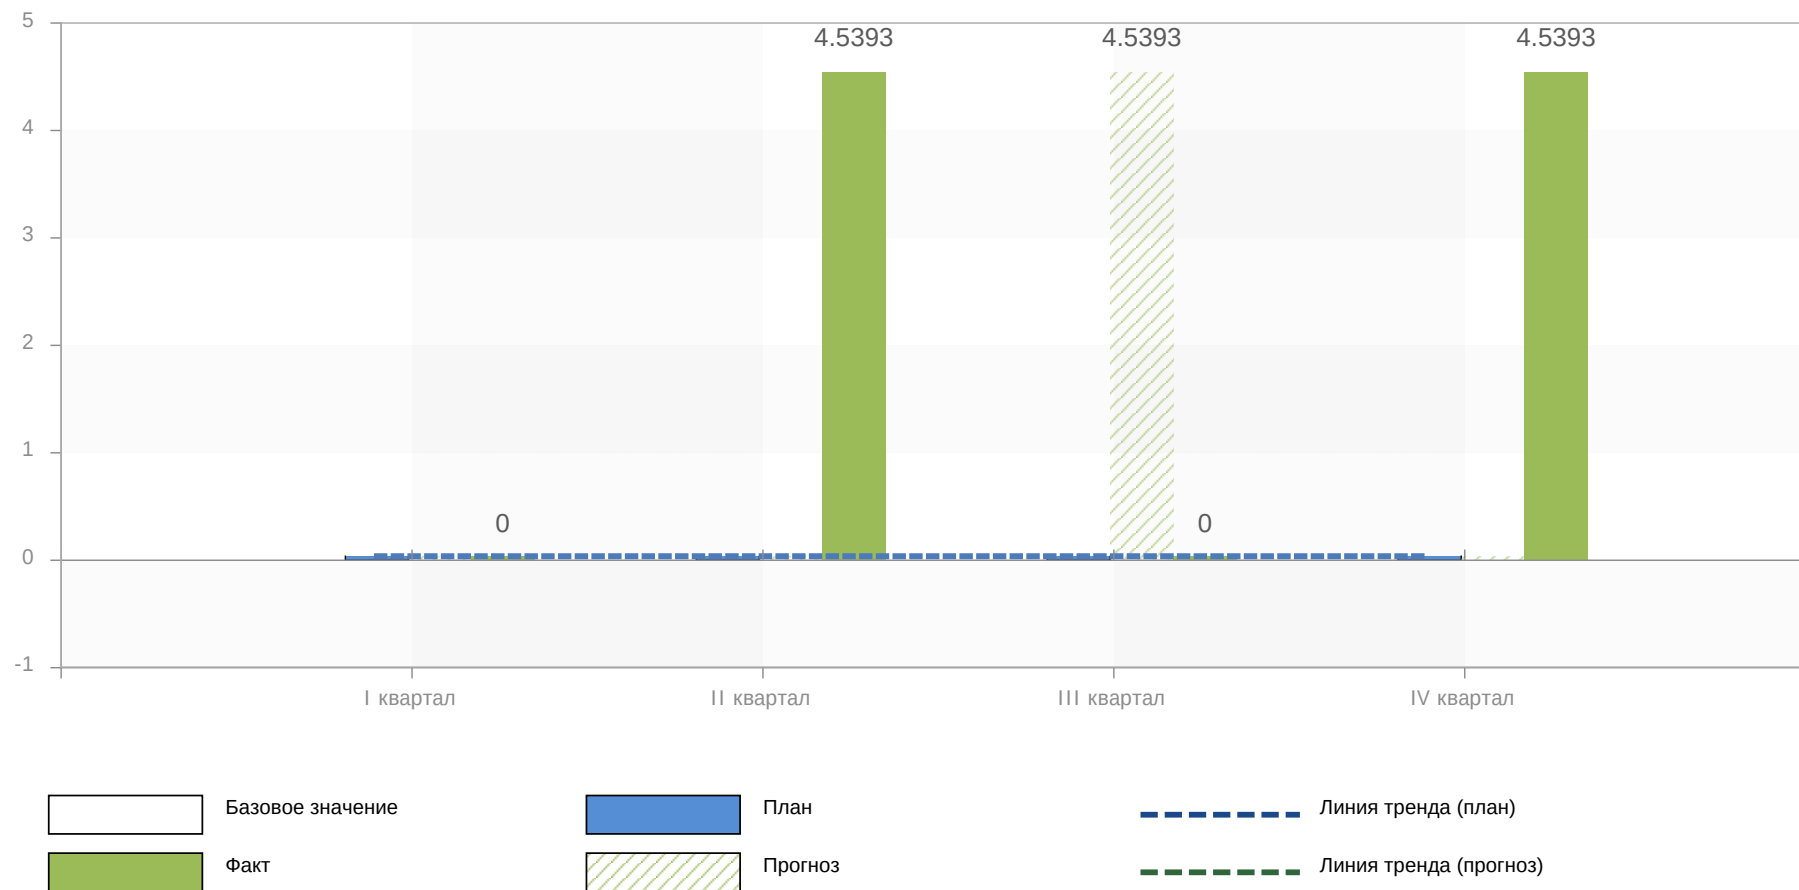


Рис. 12. Ущерб от лесных пожаров

График достижения показателя

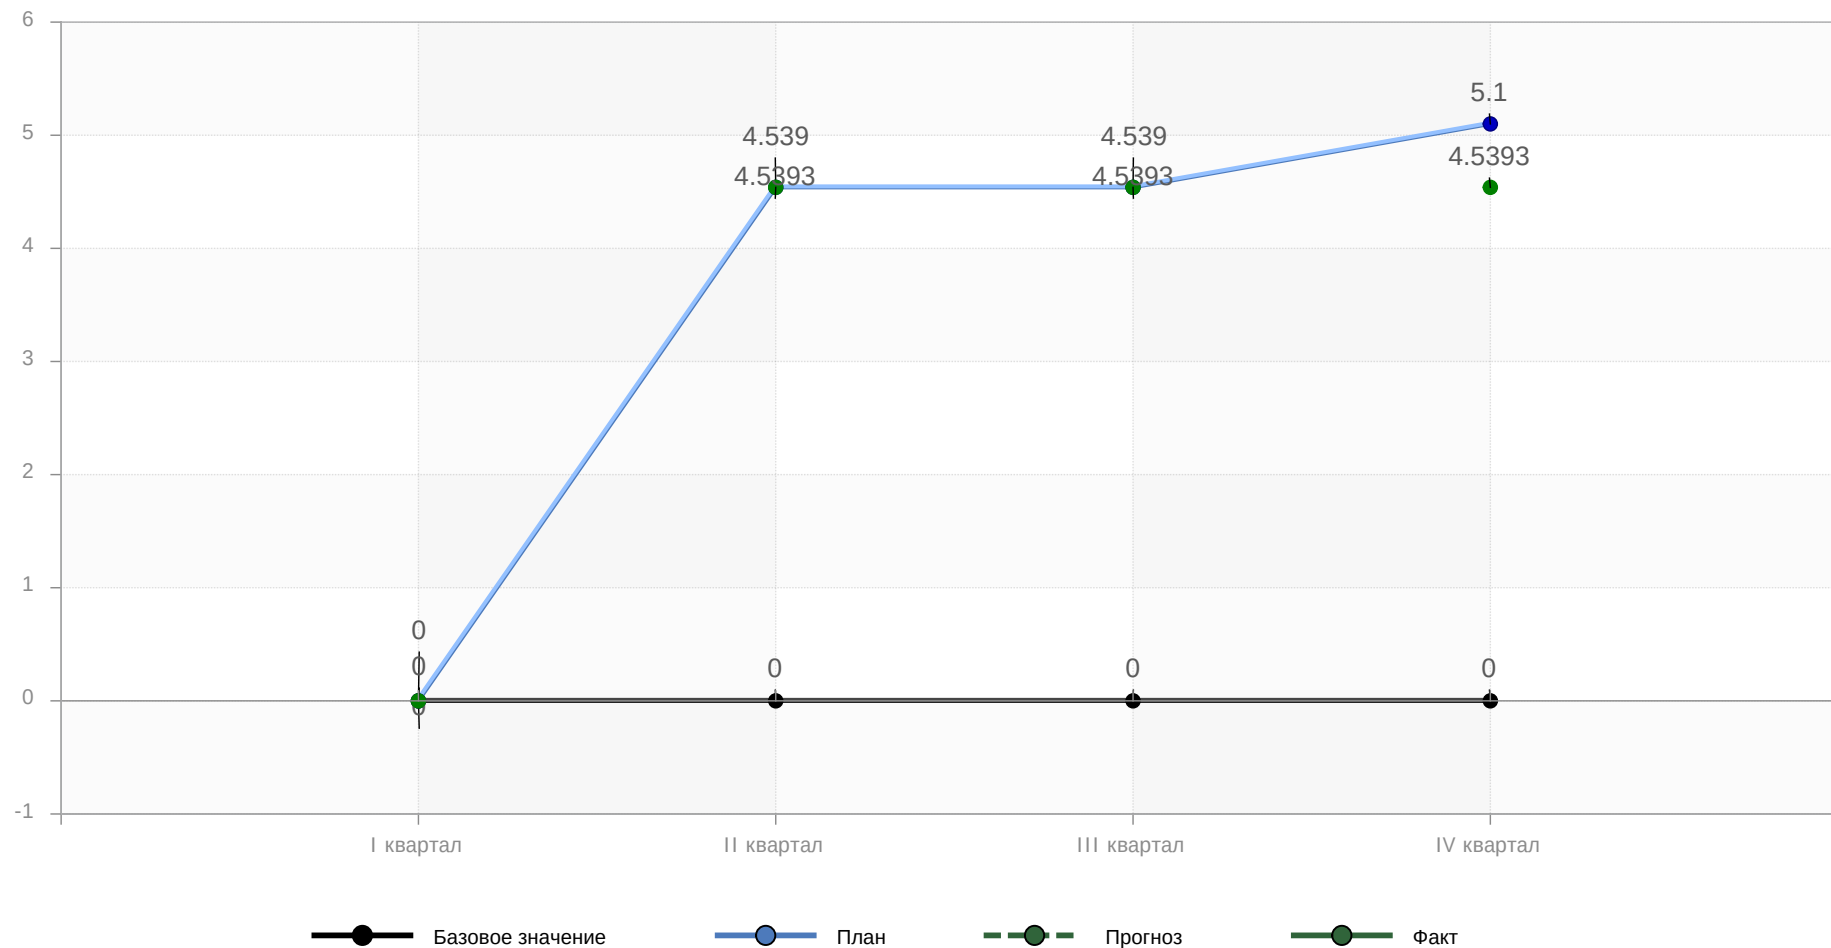


Рис. 13. Ущерб от лесных пожаров по годам

Диаграмма достижения показателя

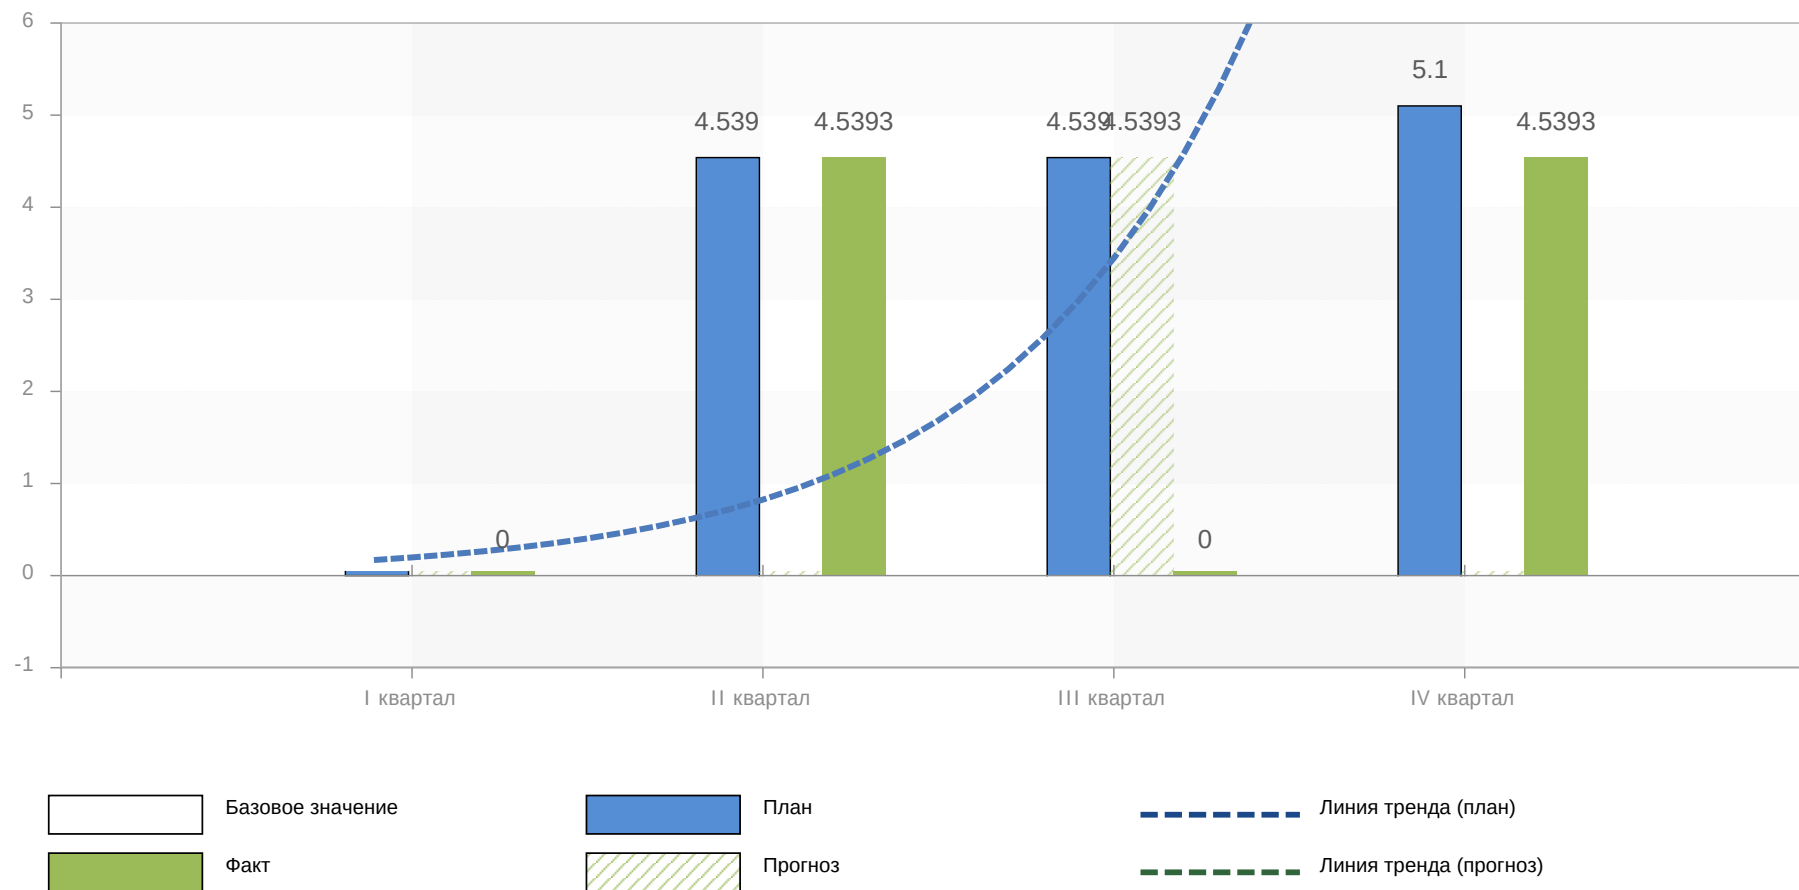


Рис. 14. Ущерб от лесных пожаров по годам
