

Руководитель
регионального проекта —
Малин Михаил Васильевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
7B5B1EEB6D65CBE4A89D02D743C39B97B1219D7E

Владелец: Малин Михаил Васильевич

Действителен: с 30.05.2019 по 30.08.2020

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(N3-32) Борьба с онкологическими заболеваниями (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Наличие некритических отклонений	наличие некритических отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1		3. Цели и показатели	Низкий удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %, Причина риска: Недостаточный удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутовые: Низкий удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более	1. Увеличить удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, срок исполнения 31.12.2020;
2		3. Цели и показатели	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %, Причина риска: Недостаточное снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутовые: Недостаточное снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)	1. Достичь снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями , срок исполнения 31.12.2020;
3		3. Цели и показатели	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях , Причина риска: Низкая доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях , Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутовые: Недостаточное увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях	1. Достичь увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях , срок исполнения 31.12.2020;

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях	Процент	55.6	55.6	55.6	56.2	56.3	57	98,77%	Существует риск: Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях , Причина риска: Низкая доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях , Вероятность: 100%, Сутовые: Недостаточное увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях Предлагаемые решения: 1. Достичь увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях , срок исполнения 31.12.2020.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
2		Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	Процент	21.8	23	23.1	21.5	26.2	20.5	78,24%	Существует риск: Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %, Причина риска: Недостаточное снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %, Вероятность: 100%, Сутевые: Недостаточное снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) Предлагаемые решения: 1. Достичь снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями, срок исполнения 31.12.2020.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
3		Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	Процент	53.2	52	52.1	53	48.2	54	89,26%	Существует риск: Низкий удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %, Причина риска: Недостаточный удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %, Вероятность: 100%, Сутевые: Низкий удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более Предлагаемые решения: 1. Увеличить удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, срок исполнения 31.12.2020.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	1 000,00	1 000,00	1 000,00	941,90	941,90	94,19	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	941,90	941,90	94,19	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 000,00	1 000,00	1 000,00	941,90	941,90	94,19	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(18) Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 923,80	34 923,80	99,78	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 923,80	34 923,80	99,78	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 923,80	34 923,80	99,78	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(20) Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	458 630,70	458 630,70	458 630,70	458 628,91	458 628,91	100,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	458 630,70	458 630,70	458 630,70	458 628,91	458 628,91	100,00	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	458 630,70	458 630,70	458 630,70	458 628,91	458 628,91	100,00	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			494 630,70	494 630,70	494 630,70	494 494,61	494 494,61	99,97	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			494 630,70	494 630,70	494 630,70	494 494,61	494 494,61	99,97	
бюджет субъекта Российской Федерации			494 630,70	494 630,70	494 630,70	494 494,61	494 494,61	99,97	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	
2		Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	
3		Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи	
4		Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
5		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Значение: 50, на дату 31.12.2019	31.12.2019	24.12.2019	Малин М. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проведение информационно-коммуникационной кампании" Отчет ДОЗН КО от 24.12.2019г. № 8469, приложен файл.
1.1	ПК		Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	30.06.2019	27.06.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ № 1249 от 27 06 2019г Об утверждении плана мероприятий реализации креативной концепции" Приказ от 27.06.2019г. №1249, приложен файл;

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.1	РРП		Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видеоролики, радиоролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», макеты наружной рекламы)	30.06.2019	27.06.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ № 1249 от 27.06.2019г. Об утверждении плана мероприятий реализации креативной концепции_" Приказ от 27.06.2019г. №1249, приложен файл;
1.2	ПК		Отчет о создании интернет-портала	30.09.2019	26.09.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании Интернет-портала" Информационная справка департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 26.09.2019г. №6325, приложен файл, указана ссылка.
1.2.1	РРП		Создание интернет-портала	30.09.2019	26.09.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании Интернет-портала" Информационная справка департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 26.09.2019г. №6325, приложен файл, указана ссылка.
1.3	ПК		Отчет о создании, поддержке и развитии интернет-портала	31.12.2019	24.12.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О поддержке и развитии интернет-портала" Отчет ДОЗН КО от 24.12.2019г. № 8472, приложен файл.
1.3.1	РРП		Поддержка и развитие интернет-портала	31.12.2019	24.12.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О поддержке и развитии интернет-портала" Отчет ДОЗН КО от 24.12.2019г. №8472, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.4	ПК		Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	31.12.2019	24.12.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проведение информационно-коммуникационной кампании" Отчет ДОЗН КО от 24.12.2019г. № 8469, приложен файл.
1.4.1	РПП		Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах	31.12.2019	24.12.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " о проведении информационно-коммуникационной кампании" Отчет ДОЗН КО от 24.12.2019г. № 8469, приложен файл.
2			<i>В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Значение: 1, на дату 01.07.2019</i>	01.07.2019	28.06.2019	Малин М. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Программа Борьба с онкологическими заболеваниями" Информация ДОЗН КО от 27.06.2019г. №385, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
2.1	ПК		Документ разработан	01.05.2019	22.04.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо в Минздрав РФ от 22.04.2019 № 2597 о направлении проекта рег. программы борьба с онкологическими заболеваниями" Письмо от 22.04.2019г. №2597, приложен файл;

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.1	РРП		Разработка проекта программы Кемеровской области «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.05.2019	22.04.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо в Минздрав РФ от 22.04.2019 № 2597 о направлении проекта рег. программы борьба с онкологическими заболеваниями" Письмо от 22.04.2019г. №2597, приложен файл;
2.2	ПК		Документ утвержден (подписан)	01.07.2019	27.06.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Программа _Борьба с онкологическими заболеваниями _ утв. постановлением ПКО" Постановление Правительства Кемеровской области от 27.06.2019г. № 385, приложен файл.
2.2.1	РРП		Утверждение программы Кемеровской области «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.07.2019	27.06.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Программа _Борьба с онкологическими заболеваниями _ утв. постановлением ПКО" Постановление Правительства Кемеровской области от 27.06.2019г. № 385, приложен файл.
2.3	ПК		Документ опубликован	01.07.2019	28.06.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Опубликование на сайте 28.06.2019 Об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями " Прочий тип документа Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 28.06.2019г. №385, приложен файл.
2.3.1	РРП		Публикация документа	01.07.2019	28.06.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Опубликование на сайте 28.06.2019 Об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями" Прочий тип документа Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 28.06.2019г. №385, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3			Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1, на дату 31.12.2019	31.12.2019	25.11.2019	Малин М. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации по региональным проектам" Отчет ТФОМС от 25.11.2019г. №5940, приложен файл. Информация по результату: В работе.
3.1	ПК		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	31.03.2019	27.03.2019	Цигельник А. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения ТФОМС КО по проекту Борьба с онкологией за 1 квартал 2019" Письмо от 27.03.2019г. №1390, приложен файл;
3.1.1	РРП		Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31.03.2019	27.03.2019	Цигельник А. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения ТФОМС КО по проекту Борьба с онкологией за 1 квартал 2019" Письмо от 27.03.2019г. №1390, приложен файл;
3.2	ПК		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области	30.06.2019	24.06.2019	Цигельник А. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет ТФОМС № 2742 от 24.06.2019 июнь 2019 Онкология" Письмо от 24.06.2019г. №2742, приложен файл;
3.2.1	РРП		Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.06.2019	24.06.2019	Цигельник А. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет ТФОМС № 2742 от 24.06.2019 июнь 2019 Онкология" Письмо от 24.06.2019г. №2742, приложен файл;
3.3	ПК		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области	30.09.2019	30.09.2019	Цигельник А. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет ТФОМС август 2019 " Отчет Территориально фонда обязаельного медицинского страхования от 24.09.2019г. №4507, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.3.1	РРП		Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.09.2019	24.09.2019	Цигельник А. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет ТФОМС август 2019" Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования от 24.09.2019г. №4507, приложен файл.
3.4	ПК		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области	31.12.2019	25.11.2019	Цигельник А. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации по региональным проектам" Письмо ТФОМС от 25.11.2019г. №5940, приложен файл.
3.4.1	РРП		Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31.12.2019	25.11.2019	Цигельник А. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации по региональным проектам" Письмо ТФОМС от 25.11.2019г. №5940, приложен файл.
3.5	ПК		Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.	31.12.2019	25.11.2019	Цигельник А. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации по региональным проектам" Отчет ТФОМС от 25.11.2019г. №5940, приложен файл.
3.5.1	РРП		Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	31.12.2019	25.11.2019	Цигельник А. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации по региональным проектам" Отчет ТФОМС от 25.11.2019г. №5940, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений







Сведения не представлены



Прогнозные сведения



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4			Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Малин М. В.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.
4.1	ПК		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области	31.03.2020	31.03.2020	Цигельник А. М.	В работе.
4.1.1	РРП		Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31.03.2020	31.03.2020	Цигельник А. М.	В работе.
5			Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи Значение: 2, на дату 31.12.2019	31.12.2019	18.11.2019	Малин М. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ ДОЗН КО о создании ЦАОП" Приказ ДОЗН КО от 08.05.2019г. №2944, приложен файл.
5.1	ПК		Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	31.12.2019	15.11.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Лицензия на осуществление медицинской деятельности ГАУЗ КО ОКЦОЗШ" Иной вид документа Управления лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области от 13.08.2019г. №ло-42-01-005888, приложен файл. 2. "Лицензия на осуществление медицинской деятельности ГАУЗ КО ОКБСМП" Иной вид документа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 02.09.2019г. №фс-42-01-002439, приложен файл. 3. "О лицензиях медицинских организаций, на базе которых открыт ЦАОП" Письмо ДОЗН КО от 15.11.2019г. №7507, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.1.1	РРП		Получение лицензий, соответствующих видам деятельности организации (структурного подразделения)	31.12.2019	15.11.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о лицензиях медицинских организаций, на базе которых открыты ЦАОП" Письмо ДФЗН КО от 15.11.2019г. № 07507, приложен файл. 2. "Лицензия на осуществление медицинской деятельности ГАУЗ КО ОКБСМП" Иной вид документа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 02.09.2019г. №фс-42-01-002439, приложен файл. 3. "Лицензия на осуществление медицинской деятельности ГАУЗ КО ОКЦОЗШ" Иной вид документа Управления лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области от 13.08.2019г. №ло-42-01-005888, приложен файл.
5.2	ПК		Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	01.04.2019	28.03.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо исходящее № 01854 от 28.03.2019 отчет в МИНФИН о создании ЦАОП за 1 кв" Письмо от 28.03.2019г. №1854, приложен файл;
5.2.1	РРП		Создание центров амбулаторной онкологической помощи	01.04.2019	28.03.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо исходящее № 01854 от 28.03.2019 отчет в МИНФИН о создании ЦАОП за 1 кв" Письмо от 28.03.2019г. №1854, приложен файл;
5.3	ПК		Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	01.07.2019	27.06.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о создании центров амбулаторной онкологической помощи" Отчет Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 08.05.2019г. №2944, приложен файл.
5.3.1	РРП		Создание центров амбулаторной онкологической помощи	01.07.2019	08.05.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о создании центров амбулаторной онкологической помощи" Отчет Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 08.05.2019г. № 2944, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.4	ПК		Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	01.10.2019	04.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие документы: 1. "О создании центров амбулаторной онкологической помощи" Отчет ДОЗН КО от 04.10.2019г. № 6547, приложен файл.
5.4.1	РРП		Создание центров амбулаторной онкологической помощи	01.10.2019	04.10.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие документы: 1. "О создании центров амбулаторной онкологической помощи" Отчет ДОЗН КО от 04.10.2019г. № 6547, приложен файл.
5.5	ПК		Определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2019 году	15.02.2019	14.02.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ ДОЗН от 14-02-2019 № 299 об организации сети центров амбулаторной онкологической помощи в 2019 году" Приказ от 14.02.2019г. №299, приложен файл;
5.5.1	РРП		Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	15.02.2019	14.02.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об организации сети центров амбулаторной онкологической помощи в 2019 году" Приказ от 14.02.2019г. №299, приложен файл;
5.6	ПК		В Кемеровской области организована работа двух центров амбулаторной онкологической помощи	31.12.2019	18.11.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об оснащении ЦАОП" Приказ ДОЗН КО от 07.03.2019г. № 469, приложен файл. 2. "О центрах амбулаторной онкологической помощи" Письмо ДОЗН КО от 06.11.2019г. №07322, приложен файл.
5.6.1	РРП		Дооснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2019 году	31.12.2019	18.11.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об оснащении ЦАОП" Приказ ДОЗН КО от 07.03.2019г. № 469, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.6.2	РРП		Укомплектование медицинскими кадрами медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2019 году	31.12.2019	06.11.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О центрах онкологической помощи" Письмо ДОЗН КО от 06.11.2019г. №7322, приложен файл.
5.7	ПК		Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	31.12.2019	06.11.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О мероприятии "Создание центров амбулаторной онкологической помощи"" Отчет ДОЗН КО от 06.11.2019г. №7322, приложен файл.
5.7.1	РРП		Создание центров амбулаторной онкологической помощи	31.12.2019	06.11.2019	Зеленина Е. М.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О мероприятии "Создание центров амбулаторной онкологической помощи"" Отчет ДОЗН КО от 06.11.2019г. №7322, приложен файл.
6			Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи Значение: 3, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Малин М. В.	Информация по значению результата: В работе.
6.1	ПК		Определена медицинская организация, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2020 году	15.02.2020	15.02.2020	Малин М. В.	В работе.
6.1.1	РРП		Определение медицинских организаций, на базе которых будет создан центр амбулаторной онкологической помощи	15.02.2020	15.02.2020	Малин М. В.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7			Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Значение: 3, на дату 31.12.2019	31.12.2019	18.12.2019	Малин М. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет ДОЗН КО от 18.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет о реализации межбюджетных трансфертов" Отчет ДОЗН КО от 18.12.2019г. №б/н, приложен файл.
7.1	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	01.07.2019	27.06.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов КО" Отчет Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 27.06.2019г. № 3964, приложен файл.
7.1.1	РРП		Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.07.2019	27.06.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов КО" Отчет Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 27.06.2019г. № 3964, приложен файл.
7.2	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	01.10.2019	01.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об использовании межбюджетного трансферта при оснащении оборудованием РСЦ и ПСО" Отчет ДОЗН КО от 01.10.2019г. №6431, приложен файл.
7.2.1	РРП		Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.10.2019	01.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об использовании межбюджетного трансферта при оснащении оборудованием РСЦ и ПСО" Отчет ДОЗН КО от 01.10.2019г. №6431, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.3	ПК		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	01.04.2019	15.02.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение от 15.02.2019 № 056-17-2019-362 о предоставлении иного межбюджетного трансферта для переоснащения мед. организаций, ОНКОЛОГИЯ" Иное от 15.02.2019г. №056-17-2019-362 , приложен файл;
7.3.1	РРП		Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2019	15.02.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение от 15.02.2019 № 056-17-2019-362 о предоставлении иного межбюджетного трансферта для переоснащения мед. организаций, ОНКОЛОГИЯ" Иное от 15.02.2019г. №056-17-2019-362 , приложен файл;
7.4	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2019	18.12.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации межбюджетных трансфертов" Отчет ДОЗН КО от 18.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет ДОЗН КО от 18.12.2019г. №б/н, приложен файл.
7.4.1	РРП		Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	31.12.2019	18.12.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации межбюджетных трансфертов" Отчет ДОЗН КО от 18.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет ДОЗН КО от 18.12.2019г. №б/н, приложен файл.
7.5	ПК		Определены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием	01.02.2019	24.01.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ ДОЗН от 24-01-2019 № 104 О переоснащении медицинских организаций Кемеровской области, оказывающих медицинскую помощь больным" Приказ от 24.01.2019г. №104, приложен файл;

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.5.1	РРП		Определение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.02.2019	24.01.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ ДОЗН от 24-01-2019 № 104 О переоснащении медицинских организаций Кемеровской области, оказывающих медицинскую помощь больным" Приказ от 24.01.2019г. №104, приложен файл;
8			<i>Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Значение: 3, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Малин М. В.	Информация по значению результата: В работе.
8.1	ПК		Определены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием	31.12.2020	31.12.2020	Малин М. В.	В работе.
8.1.1	РРП		Определение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.02.2020	01.02.2020	Малин М. В.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек

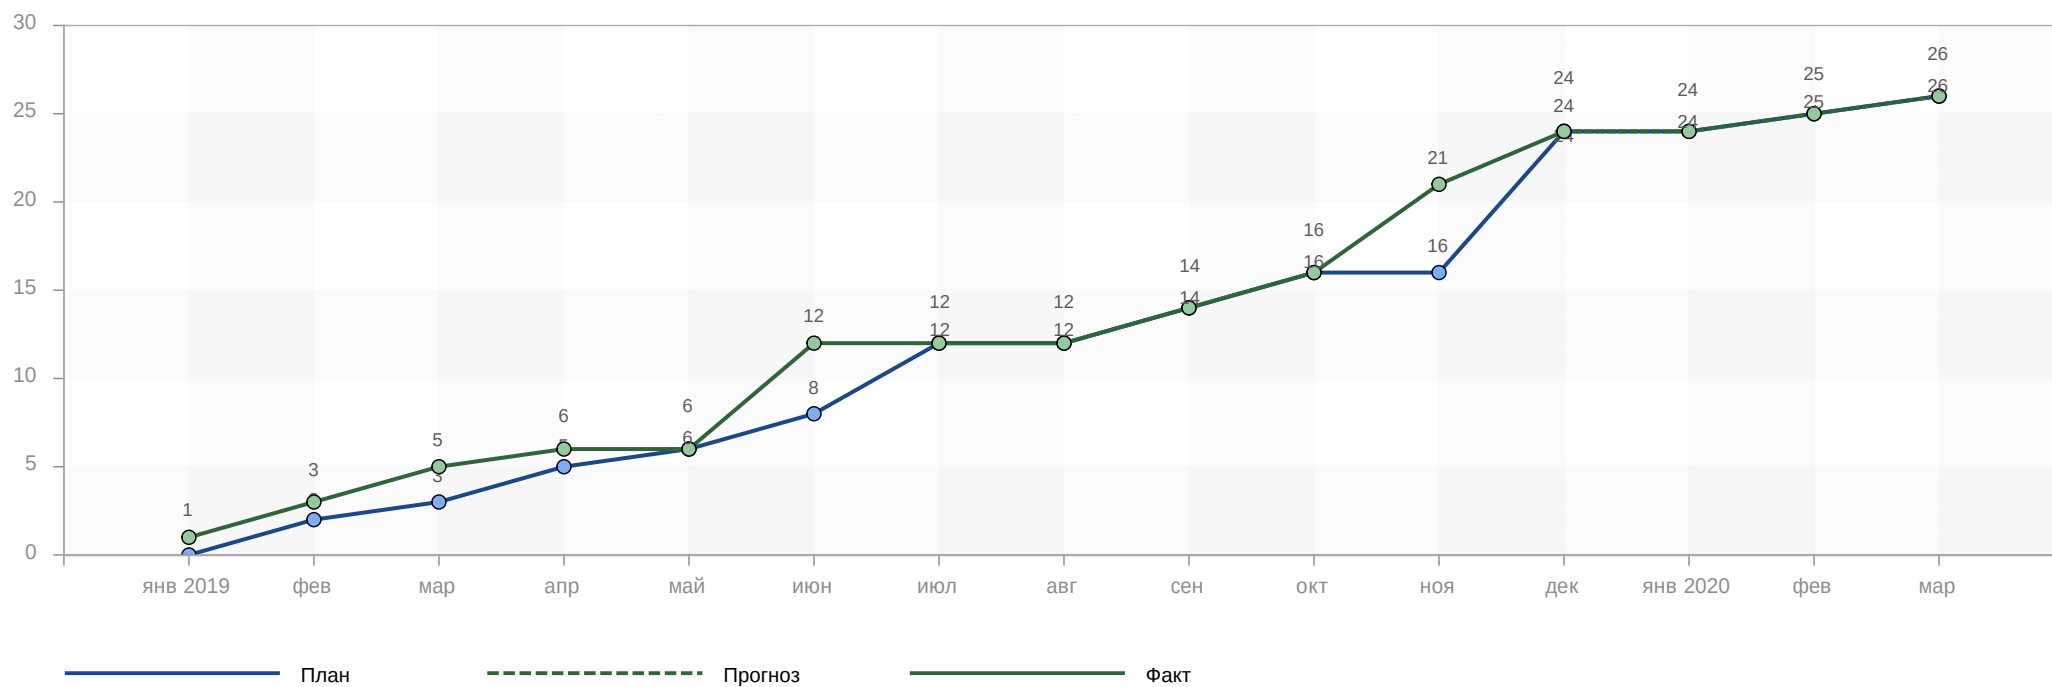


Рис. 1. "(N3-32) Борьба с онкологическими заболеваниями (Кемеровская область)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

График достижения показателя

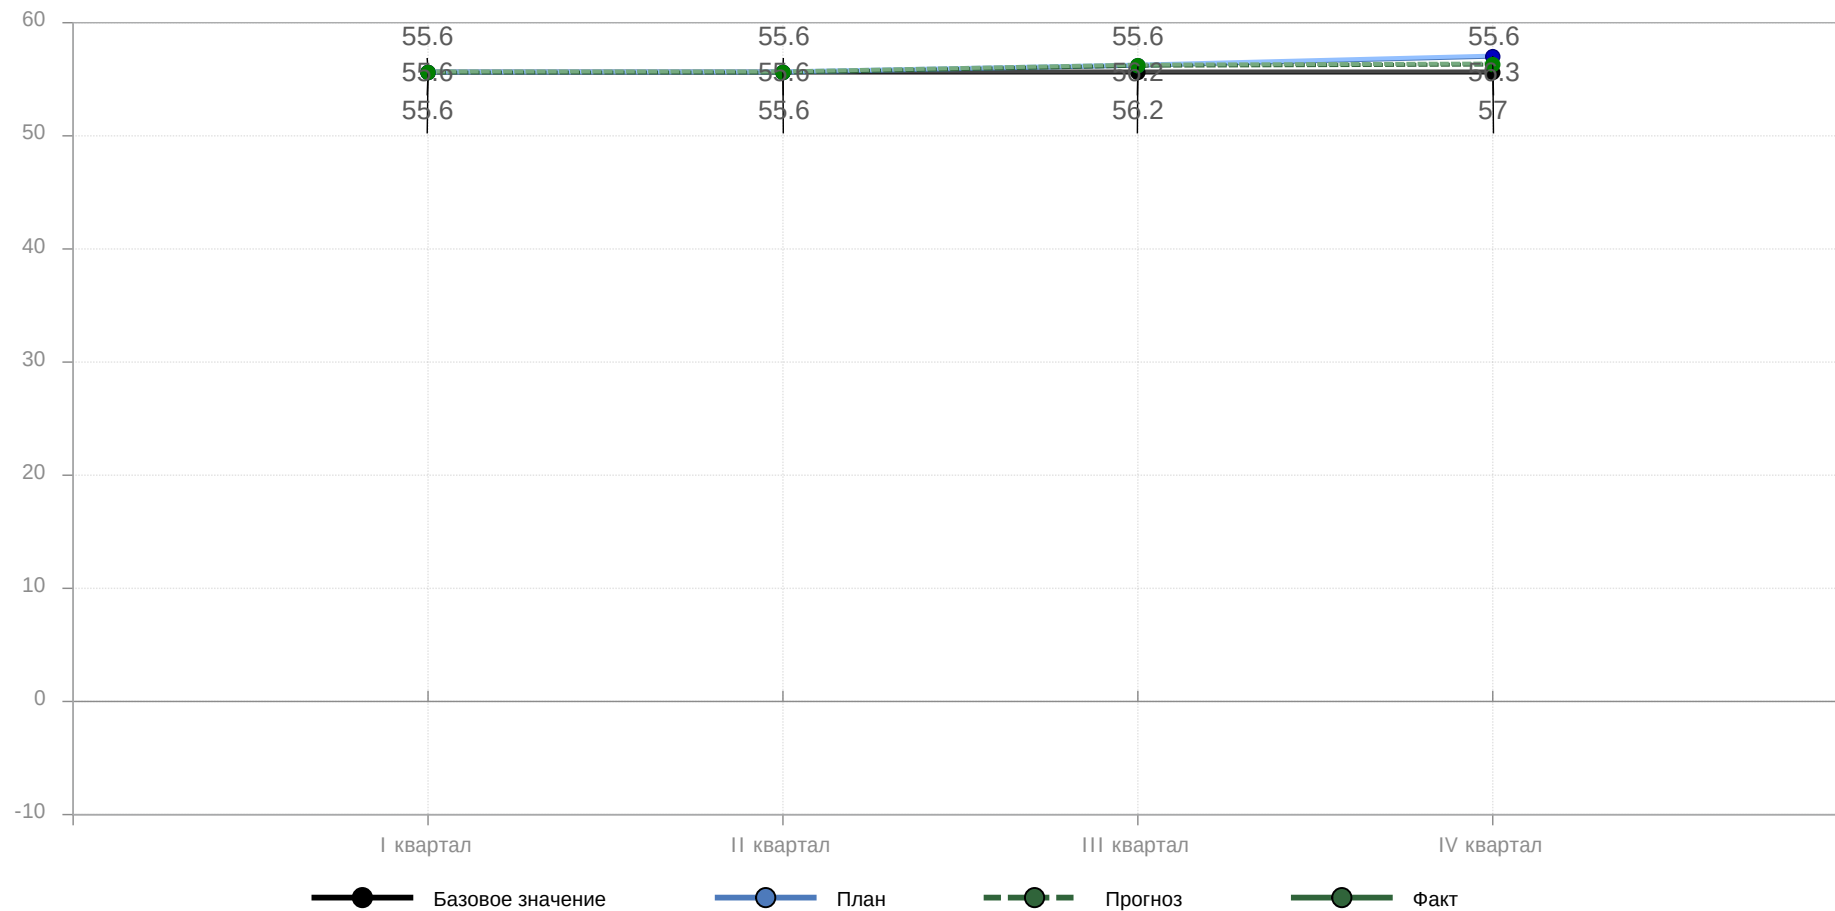


Рис. 1. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

Диаграмма достижения показателя

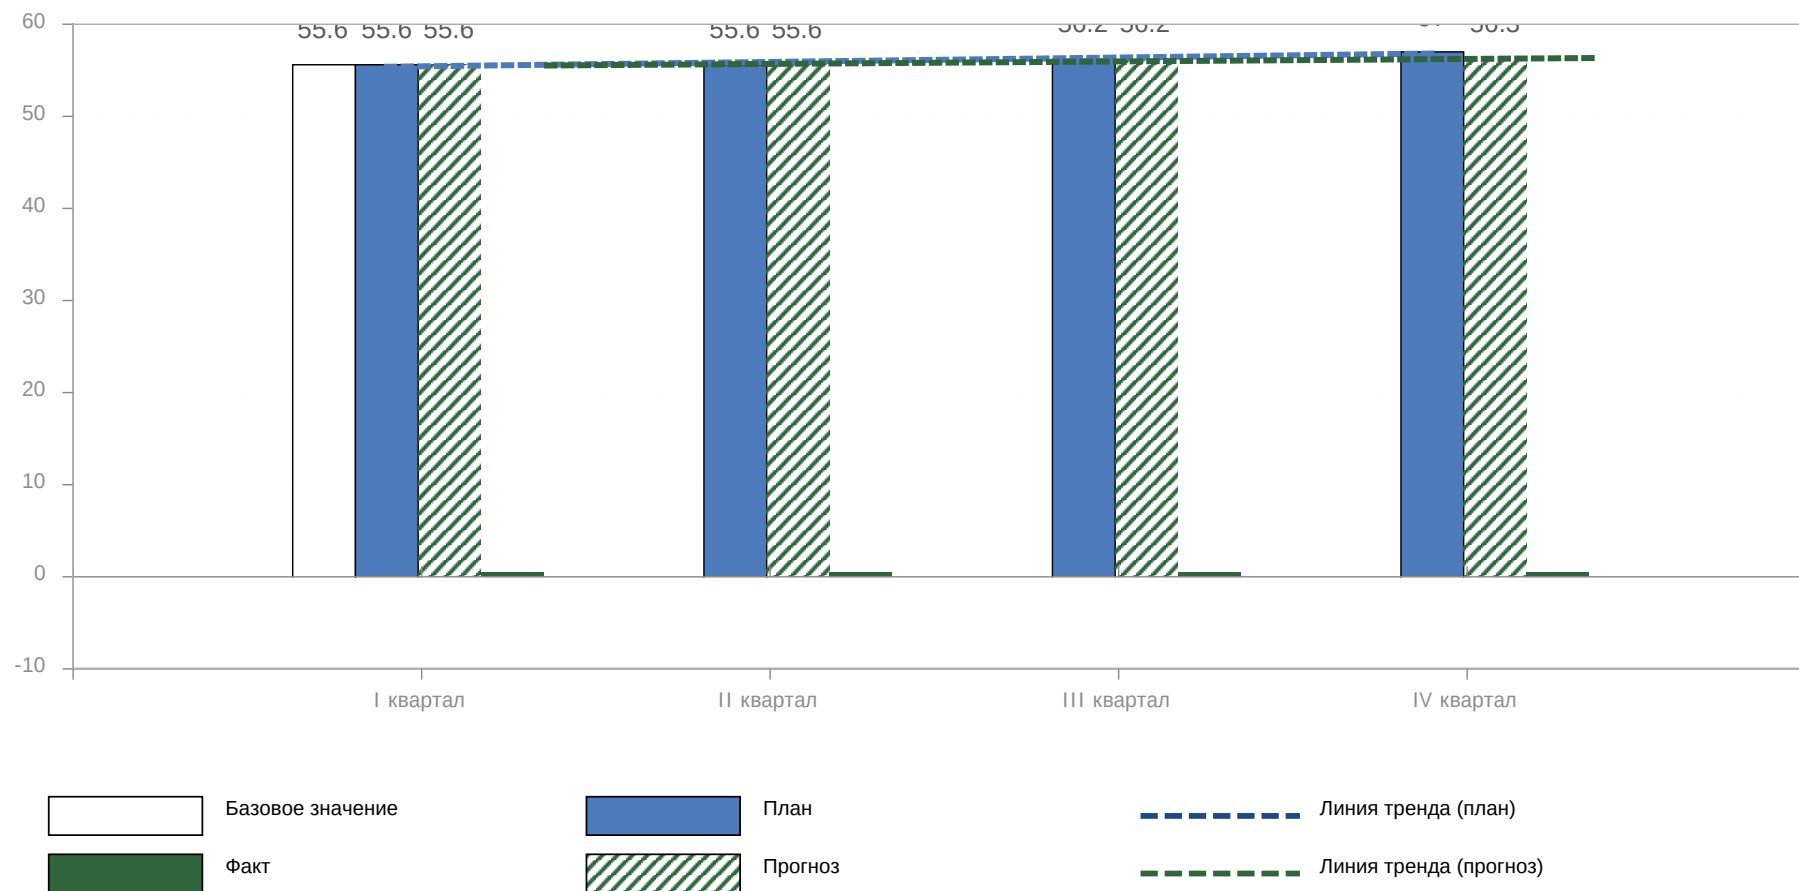


Рис. 2. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

График достижения показателя

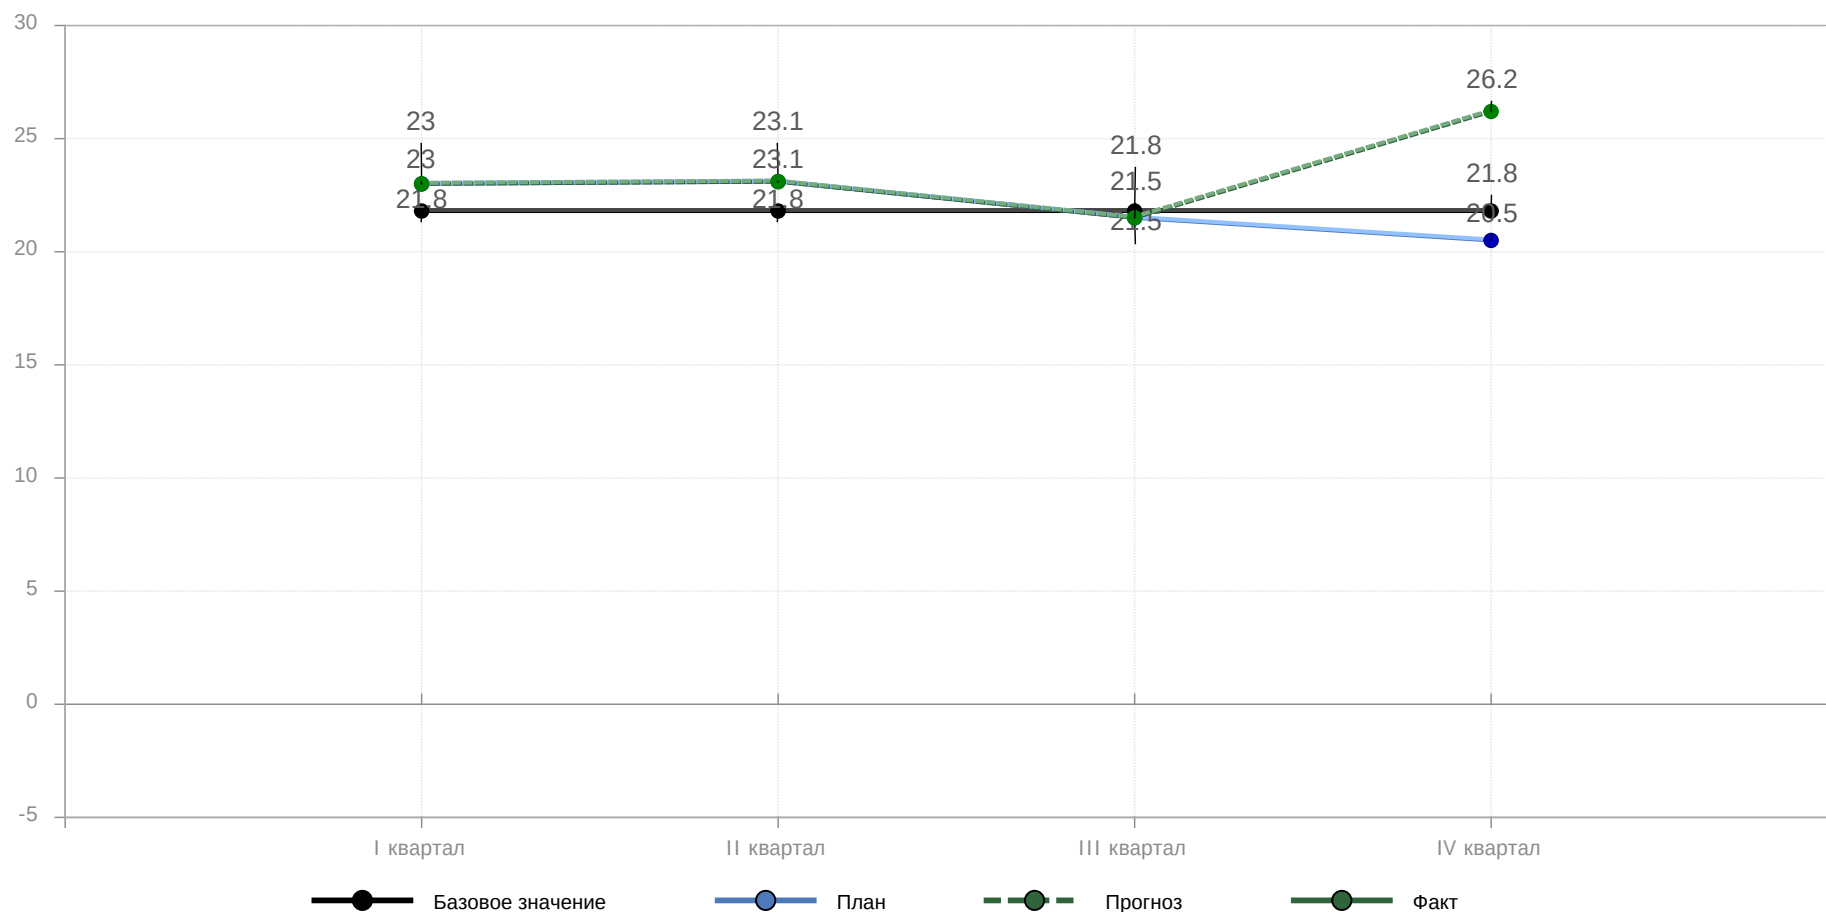


Рис. 3. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

Диаграмма достижения показателя

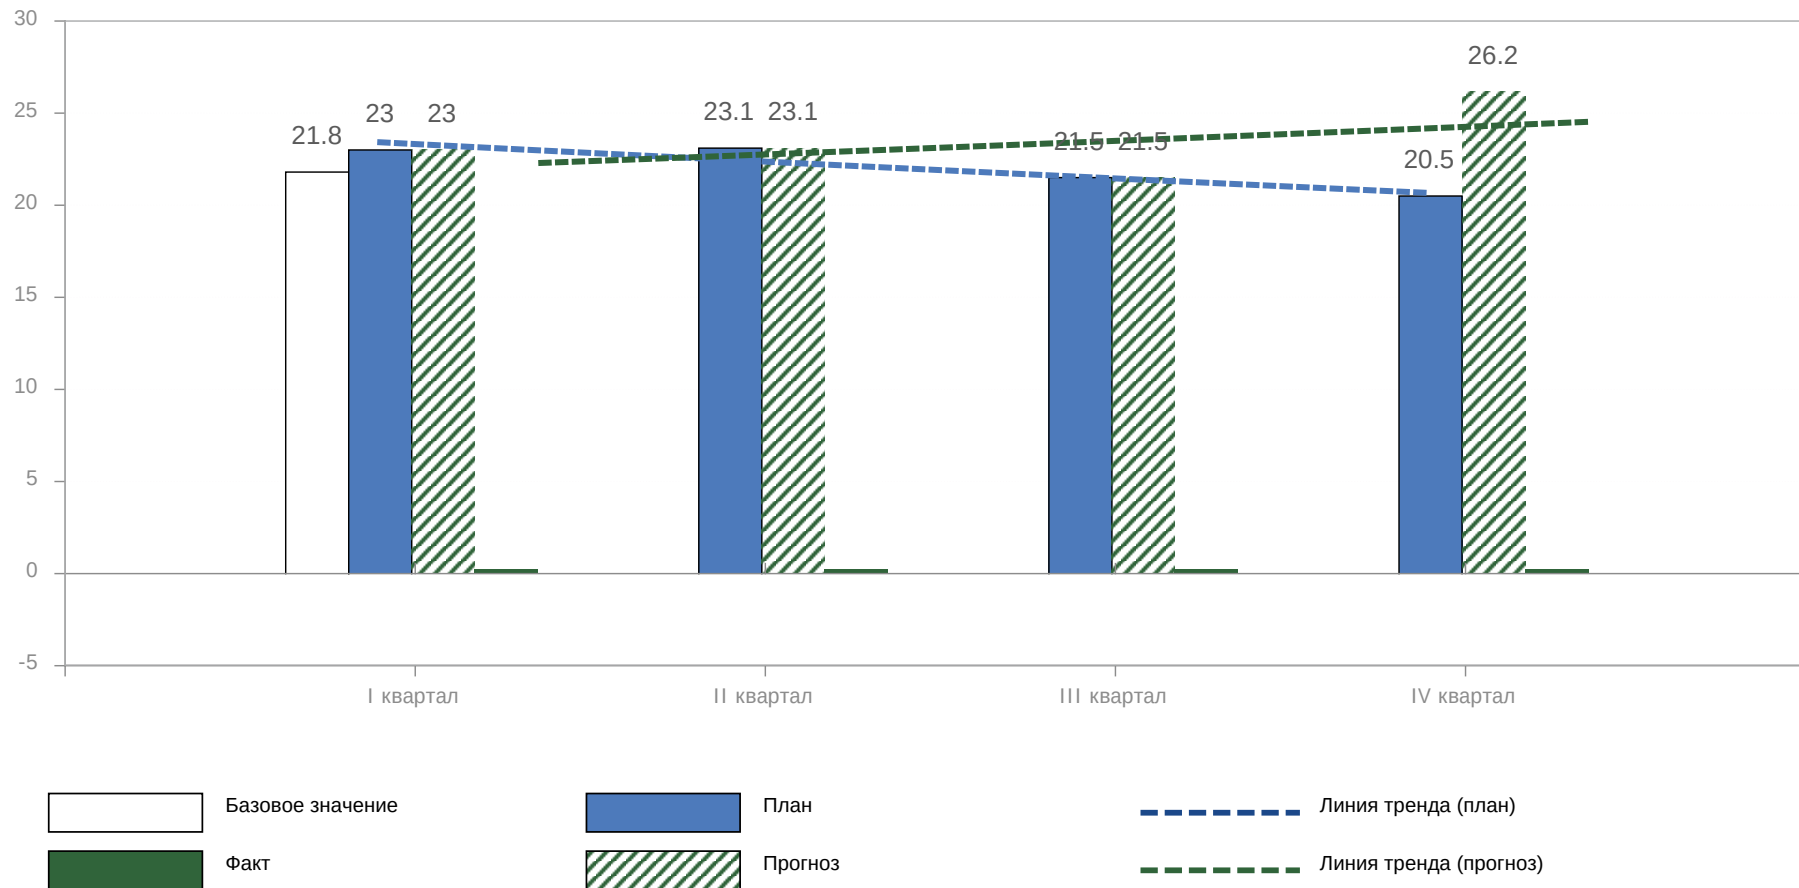


Рис. 4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

График достижения показателя

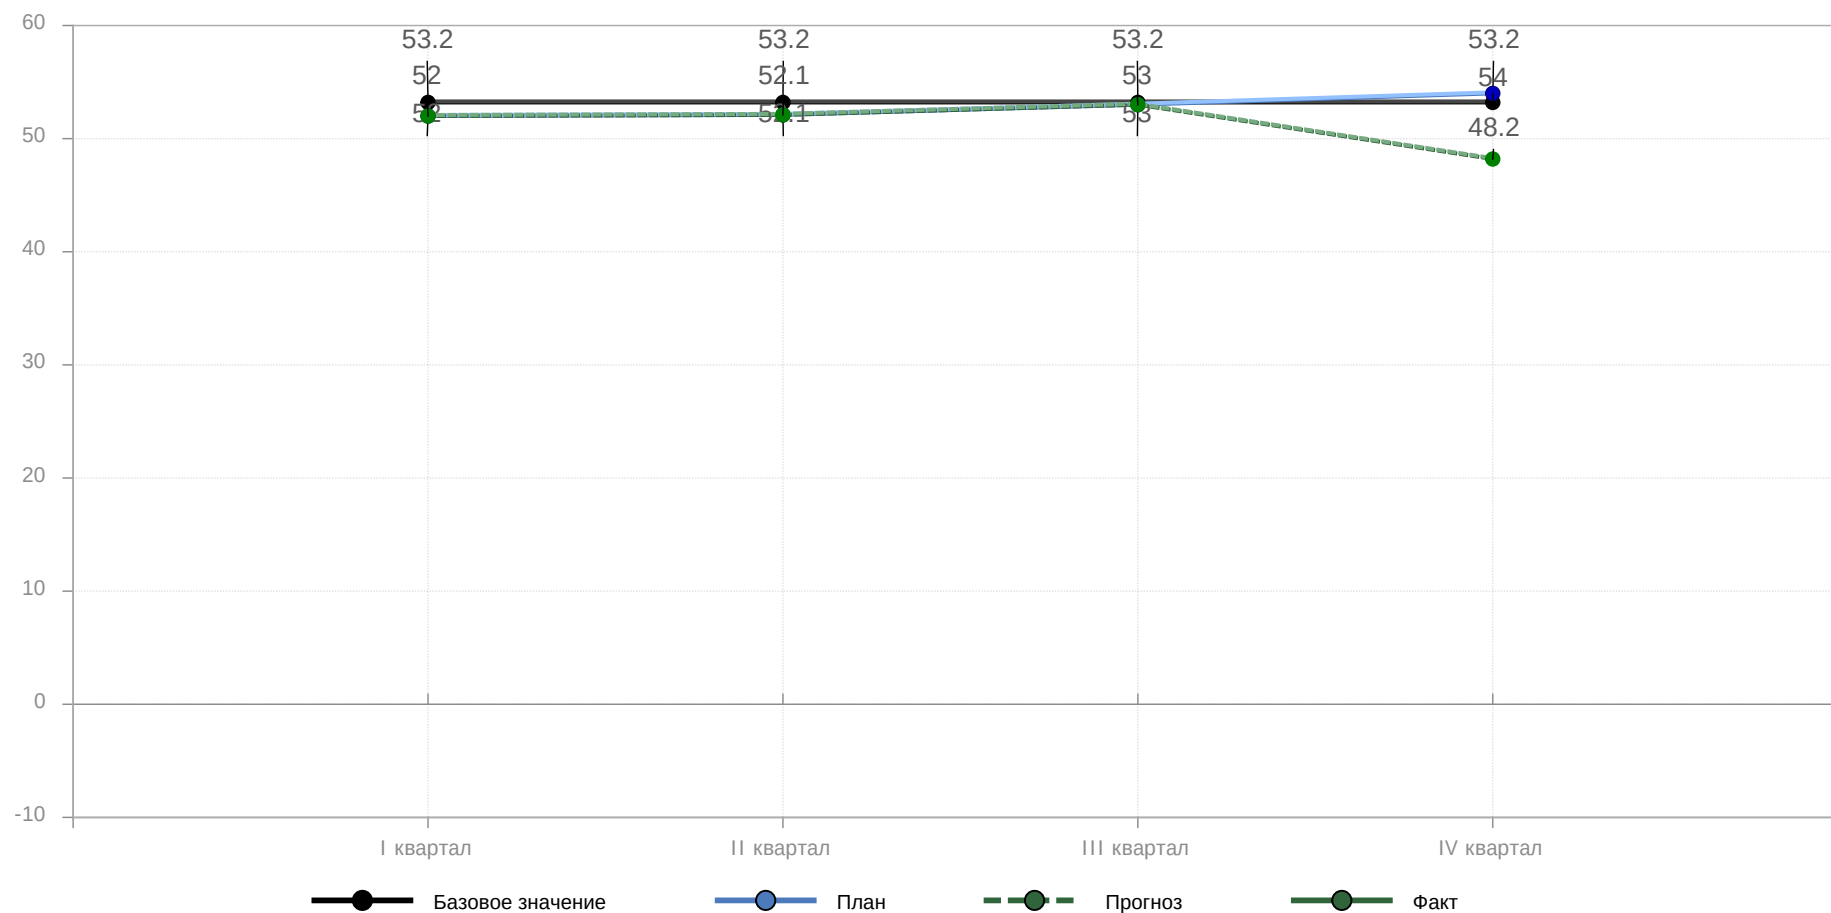


Рис. 5. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

Диаграмма достижения показателя

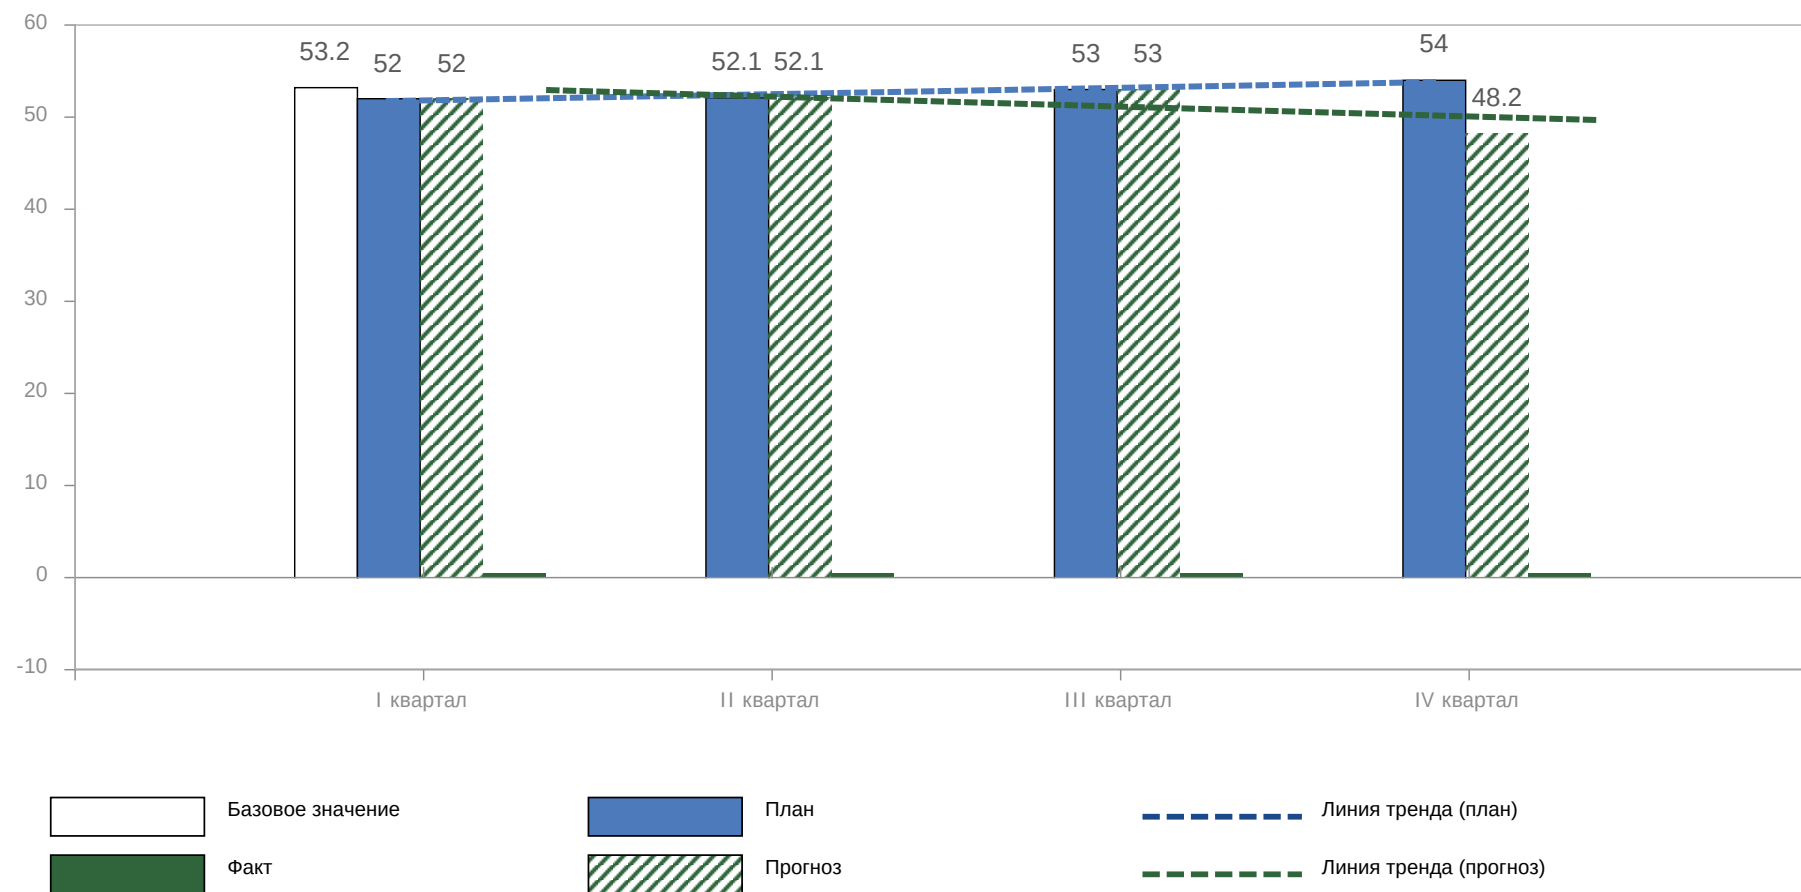


Рис. 6. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %
