

Руководитель
регионального проекта —
Садиков Максим Владимирович

ОДОБРЕН

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

24.01.2020

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
209E77DF83F221F7B3B98842C16EF062C485DA6E
Владелец: САДИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Действителен: с 13.01.2020 по 13.04.2021

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(D6-32) Цифровое государственное управление (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля приоритетных государственных и муниципальных услуг и сервисов, оказываемых органами государственной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	Процент	0	0	0	0	0	0	0,00%	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
2		Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных и муниципальных услуг и сервисов, оказываемых органами государственной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, от числа отказов в 2018 году	Процент	100	0	0	0	95	95	100,00%	
3		Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами государственной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	Процент	0	0	0	0	0	0	0,00%	
4		Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений	Процент	0	0	0	0	0	0	0,00%	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Обеспечено предоставление в Кемеровской области государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов	4 918,30	4 918,30	4 918,30	4 918,26	4 918,26	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 918,30	4 918,30	4 918,30	4 918,26	4 918,26	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 918,30	4 918,30	4 918,30	4 918,26	4 918,26	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(02) Обеспечено информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(04) В органах государственной власти Кемеровской области внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения	3 622,50	3 622,50	3 622,50	3 622,50	3 622,50	100,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 622,50	3 622,50	3 622,50	3 622,50	3 622,50	100,00	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 622,50	3 622,50	3 622,50	3 622,50	3 622,50	100,00	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		(05) Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (ФГИС ЕИСУКС) в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях	361,40	361,40	361,40	361,38	361,38	99,99	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	361,40	361,40	361,40	361,38	361,38	99,99	
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	361,40	361,40	361,40	361,38	361,38	99,99	
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		(08) Обеспечено использование системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и платформы межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативной справочной информации – ЕСНСИ) и переход на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		(15) Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления	6 658,30	6 658,30	6 658,30	6 649,89	6 649,89	99,87	
6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	6 658,30	6 658,30	6 658,30	6 649,89	6 649,89	99,87	
6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	6 658,30	6 658,30	6 658,30	6 649,89	6 649,89	99,87	
6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7		(17) Обеспечена эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства	5 039,50	5 039,50	5 039,50	5 039,03	5 039,03	99,99	
7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 039,50	5 039,50	5 039,50	5 039,03	5 039,03	99,99	
7.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 039,50	5 039,50	5 039,50	5 039,03	5 039,03	99,99	
7.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			20 680,00	20 680,00	20 680,00	20 671,06	20 671,06	99,96	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			20 680,00	20 680,00	20 680,00	20 671,06	20 671,06	99,96	
бюджет субъекта Российской Федерации			20 680,00	20 680,00	20 680,00	20 671,06	20 671,06	99,96	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Обеспечено информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов	 1
2		Обеспечена эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства	 1
3		Обеспечено использование системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и платформы межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативной справочной информации – ЕСНСИ) и переход на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)	 1
4		Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (ФГИС ЕИСУКС) в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях	 1
5		Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления	 1
6		Обеспечено предоставление в Кемеровской области государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов	 1
7		Обеспечена унификация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) на территории Кемеровской области на основе типовых стандартов и реестров государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства	 1
8		В органах государственной власти Кемеровской области внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения	 4

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
9		В Кемеровской области обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица	 1
10		Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности (далее – ТОР КНД) для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), иных информационных систем управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающих управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человекоусприимой форме	 1
11		Обеспечено официальное опубликование нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области) в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (далее – ГСПИ) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)	 1

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Обеспечено предоставление в Кемеровской области государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов Значение: 0, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Садиков М. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Доклад к заседанию координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области об итогах реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» в 2019 году " Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по результату: Выполнено.
1.1	ПК		Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально)	31.12.2019	31.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.1	РРП		Утверждение и актуализация планов мероприятий («дорожных карт») по переходу на предоставление приоритетных государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально)	31.12.2019	31.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено.
1.1.2	РРП		Технологический переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в цифровом виде в соответствии с целевой моделью, включая перевод процессов оказания государственных и муниципальных услуг на облачную цифровую платформу, интеграция региональных ведомственных информационных систем с облачной цифровой платформой, оптимизация	31.12.2019	31.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2			Обеспечено информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов Значение: 1, на дату 31.12.2019	31.12.2019	29.12.2019	Садиков М. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "доклад к заседанию координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области об итогах реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление" в 2019 году " Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 29.12.2019г. №б/н, приложен файл. Информация по результату: В работе.
2.1	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	16.09.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проделанной работе по популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг и сервисов" Отчет Департамента информационных технологий Кемеровской области от 16.09.2019г. №б/н, приложен файл.
2.1.1	РПП		Популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг и сервисов	31.12.2019	16.09.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проделанной работе по популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг и сервисов" Отчет Департамента информационных технологий Кемеровской области от 16.09.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3			Обеспечена унификация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) на территории Кемеровской области на основе типовых стандартов и реестров государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства Значение: 1, на дату 31.12.2021	31.12.2021	27.12.2019	Садиков М. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " годуд к заседанию координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области об итогах реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление" в 2019 году" Отчет департамента инфоормационных технологий Кемеровской области от 27.12.2019г. №б/н, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
3.1	ПК		Документ разработан	31.12.2021	27.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доклад к заседанию координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области об итогах реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» в 2019 году" Отчет Департамент информационных технологий Кемеровской области от 27.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1.1	РРП		Разработка регламента деятельности МФЦ и единого стандарта обслуживания заявителей	31.12.2019	27.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "регламент работы государственного автономного учреждения Кемеровской области "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кемеровской области" регламент департамента информационных технологий Кемеровской области от 25.12.2019г. №44, приложен файл. 2. "об утверждении Регламента работы Государственного автономного учреждения Кемеровской области "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кемеровской области" и единого стандарта обслуживания заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе Государственного автономного учреждения Кемеровской области "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кемеровской области"" Приказ департамента информационных технологий Кемеровской области от 25.12.2019г. №44, приложен файл. 3. "единый стандарт обслуживания заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе государственного автономного учреждения Кемеровской области "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кемеровской области"" Иное департамента информационных технологий Кемеровской области от 25.12.2019г. №44, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4			<i>В органах государственной власти Кемеровской области внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения Значение: 1, на дату 31.12.2019</i>	31.12.2019	31.12.2019	Садиков М. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Доклад к заседанию координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области об итогах реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» в 2019 году " Отчет Департамент информационных технологий Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: Выполнено.
4.1	ПК		Закупка включена в план закупок	31.12.2019	24.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доклад к заседанию координационного совета" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 24.12.2019г. №б/н, приложен файл.
4.1.1	РРП		Переход исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на использование отечественного офисного программного обеспечения	31.12.2019	24.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проделанной работе по мероприятию "Переход исполнительных органов государственной власти Кемеровской области-Кузбасса на использование отечественного офисного программного обеспечения"" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 24.12.2019г. №б/н, приложен файл.
4.2	ПК		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	31.12.2019	24.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доклад к заседанию координационного совета" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 24.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.2.1	РРП		Переход исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на использование отечественного офисного программного обеспечения	31.12.2019	24.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проделанной работе по мероприятию "Переход ИОГВ Кемеровской области-Кузбасса на использование отечественного программного обеспечения"" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 24.12.2019г. №б/н, приложен файл.
4.3	ПК		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2019	31.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доклад к заседанию координационного совета" Отчет департамент информационных технологий Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
4.3.1	РРП		Переход исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на использование отечественного офисного программного обеспечения	31.12.2019	31.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проделанной работе по мероприятию "Переход исполнительных органов государственной власти кемеровской области -Кузбасса на использование отечественного офисного программного обеспечения"" Отчет департамент информационных технологий Кемеровской области от 24.12.2019г. №б/н, приложен файл.
4.4	ПК		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	31.12.2019	24.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доклад к заседанию координационного совета" Отчет департамент информационных технологий Кемеровской области от 24.12.2019г. №б/н, приложен файл.
4.4.1	РРП		Переход исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса на использование отечественного офисного программного обеспечения	31.12.2019	24.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по проделанной работе по мероприятию "Переход ИОГВ Кемеровской области -Кузбасса на использование отечественного офисного программного обеспечения"" Отчет департамент информационных технологий Кемеровской области от 24.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5			Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (ФГИС ЕИСУКС) в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях Значение: 1, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Садиков М. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доклад к заседанию координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области об итогах реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление" в 2019 году" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
5.1	ПК		Органы государственной власти Кемеровской области, их подведомственные учреждения используют ФГИС ЕИСУКС	31.12.2019	16.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет по контрольной точке" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 16.12.2019г. №б/н, приложен файл.
5.1.1	РПП		Внедрение ФГИС ЕИСУКС в органах государственной власти Кемеровской области	31.12.2019	16.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о проделанной работе по внедрению ФГИС ЕИСУКС" Отчет департамент информационных технологий Кемеровской области от 16.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6			<i>В Кемеровской области обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица Значение: 1, на дату 31.12.2021</i>	31.12.2021	29.12.2019	Садиков М. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "доклад к заседанию координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области об итогах реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление" в 2019 году" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 29.12.2019г. №б/н, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
6.1	ПК		Обеспечена регистрация граждан в ЕСИА	31.12.2019	29.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятия по регистрации граждан в ЕСИА" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 29.12.2019г. №б/н, приложен файл.
6.1.1	РПП		Регистрация граждан в ЕСИА, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственные им учреждения	31.12.2019	29.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет по реализации мероприятия по регистрации граждан в ЕСИА" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 29.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7			Обеспечено официальное опубликование нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области) в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (далее – ГСПИ) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) Значение: 1, на дату 31.12.2021	31.12.2021	27.12.2019	Мальцева А. К.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доклад к заседанию координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области об итогах реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление" в 2019 году" Отчет департамент информационных технологий Кемеровской области от 27.12.2019г. №б/н, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
7.1	ПК		Официальные нормативные правовые акты нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области) публикуются в электронной форме через ГСПИ и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)	31.12.2019	27.12.2019	Мальцева А. К.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка по показателю "Обеспечено официальное опубликование нпа на "Официальном интернет-портале правовой информации"" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений






Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.1.1	РРП		Официальное опубликование нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области) в электронной форме через ГСПИ и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)	31.12.2019	27.12.2019	Мальцева А. К.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка по показателю "Обеспечено официальное опубликование нормативных правовых актов..." регионального проекта "Цифровое государственное управление" за 2019 год" Информационная справка департамент информационных технологий Кемеровской области от 27.12.2019г. №б/н, приложен файл.
8			Обеспечено использование системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и платформы межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативной справочной информации – ЕСНСИ) и переход на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3) Значение: 1, на дату 31.12.2021	31.12.2021	25.12.2019	Утенкова О. М.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доклад к заседанию координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области об итогах реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление" в 2019 году" Отчет отчета департамента информационных технологий Кемеровской области от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
8.1	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	25.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт оказания услуг" Акт департамента информационных технологий Кемеровской области от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8.1.1	РРП		Доработка сервисов региональной СМЭВ для интеграции с новой версией СМЭВ и платформой информационного межведомственного обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией	31.12.2019	25.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт оказанных услуг" Акт департамента информационных технологий Кемеровской области от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл.
9			Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности (далее – ТОР КНД) для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), иных информационных систем управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающих управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме Значение: 1, на дату 31.12.2021	31.12.2021	30.12.2019	Садиков М. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доклад к заседанию координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области об итогах реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление" в 2019 году" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
9.1	ПК		Обеспечено управление деятельностью сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), с использованием «цифрового инспектора», формирующего рабочие задания инспектору в результате оценки рисков, основанной на обработке массивов «больших данных», собранных об объектах проверок	31.12.2019	18.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доклад к заседанию координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области об итогах реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» в 2019 году " Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 18.12.2019г. №б/н, приложен файл.
9.1.1	РРП		Обследование, настройка процессов контроля и надзора в Государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (далее – ГИС ТОР КНД) по пилотным видам регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с региональной практикой	31.12.2019	18.11.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт приемки-сдачи услуг" Акт Департамента информационных технологий Кемеровской области от 18.11.2019г. №б/н, приложен файл.
9.1.2	РРП		Обучение администраторов ГИС ТОР КНД настройке процессов контроля и надзора по пилотным видам регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с региональной практикой	31.12.2019	18.11.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт приемки-сдачи услуг" Акт Департамента информационных технологий Кемеровской области от 18.11.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
9.1.3	РРП		Подключение к ГИС ТОР КНД исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора)	31.12.2019	16.09.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проделанной работе по подключению к ГИС ТОР КНД исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора)" Отчет Департамента информационных технологий Кемеровской области от 16.09.2019г. №б/н, приложен файл.
9.1.4	РРП		Использование ГИС ТОР КНД в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора)	31.12.2019	18.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет использования ГИС ТОР КНД" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 18.12.2019г. №б/н, приложен файл.
10			Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления Значение: 1, на дату 31.12.2021	31.12.2021	24.12.2019	Утенкова О. М.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доклад к заседанию координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области об итогах реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление" в 2019 году" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 24.12.2019г. №б/н, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
10.1	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	24.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет по контрольной точке "Услуга оказана (работы выполнены)"" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 24.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений







Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
10.1.1	РРП		Внедрение автоматизированной информационной системы «Электронный документооборот Администрации Кемеровской области» в исполнительных органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органах местного самоуправления	31.12.2019	24.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет по контрольной точке "Услуга оказана (работы выполнены)"" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 24.12.2019г. №б/н, приложен файл.
11			Обеспечена эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства Значение: 1, на дату 31.12.2019	31.12.2019	26.12.2019	Утенкова О. М.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по результату "Эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства " регионального проекта "Цифровое государственное управление"" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 26.12.2019г. №б/н, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
11.1	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	26.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по результату "Эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства" регионального проекта "Цифровое государственное управление"" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 26.12.2019г. №б/н, приложен файл.
11.1.1	РРП		Эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства	31.12.2019	26.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "акты выполненных работ (оказанных услуг) по эксплуатации региональной части инфраструктуры электронного правительства" Акт департамента информационных технологий Кемеровской области от 26.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Динамика достижения контрольных точек

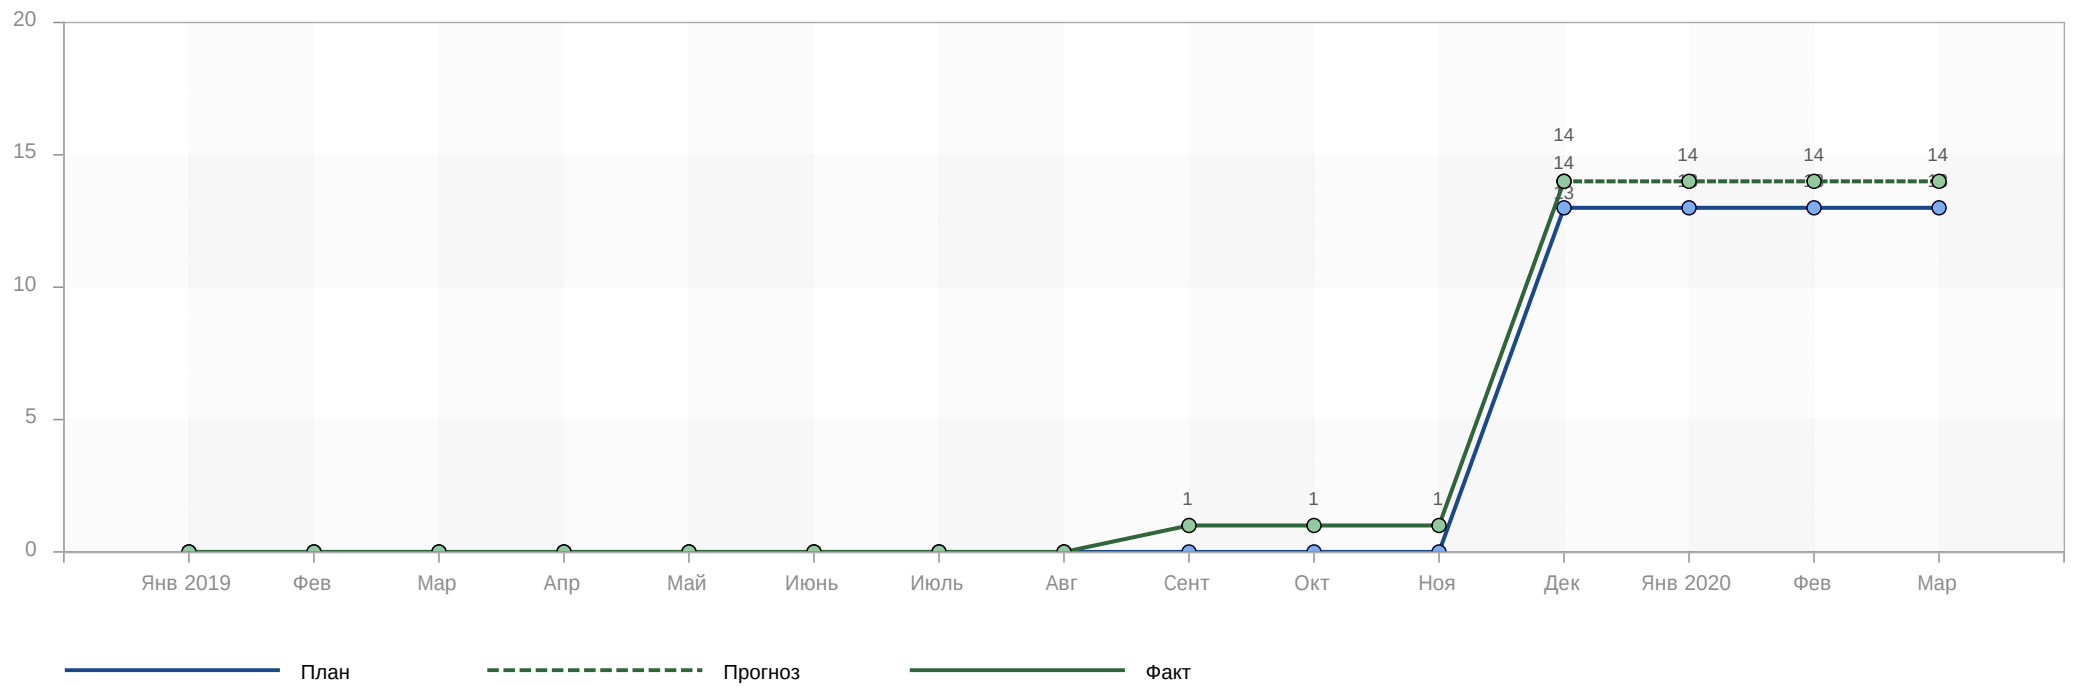


Рис. 1. "(D6-32) Цифровое государственное управление (Кемеровская область - Кузбасс)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

График достижения показателя

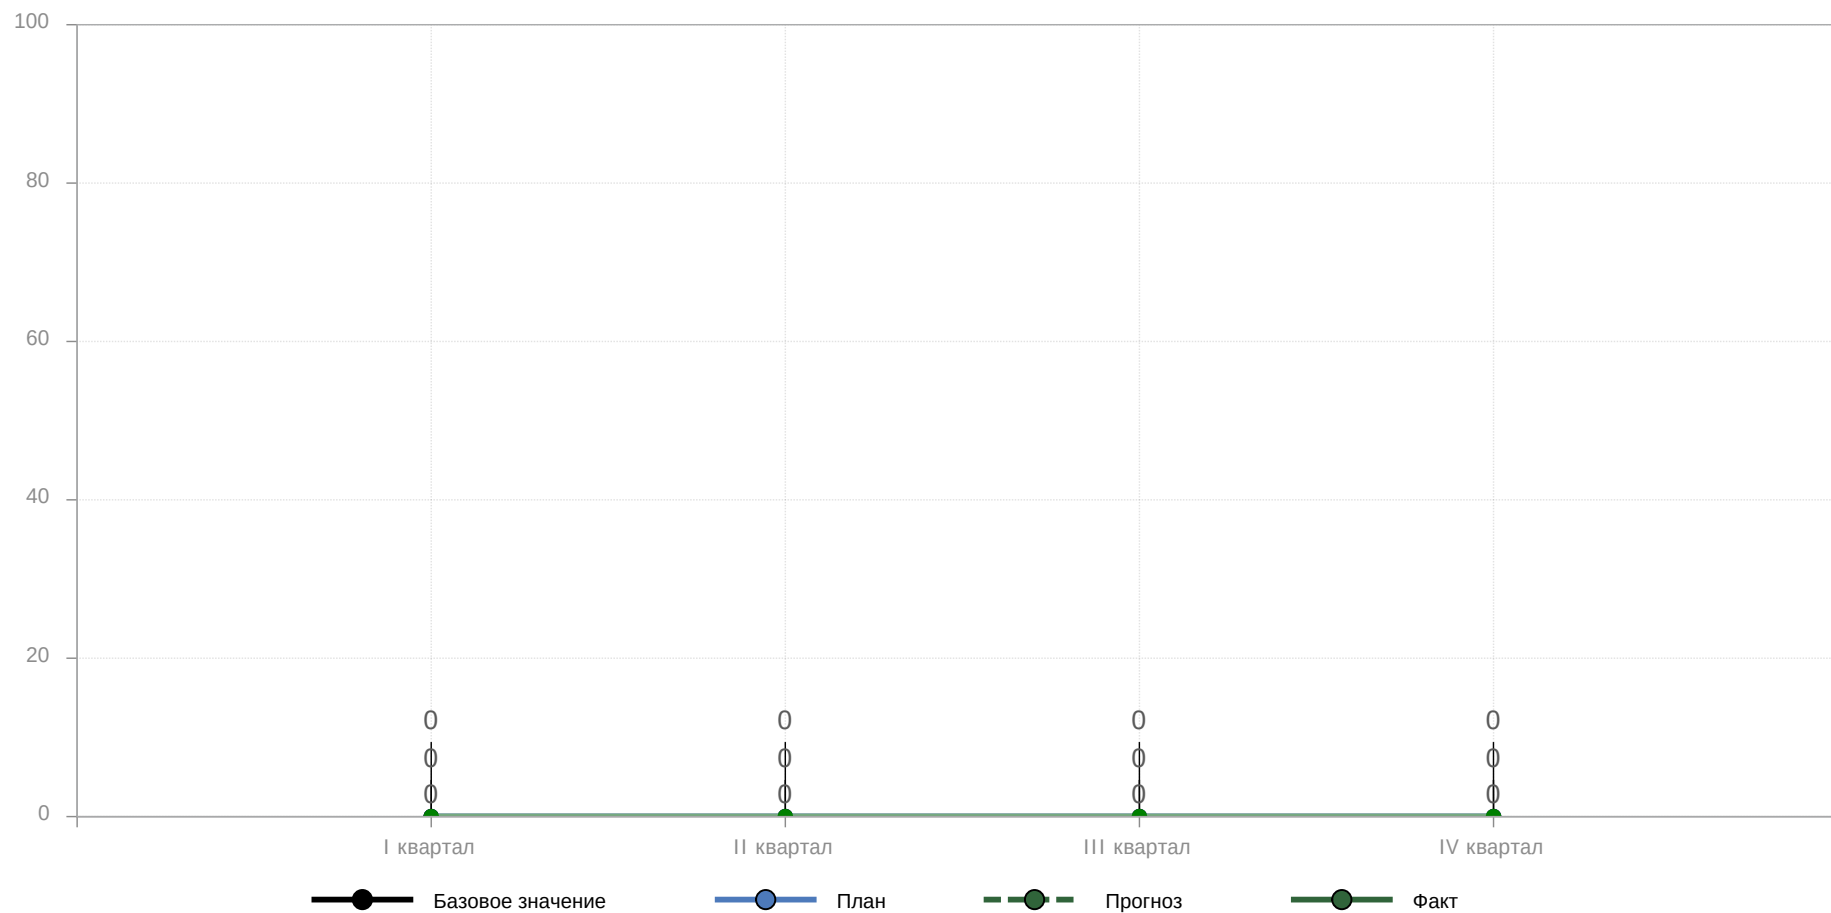


Рис. 1. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

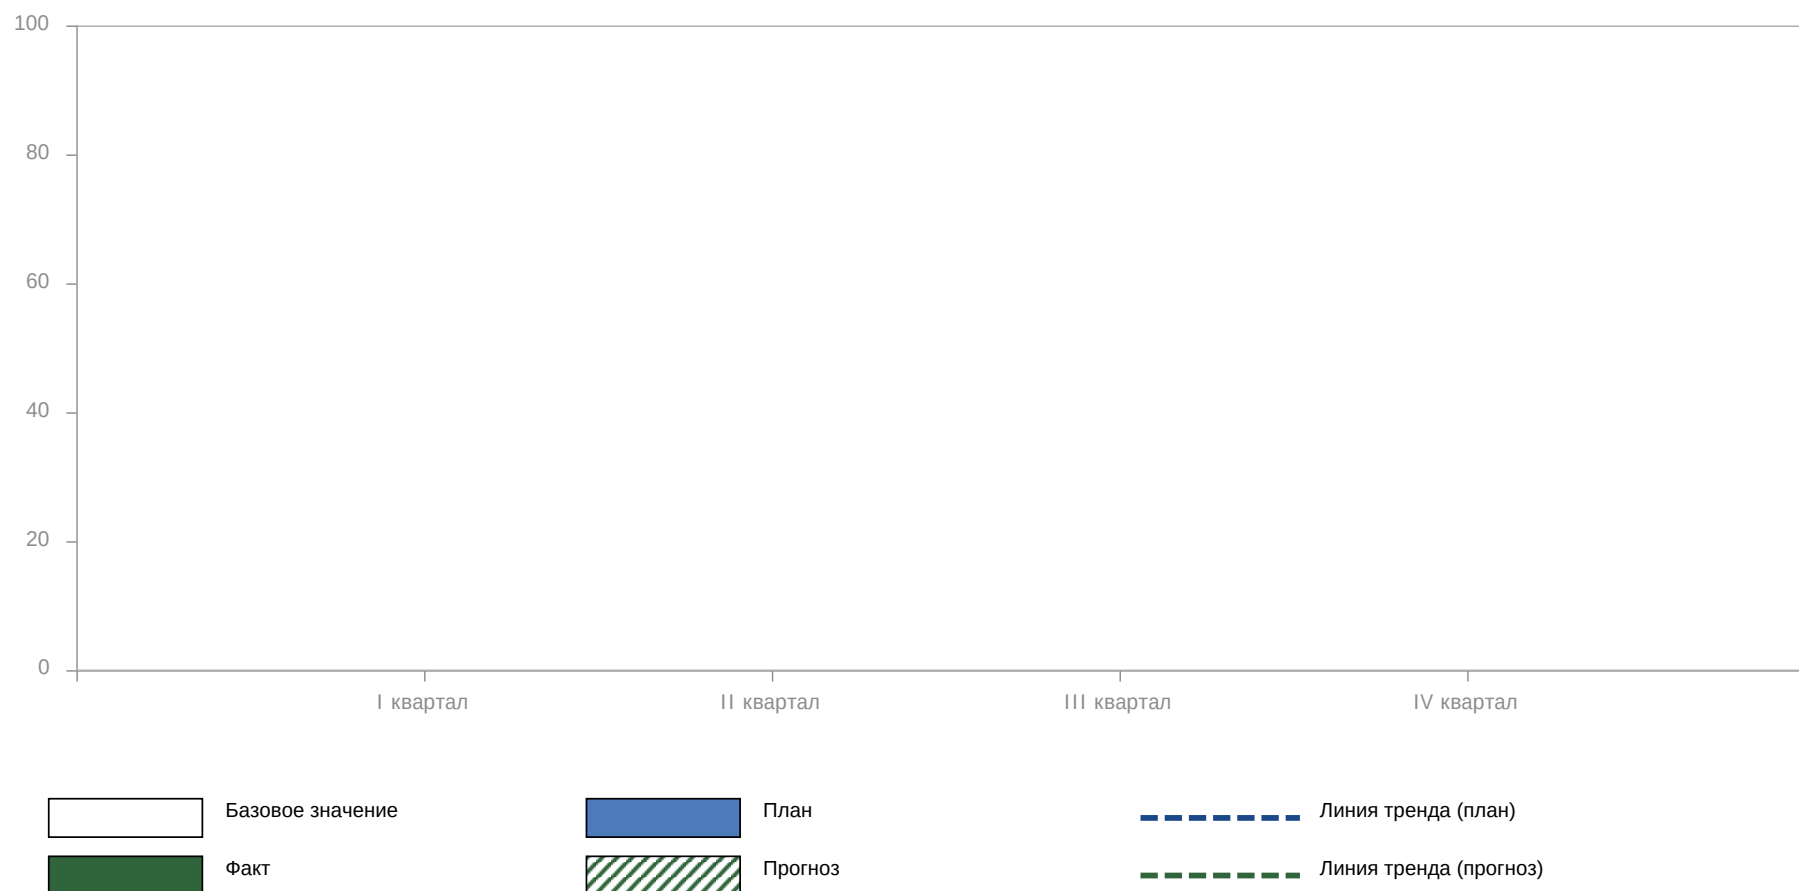


Рис. 2. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений

График достижения показателя

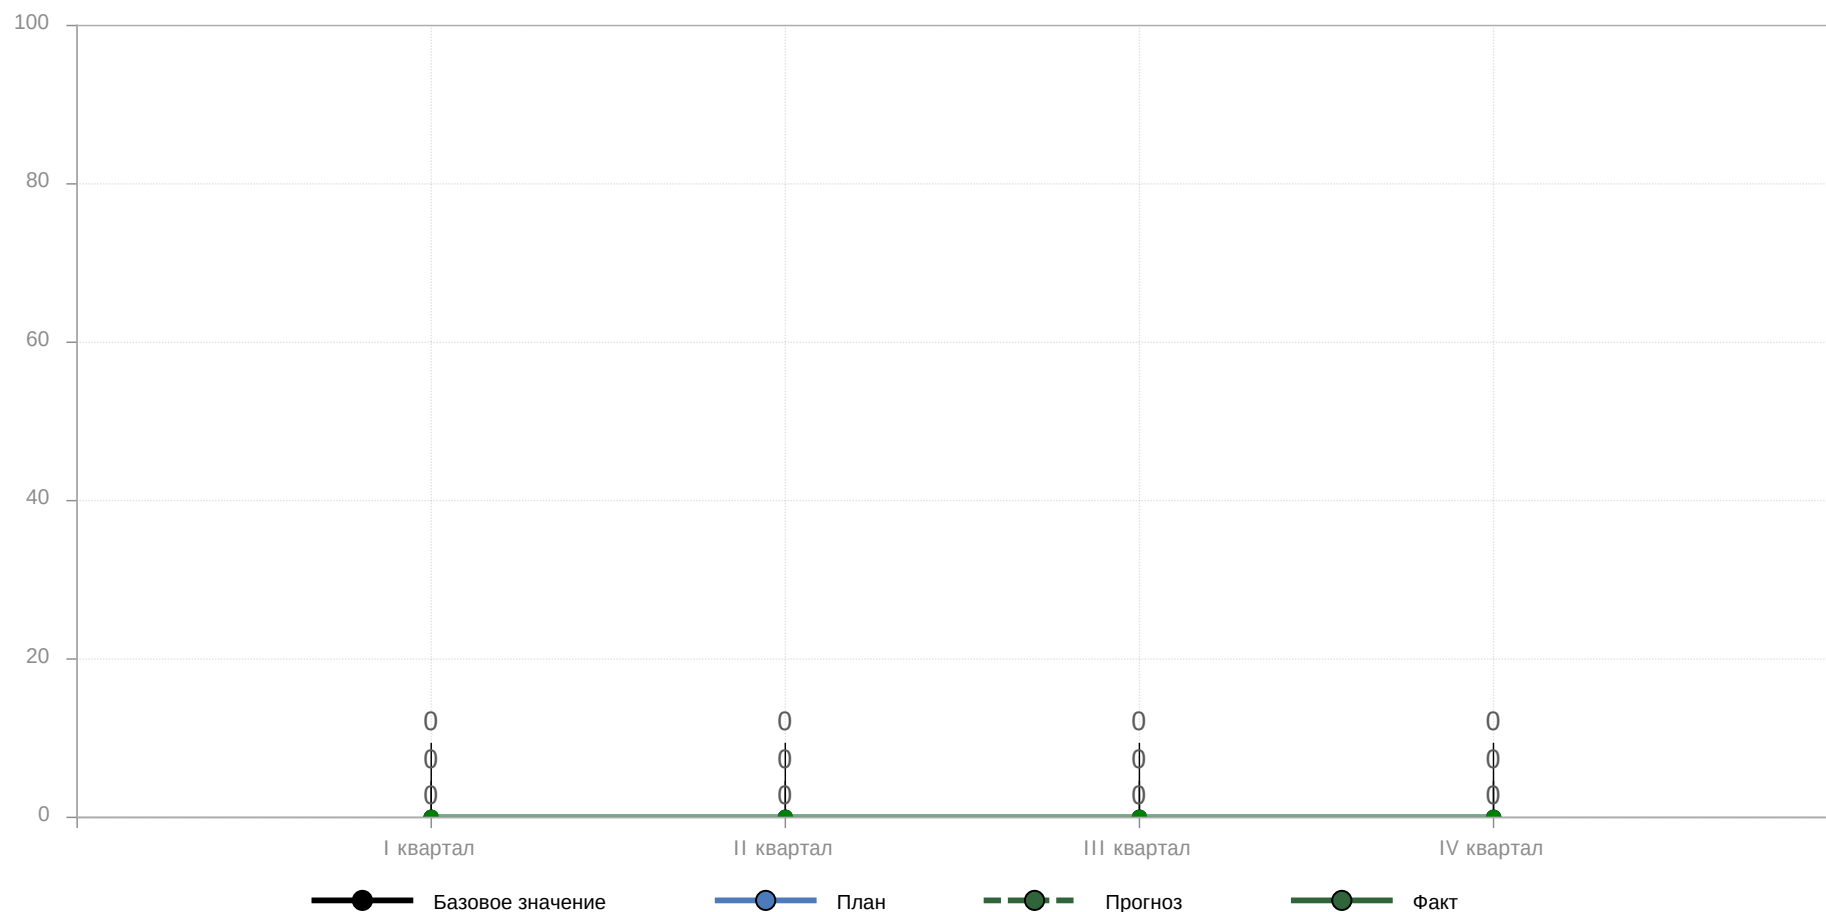


Рис. 3. Доля приоритетных государственных и муниципальных услуг и сервисов, оказываемых органами государственной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

Диаграмма достижения показателя

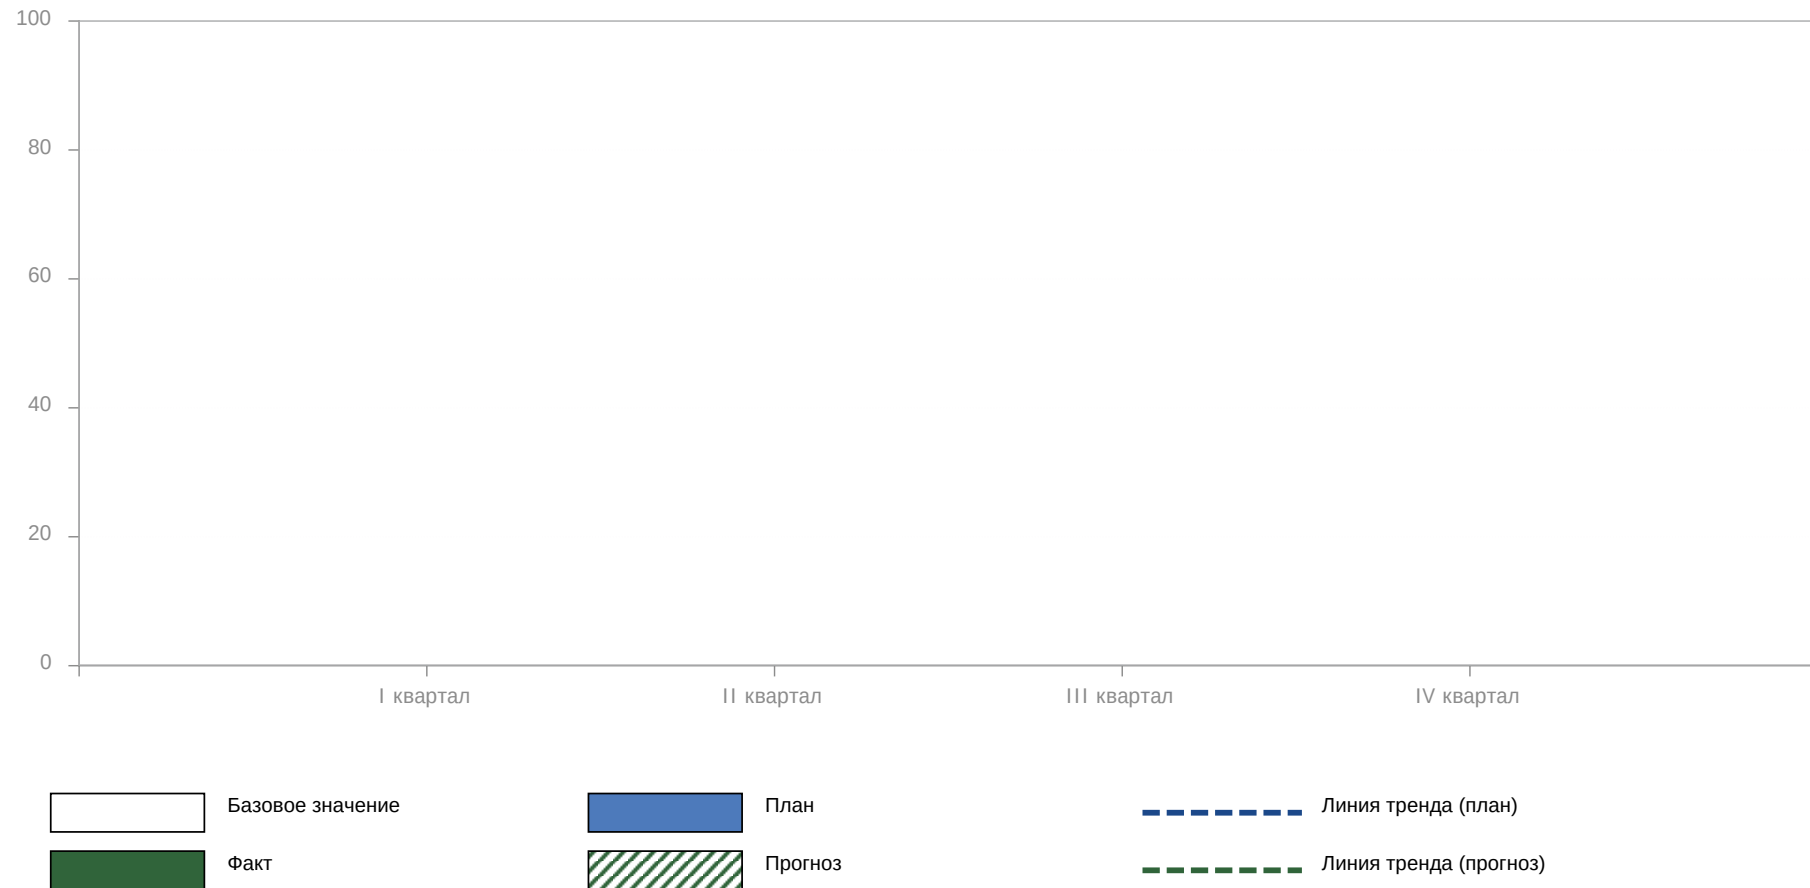


Рис. 4. Доля приоритетных государственных и муниципальных услуг и сервисов, оказываемых органами государственной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

График достижения показателя

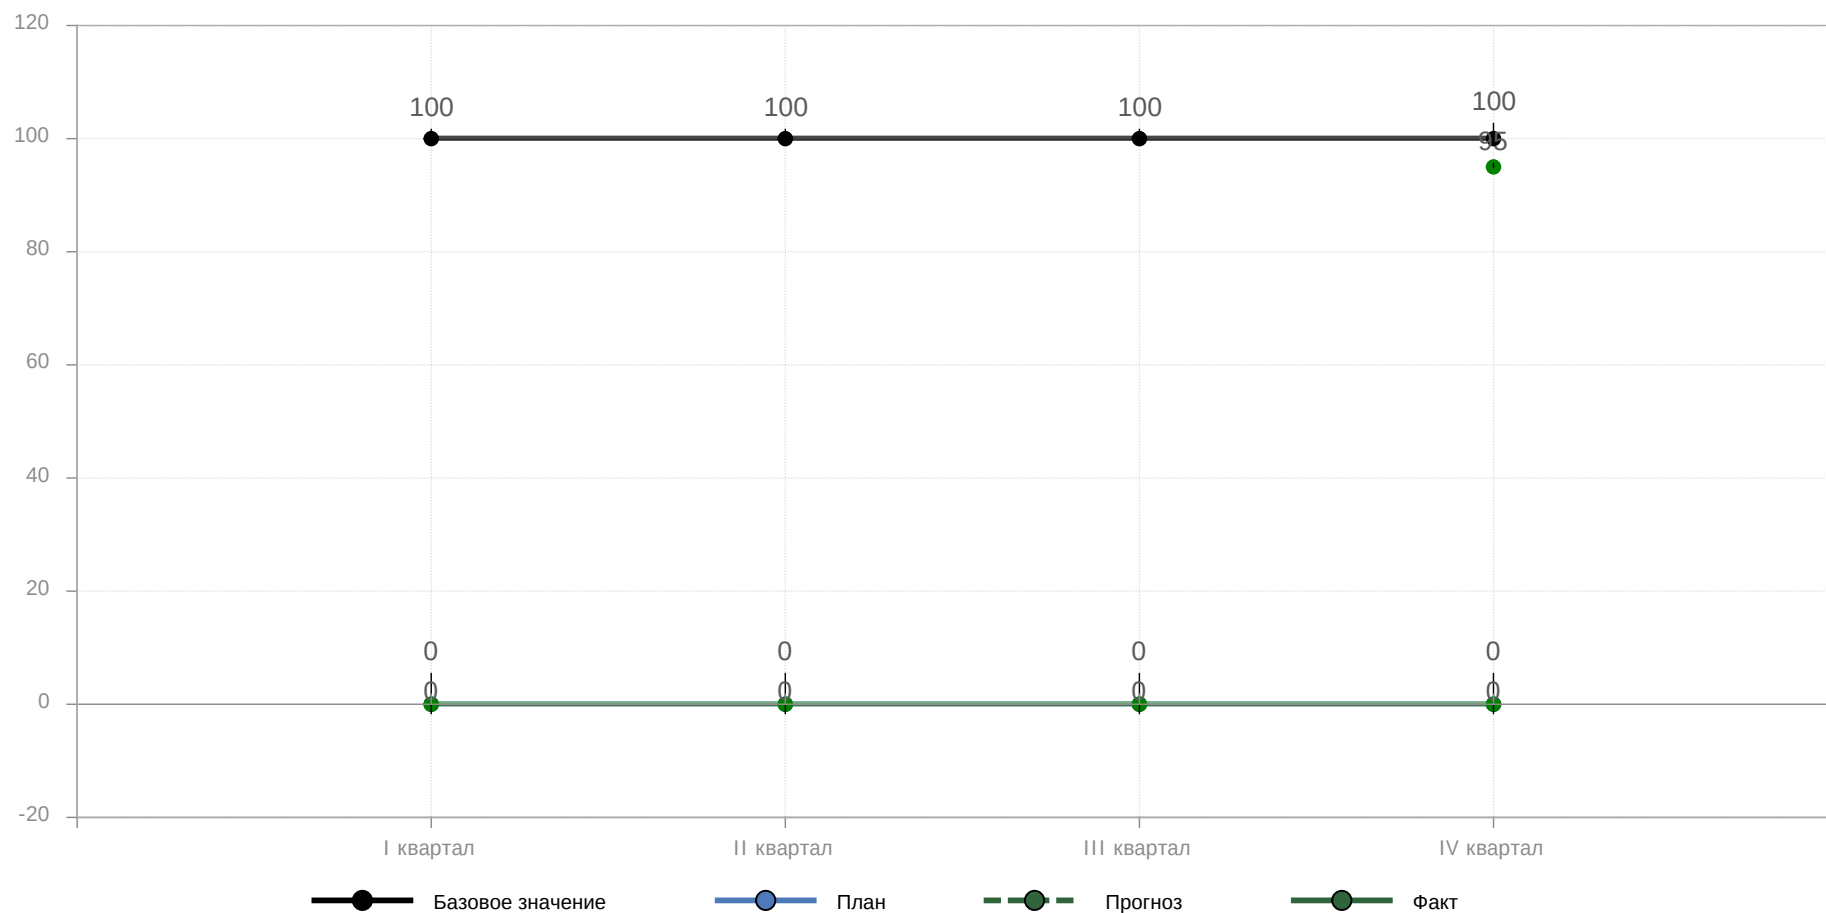


Рис. 5. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных и муниципальных услуг и сервисов, оказываемых органами государственной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, от числа отказов в 2018 году

Диаграмма достижения показателя

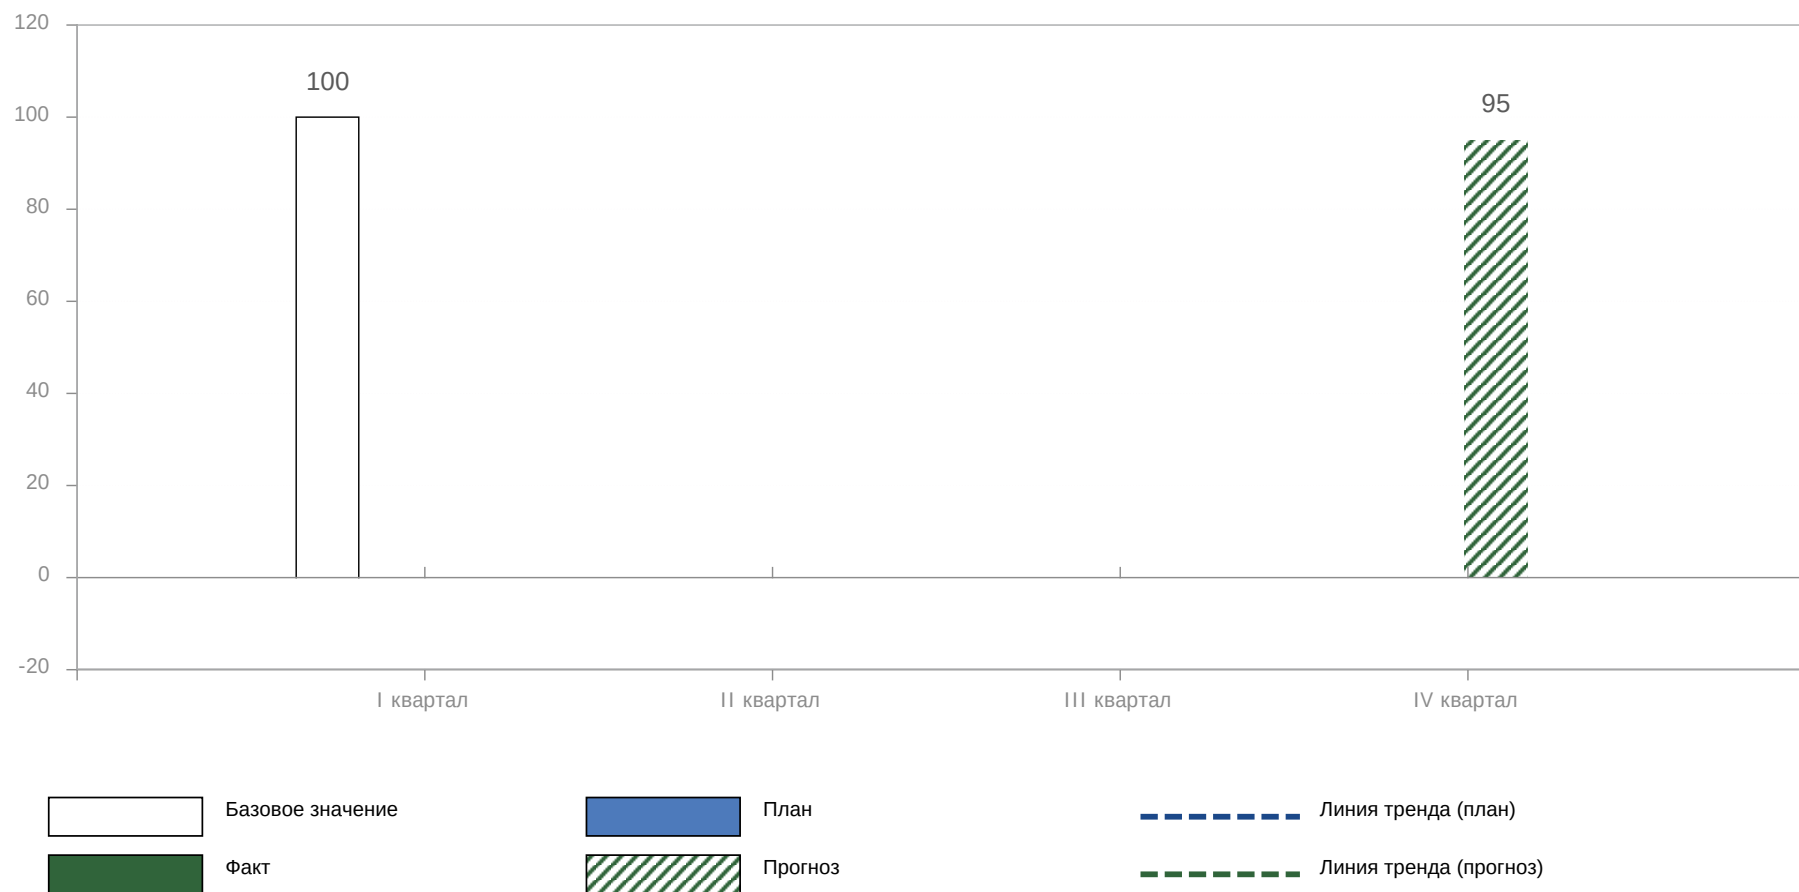


Рис. 6. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных и муниципальных услуг и сервисов, оказываемых органами государственной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, от числа отказов в 2018 году

График достижения показателя

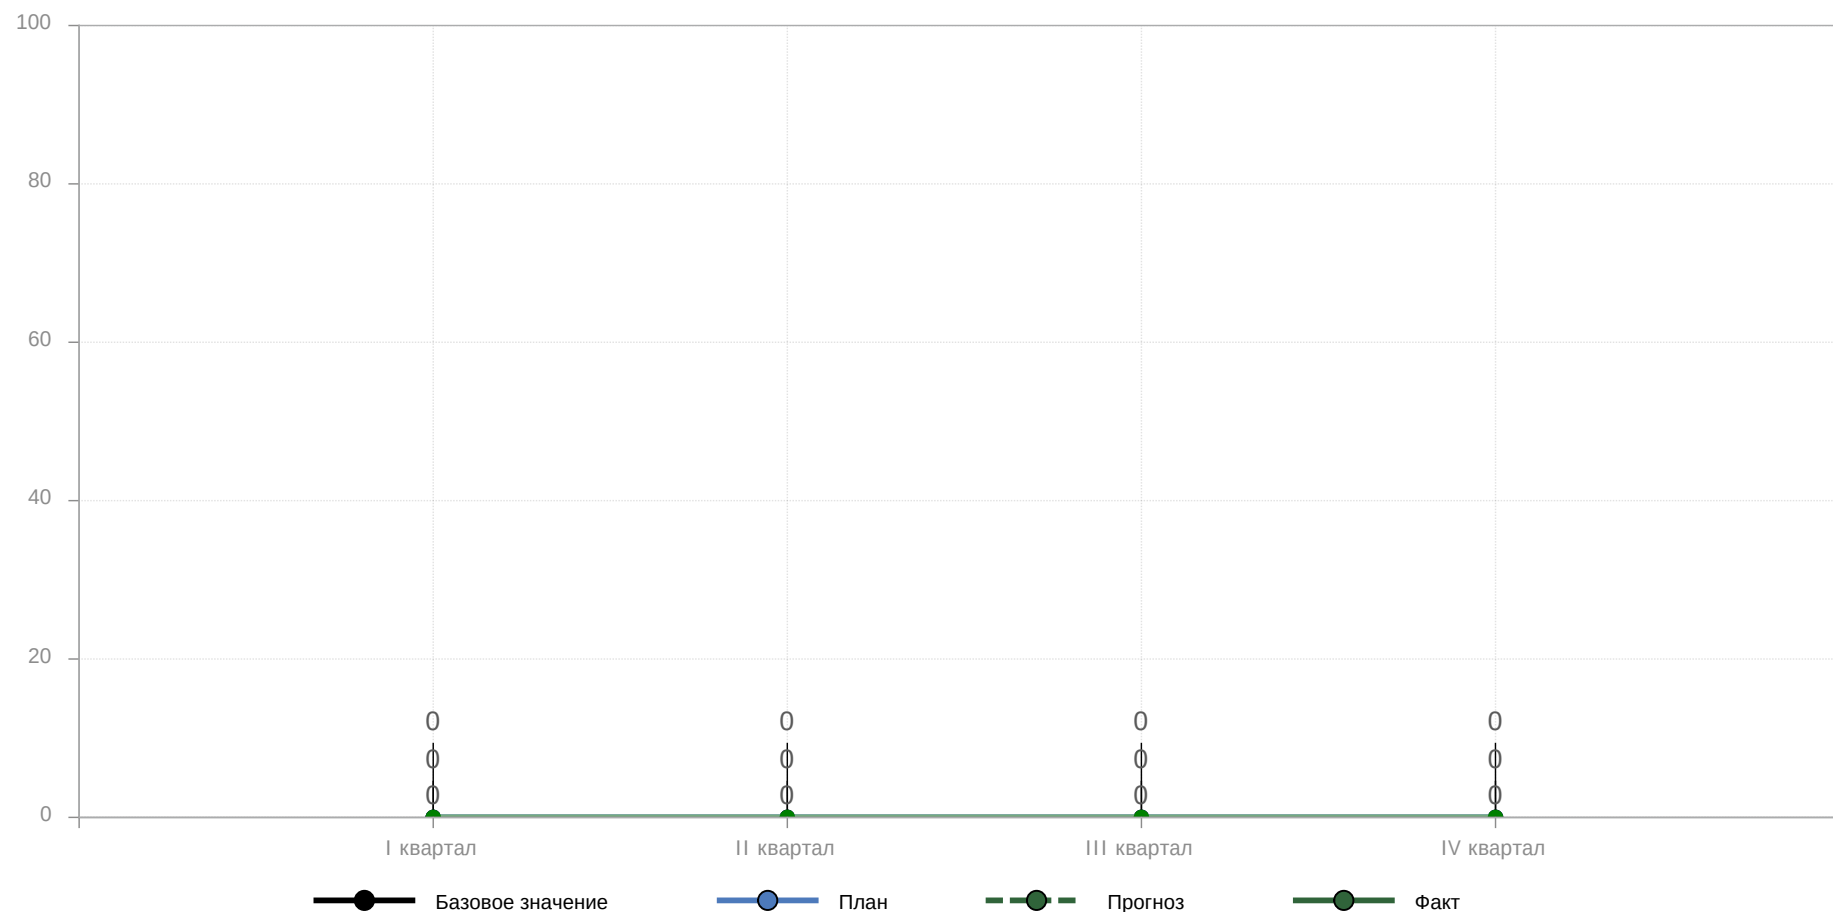


Рис. 7. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами государственной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

Диаграмма достижения показателя

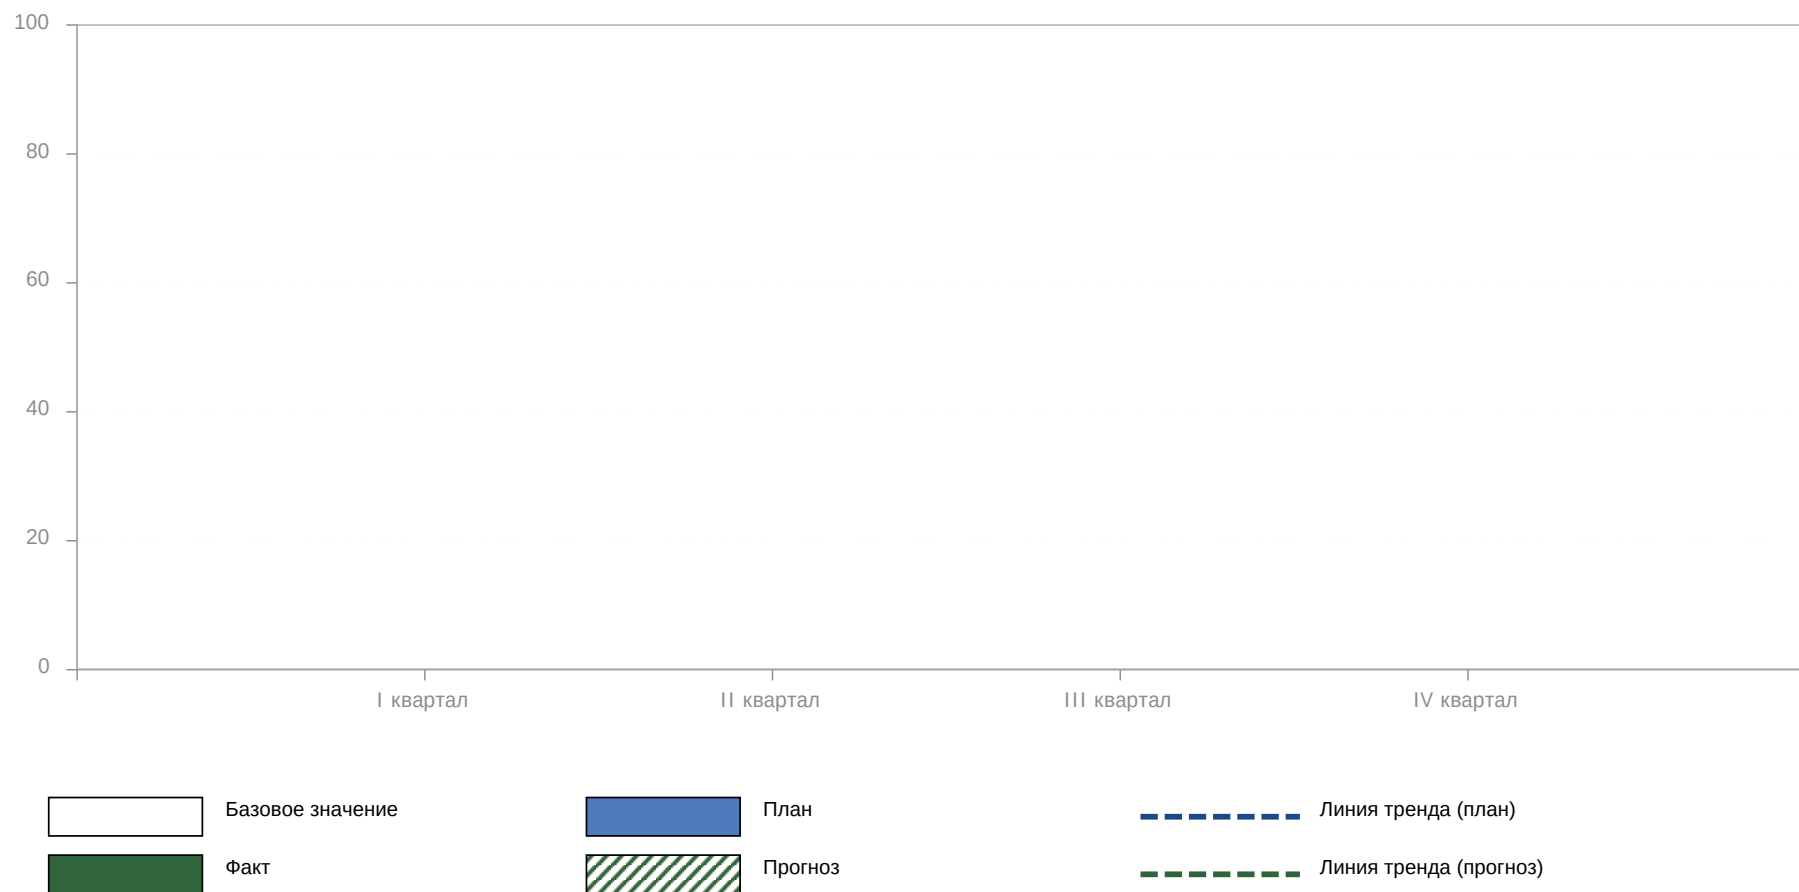


Рис. 8. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами государственной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, осуществляемых в цифровом виде
