

Руководитель
регионального проекта —
Чурина Елена Владимировна

(подпись)

19.06.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
38A23CCAB71E3F55B0A5B31CD13E72CECFEE6A32

Владелец: Чурина Елена Владимировна

Действителен: с 07.04.2020 по 07.07.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(Т6-32) Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
		–		
<i>Наличие критических отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	--	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Наличие критических отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1		6. План мероприятий	Некритический риск невыполнения, Причина риска: Не определено подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, не утверждена штатная структура подразделения, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 09.01.2020г.	1. На уровне куратора регионального проекта определить подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить штатную структуру подразделения, срок исполнения 09.01.2020, Выполнено;
2		6. План мероприятий	некритические риски невыполнения, Причина риска: Не определено подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, не утверждена штатная структура подразделения, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.01.2020г.	1. На уровне куратора регионального проекта определить подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить штатную структуру подразделения, срок исполнения 09.01.2020, Выполнено;
3		6. План мероприятий	некритические риски невыполнения, Причина риска: Не определено подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.02.2020г.	1. На уровне куратора регионального проекта определить подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить штатную структуру подразделения, срок исполнения 01.02.2020, Выполнено;
4		6. План мероприятий	Некритический риск невыполнения, Причина риска: Минэкономразвития совместно с АО "РЭЦ" выстраивают единую систему экспортной поддержки. Это делается для исключения дублирования функций в регионах, а также в целях стандартизации деятельности центров поддержки экспорта. Предусмотрена модернизация торговых представительств Российской Федерации за рубежом и интеграция центров поддержки экспорта с региональной сетью РЭЦ. Между точками региональной и международной сети будут обеспечены сквозные процессы, все будет подключено к единому программно-техническому комплексу, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 30.04.2020г.	1. Обеспечить работу регионального центра поддержки экспорта как одного из элементов сквозных процессов, срок исполнения 30.04.2020, Выполнено;
5		6. План мероприятий	Некритический риск невыполнения, Причина риска: Со стороны руководителя федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорту" Слепнева А.А. (АО "РЭЦ")	1. Ожидаются запросы со стороны руководителя федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорту" Слепнева

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

			концепция проведения в России "Года экспортера" и запросы на предложения от регионов по проведению мероприятий не поступали., Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.02.2020г.	А.А. (АО "РЭЦ") запросы на предложения от регионов по проведению мероприятий, срок исполнения 01.02.2020, Выполнено;
6		6. План мероприятий	некритические риски невыполнения, Причина риска: Не определено подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, не утверждена штатная структура подразделения, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.02.2020г.	1. На уровне куратора регионального проекта определить подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить штатную структуру подразделения, срок исполнения 01.02.2020, Выполнено;
7		6. План мероприятий	некритические риски невыполнения, Причина риска: Не определено подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, не утверждена штатная структура подразделения, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г.	1. На уровне куратора регионального проекта определить подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить штатную структуру подразделения, срок исполнения 31.12.2019, Выполнено;
8		6. План мероприятий	некритические риски невыполнения, Причина риска: Не определено подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, не утверждена штатная структура подразделения, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.02.2020г.	1. На уровне куратора регионального проекта определить подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить штатную структуру подразделения, срок исполнения 01.02.2020, Выполнено;
9		6. План мероприятий	некритические риски невыполнения, Причина риска: Не определено подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, не утверждена штатная структура подразделения, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 09.01.2020г.	1. На уровне куратора регионального проекта определить подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить штатную структуру подразделения, срок исполнения 09.01.2020, Выполнено;
10		6. План мероприятий	некритические риски невыполнения, Причина риска: Не определено подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, не утверждена штатная структура подразделения, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 09.01.2020г.	1. На уровне куратора регионального проекта определить подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить штатную структуру подразделения, срок исполнения 09.01.2020, Выполнено;
11		6. План мероприятий	некритические риски невыполнения, Причина риска: Не определено	1. На уровне куратора регионального проекта

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

			подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, не утверждена штатная структура подразделения, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.02.2020г.	определить подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить штатную структуру подразделения, срок исполнения 01.02.2020, Выполнено;
12		6. План мероприятий	Некритические риски невыполнения, Причина риска: Минэкономразвития совместно с АО "РЭЦ" выстраивают единую систему экспортной поддержки. Это делается для исключения дублирования функций в регионах, а также в целях стандартизации деятельности центров поддержки экспорта. Предусмотрена модернизация торговых представительств Российской Федерации за рубежом и интеграция центров поддержки экспорта с региональной сетью РЭЦ. Между точками региональной и международной сети будут обеспечены сквозные процессы, все будут подключены к единому программно-техническому комплексу, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 30.04.2020г.	1. Обеспечить работу регионального центра поддержки экспорта как одного из элементов сквозных процессов, срок исполнения 30.04.2020, Выполнено;
13		6. План мероприятий	Некритический риск невыполнения, Причина риска: Со стороны руководителя федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорту" Слепнева А.А. (АО "РЭЦ") концепция проведения в России "Года экспортера" и запросы на предложения от регионов по проведению мероприятий не поступали., Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.02.2020г.	1. Ожидается со стороны руководителя федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорту" Слепнева А.А. (АО "РЭЦ") запросы на предложения от регионов по проведению мероприятий, срок исполнения 01.02.2020, Выполнено;
14		6. План мероприятий	некритические риски невыполнения, Причина риска: Не определено подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, не утверждена штатная структура подразделения, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.02.2020г.	1. На уровне куратора регионального проекта определить подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить штатную структуру подразделения, срок исполнения 01.02.2020, Выполнено;
15		6. План мероприятий	некритические риски невыполнения, Причина риска: Не определено подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, не утверждена штатная структура подразделения, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.02.2020г.	1. На уровне куратора регионального проекта определить подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить штатную структуру подразделения, срок исполнения 01.02.2020, Выполнено;

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество зарубежных бизнес-миссий, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере	Единица	0	0	0	0	4	1	400,00%	Подтверждающие документы: 1. "на отчет в Инстаграмм о пребывании кузбасских бизнес-миссий за рубежом" Ссылка Регионального центра поддержки экспорта от 31.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "на отчет в Инстаграмм о пребывании кузбасских бизнес-миссий за рубежом" Ссылка Регионального центра поддержки экспорта от 31.12.2019г. №б/н, указана ссылка.
2		Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году	Процент	0	0	0	0	0	0	100,00%	
3		Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.	Штука	0	0	0	0	0	0	100,00%	
4		Число зарегистрированных уникальных пользователей (организаций и индивидуальных предпринимателей) информационной системы «одного окна»	Единица	0	0	0	0	0	0	100,00%	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений




Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения



4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Создана система институтов поддержки экспорта в Кемеровской области	 3  4
2		Компании Кемеровской области приняли участие в конкурсе на соискание Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	
3		Организовано информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах финансовой поддержки экспортной деятельности	 1  1
4		Активизировано международное взаимодействие с иностранными государствами в торгово-экономической сфере	
5		Осуществлена популяризация экспортной деятельности в Кемеровской области	 1  6  2
6		Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Создана система институтов поддержки экспорта в Кемеровской области Значение: 1, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Венгер К. Г.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: В работе.
1.1.	ПК		Сформирована и утверждена штатная структура подразделения, ответственного за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области	01.04.2019	09.01.2020	Венгер К. Г.	В работе. Просрочка 283 дней. Существует риск: некритические риски невыполнения, Причина риска: Не определено подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, не утверждена штатная структура подразделения, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 09.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. На уровне куратора регионального проекта определить подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить штатную структуру подразделения, срок исполнения 09.01.2020, Выполнено. Не выполнено, выявлены некритические риски невыполнения. Подготовлена служебная записка на Губернатора Кузбасса за подписью руководителя Представительства Кузбасса в Москве ВВ Кириллова (от 18.09.2018 №18). Ожидается виза Губернатора

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.1	РРП		Определение органа исполнительной власти Кемеровской области, ответственного за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области	01.04.2019	09.01.2020	Венгер К. Г.	В работе. Просрочка 283 дней. Существует риск: Некритический риск невыполнения, Причина риска: Не определено подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, не утверждена штатная структура подразделения, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 09.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. На уровне куратора регионального проекта определить подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить штатную структуру подразделения, срок исполнения 09.01.2020, Выполнено. Не выполнено, выявлены некритические риски невыполнения. Подготовлена служебная записка на Губернатора Кузбасса за подписью руководителя Представительства Кузбасса в Москве ВВ Кириллова (от 18.09.2018 №18). Ожидается виза Губернатора

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2.	ПК		Разработан и утвержден план работы подразделения, ответственного за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области	01.05.2019	09.01.2020	Венгер К. Г.	В работе. Просрочка 253 дней. Существует риск: некритические риски невыполнения, Причина риска: Не определено подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, не утверждена штатная структура подразделения, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 09.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. На уровне куратора регионального проекта определить подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить штатную структуру подразделения, срок исполнения 09.01.2020, Выполнено. Не выполнено, выявлены некритические риски невыполнения. Подготовлена служебная записка на Губернатора Кузбасса за подписью руководителя Представительства Кузбасса в Москве ВВ Кириллова (от 18.09.2018 №18). Ожидается виза Губернатора

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2.1	РРП		Определение органа исполнительной власти Кемеровской области, ответственного за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области	01.04.2019	09.01.2020	Венгер К. Г.	В работе. Просрочка 283 дней. Существует риск: некритические риски невыполнения, Причина риска: Не определено подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, не утверждена штатная структура подразделения, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. На уровне куратора регионального проекта определить подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить штатную структуру подразделения, срок исполнения 09.01.2020, Выполнено.
1.3.	ПК		Определен состав совещательно-координационного органа по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области	01.05.2019	05.06.2019	Чурина Е. В.	Выполнено. Просрочка 35 дней. Подтверждающие документы: 1. ""О совете по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области"" Постановление постановление Губернатора Кемеровской области от 05.06.2019г. №37-пг, приложен файл. Выполнено

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.3.1	РРП		Создание и осуществление деятельности совещательно-координационного органа (совета) по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области	01.05.2019	05.06.2019	Чурина Е. В.	Выполнено. Просрочка 35 дней. Подтверждающие документы: 1. ""О совете по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области"" Постановление постановление Губернатора Кемеровской области от 05.06.2019г. №37-пг, приложен файл. Выполнено
1.4.	ПК		Определены полномочия и порядок работы совещательно-координационного органа по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области	01.06.2019	05.06.2019	Чурина Е. В.	Выполнено. Просрочка 4 дней. Подтверждающие документы: 1. ""О совете по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области"" Постановление постановление Губернатора Кемеровской области от 05.06.2019 от 05.06.2019г. №37-пг, приложен файл. Выполнено
1.4.1	РРП		Создание и осуществление деятельности совещательно-координационного органа (совета) по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области	01.06.2019	05.06.2019	Чурина Е. В.	Выполнено. Просрочка 4 дней. Подтверждающие документы: 1. ""О совете по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области"" Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 05.06.2019г. №37-пг, приложен файл. Выполнено

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.5.	ПК		Сформированы планы работы центра поддержки экспорта в Кемеровской области, утверждены ключевые показатели эффективности	01.07.2019	28.06.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным учреждением, для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке"" Постановление постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2019г. №339, приложен файл. Выполнено
1.5.1	РРП		Создание центра поддержки экспорта в Кемеровской области	01.07.2019	28.06.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным учреждением, для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке"" Постановление постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2019г. №339, приложен файл. Выполнено

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.6.	РНП		Подготовлены и заключены соглашения с торговыми представительствами Российской Федерации за рубежом и подразделениями АО «РЭЦ» за рубежом о прохождении практик обучающимися образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Кемеровской области, а также сотрудниками органов исполнительной власти Кемеровской области, ответственных за развитие внешнеэкономической деятельности в Кемеровской области, и инфраструктуры поддержки экспорта Кемеровской области программ повышения квалификации	31.10.2019	01.02.2020	Венгер К. Г.	В работе. Просрочка 93 дней. Существует риск: некритические риски невыполнения, Причина риска: Не определено подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, не утверждена штатная структура подразделения, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.02.2020г. Предлагаемые решения: 1. На уровне куратора регионального проекта определить подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить штатную структуру подразделения, срок исполнения 01.02.2020, Выполнено. Не выполнено, выявлены некритические риски невыполнения. Органом исполнительной власти Кемеровской области, ответственным за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, будет прорабатываться вопрос о заключении соглашения с торговыми представительствами Российской Федерации за рубежом и подразделениями АО «РЭЦ» за рубежом о прохождении практик обучающимися

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.6.1	РРП		Организация работы по направлению обучающихся образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Кемеровской области, для прохождения практик, а также сотрудников органов исполнительной власти Кемеровской области, ответственных за развитие внешнеэкономической деятельности в Кемеровской области, и инфраструктуры поддержки экспорта Кемеровской области на повышение квалификации в торговые представительства Российской Федерации за рубежом и подразделения АО «РЭЦ» за рубежом	31.10.2019	01.02.2020	Венгер К. Г.	В работе. Просрочка 93 дней. Существует риск: некритические риски невыполнения, Причина риска: Не определено подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.02.2020г. Предлагаемые решения: 1. На уровне куратора регионального проекта определить подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить штатную структуру подразделения, срок исполнения 01.02.2020, Выполнено. Не выполнено, выявлены некритические риски невыполнения. Органом исполнительной власти Кемеровской области, ответственным за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, будет прорабатываться вопрос о заключении соглашения с торговыми представительствами Российской Федерации за рубежом и подразделениями АО «РЭЦ» за рубежом о прохождении практик обучающимися

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.7.	ПК		Инициирована разработка нормативных документов для поддержки центра поддержки экспорта в Кемеровской области	01.07.2019	28.05.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "«О создании автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»" Распоряжение распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.03.2019г. №161-р, приложен файл. 2. ""Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным учреждением, для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке"" Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2019г. №339, приложен файл. Выполнено

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.7.1	РРП		Создание центра поддержки экспорта в Кемеровской области	01.07.2019	28.05.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "«О создании автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»" Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.03.2019г. №161-р, приложен файл. 2. ""Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным учреждением, для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке"" Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2019г. №339, приложен файл. Выполнено.
2.			Компании Кемеровской области приняли участие в конкурсе на соискание Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» Значение: 1, на дату 31.12.2021	31.12.2021	01.02.2020	Венгер К. Г.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: В работе.
3.			Организовано информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах финансовой поддержки экспортной деятельности Значение: 1, на дату 04.02.2022	04.02.2022	04.02.2022	Венгер К. Г.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1.	ПК		Проведены консультации кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»	01.10.2019	01.10.2019	Венгер К. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об услугах и мерах поддержки Регионального центра поддержки экспорта" Ссылка Регионального центра поддержки экспорта от 01.10.2019г. №б/н, указана ссылка. Выполнено. Центром поддержки экспорта Кемеровской области на постоянной основе проводятся консультации кузбасским товаропроизводителям–экспортерам о мерах финансовой поддержки АО «РЭЦ» (42.ru). Дополнительно в рамках состоявшихся 31.07.2019 в г. Кемерово межрегионального экспортного агрофорума и 01.08.2019 в г. Новокузнецке межрегионального форума «Экспорт в приоритете» спикерами выступили представители АО "РЭЦ", которые рассказали о реализуемых мерах поддержки экспортеров
3.1.1	РРП		Оказание содействия кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»	01.10.2019	01.10.2019	Венгер К. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об оказании услуг региональным центром поддержки экспорта" Ссылка Региональный центр поддержки экспорта от 01.10.2019г. №б/н, указана ссылка. Выполнено. Центром поддержки экспорта Кемеровской области на постоянной основе проводятся консультации кузбасским товаропроизводителям–экспортерам о мерах финансовой поддержки АО «РЭЦ» (42.ru). Дополнительно в рамках состоявшихся 31.07.2019 в г. Кемерово межрегионального экспортного агрофорума и 01.08.2019 в г. Новокузнецке межрегионального форума «Экспорт в приоритете» спикерами выступили представители АО "РЭЦ", которые рассказали о реализуемых мерах поддержки экспортеров

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений






Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.2.	ПК		Проведены консультации кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»	01.01.2020	01.01.2020	Венгер К. Г.	В работе. В работе. Риск невыполнения отсутствует
3.2.1	РРП		Оказание содействия кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»	01.01.2020	01.01.2020	Венгер К. Г.	В работе. В работе. Риск невыполнения отсутствует
4.			Активизировано международное взаимодействие с иностранными государствами в торгово-экономической сфере Значение: 1, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Венгер К. Г.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: В работе.
5.			Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. Значение: 0, на дату 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	Венгер К. Г.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о внедрении Региональный экспортный стандарт в "пилотном" режиме в 22 регионах РФ" Ссылка АО "РЭЦ" от 01.12.2019г. №б/н, указана ссылка. Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по результату: Выполнено.
6.			Осуществлена популяризация экспортной деятельности в Кемеровской области Значение: 1, на дату 31.12.2024	31.12.2024	01.02.2020	Венгер К. Г.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.1.	ПК		Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации	01.07.2019	31.07.2019	Венгер К. Г.	Выполнено. Просрочка 30 дней. Подтверждающие документы: 1. "о лучших практиках экспортной деятельности" Ссылка Регионального центра поддержки экспорта от 31.07.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "о лучших практиках экспортной деятельности" Ссылка регионального центра поддержки экспорта от 31.07.2019г. №б/н, указана ссылка. Выполнено. 31.07.2019 в г. Кемерово состоялся межрегиональный экспортный агрофорум. Информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний размещены, в том числе, в средствах массовой информации в телеграм-чате @exportkuzbassa, ВКонтакте https://public184036690 , Facebook https://.com/pg/innoteh42/posts/?ref=page_internal

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.1.1	РРП		Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки	01.07.2019	31.07.2019	Венгер К. Г.	Выполнено. Просрочка 30 дней. Подтверждающие документы: 1. "о лучших практиках экспортной деятельности" Ссылка регионального центра поддержки экспорта от 31.07.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "о лучших практиках экспортной деятельности" Ссылка регионального центра поддержки экспорта от 31.07.2019г. №б/н, указана ссылка. Выполнено. 31.07.2019 в г. Кемерово состоялся межрегиональный экспортный агрофорум. Информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний размещены, в том числе, в средствах массовой информации в телеграм-чате @exportkuzbassa, ВКонтakte https://public184036690, Facebook https://.com/pg/innoteh42/posts/?ref=page_internal

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.2.	ПК		Проведен анализ экспортной деятельности компаний Кемеровской области	01.10.2019	28.11.2019	Венгер К. Г.	Выполнено. Просрочка 58 дней. Подтверждающие документы: 1. "информация о состоянии и направлениях развития экспорта региона" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 28.11.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "информация о состоянии и направлениях развития экспорта региона" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 28.11.2019г. №б/н, указана ссылка. Выполнено. В рамках состоявшихся Конференции по внешнеэкономической деятельности (26.11.2019 г. Кемерово), заседания Совета по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области (28.11.2019, г. Кемерово) руководителем Регионального центра поддержки экспорта, заместителем Губернатора Кемеровской области – руководителем представительства Администрации Кемеровской области при Правительстве РФ представлена информация о перспективных направлений по расширению международных и внешнеэкономических связей Кемеровской области. Информация размещена в разделах, посвященных развитию экспорта, на Инвестиционном портале Кемеровской области https://ru/pages/5d405446be3319630a000015 и официальном сайте департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области http://.ru/

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.2.1	РРП		Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки	01.10.2019	28.11.2019	Венгер К. Г.	Выполнено. Просрочка 58 дней. Подтверждающие документы: 1. "информация о состоянии и направлениях развития экспорта региона" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 28.11.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "информация о состоянии и направлениях развития экспорта региона" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 28.11.2019г. №б/н, указана ссылка. Выполнено. В рамках состоявшихся Конференции по внешнеэкономической деятельности (26.11.2019 г. Кемерово), заседания Совета по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области (28.11.2019, г. Кемерово) руководителем Регионального центра поддержки экспорта, заместителем Губернатора Кемеровской области – руководителем представительства Администрации Кемеровской области при Правительстве РФ представлена информация о перспективных направлений по расширению международных и внешнеэкономических связей Кемеровской области. Информация размещена в разделах, посвященных развитию экспорта, на Инвестиционном портале Кемеровской области https://ru/pages/5d405446be3319630a000015 и официальном сайте департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области http://.ru/

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.3.	ПК		Создан раздел на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области	01.10.2019	01.10.2019	Венгер К. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ссылка на раздел" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 01.10.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "ссылка на раздел" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 01.10.2019г. №б/н, указана ссылка. Выполнено. На Инвестиционном портале Кемеровской области сформирован раздел, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области https://ru/pages/5d405446be3319630a000015 Также сформирован раздел на официальном сайте департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области http://.ru/
6.3.1	РРП		Создание раздела на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области	01.10.2019	01.10.2019	Венгер К. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ссылка на раздел" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 01.10.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "ссылка на раздел" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 01.10.2019г. №б/н, указана ссылка. Выполнено. На Инвестиционном портале Кемеровской области сформирован раздел, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области https://ru/pages/5d405446be3319630a000015 Также сформирован раздел на официальном сайте департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области http://.ru/

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.4.	ПК		Подготовлены предложения по структуре и наполнению раздела	20.10.2019	20.10.2019	Венгер К. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ссылка на раздел" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 20.10.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "ссылка на раздел" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 20.10.2019г. №б/н, указана ссылка. Выполнено. На Инвестиционном портале Кемеровской области сформирован раздел, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области https://ru/pages/5d405446be3319630a000015 Также сформирован раздел на официальном сайте департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области http://.ru/
6.4.1	РРП		Создание раздела на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области	20.10.2019	20.10.2019	Венгер К. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ссылка на раздел" Ссылка департаменента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 20.10.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "ссылка на раздел" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 20.10.2019г. №б/н, указана ссылка. Выполнено. На Инвестиционном портале Кемеровской области сформирован раздел, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области https://ru/pages/5d405446be3319630a000015 Также сформирован раздел на официальном сайте департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области http://.ru/

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.5.	ПК		Сформирован и утвержден план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области	01.11.2019	01.02.2020	Венгер К. Г.	В работе. Просрочка 92 дней. Существует риск: некритические риски невыполнения, Причина риска: Не определено подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, не утверждена штатная структура подразделения, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.02.2020г. Предлагаемые решения: 1. На уровне куратора регионального проекта определить подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить штатную структуру подразделения, срок исполнения 01.02.2020, Выполнено. Не выполнено, выявлены некритические риски невыполнения в срок. рганом исполнительной власти Кемеровской области, ответственного за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области будет утвержден план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.5.1	РРП		Проведение мероприятий (конференций, семинаров) в целях популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области	01.11.2019	01.02.2020	Венгер К. Г.	В работе. Просрочка 92 дней. Существует риск: некритические риски невыполнения, Причина риска: Не определено подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, не утверждена штатная структура подразделения, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.02.2020г. Предлагаемые решения: 1. На уровне куратора регионального проекта определить подразделение, ответственное за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить штатную структуру подразделения, срок исполнения 01.02.2020, Выполнено. Не выполнено, выявлены некритические риски невыполнения в срок. Органом исполнительной власти Кемеровской области, ответственного за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области будет утвержден план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.6.	ПК		Сформирован свод лучших практик экспортной деятельности региональных компаний	15.12.2019	15.12.2019	Венгер К. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "видеосюжет" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 15.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "видеосюжет" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 15.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 3. "видеосюжет" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 15.12.2019г. №б/н, указана ссылка. Выполнено. Подготовлены и выпущены в эфир видеосюжеты "Истории успешного бизнеса" об опыте предпринимательской деятельности экспортно ориентированных кузбасских компаний: https://i/_U-UZ4d1fvGh1g https://i/MTv2qpiCEic7rg https://.com/watch?time_continue=1&v=iQP046xtuZs&feature=emb_logo

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.6.1	РРП		Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки	15.12.2019	15.12.2019	Венгер К. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "видеосюжет" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 15.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "видеосюжет" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 15.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 3. "видеосюжет" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 15.12.2019г. №б/н, указана ссылка. Выполнено. Подготовлены и выпущены в эфир видеосюжеты "Истории успешного бизнеса" об опыте предпринимательской деятельности экспортно ориентированных кузбасских компаний: https://i/_U-UZ4d1fvGh1g https://i/MTv2qpiCEic7rg https://.com/watch?time_continue=1&v=iQP046xtuZs&feature=emb_logo

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.7.	ПК		Сформирована информация для размещения на сайте	31.12.2019	31.12.2019	Венгер К. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ссылка на раздел" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "ссылка на раздел" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, указана ссылка. Выполнено. На Инвестиционном портале Кемеровской области сформирован раздел, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области https://ru/pages/5d405446be3319630a000015 Также сформирован раздел на официальном сайте департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области http://.ru/
6.7.1	РРП		Создание раздела на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области	31.12.2019	31.12.2019	Венгер К. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ссылка на раздел" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "ссылка на раздел" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, указана ссылка. Выполнено. На Инвестиционном портале Кемеровской области сформирован раздел, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области https://ru/pages/5d405446be3319630a000015 Также сформирован раздел на официальном сайте департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области http://.ru/

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.8.	ПК		Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации	01.01.2020	01.01.2020	Венгер К. Г.	В работе. В работе. Риски невыполнения отсутствуют
6.8.1	РРП		Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки	01.01.2020	01.01.2020	Венгер К. Г.	В работе.
6.9.	ПК		Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация	01.01.2020	01.01.2020	Венгер К. Г.	В работе. В работе. Риски невыполнения отсутствуют.
6.9.1	РРП		Создание раздела на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области	01.01.2020	01.01.2020	Венгер К. Г.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек

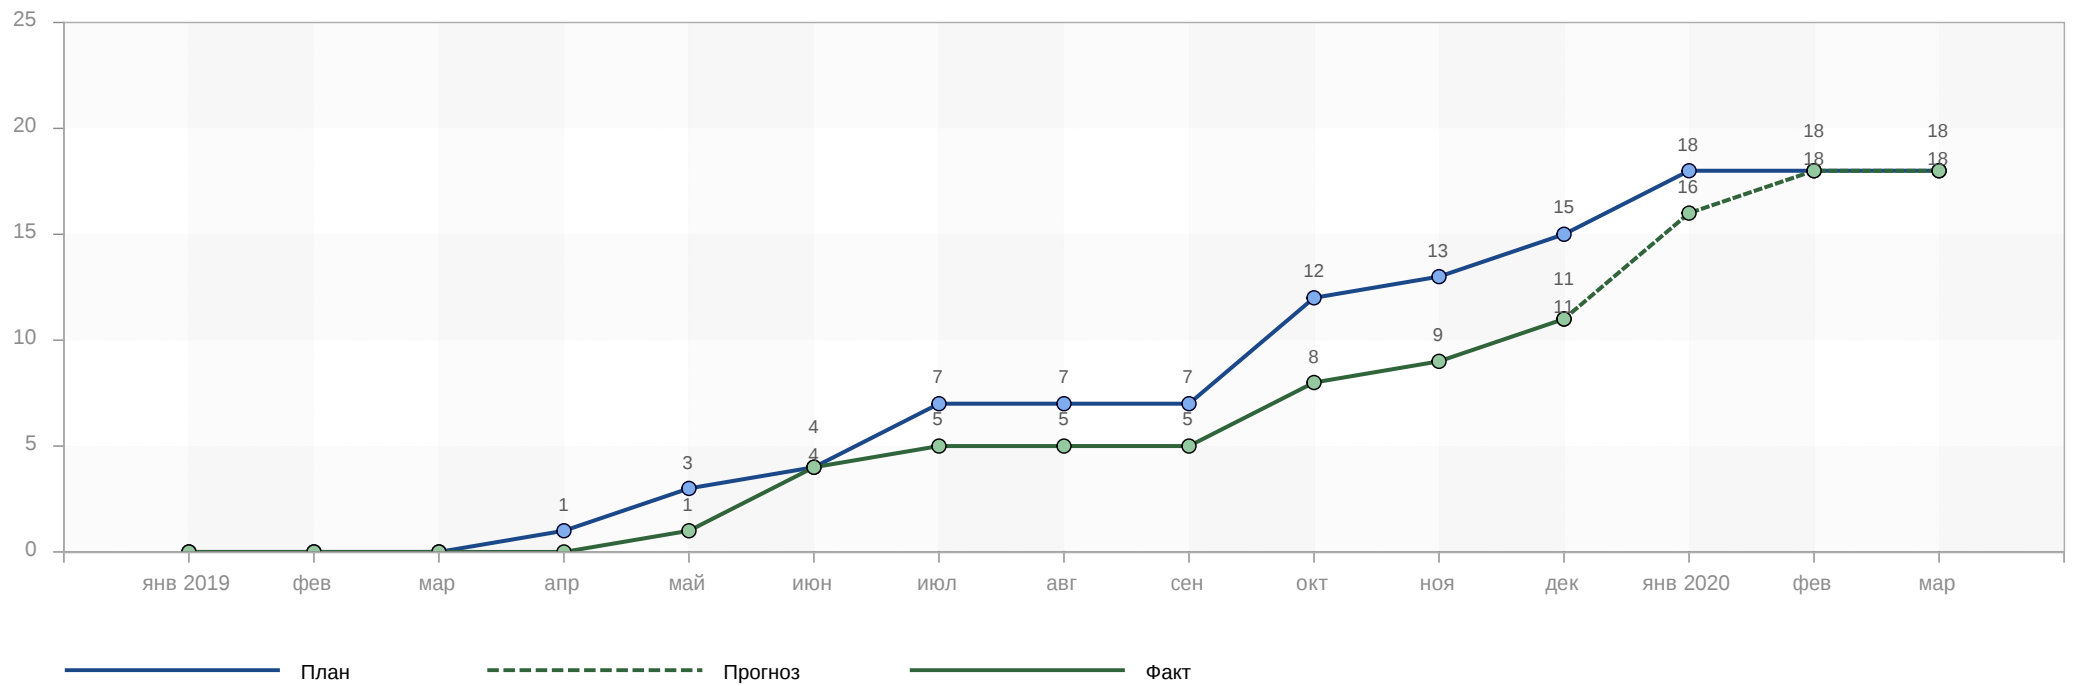


Рис. 1. "(Т6-32) Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

График достижения показателя

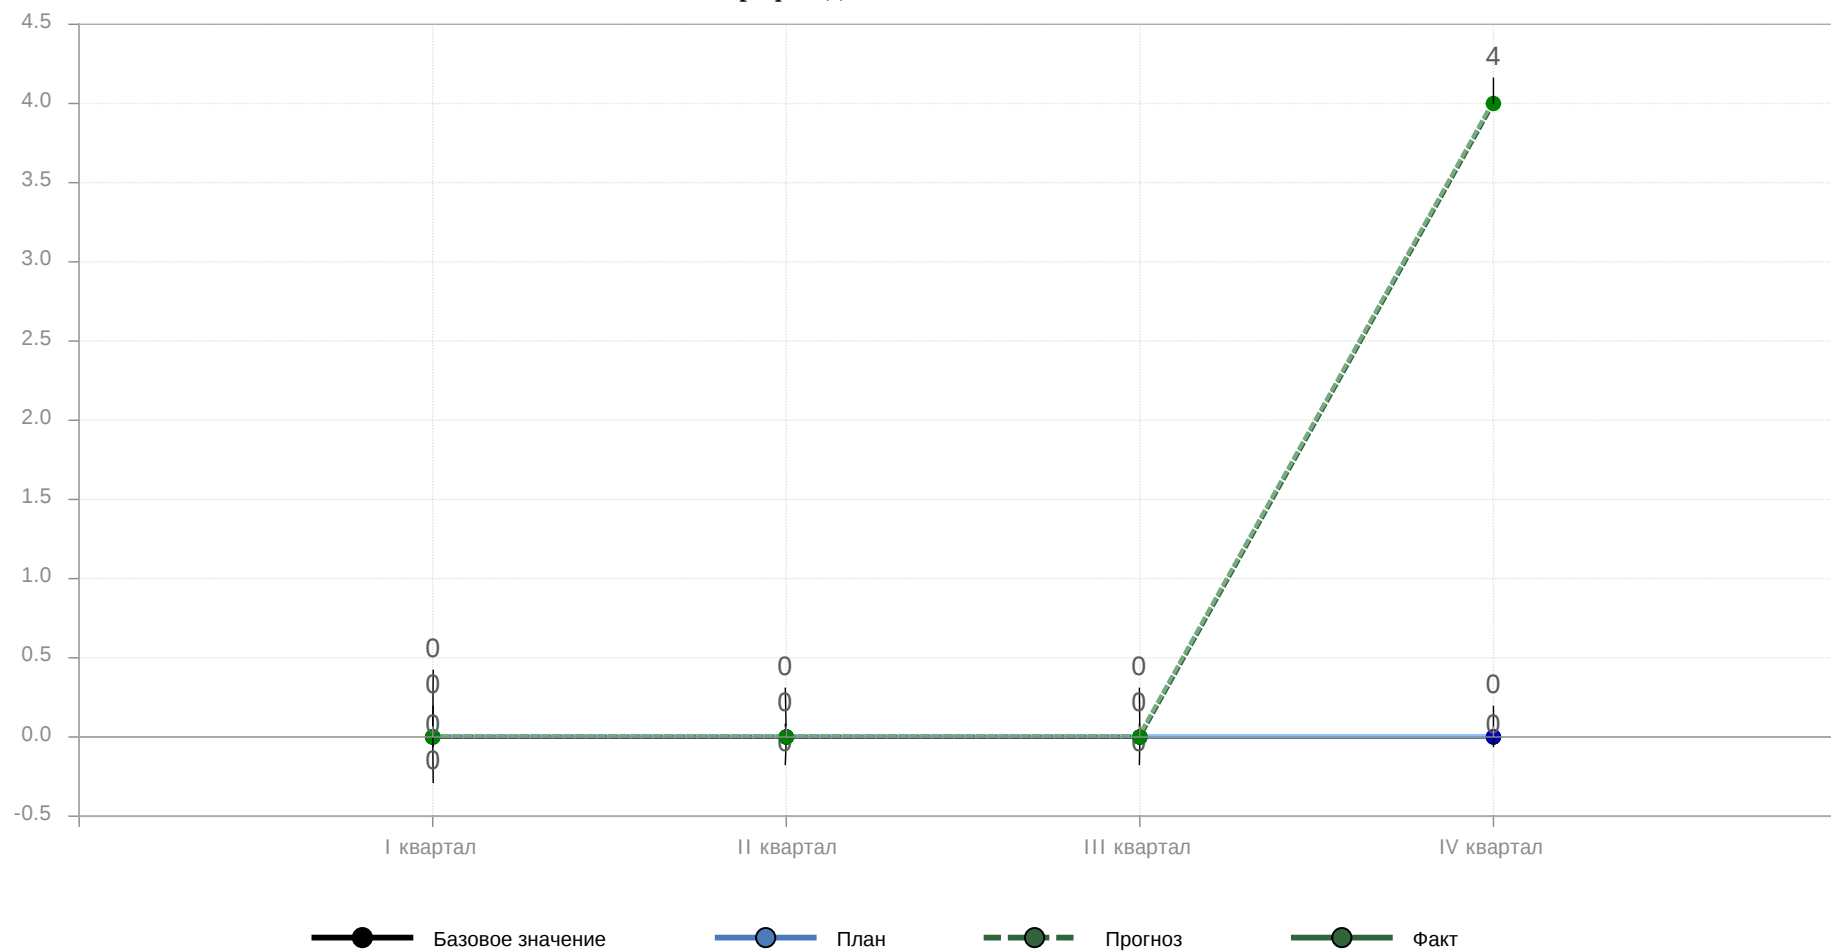


Рис. 1. Количество зарубежных бизнес-миссий, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере

Диаграмма достижения показателя

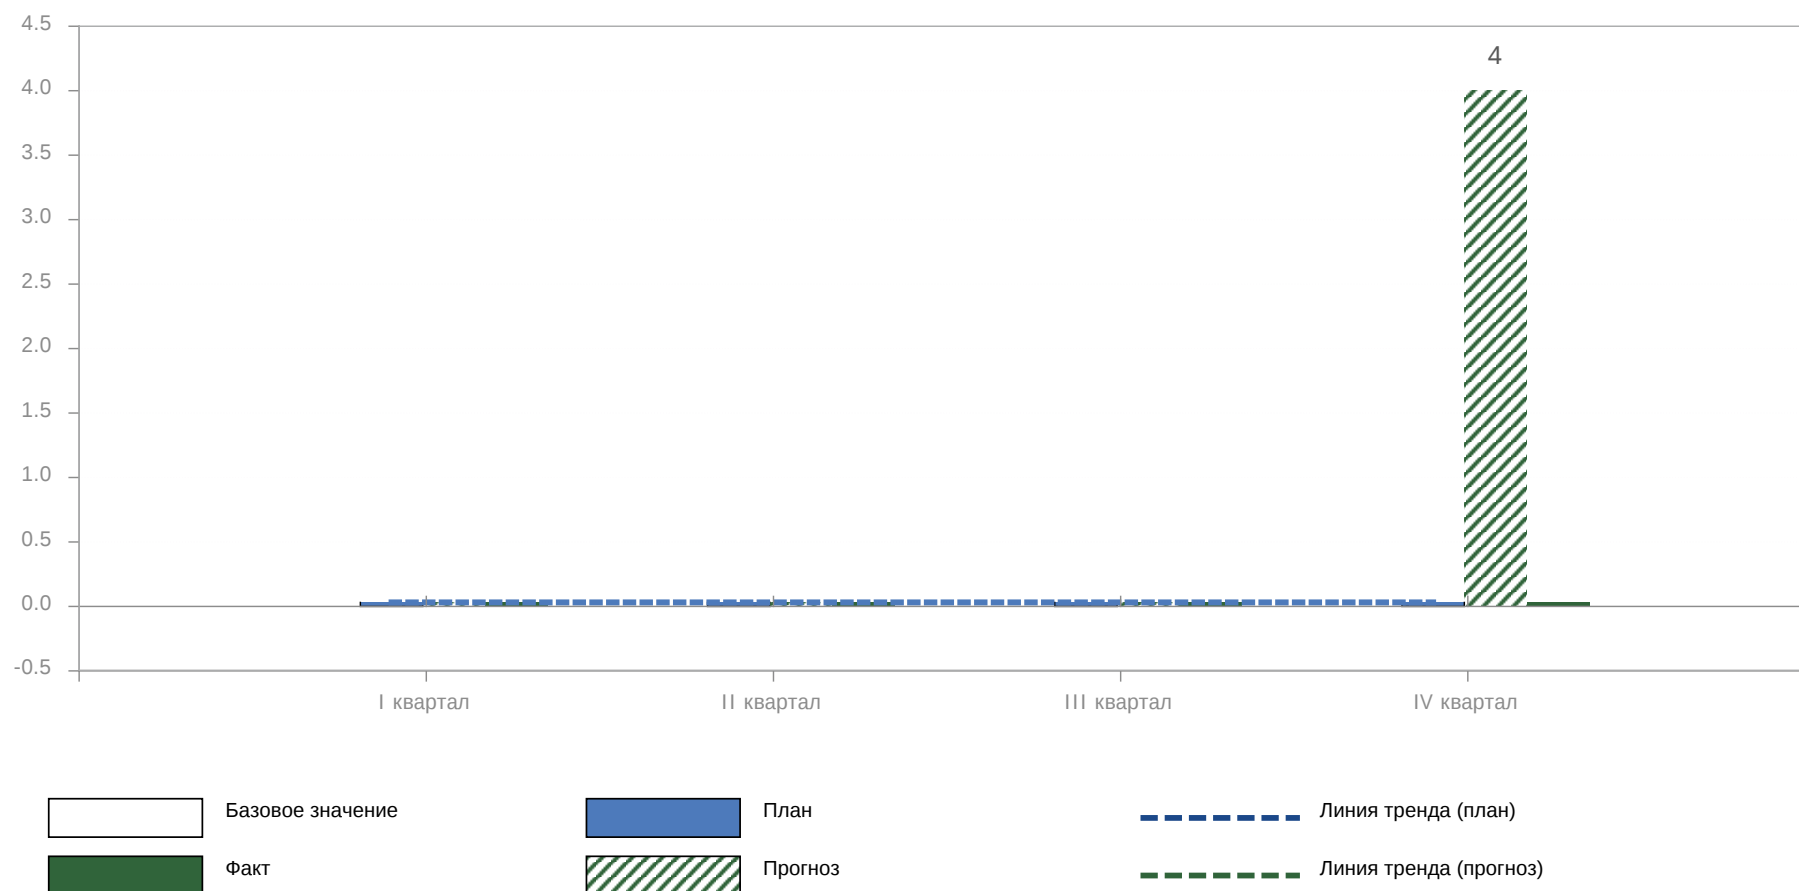


Рис. 2. Количество зарубежных бизнес-миссий, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере

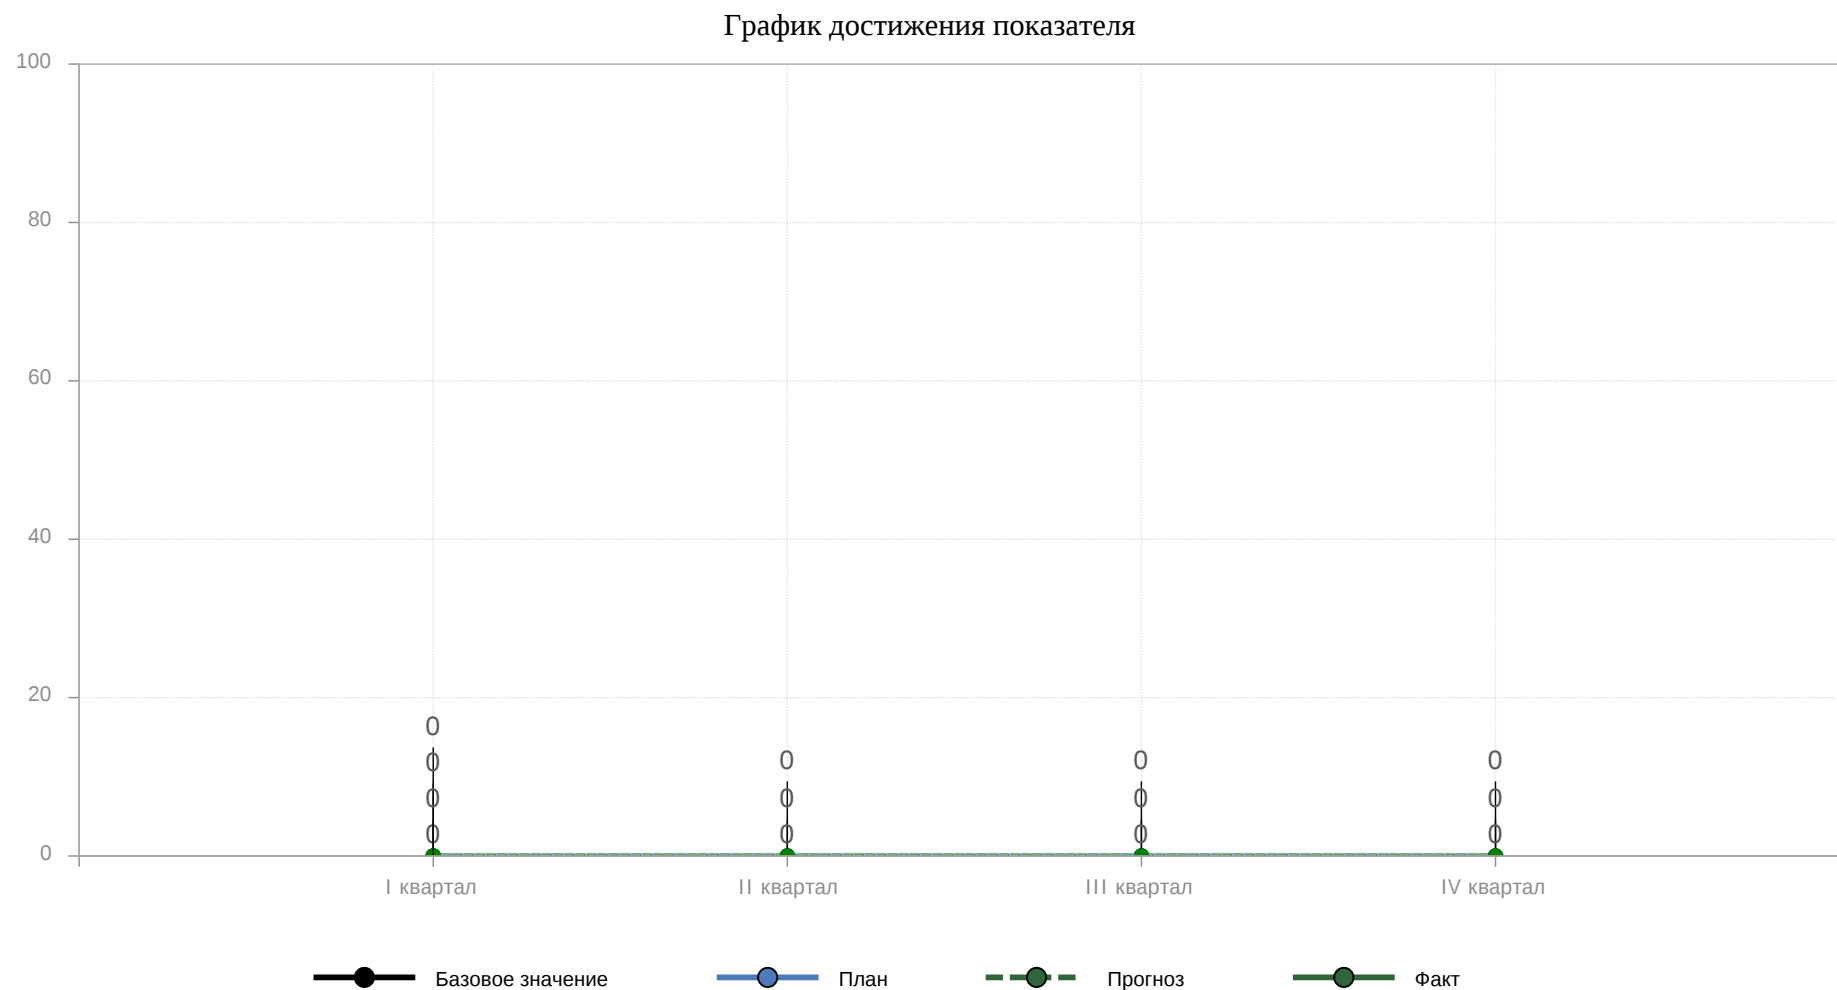


Рис. 3. Число зарегистрированных уникальных пользователей (организаций и индивидуальных предпринимателей) информационной системы «одного окна»

Диаграмма достижения показателя

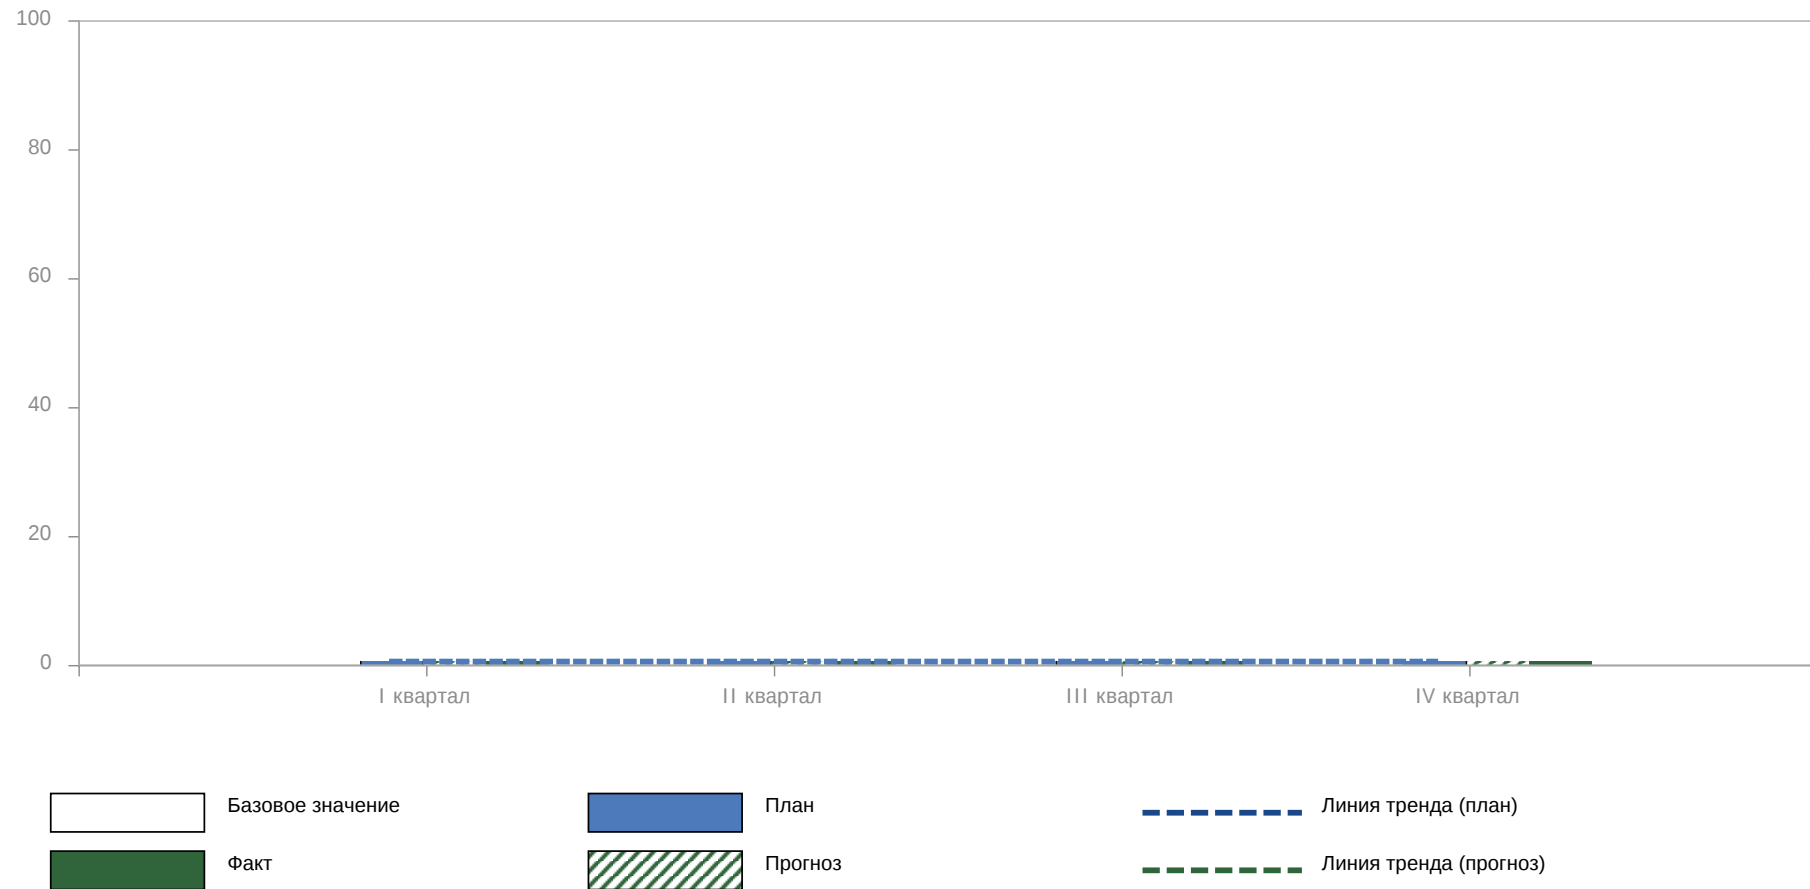


Рис. 4. Число зарегистрированных уникальных пользователей (организаций и индивидуальных предпринимателей)
информационной системы «одного окна»

График достижения показателя

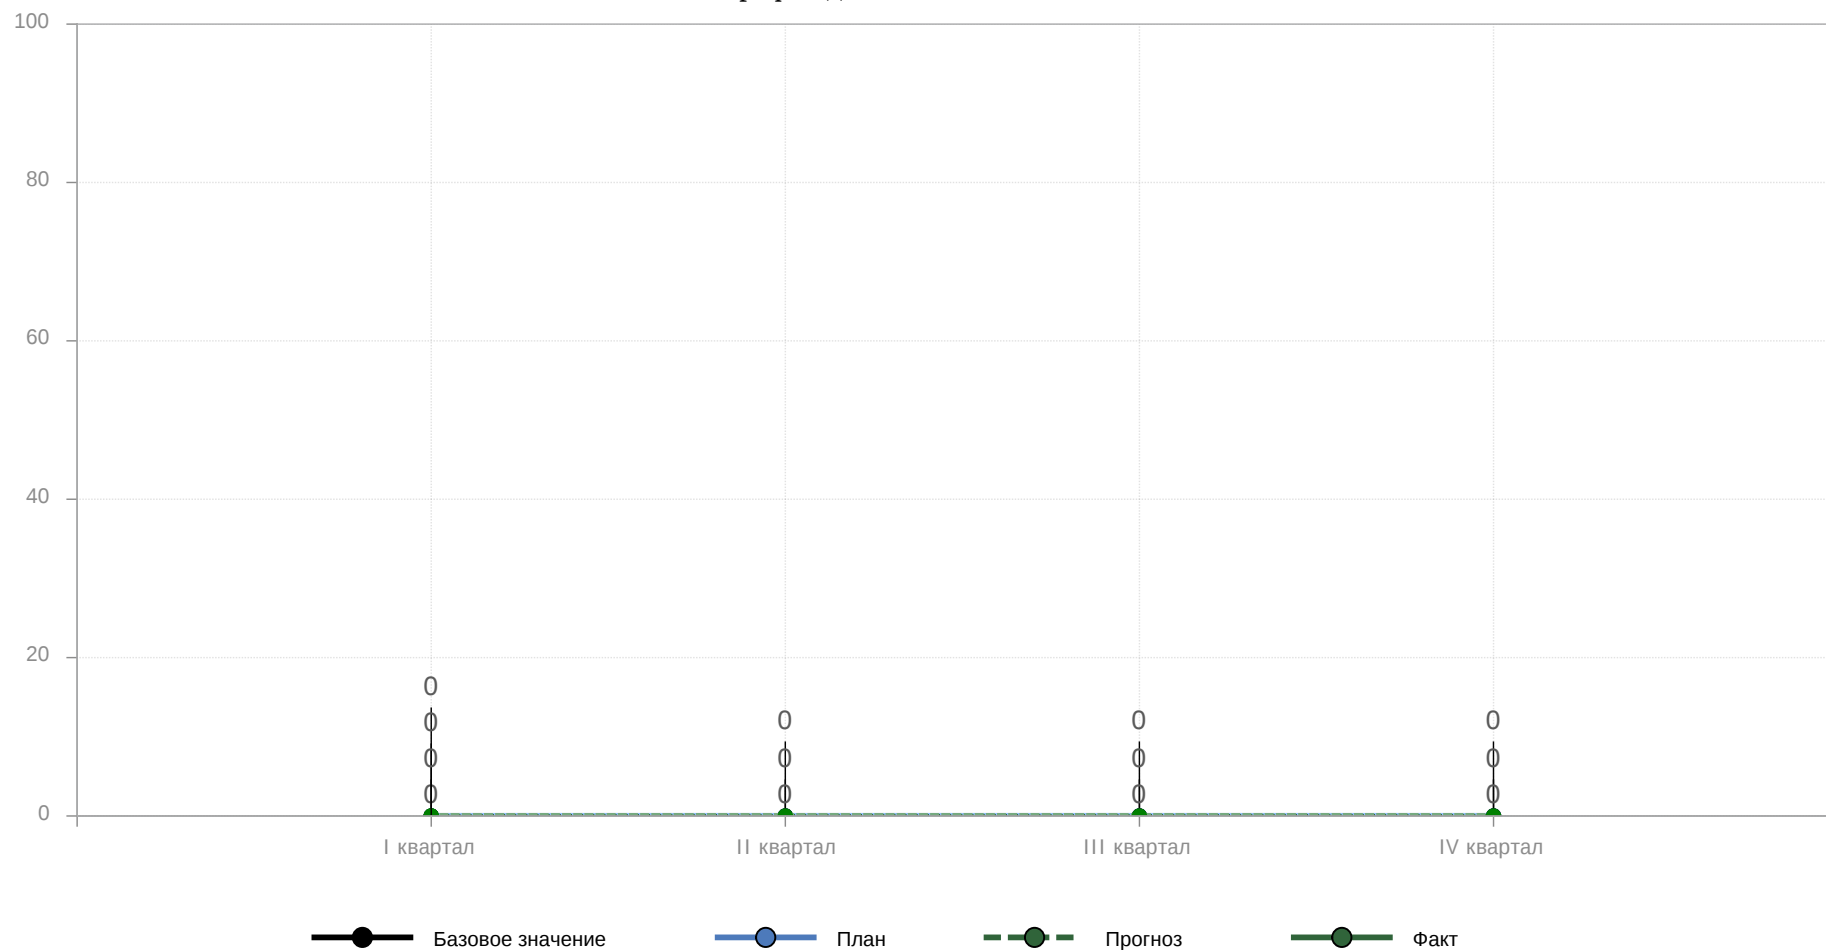


Рис. 5. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

Диаграмма достижения показателя

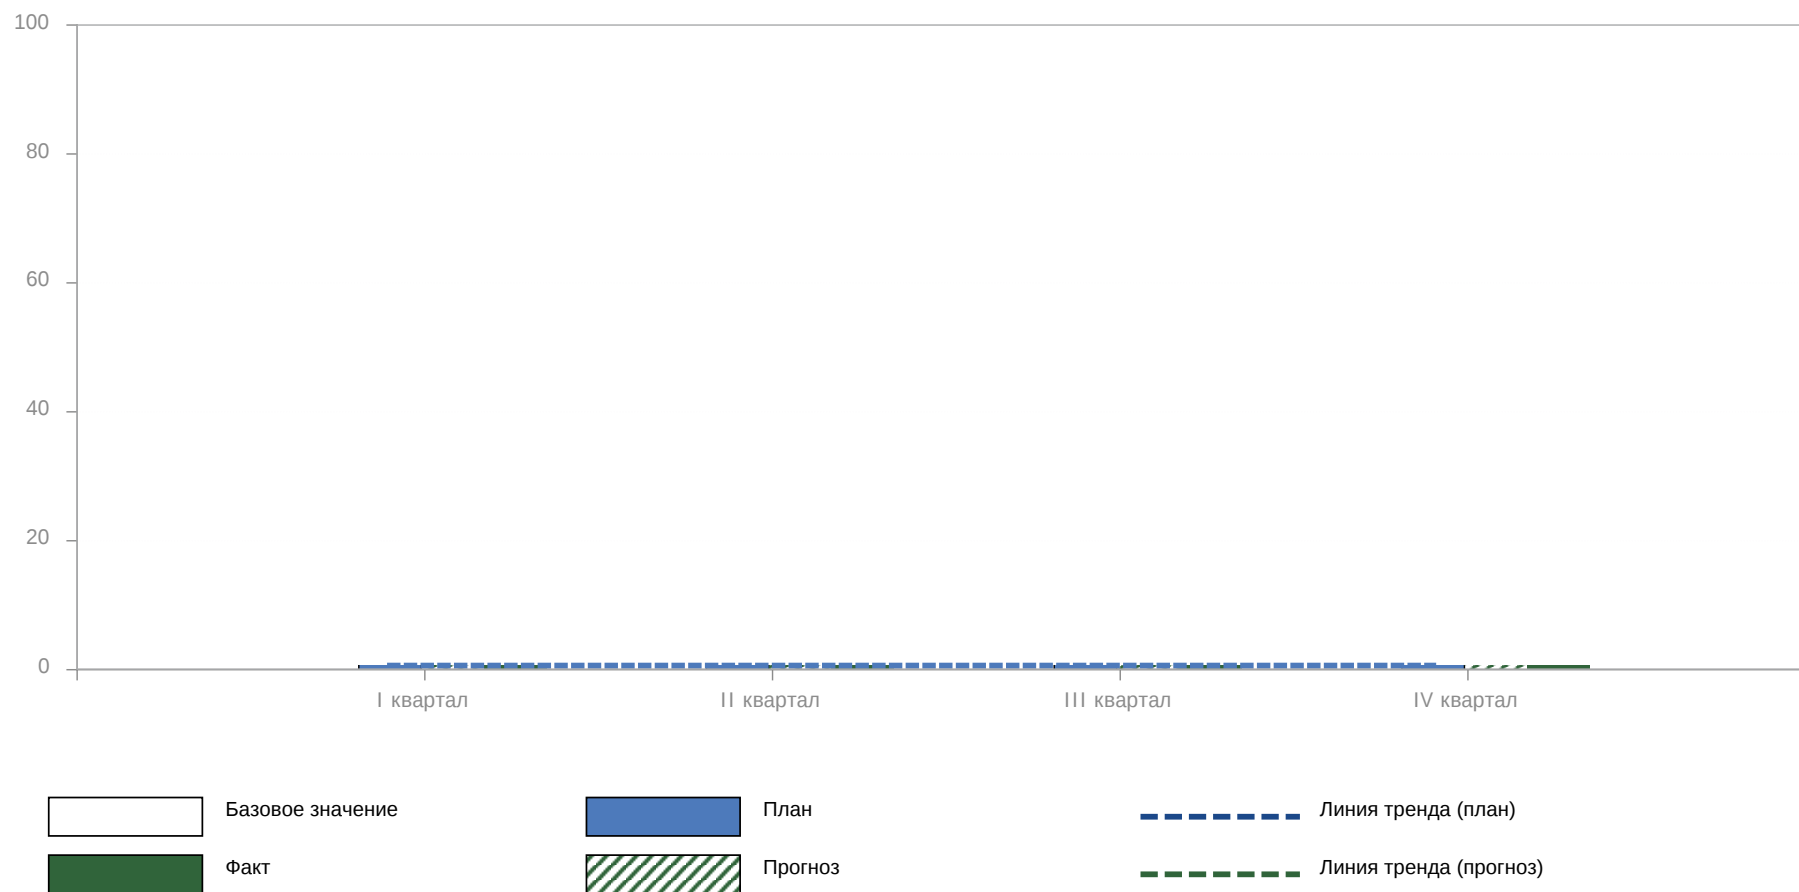


Рис. 6. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

График достижения показателя

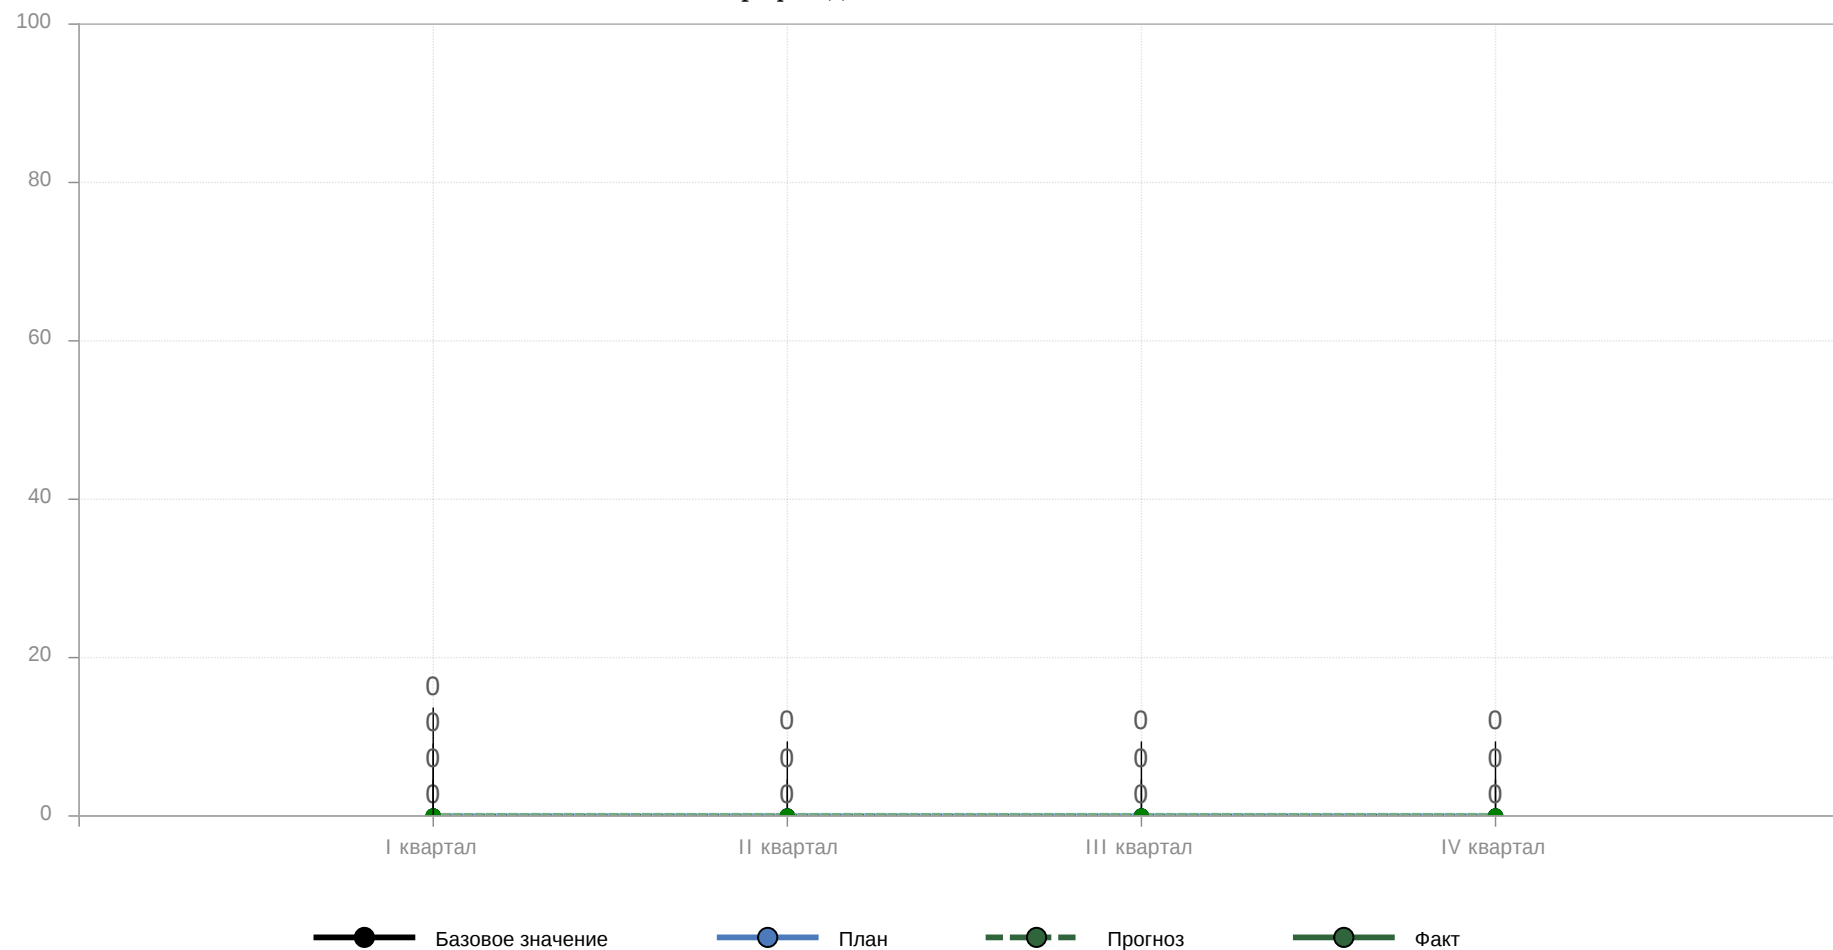


Рис. 7. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,
% к 2018 году

Диаграмма достижения показателя

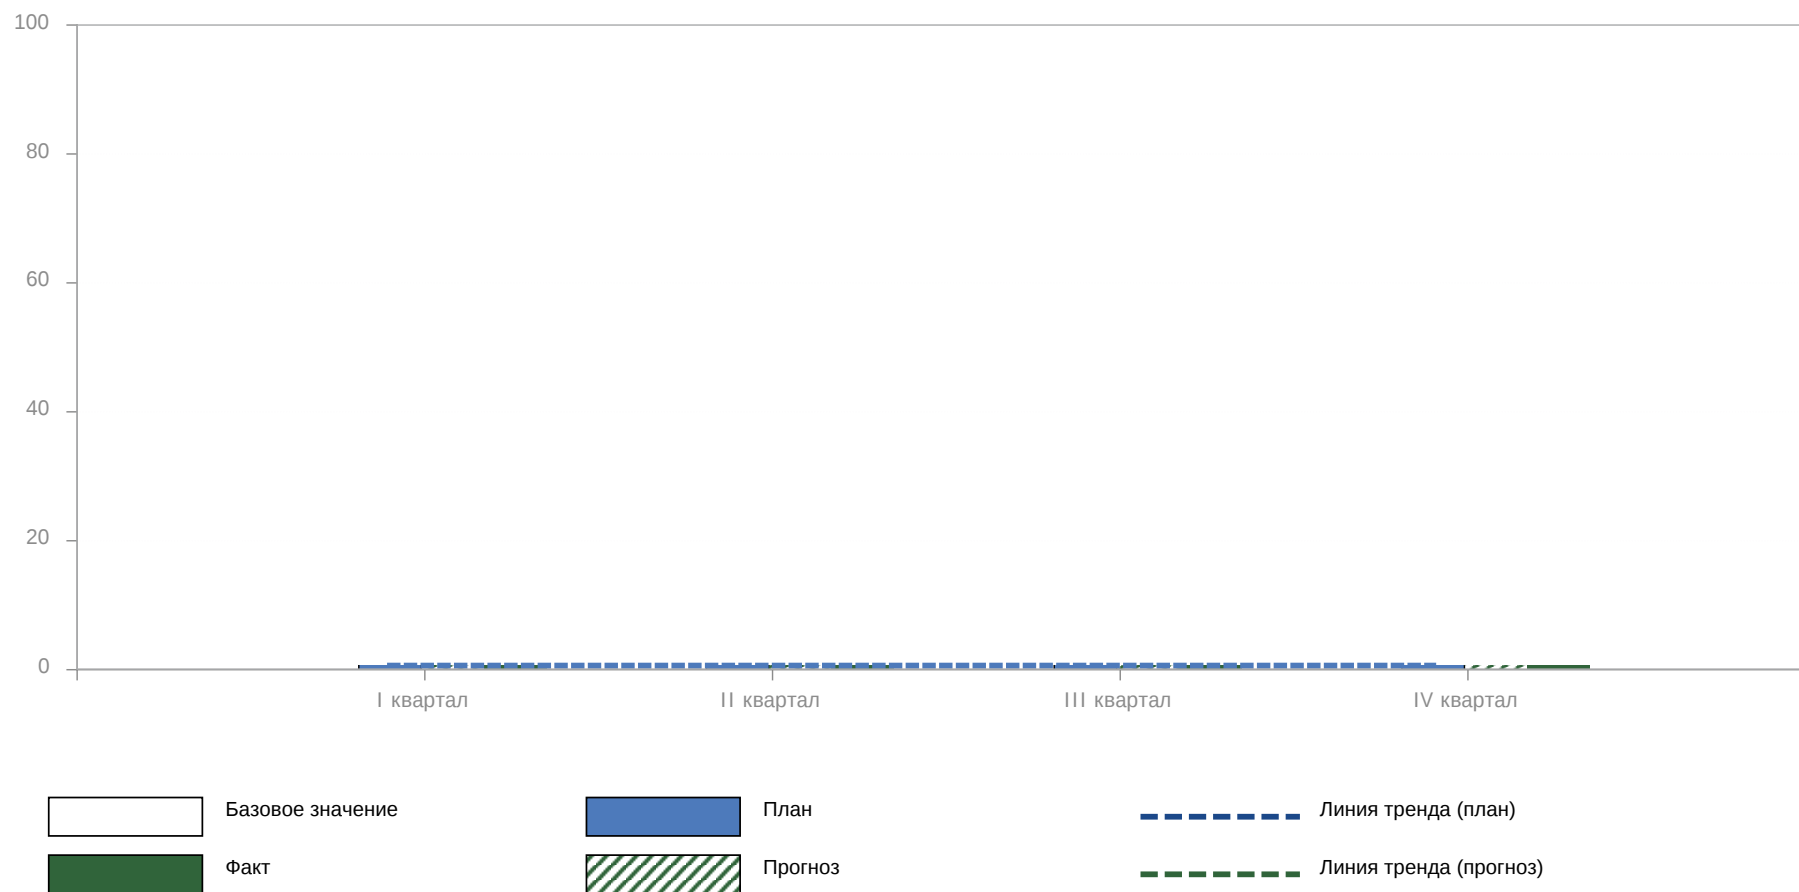


Рис. 8. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году
