

Руководитель
регионального проекта —
Трихина Вероника Валерьевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

26.06.2020

Сертификат:

6D20EEBE7B419B9A9A6C4422E8EA3A21B0A1FE5

Владелец: Трихина Вероника Валерьевна

Действителен: с 25.03.2020 по 25.06.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(15-32) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства "

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Наличие критических отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Наличие критических отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1		6. План мероприятий	Несанкционирование платежей Управлением Федерального казначейства по Кемеровской области , Причина риска: в Соглашении, заключенном с Минэкономразвития России, отсутствует адресное (пообъектное) распределение субсидии по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества согласно типовых форм №2 и №6 к Типовой форме соглашения, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.06.2019 №90н., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г.; Стоимостные: 257258.00 тыс. руб.; Сутевые: Перенос срока реализации проекта на 2020 год	1. Перенос срока реализации проекта на 2020 год , срок исполнения 31.12.2019; 2. Перенос срока реализации проекта на 2020 год , срок исполнения 31.12.2019;
2		6. План мероприятий	приостановлена оплата фактически выполненных работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры индустриального парка , Причина риска: В соглашении, заключенном с Минэкономразвития России, отсутствует адресное (пообъектное) распределение субсидии по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества согласно типовых форм №2 и №6 к Типовой форме соглашения, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.06.2019 №90н., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.12.2020г.; Стоимостные: 257258.00 тыс. руб.	1. Перенос срока реализации проекта на 2020 год , срок исполнения 01.12.2020;
3		4. Результаты	Несанкционирование платежей Управлением Федерального казначейства по Кемеровской области , Причина риска: в Соглашении, заключенном с Минэкономразвития России, отсутствует адресное (пообъектное) распределение субсидии по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества согласно типовых форм №2 и №6 к Типовой форме соглашения, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.06.2019 №90н., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г.; Стоимостные: 257258.00 тыс. руб.; Сутевые: Перенос срока реализации проекта на 2020 год	1. Перенос срока реализации проекта на 2020 год , срок исполнения 31.12.2019; 2. Перенос срока реализации проекта на 2020 год , срок исполнения 31.12.2019;

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом	Тысяча единиц	0.624	0	0	0	1.186	1.186	100,00%	
2		Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом	Единица	0	0	0	0	29	29	100,00%	По состоянию на 31.12.2019 субъектами малого и среднего предпринимательства Кемеровской области-Кузбасса при поддержке регионального центра экспорта заключено 14 экспортных контрактов. Сроки достижения целевого значения показателя перенесены до 01.04.2020 в связи с переносом остатка расходования средств бюджета на первый квартал 2020 года в рамках соглашения с Российским экспортным центром. Риски невыполнения отсутствуют.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2019 год
Всего: 774 513,51 тыс. руб

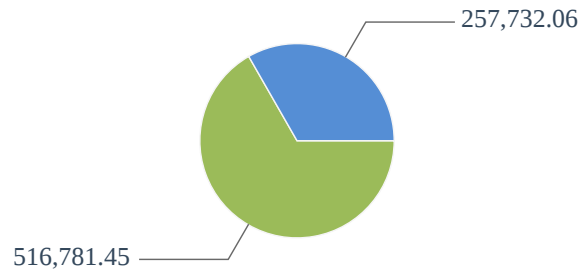


Сводный бюджет МО
на 2019 год
Всего: 610 066,54 тыс. руб

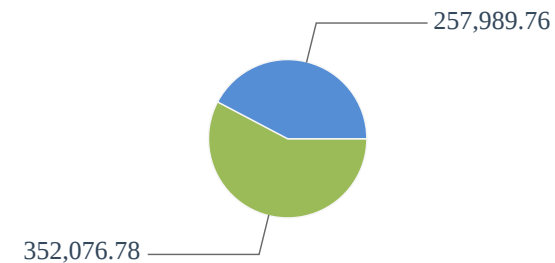

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2019 год
Всего: 82 079,10 тыс. руб

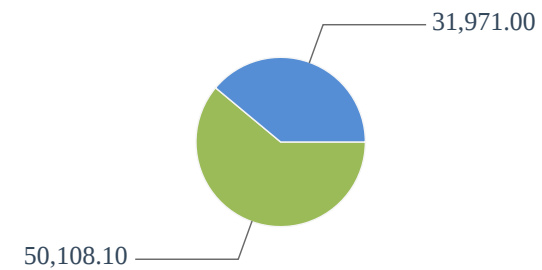

Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний путем строительства объектов инженерной инфраструктуры промышленных парков. При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 4,814 млрд. рублей.	339 960,76	257 989,76	257 989,76	257 989,76	50 000,00	14,71	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	257 989,76	257 989,76	257 989,76	257 989,76	0,00	0,00	Финансирование перенесено на 2020 год
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	257 731,96	257 731,96	257 731,96	257 731,96	0,00	0,00	Финансирование перенесено на 2020 год
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	257 731,96	257 731,96	257 731,96	257 731,96	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	257 989,76	257 989,76	257 989,76	257 989,76	0,00	0,00	Финансирование перенесено на 2020 год
1.2		внебюджетные источники	81 971,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	61,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(01) Создан и осуществляет деятельность единый оператор организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	10 067,20	10 067,20	10 067,20	10 067,20	10 067,20	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	67,20	67,20	67,20	67,20	67,20	100,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(03) В Кемеровской области организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Кемеровской области в Центре "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%	97 159,18	97 159,18	97 159,18	97 159,08	97 159,08	100,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	97 159,18	97 159,18	97 159,18	97 159,08	97 159,08	100,00	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	97 159,18	97 159,18	97 159,18	97 159,08	97 159,08	100,00	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		(06) Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Кемеровской области. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 295 единиц (нарастающим итогом)	265 209,08	265 209,08	265 209,08	265 209,08	265 209,08	100,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	265 209,08	265 209,08	265 209,08	265 209,08	265 209,08	100,00	
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	257 252,78	257 252,78	257 252,78	257 252,78	257 252,78	100,00	
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	257 252,78	257 252,78	257 252,78	257 252,78	257 252,78	100,00	
4.2.3		бюджеты муниципальных образований	265 209,08	265 209,08	265 209,08	265 209,08	265 209,08	100,00	
4.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		(06) Создан региональный экспортный центр. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта Кемеровской области, достигло к 2024 году 141 единиц	65 098,79	65 059,79	65 059,79	65 059,79	65 098,79	100,00	
5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	65 059,79	65 059,79	65 059,79	65 059,79	65 059,79	100,00	
5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	65 059,79	65 059,79	65 059,79	65 059,79	65 059,79	100,00	
5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2		внебюджетные источники	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	100,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		(10) Реализовано мероприятие по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства	86 867,70	86 867,70	84 261,60	84 261,60	86 867,70	100,00	
6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	86 867,70	86 867,70	84 261,60	84 261,60	86 867,70	100,00	
6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	84 261,60	84 261,60	84 261,60	84 261,60	84 261,60	100,00	
6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	84 261,60	84 261,60	0,00	0,00	84 261,60	100,00	
6.2.3		бюджеты муниципальных образований	86 867,70	86 867,70	0,00	0,00	86 867,70	100,00	
6.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7		(13) Создан региональный экспортный центр.	3 050,10	3 048,20	3 048,20	3 048,20	3 050,10	100,00	
7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 048,20	3 048,20	3 048,20	3 048,20	3 048,20	100,00	
7.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 048,20	3 048,20	3 048,20	3 048,20	3 048,20	100,00	
7.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2		внебюджетные источники	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	100,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			867 412,81	785 400,91	782 794,81	782 794,71	577 451,95	66,57	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			785 333,71	785 333,71	782 727,61	782 727,51	527 343,85	67,15	
бюджет субъекта Российской Федерации			774 513,51	774 513,51	774 513,51	774 513,41	516 781,45	66,72	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			599 246,34	599 246,34	514 984,74	514 984,74	341 514,38	56,99	
бюджеты муниципальных образований			610 066,54	610 066,54	523 198,84	523 198,84	352 076,78	57,71	
внебюджетные источники			82 079,10	67,20	67,20	67,20	50 108,10	61,05	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Создан и осуществляет деятельность единый оператор организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Значение: 700,0000 Дата: 20.12.2020	
2		Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний путем строительства объектов инженерной инфраструктуры промышленных парков. При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 4,814 млрд. рублей. Значение: 0,4360 Дата: 20.12.2019	
3		Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний путем строительства объектов инженерной инфраструктуры промышленных парков. При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 4,814 млрд. рублей. Значение: 1,0030 Дата: 20.12.2020	
4		В Кемеровской области организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Кемеровской области в Центре "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10% Значение: 3,0000 Дата: 20.12.2019	
5		В Кемеровской области организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Кемеровской области в Центре "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10% Значение: 4,0000 Дата: 20.12.2020	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
6		Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Кемеровской области. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 295 единиц (нарастающим итогом) Значение: 109,0000 Дата: 20.12.2019	 11
7		Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Кемеровской области. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 295 единиц (нарастающим итогом) Значение: 61,0000 Дата: 20.12.2020	 1
8		Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры Кемеровской области и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов государственной власти, институтов развития и других организаций Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024	 1
9		С учетом предложений органов местного самоуправления сформирован реестр производственных субъектов МСП Кемеровской области - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2019	 1
10		Создан региональный экспортный центр. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта Кемеровской области, достигло к 2024 году 141 единиц Значение: 0,0290 Дата: 20.12.2019	 3
11		Создан региональный экспортный центр. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта Кемеровской области, достигло к 2024 году 141 единиц Значение: 0,0650 Дата: 20.12.2020	 1
12		Обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП Значение: 50,0000 Дата: 20.12.2019	 3
13		Внедрена система "Инвестиционный лифт" в сфере несырьевого экспорта с участием региональной гарантийной организации, регионального экспортного центра. Система "Инвестиционный лифт" включена в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемого в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024	 1

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
14		Реализовано мероприятие по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства Значение: 87,0000 Дата: 31.12.2019	
15		Создан региональный экспортный центр. Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2019	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Создан и осуществляет деятельность единый оператор организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Значение: 700, на дату 20.12.2020	20.12.2020	20.12.2019	Трихина В. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Итоговый отчет Единого оператора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 10000 из 10000.
1.1.			Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	20.12.2019	29.10.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии обществу с ограниченной ответственностью "Инновационный научно-производственный центр "Иннотех" для реализации мероприятия по созданию и (или) развитию единого оператора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства " Распоряжение Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 29.10.2019г. №664-р, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2.			Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	20.12.2019	12.11.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов. произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг " Соглашение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 12.11.2019г. №5/29-ЕО, приложен файл.
1.3.			Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	20.12.2019	20.11.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) развитием) единого оператора " Платежное поручение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 20.11.2019г. №245611, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.4.	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	20.12.2019	12.11.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда) выполнением работ, оказанием услуг " Соглашение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 12.11.2019г. №№5/29-ЕО, приложен файл.
1.5.			Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Итоговый отчет Общества с ограниченной ответственностью "Инновационный научно-производственный центр "Иннотех" от 20.12.2019г. № б/н, приложен файл.
2.			Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний путем строительства объектов инженерной	20.12.2019	01.04.2020	Трихина В. В.	Информация по значению результата: В работе. Риск снят: Неподтверждение финансирования на 2020 год, Причина риска: С октября 2019 органами федерального казначейства приостановлена оплата фактически выполненных работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры индустриального парка "Западный", поскольку в соглашении, заключенном с Минэкономразвития России, отсутствует адресное

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			инфраструктуры промышленных парков. При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 4,814 млрд. рублей. Значение: 0.436, на дату 20.12.2019				(пообъектное) распределение субсидии по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества согласно типовых форм №2 и №6 к Типовой форме соглашения., утвержденной приказом Министерства финансов от 10.06.2019 №90-н. Принимая во внимание, что срок реализации проекта - 31-12.2020, а позиция Управления Федерального казначейства по Кемеровской области и позиция Минфина РФ не приемлема для Минэкономразвития, для реализации мероприятия региону рекомендовано изменить порядок предоставления субсидии. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2020г. Предлагаемые решения: 1. Перенос реализации мероприятия на 2020 год , срок исполнения 01.04.2020, По согласованию с Минэкономразвития России срок реализации мероприятия перенесен на 2020 год , Выполнено. В рамках соглашения с Минэкономразвития России реализация мероприятия перенесена на 2020 год. Срок исполнения результата - до 01.04.2020 Просрочка 103 дня. Предоставлена информация : 0.345 из 0.436.Информация по результату:Существует риск: Несанкционирование платежей Управлением Федерального казначейства по Кемеровской области , Причина риска: в Соглашении, заключенном с Минэкономразвития России, отсутствует адресное (пообъектное) распределение субсидии по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества согласно типовых форм №2 и №6 к Типовой форме соглашения, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.06.2019 №90н., Вероятность: 100%, ожидаемая дата

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							наступления: 31.12.2019г.; Стоимостные: 257 258,00 тыс. руб.; Сутевые: Перенос срока реализации проекта на 2020 год Предлагаемые решения: 1. Перенос срока реализации проекта на 2020 год , срок исполнения 31.12.2019. 2. Перенос срока реализации проекта на 2020 год , срок исполнения 31.12.2019.
2.1.			С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	20.12.2019	14.02.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации " Соглашение с Минэкономразвития России от 14.02.2019г. №№ 139-09-2019-234, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.			Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний путем строительства объектов инженерной инфраструктуры промышленных парков. При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 4,814 млрд. рублей. Значение: 1.003, на дату 20.12.2020	20.12.2020	22.10.2019	Трихина В. В.	Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 1003 из 1.003. Информация по результату: Существует риск: Несанкционирование платежей Управлением Федерального казначейства по Кемеровской области , Причина риска: в Соглашении, заключенном с Минэкономразвития России, отсутствует адресное (пообъектное) распределение субсидии по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества согласно типовых форм №2 и №6 к Типовой форме соглашения, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.06.2019 №90н., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г.; Стоимостные: 257 258,00 тыс. руб.; Сутевые: Перенос срока реализации проекта на 2020 год Предлагаемые решения: 1. Перенос срока реализации проекта на 2020 год , срок исполнения 31.12.2019. 2. Перенос срока реализации проекта на 2020 год , срок исполнения 31.12.2019.
3.1.			Земельный участок предоставлен заказчику	30.06.2019	01.10.2018	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договор аренды земельного участка " Соглашение Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области от 17.07.2018г. №09-07-Э/18, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.			В Кемеровской области организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Кемеровской области в Центре "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10% Значение: 3, на дату 20.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений показателя результативности " Итоговый отчет ООО "Инновационный научно-производственный центр "Иннотех" от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 3 из 3.
4.1.			Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.02.2019	15.02.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации " Соглашение с Минэкономразвития России от 14.02.2019г. №№ 139-09-2019-234, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.2.			Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	01.05.2019	30.04.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Направления расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование центра "Мой бизнес" в 2019 году " Иной вид документа Департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 29.03.2019г. №б/н, приложен файл. Разработаны и утверждены направления расходования бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятия.
4.3.			Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документы о предоставлении субсидии для организации комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Кемеровской области в Центре "Мой бизнес" " Иное Департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 20.12.2019г. №б/н , приложен файл. 2. "Реестр получателей услуг в центре "Мой бизнес"" Иной вид документа Департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.			<i>В Кемеровской области организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Кемеровской области в Центре "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10% Значение: 4, на дату 20.12.2020</i>	20.12.2020	20.12.2020	Трихина В. В.	Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 4 из 4.
5.1.			Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.02.2020	15.02.2020	Трихина В. В.	В работе. Отклонения отсутствуют.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.			Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Кемеровской области. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 295 единиц (нарастающим итогом) Значение: 109, на дату 20.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежные поручения о предоставлении субсидии субъектам МСП моногородов Кузбасса" Платежное поручение Администраций моногородов Кузбасса от 20.12.2019г. № в приложении, приложен файл. Предоставлена информация : 109 из 109.
6.1.			Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.03.2019	14.02.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации" Соглашение Минэкономразвития России от 14.02.2019г. №№ 139-09-2019-234, приложен файл.
6.2.			Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	20.12.2019	03.07.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О Порядке предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований Кемеровской области на реализацию программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах" Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 03.07.2019г. №415, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.3.			Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежные поручения о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства моногородов" Платежное поручение муниципальных образований Кузбасса от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.
6.4.			Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	20.12.2019	11.09.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований Кемеровской области на реализацию программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах" Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 11.09.2019г. №524, приложен файл.
6.5.			С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	20.12.2019	14.02.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации " Соглашение Минэкономразвития России от 14.02.2019г. №№ 139-09-2019-234, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.6.			Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства моногородов Кузбасса " Платежное поручение Администраций моногородов от 20.12.2019г. №согласно приложению , приложен файл.
6.7.			Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр муниципальных образований, с которыми заключены соглашения " Соглашение Муниципальные образования Кемеровской области-Кузбасса от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.
6.8.			Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводный отчет муниципальных образований о предоставленных субсидиях " Иной вид документа Муниципальных образований области от 20.12.2019г. № б/н, приложен файл.
6.9.			Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводный реестр соглашений с МО " Иной вид документа Муниципальные образования от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.10.			Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводный реестр соглашений " Иной вид документа Муниципальные образования области от 20.12.2019г. № б/н, приложен файл.
6.11.			Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводный отчет МО о предоставлении субсидии " Иной вид документа муниципальные образования области от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.
7.			<i>Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Кемеровской области. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 295 единиц (нарастающим итогом) Значение: 61, на дату 20.12.2020</i>	20.12.2020	20.12.2020	Трихина В. В.	Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 61 из 61.
7.1.			Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.03.2020	15.03.2020	Трихина В. В.	В работе. Отклонения отсутствуют.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8.			Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры Кемеровской области и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов государственной власти, институтов развития и других организаций Значение: 1, на дату 20.12.2024	20.12.2024	20.12.2024	Трихина В. В.	Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: В работе.
8.1.			Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	20.12.2024	20.12.2024	Трихина В. В.	В работе. Отклонения отсутствуют.
8.1.1	РРП		Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и действующих мер поддержки субъектов МСП в Кемеровской области	01.03.2019	01.03.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр услуг объектов инфраструктуры Кемеровской области" Реестр Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 01.03.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
9.			С учетом предложений органов местного самоуправления сформирован реестр производственных субъектов МСП Кемеровской области - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков Значение: 1, на дату 01.03.2019	01.03.2019	01.03.2019	Трихина В. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Форма предоставления данных конкретным заказчикам о потенциальных поставщиках (исполнителях, подрядчиках) - субъектах МСП *" Реестр Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 01.03.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: Выполнено.
9.1.			Услуга оказана (работы выполнены)	01.03.2019	01.03.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр " Иное Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 01.03.2019г. №б/н, приложен файл.
9.1.1	РРП		Формирование и ежегодная актуализация с учетом предложение органов местного самоуправления реестра производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	01.03.2019	01.03.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Форма предоставления данных конкретным заказчикам о потенциальных поставщиках (исполнителях, подрядчиках) - субъектах МСП *" Реестр Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 01.03.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
10.			Создан региональный экспортный центр. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта Кемеровской области, достигло к 2024 году 141 единиц Значение: 0.029, на дату 20.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Реестр экспортеров " Иной вид документа Автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области" от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. В рамках соглашения с Минэкономразвития России срок исполнения показателя - 01.04.2020. Риски неисполнения отсутствуют. Предоставлена информация : 0.029 из 0.029.
10.1.			Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.03.2019	14.02.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации" Соглашение с Минэкономразвития России от 14.02.2019г. №№ 139-09-2019-234, приложен файл.
10.2.			Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.05.2019	01.05.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение с АО "Российский экспортный центр" о методическом взаимодействии " Соглашение АО "Российский экспортный центр" от 29.03.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Смета " Иной вид документа Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 01.05.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
10.3.			Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Иной вид документа Автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства" от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет о достижении показателей результативности " Итоговый отчет Автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства" от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.
11.			<i>Создан региональный экспортный центр. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта Кемеровской области, достигло к 2024 году 141 единиц Значение: 0.065, на дату 20.12.2020</i>	20.12.2020	20.12.2020	Трихина В. В.	В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0.065 из 0.065.
11.1.			Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.02.2020	15.02.2020	Трихина В. В.	В работе. Отклонения отсутствуют.
12.			<i>Обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП Значение: 50, на дату 20.12.2019</i>	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Информация по значению результата:Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Реестр обученных сотрудников " Иной вид документа Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 52 из 50.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
12.1.			Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Списки региональных команд для прохождения обучения " Иной вид документа Минэкономразвития России от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. Сформированы списки региональных команд для прохождения обучения
12.2.			Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Списки для обучения " Иной вид документа Минэкономразвития России от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.
12.3.			Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр обученных " Иной вид документа Минэкономразвития России от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.
13.			Внедрена система "Инвестиционный лифт" в сфере несырьевого экспорта с участием региональной гарантийной организации, регионального экспортного центра. Система "Инвестиционный лифт" включена в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемого в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта Значение: 1, на дату 20.12.2024	20.12.2024	20.12.2024	Трихина В. В.	Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
13.1.			Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	20.12.2024	01.05.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение между АО "Российский экспортный центр" и департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области " Соглашение АО "Российский экспортный центр" от 22.03.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Информация о ключевых показателях эффективности деятельности центра (агентства) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства от 01.05.2019" Иной вид документа Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 01.05.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
13.1.1	РРП		Определены показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта субъектов МСП Кемеровской области (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта Кузбасса), в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта на основании решения Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам	01.05.2019	01.05.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о ключевых показателях эффективности деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области" " Иной вид документа Российский экспортный центр от 01.05.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Соглашение между АО "Российский экспортный центр" и департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области о методическом и информационном взаимодействии при реализации мероприятий по созданию и (или) развитию центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №316" Соглашение Российского экспортного центра от 22.03.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
14.			Реализовано мероприятие по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства Значение: 87, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Трихина В. В.	Информация по значению результата:Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Платежные поручения о предоставлении субсидии предпринимателям " Платежное поручение Муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса от 31.12.2019г. №согласно приложением , приложен файл. Предоставлена информация : 180 из 87.Информация по результату:Выполнено.
14.1.	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.08.2019	03.07.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О Порядке предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований Кемеровской области на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства" Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.07.2019г. №414, приложен файл.
14.2.			Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежные поручения о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства " Платежное поручение Муниципальных образований Кемеровской области от 31.12.2019г. №согласно прилагаемым документам , приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
15.			Создан региональный экспортный центр. Значение: 1, на дату 20.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение и платежные поручения о предоставлении субсидии на создание экспортного центра " Иной вид документа Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 16.10.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
15.1.	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	20.12.2019	14.02.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации " Соглашение Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.02.2019г. № 139-09-2019-234, приложен файл.
15.2.			Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	20.12.2019	16.04.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации " Иной вид документа Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области от 16.04.2019г. № 4214050628, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
15.3.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Список экспортеров выведенных на экспорт " Иной вид документа Автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства2 от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.
15.4.	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.07.2019	21.06.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии Автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области» " Соглашение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса от 21.06.2019г. №4/28-ЦПЭ, приложен файл.
15.5.	РРП		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Итоговый отчет Автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства" от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Динамика достижения контрольных точек

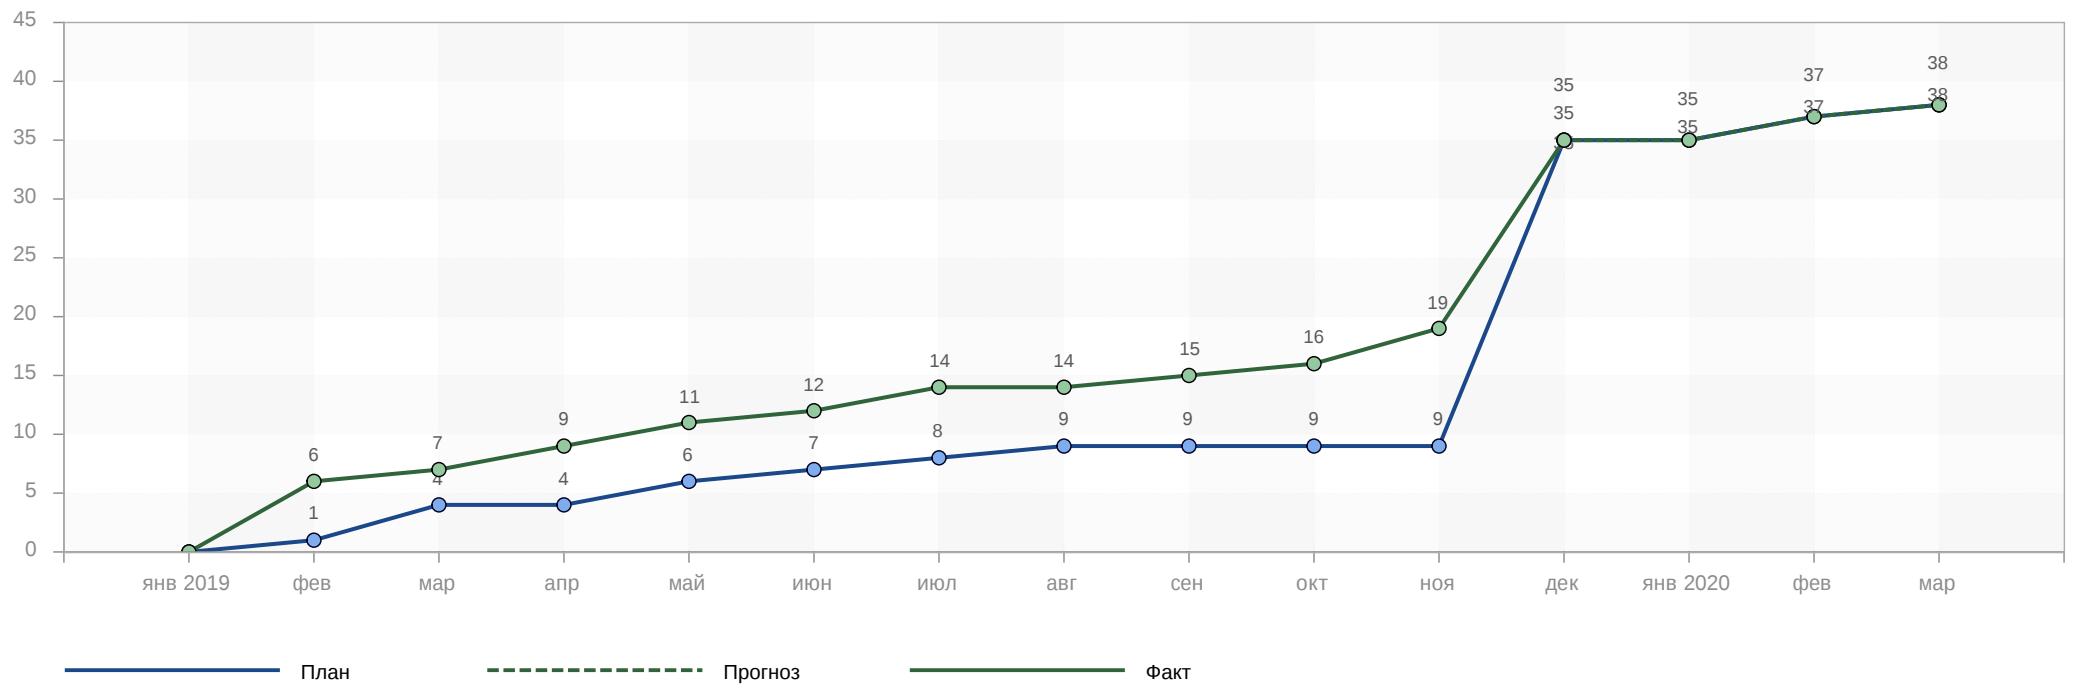


Рис. 1. "(I5-32) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства "

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

График достижения показателя

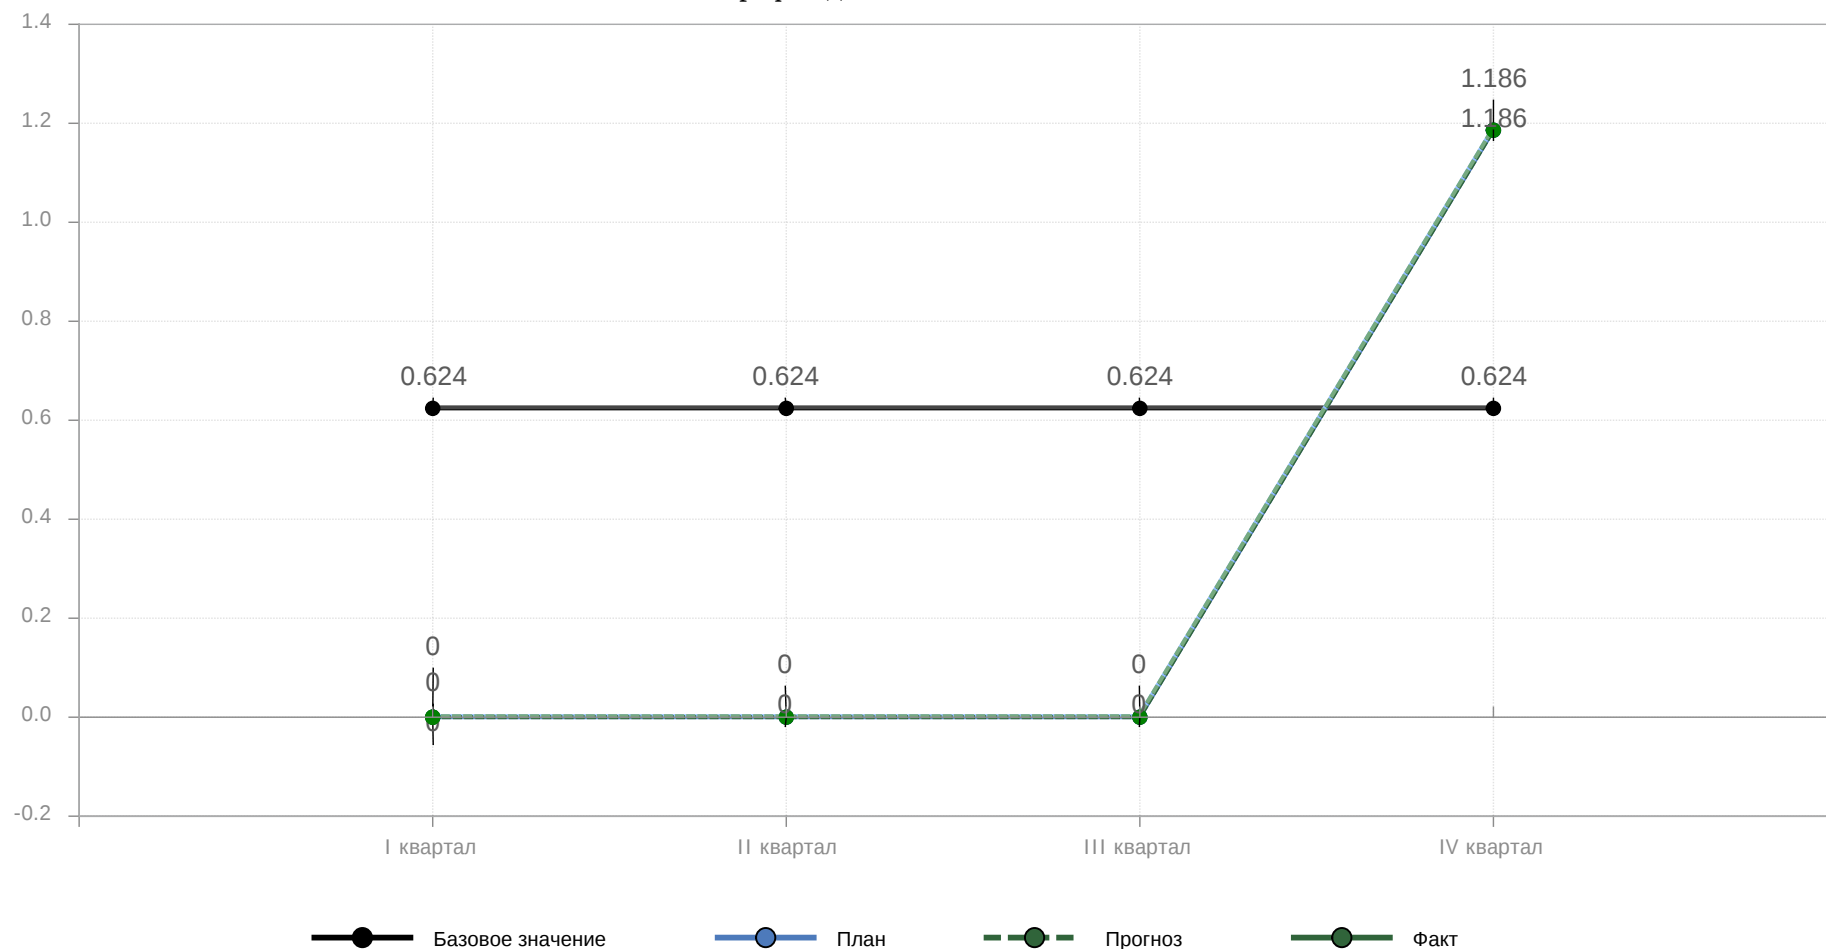


Рис. 1. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя

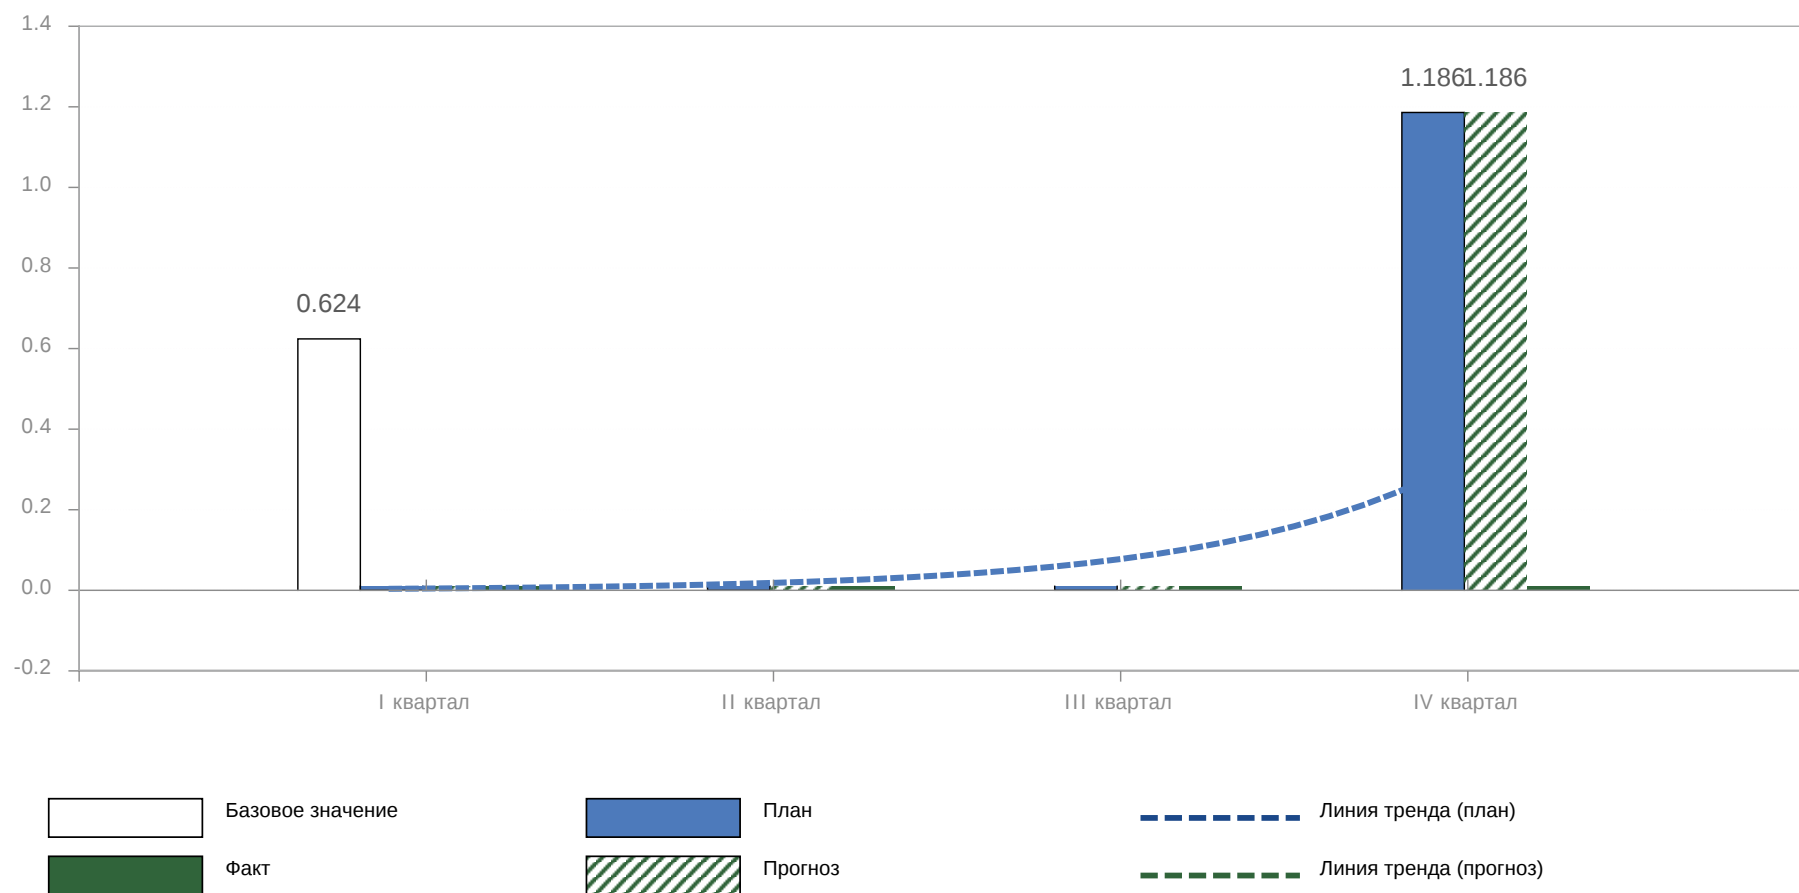


Рис. 2. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом

График достижения показателя

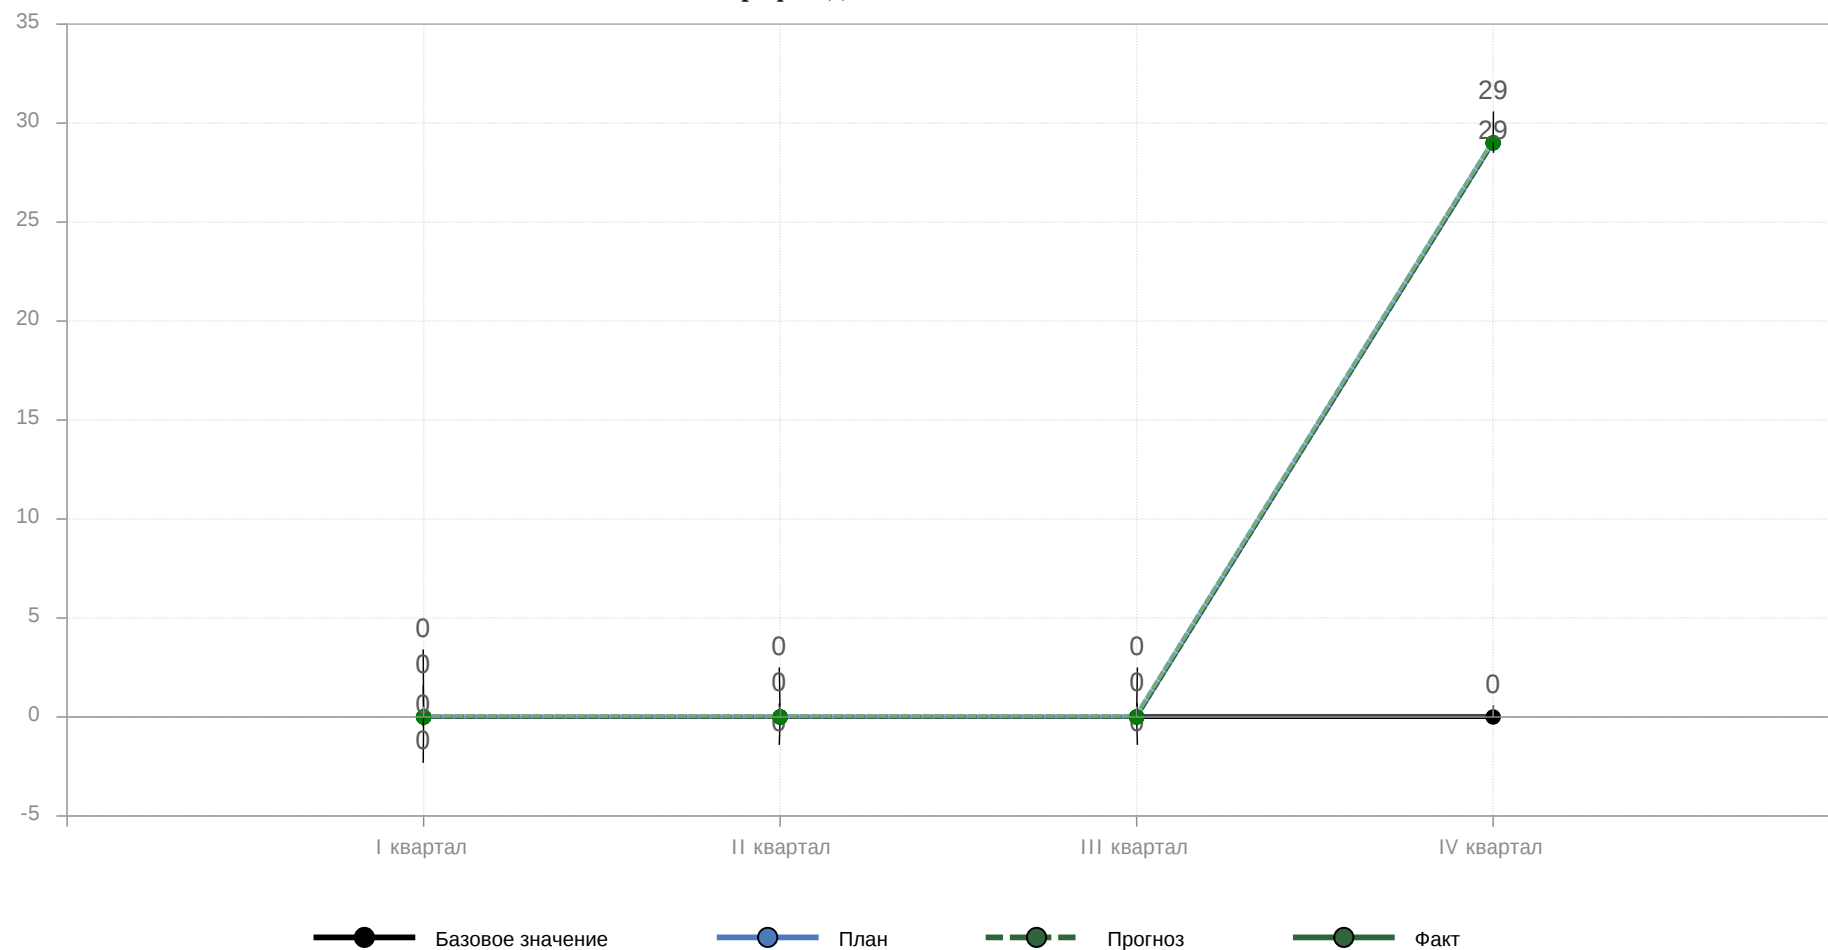


Рис. 3. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя

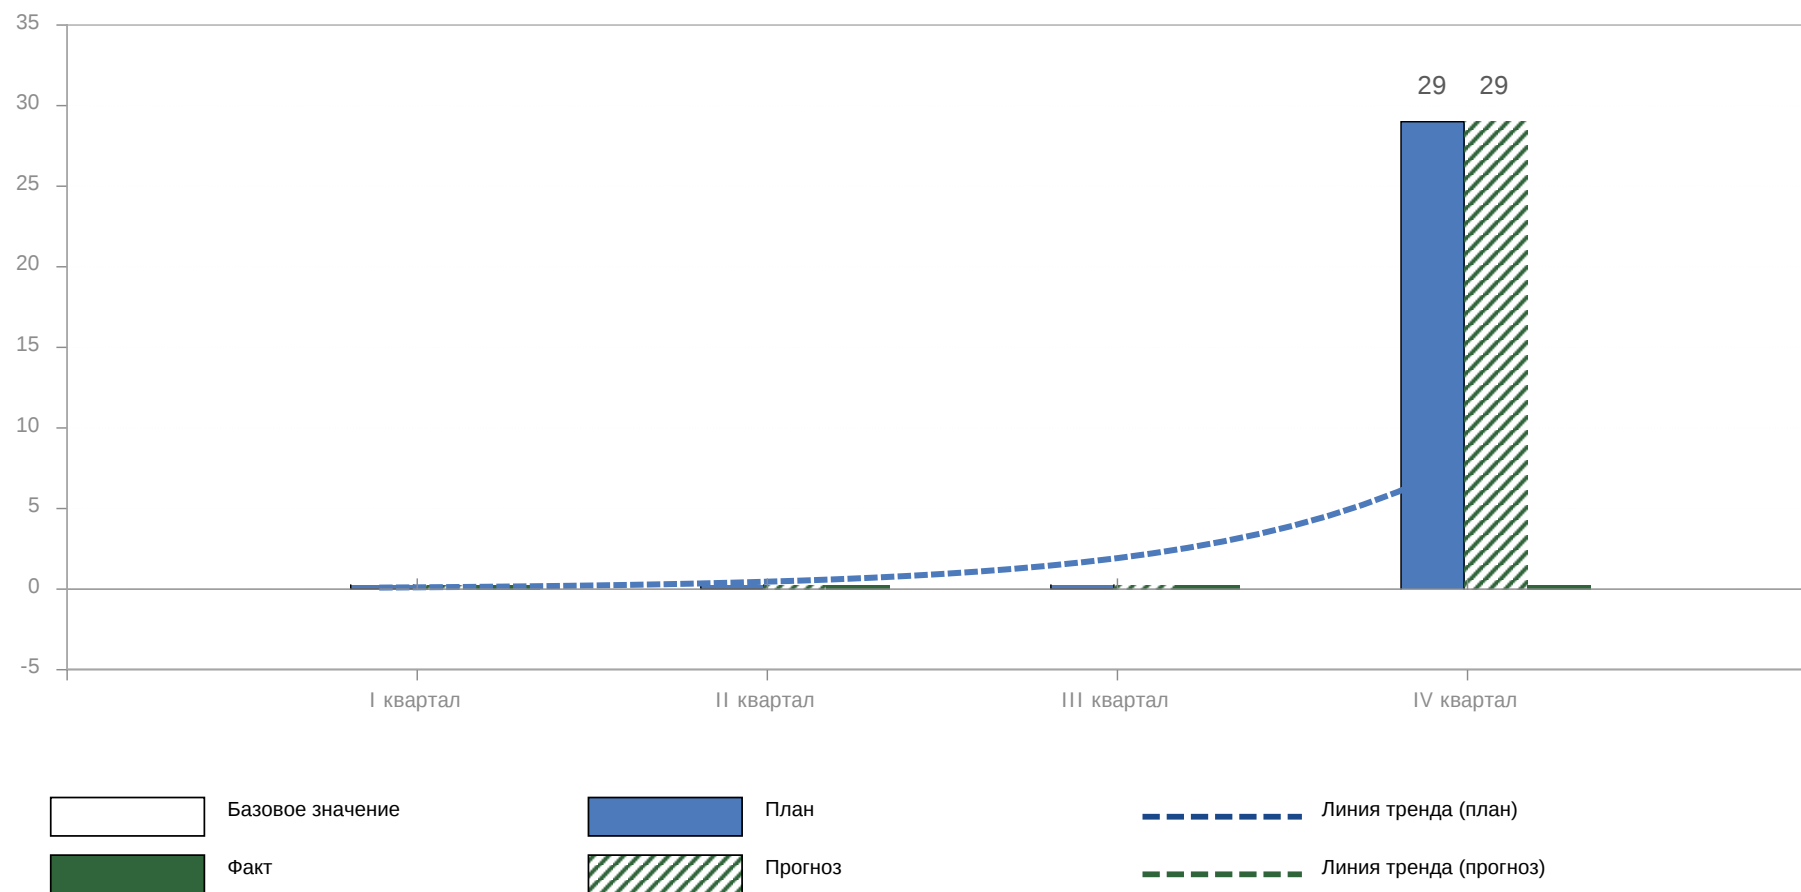


Рис. 4. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом
