

Руководитель
регионального проекта —
Малин Михаил Васильевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
43ABC0E26AF3358D05B69165061410E1A5E49451

Владелец: Малин Михаил Васильевич

Действителен: с 29.06.2021 по 29.09.2022

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

" (N7-32) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
(Кемеровская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1		6. План мероприятий	Контрольная точка: В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ, Причина риска: Указано значение на 21.12.2020 год, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Итоговый расчет значения за 2020 год, срок исполнения 31.01.2021;
2		6. План мероприятий	Контрольная точка: 90 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Кемеровской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ, Причина риска: Указано значение на 21.12.2020 г., Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Итоговый расчет значения за 2020 год, срок исполнения 31.01.2021;
3		6. План мероприятий	Мероприятие: В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ, Причина риска: Указано значение на 21.12.2020 год, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	1. Итоговый расчет значения за 2020 год, срок исполнения 31.01.2021;
4		6. План мероприятий	Мероприятие: 90 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Кемеровской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава	1. Итоговый расчет значения за 2020 год, срок исполнения 31.01.2021;

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
			России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ., Причина риска: Указано значение на 21.12.2020 год, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.	
5		3. Цели и показатели	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, Причина риска: Перенос сроков подключения медицинских организаций к медицинским информационным системам., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Недостижение показателя: Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	1. Показатель не достигнут, срок исполнения 31.12.2021;
6		3. Цели и показатели	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %, Причина риска: Перенос сроков подключения медицинских организаций к медицинским информационным системам., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Не достижение показателя: Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %	1. Показатель не достигнут, срок исполнения 31.12.2021;
7		3. Цели и показатели	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году., Причина риска: Ограничения, связанные с COVID-19 (ограничения по проведению профилактических осмотров, по проведению приемов узкими специалистами и т.п.). Низкая информированность граждан о возможности использования сервиса "Моё здоровье" (Личный кабинет пациента) на Едином портале государственных услуг и функций., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Не достижение показателя: Число граждан,	1. Показатель не достигнут, срок исполнения 31.12.2021;

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
			воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году.	

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году.	Тысяча человек	65.84	38.4	65.046	72.923	132.04	137.26	96,20%	Подтверждающие документы: 1. "О достижении показателей за 2020 год" Отчет Минздрав Кузбасса от 14.09.2021г. №7176, приложен файл. Существует риск: Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году., Причина риска: Ограничения, связанные с COVID-19 (ограничения по проведению профилактических осмотров, по проведению приемов узкими специалистами и т.п.). Низкая информированность граждан о возможности использования сервиса "Моё здоровье" (Личный кабинет пациента) на Едином портале государственных услуг и функций., Вероятность: 100%, Сутовые: Не достижение показателя: Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году. Предлагаемые решения: 1. Показатель не достигнут, срок исполнения 31.12.2021. Не достижение показателя.
2		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем	Процент	49	55	55	64	71	79	89,87%	Подтверждающие документы: 1. "О достижении целевых показателей за 2020 год." Отчет Минздрав Кузбасса от

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
		здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %									14.09.2021г. №7176, приложен файл.Существует риск:Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %, Причина риска: Перенос сроков подключения медицинских организаций к медицинским информационным системам., Вероятность: 100%, Сутевые: Не достижение показателя: Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %Предлагаемые решения:1. Показатель не достигнут, срок исполнения 31.12.2021.Показатель не достигнут.
3		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения	Процент	31	25	25	42	59.79	63	94,90%	Подтверждающие документы:1. "О достижении целевых показателей за 2020 год" Отчет Минздрава Кузбасса от 14.09.2021г. №7176, приложен файл.Существует риск:Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, Причина риска: Перенос сроков подключения медицинских организаций к



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
		субъектов Российской Федерации									медицинским информационным системам., Вероятность: 100%, Сутевые: Недостижение показателя: Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации Предлагаемые решения: 1. Показатель не достигнут., срок исполнения 31.12.2021. Не достижение показателя.
4		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	Процент	3	4.5	4.5	5	29.6	26	113,85%	Подтверждающие документы: 1. "О достижении целевых показателей." Отчет Минздрав Кузбасса от 14.06.2021г. №7176, приложен файл. Показатель достигнут.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 854 354,60 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

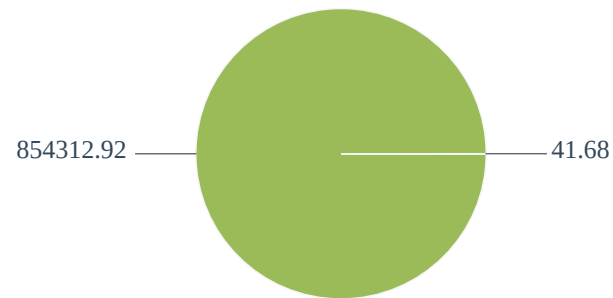

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(09) Кемеровская область реализовала региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	854 354,60	854 354,60	854 354,60	854 312,92	854 312,92	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	854 354,60	854 354,60	854 354,60	854 312,92	854 312,92	100,00	Выполнено
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	854 354,60	854 354,60	854 354,60	854 312,92	854 312,92	100,00	Выполнено
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			854 354,60	854 354,60	854 354,60	854 312,92	854 312,92	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			854 354,60	854 354,60	854 354,60	854 312,92	854 312,92	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			854 354,60	854 354,60	854 354,60	854 312,92	854 312,92	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2019	
2		Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020	
3		Кемеровская область реализовала систему электронных рецептов. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	
4		Кемеровская область реализовала региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	
5		Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет) Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2021	
6		Организовано не менее 23172 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области Значение: 21 267,0000 Дата: 31.12.2020	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "об обеспечении межведомственного информационного взаимодействия" Отчет ДОЗН КО от 26.11.2019г. №7722, приложен файл. Предоставлена информация : 20 из 20.
1.1.	ПК		20% государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования	31.12.2019	26.12.2019	Иванов Андрей Валерьевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о медицинских организациях, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие" Отчет ДОЗН КО от 26.12.2019г. №7722, приложен файл. Выполнено.
1.1.1	РРП		Проведение модернизации и развития медицинских информационных систем, государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия	31.12.2019	26.12.2019	Брежнева Юлия Юрьевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о медицинских организациях, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие" Отчет ДОЗН КО от 26.12.2019г. №7722, приложен файл.
2.			Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем	31.12.2020	30.12.2020	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			здравоохранения Кемеровской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020				1. "Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие" Отчет КузбассМИАЦ от 30.12.2020г. №1292, приложен файл. Предоставлена информация : 51.4 из 50.
2.1.	ПК		50% государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования	31.12.2020	21.12.2020	Березин Евгений Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за 2020 год о доле государственных и муниципальных медицинских организаций обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с ИС ФФСС" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.12.2020г. №8905, приложен файл.
2.1.1	РПП		Проведение модернизации и развития медицинских информационных систем, государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия	31.12.2020	21.12.2020	Гончаренко Алексей Владимирович	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за 2020 год о доле государственных и муниципальных медицинских организаций обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с ИС ФФСС" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.12.2020г. №8905, приложен файл.
2.2.	ПК		50% государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы	31.12.2020	28.12.2020	Березин Евгений Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы" Отчет

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Министерства здравоохранения Кузбасса от 28.12.2020г. №9212, приложен файл.
2.2.1	РРП		Проведение модернизации и развития медицинских информационных систем, государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия	31.12.2020	28.12.2020	Гончаренко Алексей Владимирович	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 28.12.2020г. №9212, приложен файл.
3.			<i>Кемеровская область реализовала систему электронных рецептов. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023</i>	31.12.2023	31.12.2023	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
3.1.	ПК		Проведены мероприятия по обеспечению информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами	01.11.2020	30.10.2020	Березин Евгений Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о проведении мероприятий по обеспечению информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 30.10.2020г. №7358, приложен файл.
3.1.1	РРП		Проведение мероприятий по обеспечению информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами	01.11.2020	30.10.2020	Гончаренко Алексей Владимирович	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о проведении мероприятий по обеспечению информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 30.10.2020г. №7358, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.2.	ПК		В Кемеровской области проведено обучение медицинских работников, участвующих в процессе оформления рецептов, технологии и методологии формирования электронных рецептов	20.12.2020	24.12.2020	Березин Евгений Николаевич	Выполнено. Просрочка 4 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проведении обучения медицинских работников (регламент взаимодействия участников)" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 24.12.2020г. №3406, приложен файл.
3.2.1	РРП		Проведение обучения медицинских работников, участвующих в процессе оформления рецептов, технологии и методологии формирования электронных рецептов	20.12.2020	24.12.2020	Гончаренко Алексей Владимирович	Выполнено. Просрочка 4 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проведении обучения медицинских работников (регламент взаимодействия участников)" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 24.12.2020г. №3406, приложен файл.
3.3.	ПК		В Кемеровской области подготовлены нормативно-правовые акты о функционировании реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами для обеспечения населения лекарственными препаратами	20.12.2020	24.12.2020	Березин Евгений Николаевич	Выполнено. Просрочка 4 дней. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о функционировании реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами." Приказ Министерства здравоохранения Кузбасса от 24.12.2020г. №3406, приложен файл.
3.3.1	РРП		Подготовка нормативно-правовых актов о функционировании реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами для	20.12.2020	24.12.2020	Гончаренко Алексей Владимирович	Выполнено. Просрочка 4 дней. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о функционировании реализации информационного обмена с аптечными организациями, в

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			обеспечения населения лекарственными препаратами				том числе электронными рецептами." Приказ Министерства здравоохранения Кузбасса от 24.12.2020г. №3406, приложен файл.
3.4.	ПК		Медицинские организации Кемеровской области организовали информационный обмен с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами	20.12.2020	28.12.2020	Березин Евгений Николаевич	Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об организации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 28.12.2020г. №9213, приложен файл.
3.4.1	РПП		Организация информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами	20.12.2020	28.12.2020	Гончаренко Алексей Владимирович	Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об организации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 28.12.2020г. №9213, приложен файл.
4.			<i>Кемеровская область реализовала региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем,</i>	31.12.2024	15.02.2021	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 1.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений







Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024				
4.1.	ПК		Утверждены планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год.	15.04.2020	29.04.2020	Березин Евгений Николаевич	Выполнено. Просрочка 14 дней. Подтверждающие документы: 1. "об утверждении плана по модернизации и развитию государственных информационных систем" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 29.04.2020г. №2770, приложен файл.
4.1.1	РПП		Утверждение планов по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год.	15.04.2020	29.04.2020	Гончаренко Алексей Владимирович	Выполнено. Просрочка 14 дней. Подтверждающие документы: 1. "об утверждении плана по модернизации и развитию государственных информационных систем" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 29.04.2020г. №2770, приложен файл.
4.2.	ПК		Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области на 2020 г.	15.04.2020	29.04.2020	Березин Евгений Николаевич	Выполнено. Просрочка 14 дней. Подтверждающие документы: 1. "об утверждении планов по дооснащению центров обработки данных" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 29.04.2020г. №2770,

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							приложен файл.
4.2.1	РРП		Утверждение планов по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области на 2020 г.	15.04.2020	29.04.2020	Гончаренко Алексей Владимирович	Выполнено. Просрочка 14 дней. Подтверждающие документы: 1. "об утверждении планов по дооснащению центров обработки данных" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 29.04.2020г. №2770, приложен файл.
4.3.	ПК		75 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения Кемеровской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России	20.12.2020	21.12.2020	Березин Евгений Николаевич	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "об использовании медицинских информационных систем в 75% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения Кемеровской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 21.12.2020г. №8903, приложен файл.
4.3.1	РРП		75 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения Кемеровской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России	20.12.2020	21.12.2020	Гончаренко Алексей Владимирович	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "об использовании медицинских информационных систем в 75% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения Кемеровской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 21.12.2020г. №8903, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.4.	ПК		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Управление потоками пациентов», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.	20.12.2020	21.12.2020	Березин Евгений Николаевич	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "о функционировании централизованных систем "Управление потоками пациентов", к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь"" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 21.12.2020г. №8902, приложен файл.
4.4.1	РПП		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Управление потоками пациентов», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.	20.12.2020	21.12.2020	Гончаренко Алексей Владимирович	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "о функционировании централизованных систем "Управление потоками пациентов", к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь"" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 21.12.2020г. №8902, приложен файл.
4.5.	ПК		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующие с «Системой 112», к которым подключены 100%	20.12.2020	21.12.2020	Березин Евгений Николаевич	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "о функционировании централизованной системы "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиацией)",

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи.				взаимодействующие с "Системой 112", к которым подключены 100% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций"" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.12.2020г. №8901, приложен файл.
4.5.1	РРП		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующие с «Системой 112», к которым подключены 100% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи.	20.12.2020	21.12.2020	Гончаренко Алексей Владимирович	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "о функционировании централизованной системы "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиацией)", взаимодействующие с "Системой 112", к которым подключены 100% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций"" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.12.2020г. №8901, приложен файл.
4.6.	ПК		К централизованным системам «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области подключены 100% структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций и 100% аптечных пунктов и организаций	20.12.2020	21.12.2020	Березин Евгений Николаевич	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о подключении к централизованным системам "Управление льготным лекарственным обеспечением"" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.12.2020г. №8908, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.6.1	РРП		К централизованным системам «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области подключены 100% структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций и 100% аптечных пунктов и организаций	20.12.2020	21.12.2020	Гончаренко Алексей Владимирович	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о подключении к централизованным системам "Управление льготным лекарственным обеспечением"" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.12.2020г. №8908, приложен файл.
4.7.	ПК		90 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Кемеровской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	20.12.2020	31.01.2021	Березин Евгений Николаевич	В работе. Просрочка 42 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и обеспечении информационного взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.12.2020г. №8906, приложен файл. Существует риск: Контрольная точка: 90 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Кемеровской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ, Причина риска: Указано значение

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							на 21.12.2020 г., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г. Предлагаемые решения: 1. Итоговый расчет значения за 2020 год, срок исполнения 31.01.2021.
4.7.1	РРП		90 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Кемеровской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.	20.12.2020	31.01.2021	Гончаренко Алексей Владимирович	В работе. Просрочка 42 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и обеспечении информационного взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.12.2020г. №8906, приложен файл. Существует риск: Мероприятие: 90 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Кемеровской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ., Причина риска: Указано значение на 21.12.2020 год, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г. Предлагаемые решения: 1. Итоговый расчет значения за 2020 год, срок исполнения 31.01.2021.
4.8.	ПК		Осуществлена закупка и ввод в	20.12.2020	21.12.2020	Березин Евгений	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области			Николаевич	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих центров обработки данных" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.12.2020г. №8904, приложен файл.
4.8.1	РРП		Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области	20.12.2020	21.12.2020	Гончаренко Алексей Владимирович	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих центров обработки данных" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.12.2020г. №8904, приложен файл.
4.9.	ПК		Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области	20.12.2020	22.12.2020	Березин Евгений Николаевич	Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию компьютерной техники для создания АРМ и информационно-коммуникационного оборудования" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 22.12.2020г. №8979, приложен файл.
4.9.1	РРП		Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных	20.12.2020	22.12.2020	Гончаренко Алексей Владимирович	Выполнено. Просрочка 2 дней.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области				Подтверждающие документы: 1. "Отчет об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию компьютерной техники для создания АРМ и информационно-коммуникационного оборудования" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 22.12.2020г. №8979, приложен файл.
4.10.	ПК		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены не менее 67% государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области	20.12.2020	24.12.2020	Березин Евгений Николаевич	Выполнено. Просрочка 4 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о функционировании централизованных систем "Центральный архив медицинских изображений"" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 24.12.2020г. №9049, приложен файл.
4.10.1	РРП		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены не менее 67% государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области	20.12.2020	24.12.2020	Гончаренко Алексей Владимирович	Выполнено. Просрочка 4 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о функционировании централизованных систем "Центральный архив медицинских изображений"" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 24.12.2020г. №9049, приложен файл.
4.11.	ПК		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключены не менее 50% клиничко-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области и 50% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП,	20.12.2020	29.12.2020	Березин Евгений Николаевич	Выполнено. Просрочка 9 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о функционировании централизованных систем "Лабораторные исследования"" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.12.2020г. №9271, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций				
4.11.1	РРП		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключены не менее 50% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области и 50% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций	20.12.2020	29.12.2020	Гончаренко Алексей Владимирович	Выполнено. Просрочка 9 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о функционировании централизованных систем "Лабораторные исследования"" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.12.2020г. №9271, приложен файл.
4.12.	ПК		Заключено соглашение о предоставлении бюджету Кемеровской области межбюджетного трансферта	15.02.2020	15.02.2020	Березин Евгений Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении межбюджетного трансферта" Соглашение ДОЗН КО от 20.12.2019г. № 056-08-2019-332_2, приложен файл.
4.12.1	РРП		Заключено соглашение о предоставлении бюджету Кемеровской области межбюджетного трансферта	15.02.2020	15.02.2020	Гончаренко Алексей Владимирович	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении межбюджетного трансферта" Соглашение ДОЗН КО от 20.12.2019г. № 056-08-2019-332_2, приложен файл.
4.13.	ПК		Утвержден план и подготовлено техническое задание для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских	01.04.2020	03.04.2020	Березин Евгений Николаевич	Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие документы: 1. "об утверждении плана по дооснащению медицинских организаций" Отчет Министерство здравоохранения

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2020 г.				Кузбасса от 03.04.2020г. №1943, приложен файл.
4.13.1	РРП		Утверждение плана и подготовка технического задания для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2020 г.	01.04.2020	03.04.2020	Гончаренко Алексей Владимирович	Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие документы: 1. "об утверждении плана по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания АРМов" Отчет Минздрава Кузбасса от 03.04.2020г. № 1943, приложен файл.
4.14.	ПК		Утверждены планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год	15.04.2020	29.04.2020	Березин Евгений Николаевич	Выполнено. Просрочка 14 дней. Подтверждающие документы: 1. "об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 29.04.2020г. №2770, приложен файл.
4.14.1	РРП		Утверждение планов по модернизации и развитию медицинских	15.04.2020	29.04.2020	Гончаренко Алексей Владимирович	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год				Просрочка 14 дней. Подтверждающие документы: 1. "об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 29.04.2020г. №2770, приложен файл.
4.15.	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	19.12.2020	24.12.2020	Березин Евгений Николаевич	Выполнено. Просрочка 5 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении межбюджетных трансфертов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 24.12.2020г. №9054, приложен файл.
4.15.1	РПП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	19.12.2020	24.12.2020	Гончаренко Алексей Владимирович	Выполнено. Просрочка 5 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении межбюджетных трансфертов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 24.12.2020г. №9054, приложен файл.
4.16.	ПК		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных	20.12.2020	31.01.2021	Березин Евгений Николаевич	В работе. Просрочка 42 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о функционировании централизованных систем"Интегрированная электронная медицинская карта"" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.12.2020г. №8907, приложен файл. Существует риск: Контрольная точка: В Кемеровской области функционируют централизованные системы

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ				«Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ, Причина риска: Указано значение на 21.12.2020 год, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г. Предлагаемые решения: 1. Итоговый расчет значения за 2020 год, срок исполнения 31.01.2021.
4.16.1	РРП		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ	20.12.2020	31.01.2021	Гончаренко Алексей Владимирович	В работе. Просрочка 42 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о функционировании централизованных систем"Интегрированная электронная медицинская карта"" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.12.2020г. №8907, приложен файл. Существует риск: Мероприятие: В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ, Причина риска: Указано значение на 21.12.2020 год, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							31.01.2021г. Предлагаемые решения: 1. Итоговый расчет значения за 2020 год, срок исполнения 31.01.2021.
4.17.	ПК		Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	15.02.2021	15.02.2021	Березин Евгений Николаевич	В работе. В работе. Отклонения отсутствуют.
4.17.1	РРП		Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	15.02.2021	15.02.2021	Гончаренко Алексей Владимирович	В работе.
5.			Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет) Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 81.5 из 80.
5.1.	ПК		Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году объявлены	31.03.2020	03.04.2020	Березин Евгений Николаевич	Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие документы: 1. "об объявлении закупочных процедур" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 03.04.2020г. №1943, приложен файл.
5.1.1	РРП		Разработка технического задания,	31.03.2020	03.04.2020	Гончаренко Алексей	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			объявление закупок для обеспечения в 2020 году подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет), исполнение контрактов			Владимирович	Просрочка 3 дней. Подтверждающие документы: 1. "об объявлении закупочных процедур" Отчет Министерство здравоохранения кузбасса от 03.04.2020г. №1943, приложен файл.
5.2.	ПК		Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году заключены	01.05.2020	21.12.2020	Березин Евгений Николаевич	Выполнено. Просрочка 234 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о заключении контрактов в 2020 году для подключения к защищенной сети передачи данных и доля подключенных структурных подразделений медицинских организаций" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.12.2020г. №8925, приложен файл. Риск снят: КТ: Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году заключены, Причина риска: Несвоевременное заключение контрактов., Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. Заключить контракты для подключения к защищенной сети передачи данных медицинских организаций, срок исполнения 31.12.2020.
5.2.1	РРП		Подключение к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных	01.05.2020	21.12.2020	Гончаренко Алексей Владимирович	Выполнено. Просрочка 234 дней. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году				1. "Отчет о заключении контрактов в 2020 году для подключения к защищенной сети передачи данных и доля подключенных структурных подразделений медицинских организаций" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.12.2020г. №8925, приложен файл. Риск снят: Мероприятие: Подключение к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году, Причина риска: Несвоевременное заключение контрактов., Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. Заключить контракты и подключить к защищенной сети передачи данных медицинских организаций, срок исполнения 31.12.2020.
5.3.	ПК		Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году исполнены. Запланированные на 2020 год территориально-выделенные структурные подразделения медицинских организаций подключены к защищенной сети передачи данных	20.12.2020	21.12.2020	Березин Евгений Николаевич	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о заключении контрактов в 2020 году для подключения к защищенной сети передачи данных и доля подключенных структурных подразделений медицинских организаций" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.12.2020г. №8925, приложен файл.
5.3.1	РРП		Подключение к защищенной сети передачи данных территориально- выделенных структурных	20.12.2020	21.12.2020	Гончаренко Алексей Владимирович	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году				1. "Отчет о заключении контрактов в 2020 году для подключения к защищенной сети передачи данных и доля подключенных структурных подразделений медицинских организаций" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.12.2020г. №8925, приложен файл.
5.4.	ПК		Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет) в 2021 году объявлены	31.03.2021	31.03.2021	Березин Евгений Николаевич	В работе. В работе. Отклонения отсутствуют.
5.4.1	РПП		Разработка технического задания, объявление закупок для обеспечения в 2021 году подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), исполнение контрактов	31.03.2021	31.03.2021	Гончаренко Алексей Владимирович	В работе.
6.			Организовано не менее 23172 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной	31.12.2020	31.12.2020	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О достижении показателей." Отчет Минздрав Кузбасса от 14.09.2021г. №7176, приложен файл. Предоставлена информация : 21267 из 21267.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			систем здравоохранения Кемеровской области Значение: 21 267,0000 Дата: 31.12.2020				
6.1.	ПК		Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	01.06.2020	15.12.2020	Березин Евгений Николаевич	Выполнено. Просрочка 197 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проведении закупочных процедур и заключении контрактов для организации автоматизированных рабочих мест" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 15.12.2020г. №8696, приложен файл. Риск снят: КТ:Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, Причина риска: Несвоевременное проведение закупочных процедур и заключение контрактов для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников., Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. Провести закупочные процедуры и заключить контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников, срок исполнения 31.12.2020.
6.1.1	РРП		В медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской	01.06.2020	15.12.2020	Гончаренко Алексей Владимирович	Выполнено. Просрочка 197 дней. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			области проведены мероприятия по организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России				1. "Отчет о мероприятиях по организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 15.12.2020г. №8696, приложен файл. Риск снят: Мероприятие: В медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области проведены мероприятия по организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, Причина риска: Несвоевременное проведение закупочных процедур и заключение контрактов для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников., Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. Провести мероприятия по организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников, срок исполнения 31.12.2020.
6.2.	ПК		Не менее 21267 автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	31.12.2020	15.12.2020	Березин Евгений Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об организации автоматизированных рабочих мест для медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 15.12.2020г. №8696, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.2.1	РРП		В медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области проведены мероприятия по организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	31.12.2020	15.12.2020	Гончаренко Алексей Владимирович	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о мероприятиях по организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 15.12.2020г. №8696, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений




Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек

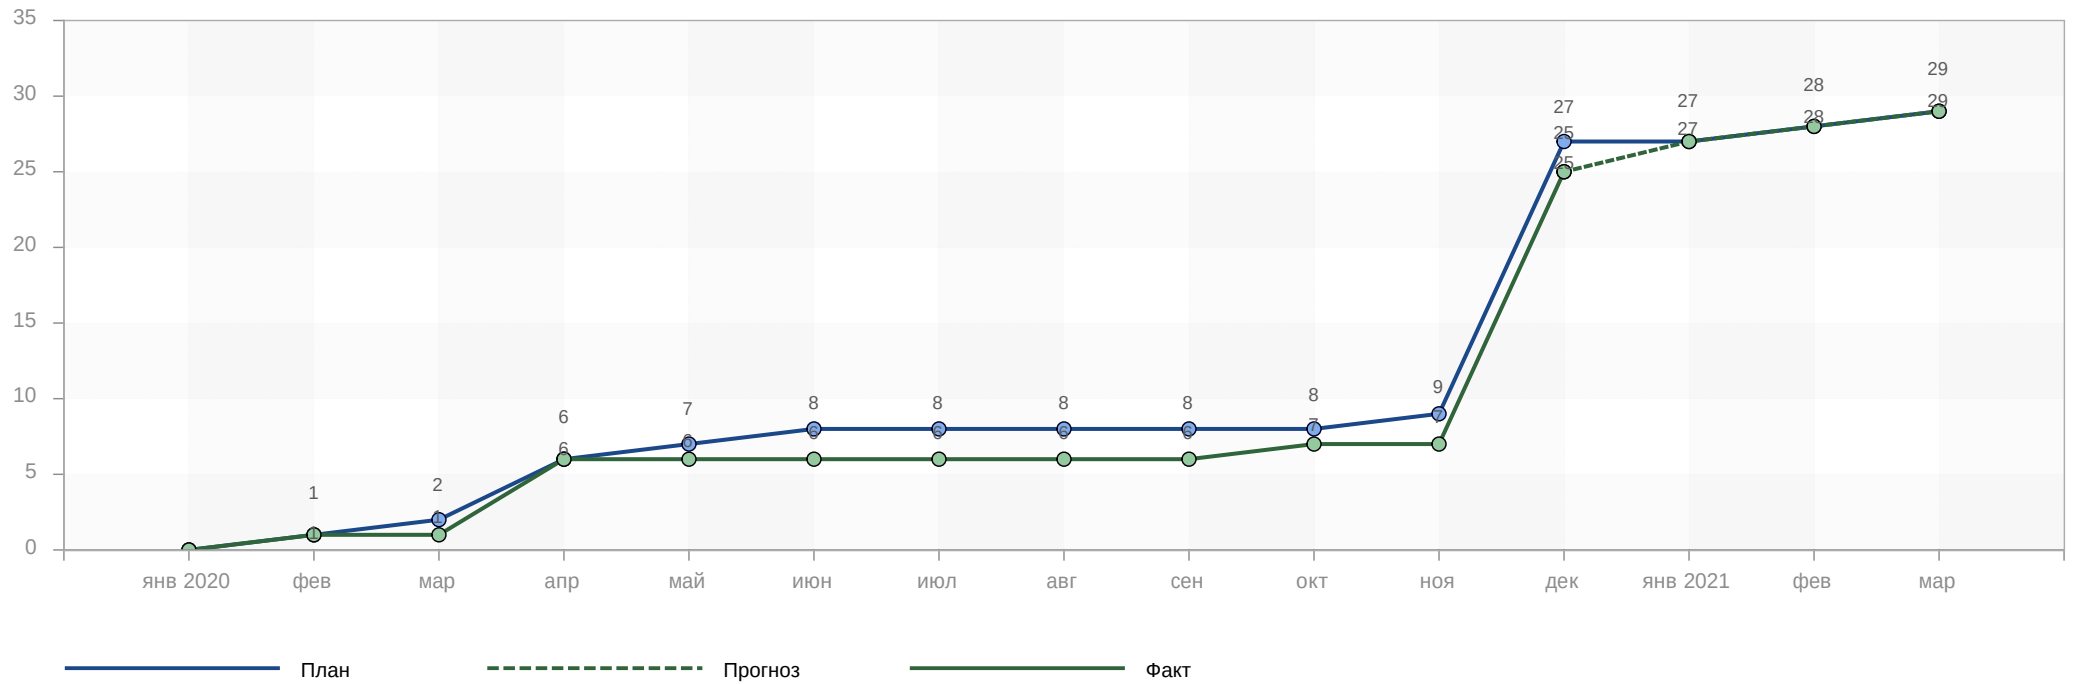

ис. 1. " (N7-32) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Кемеровская область,

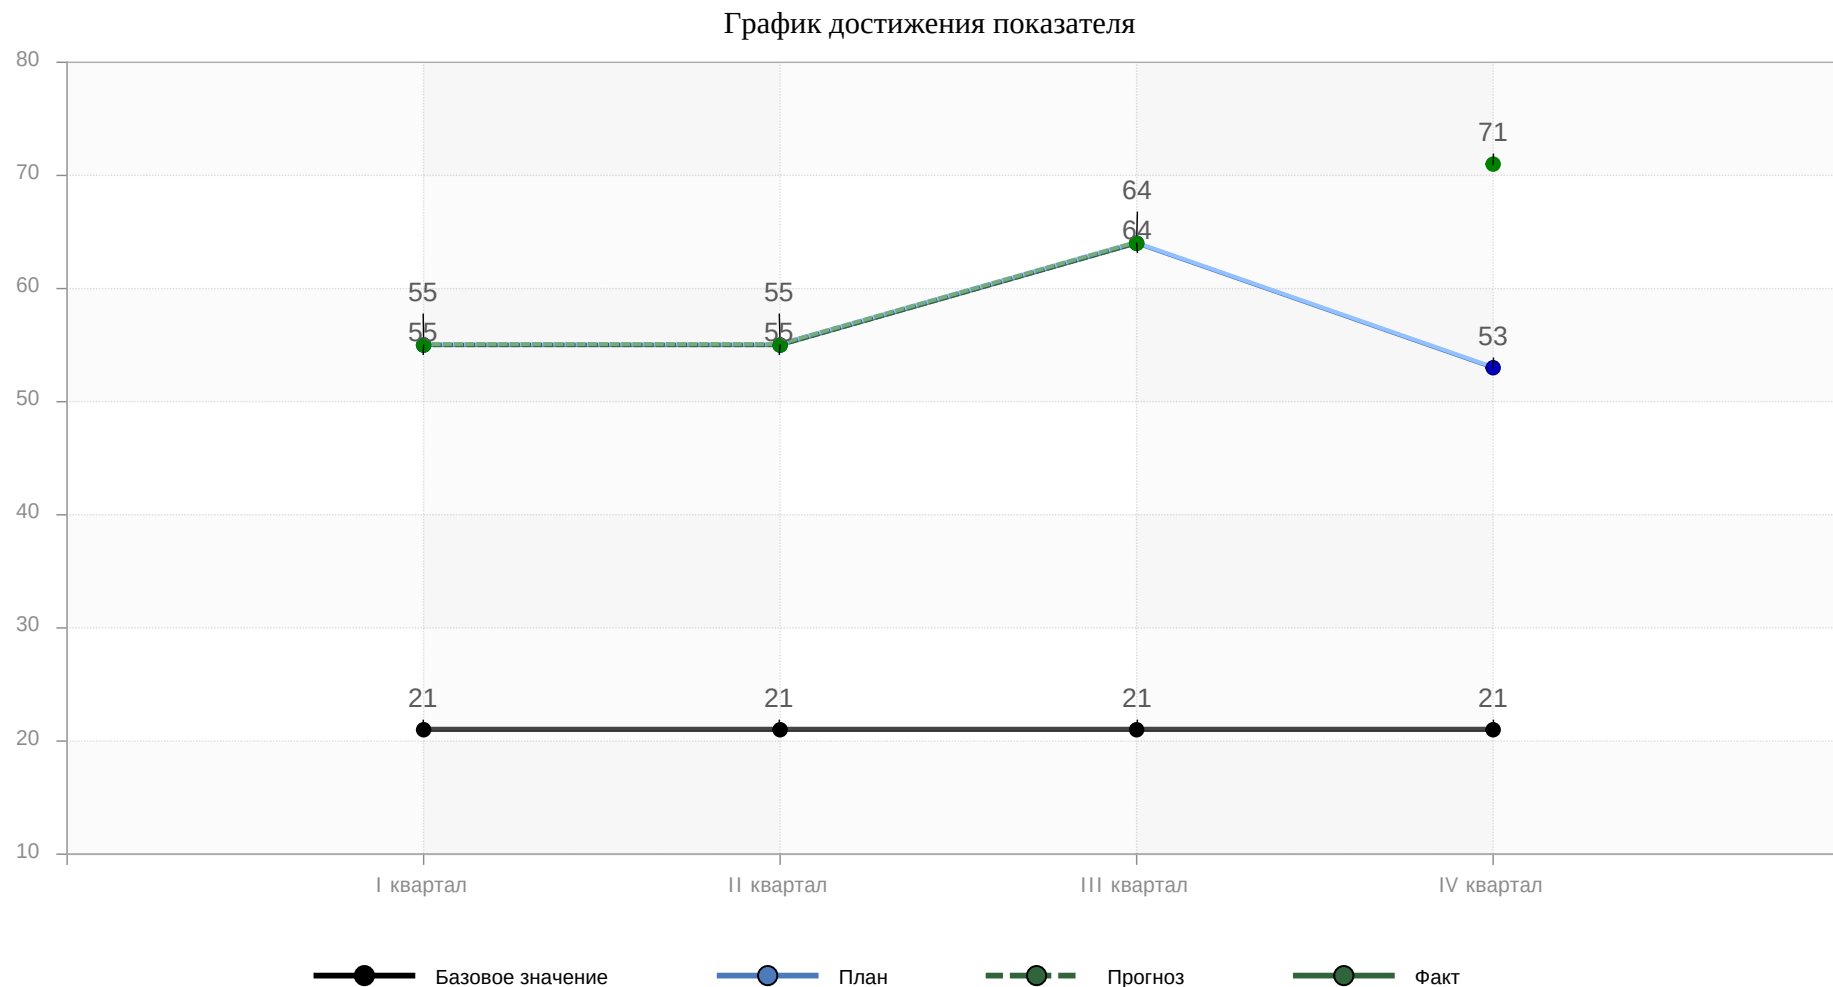


Рис. 1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %

Диаграмма достижения показателя

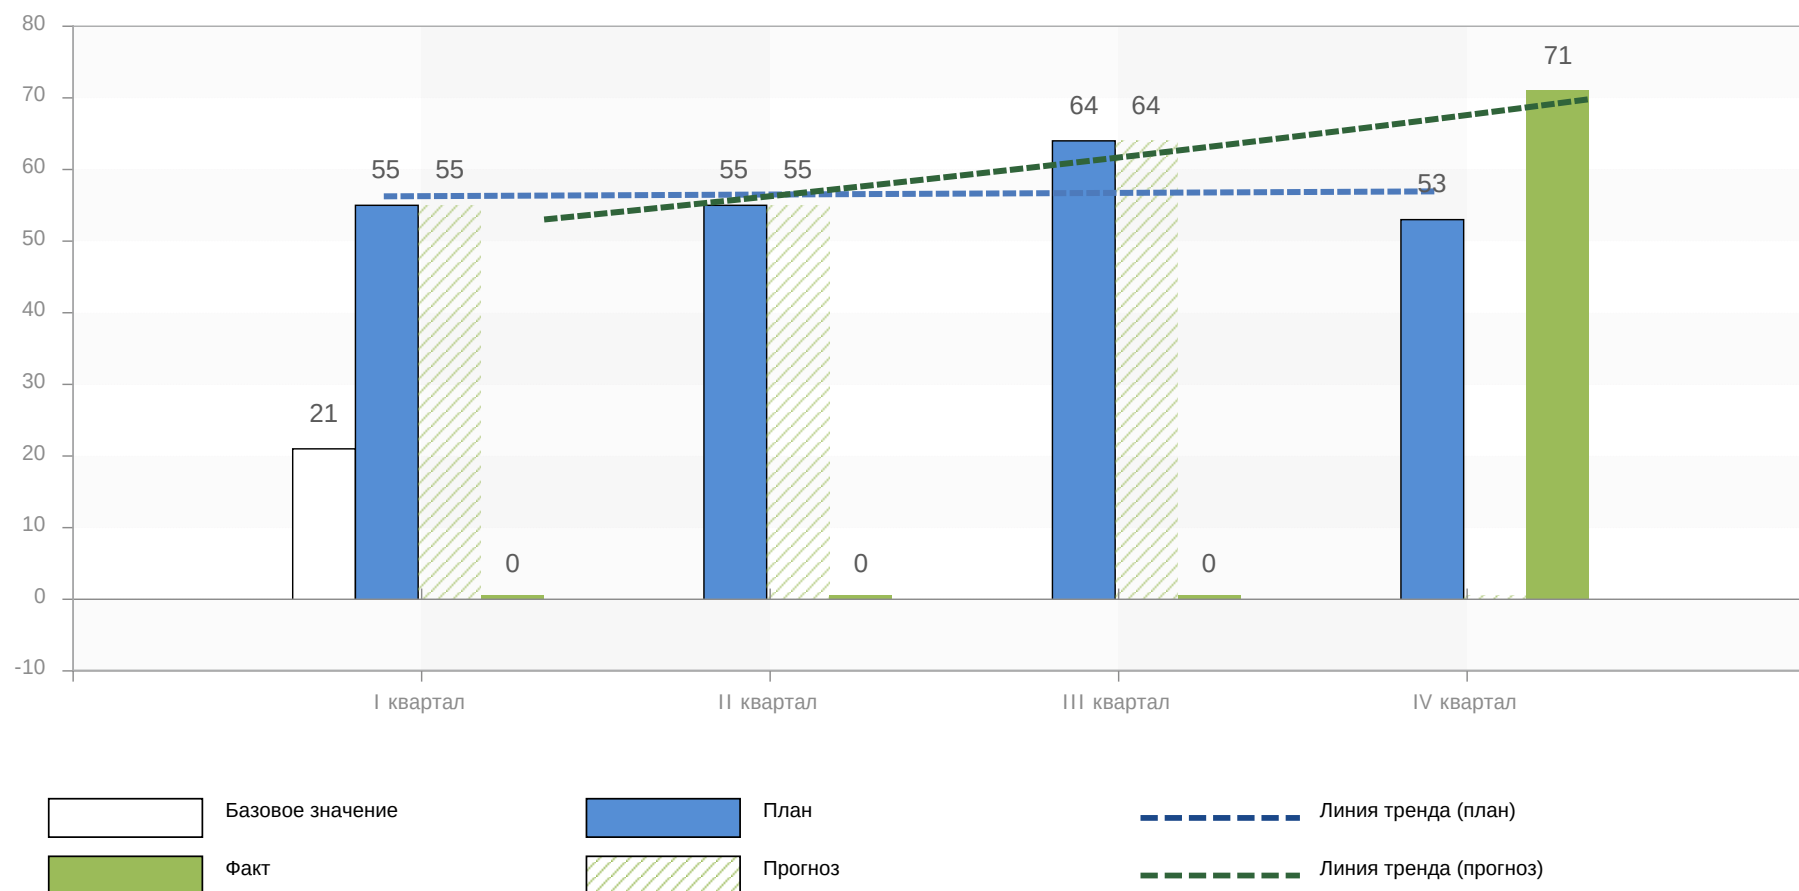


Рис. 2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %

График достижения показателя

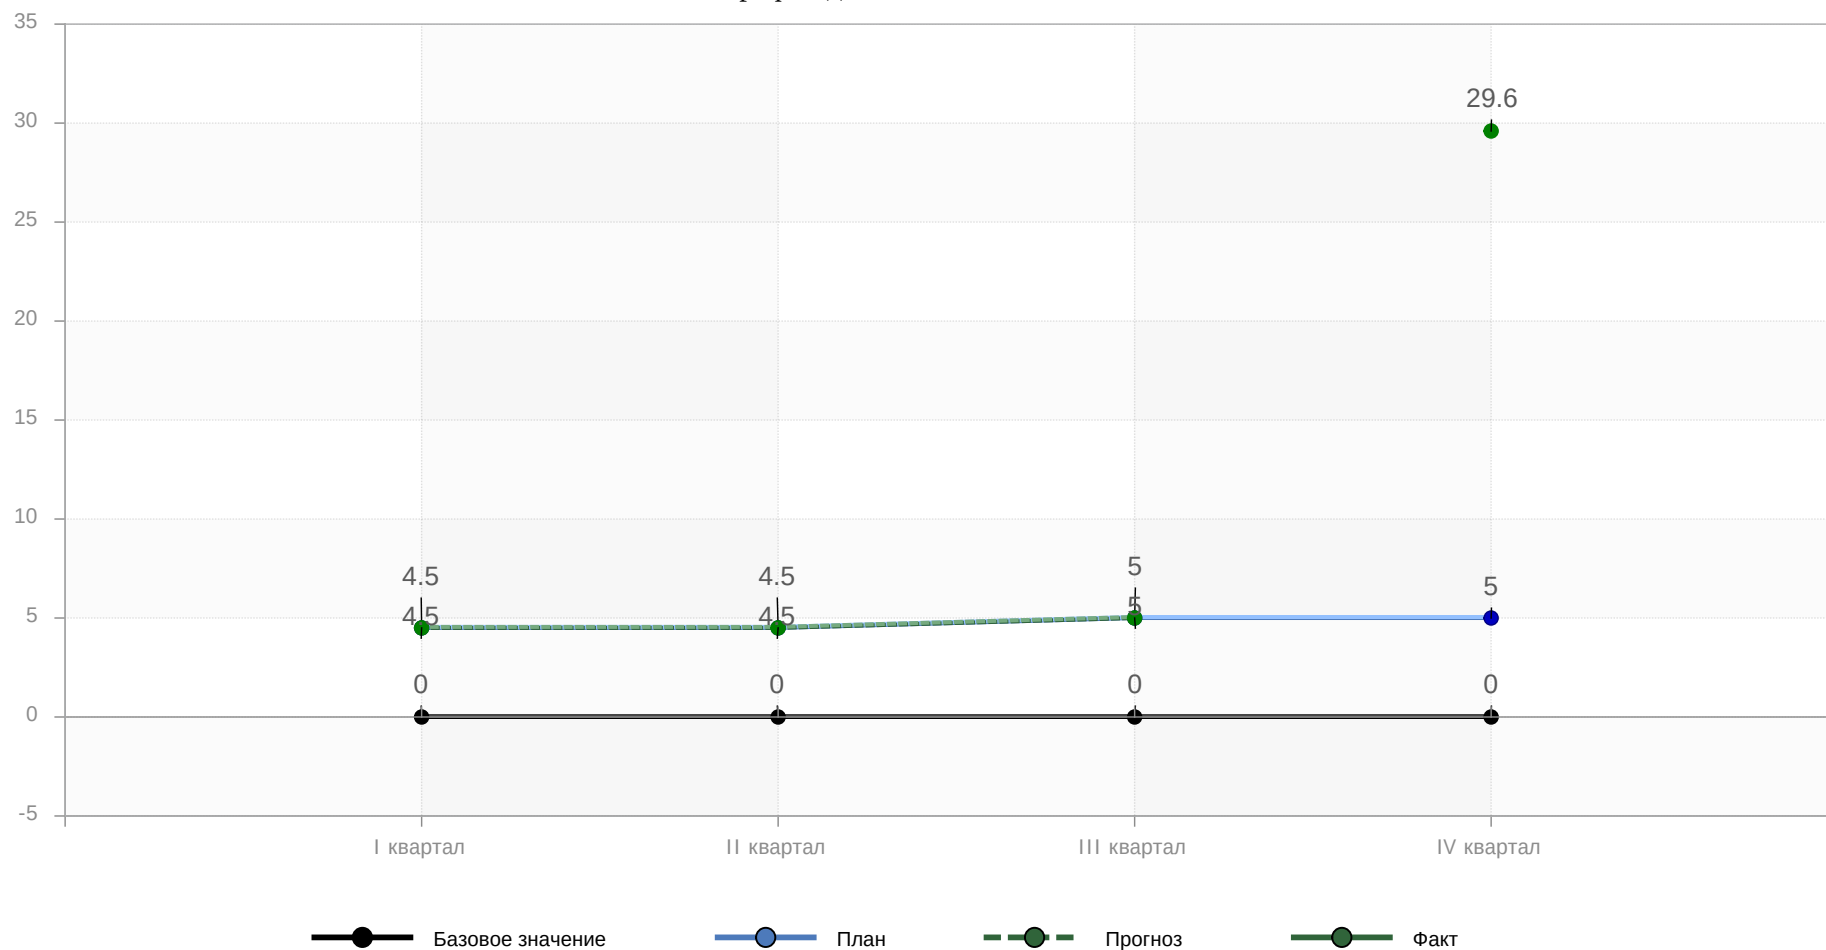


Рис. 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

Диаграмма достижения показателя

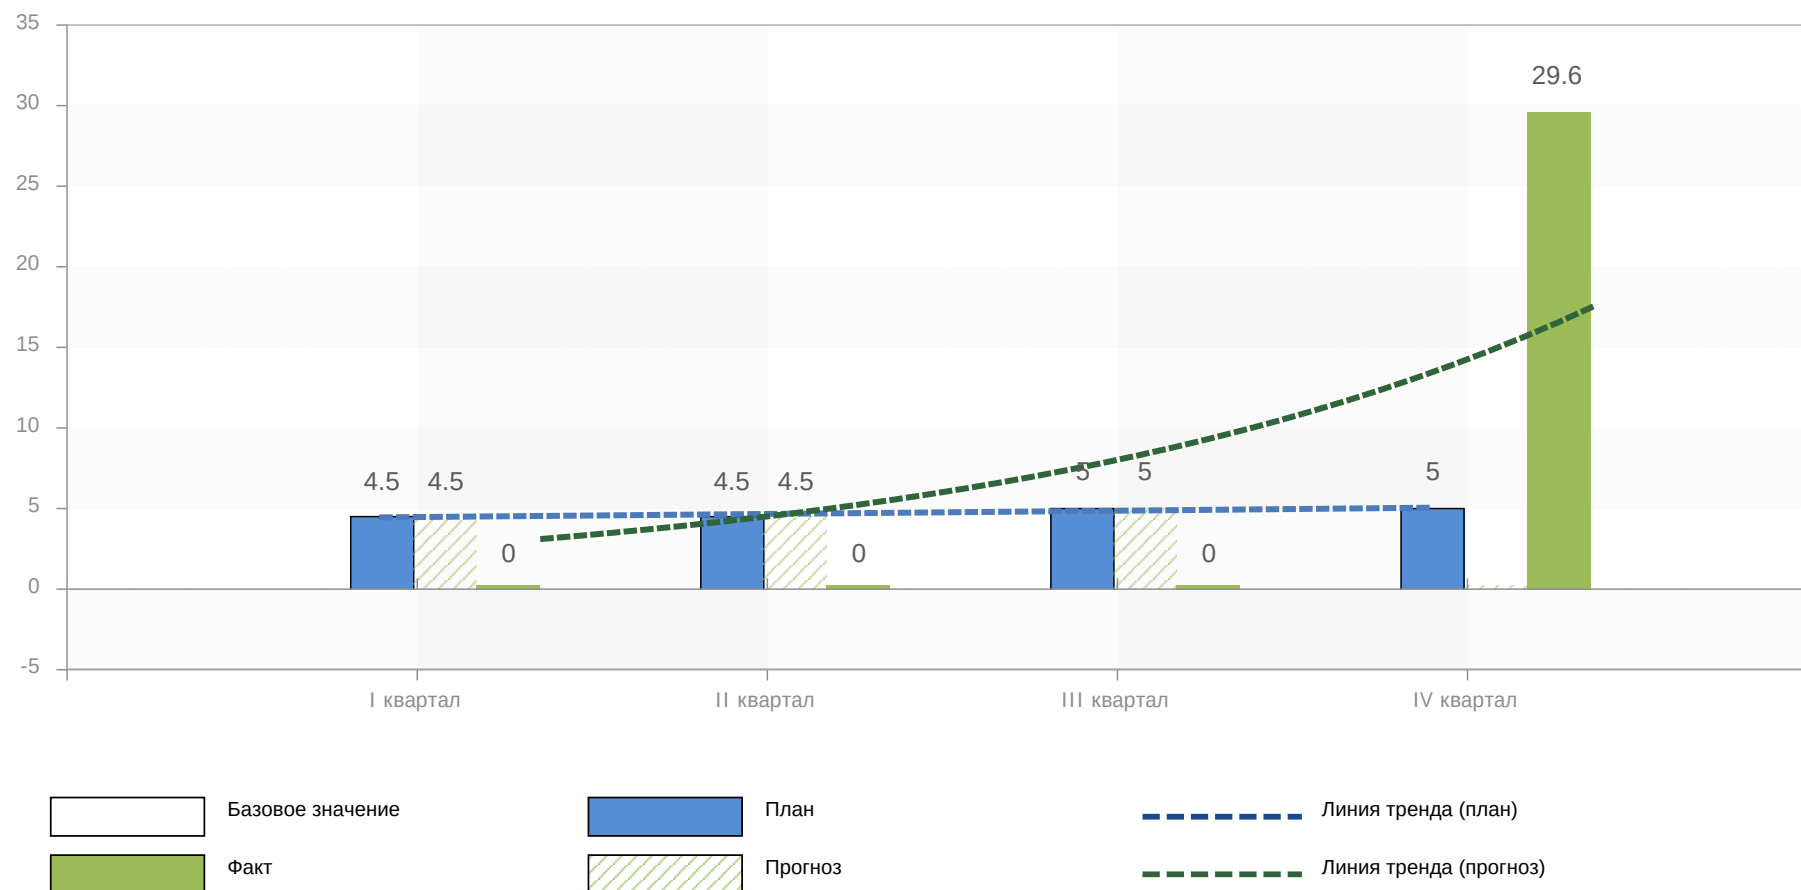


Рис. 4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

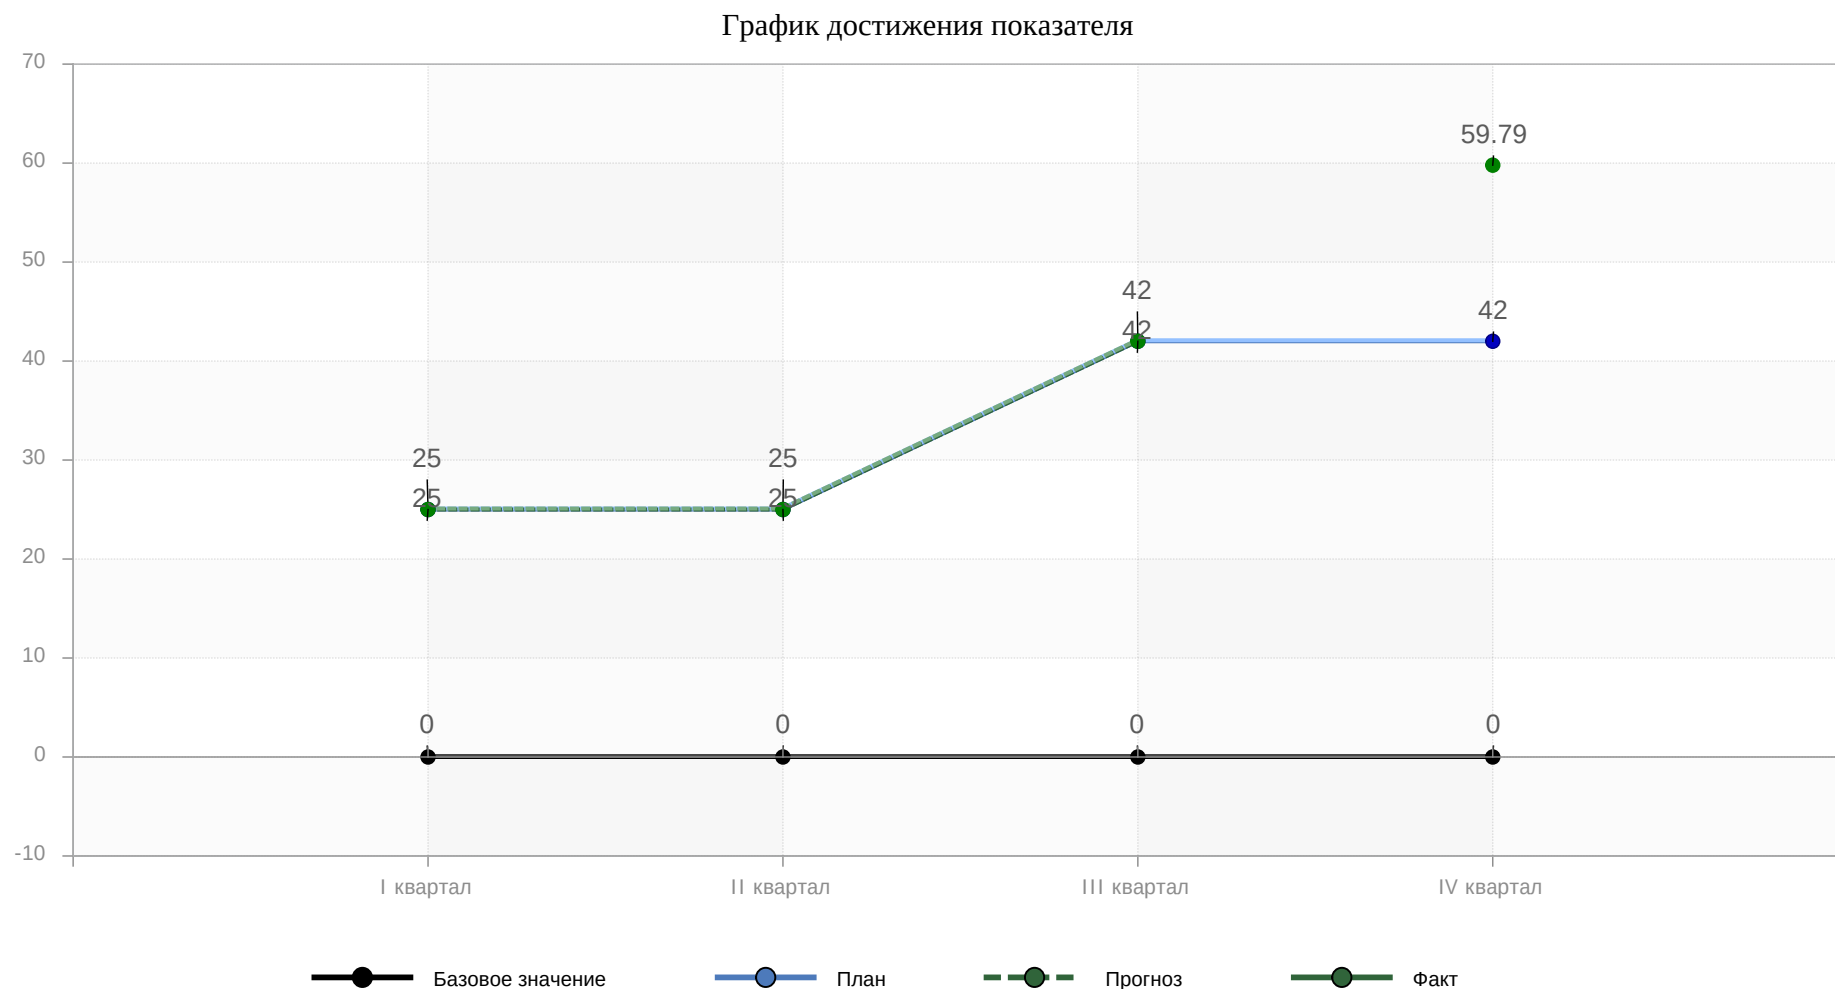


Рис. 5. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

Диаграмма достижения показателя

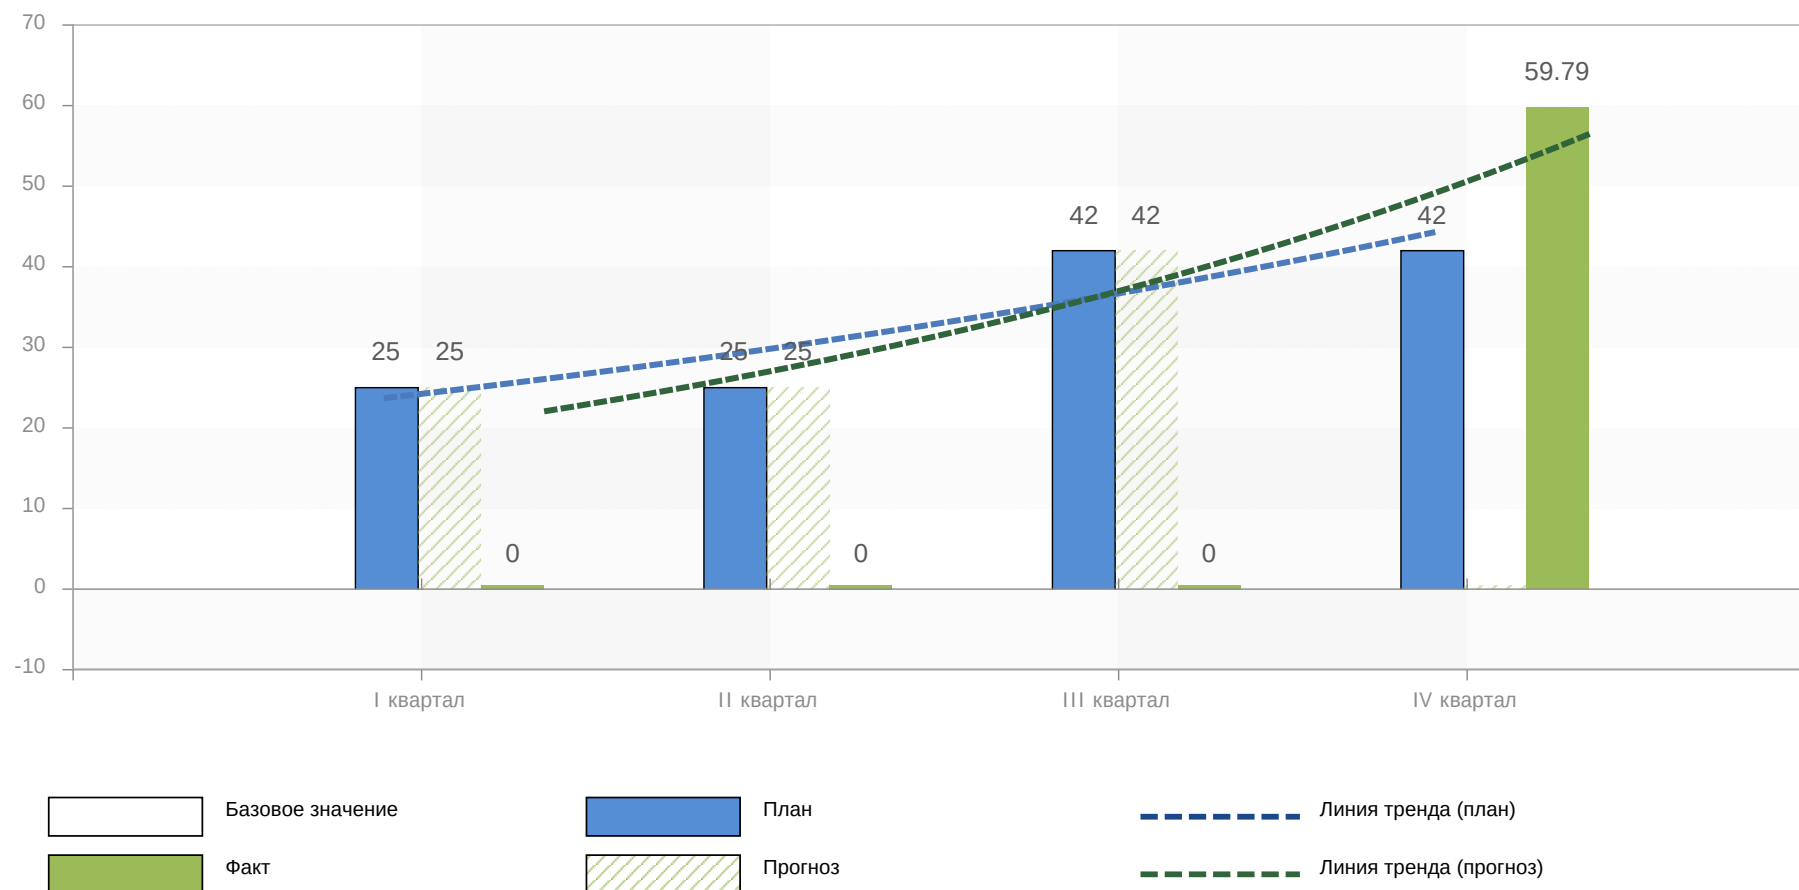


Рис. 6. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

График достижения показателя



Рис. 7. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году.

Диаграмма достижения показателя

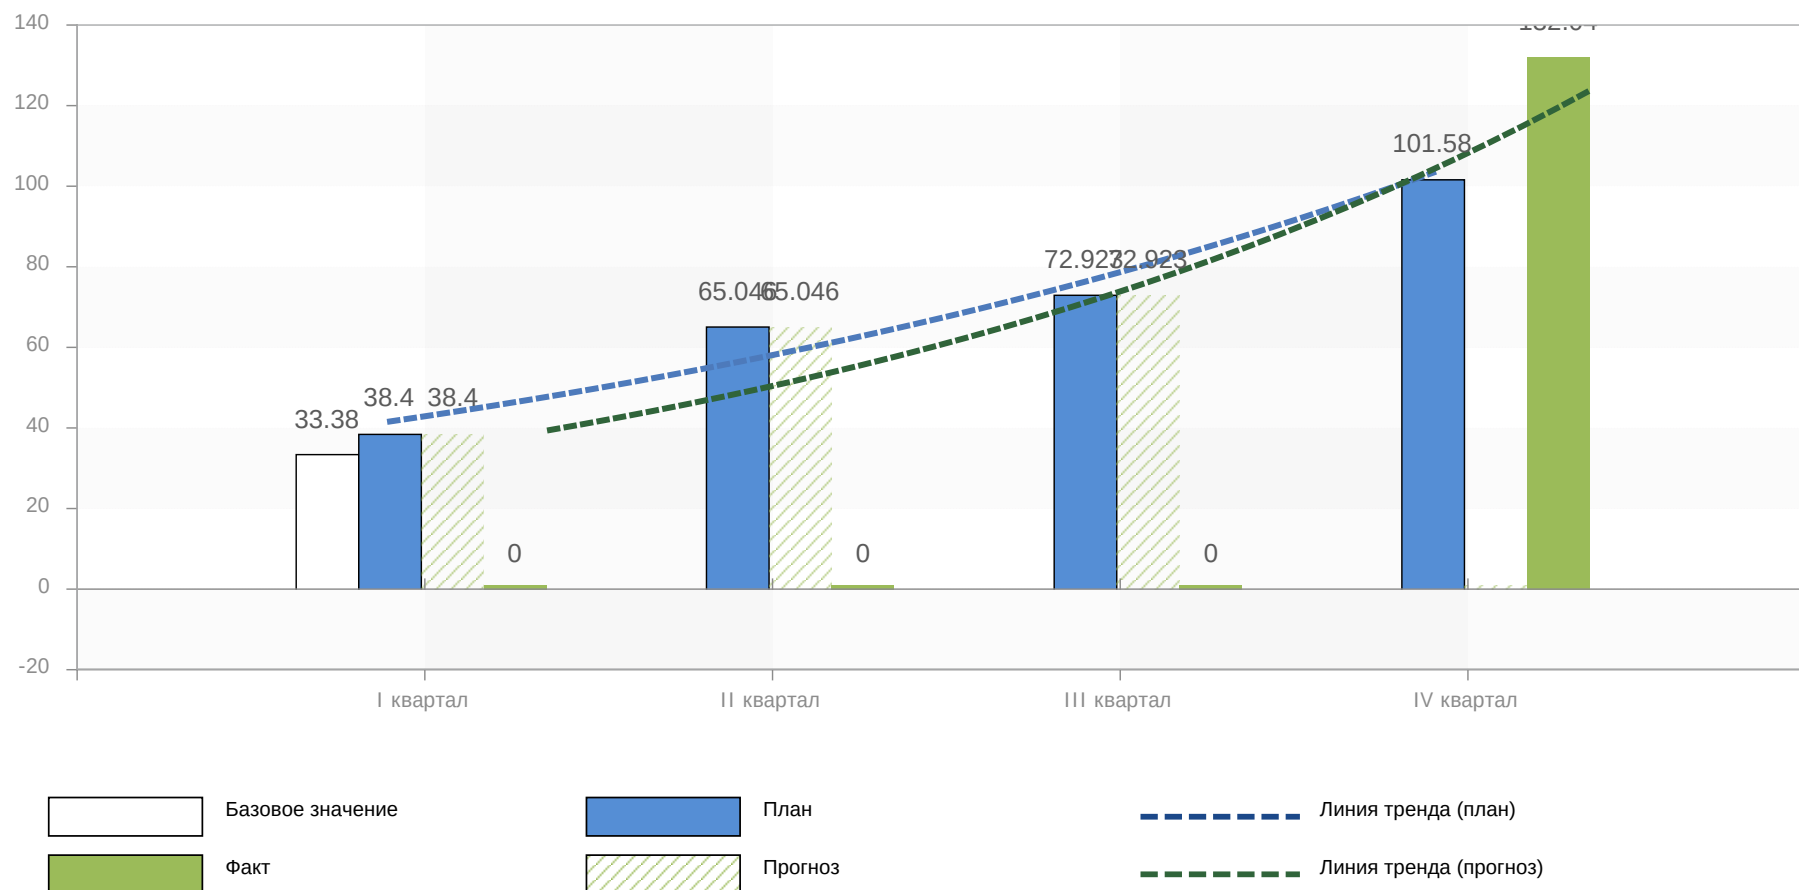


Рис. 8. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году.
