

Руководитель
регионального проекта —
Малин Михаил Васильевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

10.01.2020

Сертификат:
10470920D03BF29E0651368C1872D71E2E248AF1

Владелец: Малин Михаил Васильевич

Действителен: с 14.11.2019 по 14.02.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

*"(N7-32) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
(Кемеровская область)"*

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году.	Тысяча человек	33.38	4	7.78	11.837	65.84	65.84	100,00%	
2		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %	Процент	21	21	25	31	49	49	100,00%	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
3		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	Процент	0	0	0	0	3	3	100,00%	
4		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	Процент	0	0	10	29	31	31	100,00%	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклоненийСведения не
представленыПрогнозные
сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(09) 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	253 031,00	253 031,00	253 031,00	253 031,00	253 031,00	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	253 031,00	253 031,00	253 031,00	253 031,00	253 031,00	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	253 031,00	253 031,00	253 031,00	253 031,00	253 031,00	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			253 031,00	253 031,00	253 031,00	253 031,00	253 031,00	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			253 031,00	253 031,00	253 031,00	253 031,00	253 031,00	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			253 031,00	253 031,00	253 031,00	253 031,00	253 031,00	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	 
2		Не менее 80 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	 
3		Медицинские организации Кемеровской области используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информационными системами при оказании медицинской помощи гражданам	 
4		Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.	
5		Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).	 
6		Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Не менее 80 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистема-ми ЕГИСЗ Значение: 80, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Малин М. В.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.
1.1	ПК		Осуществлено перечисление средств федерального бюджета бюджету Кемеровской области на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2019 году	01.04.2019	13.02.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии на реализацию регионального проекта Цифровой контур здравоохранения" Иное от 13.02.2019г. № 056-08-2019-332 , приложен файл;

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.1	РРП		Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2019 году	15.03.2019	13.02.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии на реализацию регионального проекта Цифровой контур здравоохранения" Иное от 13.02.2019г. №056-08-2019-332 , приложен файл;
1.2	ПК		В Кемеровской области утвердили планы и подготовили технические задания до-оснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры	01.04.2019	21.03.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утверждение планов" Письмо ДОЗН КО от 21.03.2019г. №1661, приложен файл.
1.2.1	РРП		Проведение обследования государственных и муниципальных медицинских организаций с целью определения потребности в дооснащении информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры	01.04.2019	21.03.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утверждение планов по дооснащению, подготовке технического заданий, по модернизации и развитию на основании проведенного обследования" Письмо ДОЗН КО от 21.03.2019г. №1661, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.3	ПК		В Кемеровской области утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2019 год	15.04.2019	21.03.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утверждение планов по дооснащению, подготовке технических заданий" Письмо ДОЗН КО от 21.03.2019г. №1661, приложен файл.
1.3.1	РПП		Проведение работ по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России	15.04.2019	21.03.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утверждение планов по дооснащению, подготовке технических заданий по модернизации и развитию на основании проведенного обследования и оценки медицинских информационных систем" Письмо ДОЗН КО от 21.03.2019г. №1661, приложен файл.
1.4	ПК		65 процентов структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Кемеровской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	15.07.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "По развитию (созданию и модернизации) медицинских и централизованных информационных систем." Письмо ГАУЗ КОМИАЦ КО от 15.07.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.4.1	РРП		Проведение работ по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, в соответствии с требованиями Минздрава России	15.07.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О доле структурных подразделений муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 15.07.2019г. №955/1, приложен файл.
1.5	ПК		30 процентов структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения Кемеровской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России	15.07.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по развитию (созданию и модернизации) медицинских и централизованных информационных систем" Письмо ГАУЗ КОМИАЦ КО от 15.07.2019г. №6/н, приложен файл.
1.5.1	РРП		Проведение работ по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, в соответствии с требованиями Минздрава России	15.07.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 15.07.2019г. № 955/1, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.6	ПК		75 процентов структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Кемеровской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " об исполнении контрольных точек проекта за октябрь" Отчет ГКУ ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. №б/н, приложен файл.
1.6.1	РПП		Проведение работ по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, в соответствии с требованиями Минздрава России	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " об исполнении контрольных точек проекта за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений






Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.7	ПК		35 процентов структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения Кемеровской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " об исполнении контрольных точек проекта за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. №б/н, приложен файл.
1.7.1	РРП		Проведение работ по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, в соответствии с требованиями Минздрава России	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " об исполнении контрольных точек проекта за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. №б/н, приложен файл.
1.8	ПК		В Кемеровской области медицинские информационные системы передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ из 60 процентов структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " об исполнении контрольных точек проекта за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. № б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.8.1	РРП		Проведение закупки информационно-коммуникационного оборудования для оснащения государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " об исполнении контрольных точек проекта за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. № б/н, приложен файл.
1.9	ПК		85 процентов структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Кемеровской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.
1.9.1	РРП		Проведение работ по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, в соответствии с требованиями Минздрава России	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений





 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.10	ПК		40 процентов структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения Кемеровской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.
1.10.1	РРП		Проведение работ по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, в соответствии с требованиями Минздрава России	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.
1.11	ПК		В Кемеровской области медицинские информационные системы передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ из 70 процентов структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.11.1	РРП		Проведение закупки информационно-коммуникационного оборудования для оснащения государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.
1.12	ПК		Осуществлено перечисление средств федерального бюджета бюджету Кемеровской области на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2020 году	01.04.2020	15.03.2020	Малин М. В.	В работе.
1.12.1	РРП		Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2020 году	15.03.2020	15.03.2020	Малин М. В.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.13	ПК		В Кемеровской области утвердили планы по модернизации и развитию подсистем «Интегрированная электронная медицинская карта» по передаче структурированных электронных медицинских документов из структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год	30.11.2024	17.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " о проведении закупочных процедур и заключении контрактов" Письмо ДОЗН КО от 17.07.2019г. №4517, приложен файл.
1.13.1	РРП		Проведение закупки информационно-коммуникационного оборудования для оснащения государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области	15.07.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем для обеспечения взаимодействия с подсистемой «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ на 2019 год" Письмо ГАУЗ КОМИАЦ КО от 15.07.2019г. №6/н, приложен файл.
2			<i>Медицинские организации Кемеровской области используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информационными системами при оказании медицинской помощи гражданам Значение: 1, на дату 01.12.2022</i>	01.12.2022	01.12.2022	Малин М. В.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1	ПК		Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области	01.04.2019	21.03.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утверждение планов " Письмо ДОЗН КО от 21.03.2019г. №1661, приложен файл.
2.1.1	РРП		Проведено обследование центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области	01.04.2019	21.03.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утверждение планов" Письмо ДОЗН КО от 21.03.2019г. №1661, приложен файл.
2.2	ПК		В Кемеровской области утвердили планы по модернизации и развитию централизованных систем «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующие с «Системой 112», в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2019 год	15.07.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем в сфере здравоохранения КО" Письмо ГАУЗ КОМИАЦ КО от 15.07.2019г. №б/н, приложен файл.
2.2.1	РРП		Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области, в части внедрения централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующей с «Системой 112»	15.07.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем в сфере здравоохранения КО" Письмо ГАУЗ КОМИАЦ КО от 15.07.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений






Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.3	ПК		В Кемеровской области утвердили планы по внедрению централизованных систем «Управление потоками пациентов», в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2019 год	15.07.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем в сфере здравоохранения КО" Письмо ГАУЗ КОМИАЦ КО от 15.07.2019г. №б/н, приложен файл.
2.3.1	РРП		Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области, в части внедрения централизованной системы «Управление потоками пациентов»	15.07.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем в сфере здравоохранения КО" Письмо ГАУЗ КОМИАЦ КО от 15.07.2019г. №б/н, приложен файл.
2.4	ПК		В Кемеровской области утвердили планы по внедрению централизованных систем «Лабораторные исследования» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год	15.07.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем в сфере здравоохранения КО" Письмо ГАУЗ КОМИАЦ КО от 15.07.2019г. №б/н, приложен файл.
2.4.1	ПК		В Кемеровской области утвердили планы по внедрению централизованных систем «Лабораторные исследования» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год	15.07.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем в сфере здравоохранения КО" Письмо ГАУЗ КОМИАЦ КО от 15.07.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.5	ПК		В Кемеровской области утвердили планы по модернизации и развитию централизованных систем «Интегрированная электронная медицинская карта» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год	15.07.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем в сфере здравоохранения КО" Письмо ГАУЗ КОМИАЦ КО от 15.07.2019г. №б/н, приложен файл.
2.5.1	РРП		Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области, в части внедрения региональных централизованных систем «Интегрированная электронная медицинская карта»	15.07.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем в сфере здравоохранения КО" Письмо ГАУЗ КОМИАЦ КО от 15.07.2019г. №б/н, приложен файл.
2.6	ПК		В Кемеровской области утвердили планы по внедрению централизованных систем «Центральный архив медицинских изображений» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год	15.07.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем в сфере здравоохранения КО" Письмо ГАУЗ КОМИАЦ КО от 15.07.2019г. №б/н, приложен файл.
2.6.1	РРП		В Кемеровской области утвердили планы по внедрению централизованных систем «Центральный архив медицинских изображений» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год	15.07.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем в сфере здравоохранения КО" Письмо ГАУЗ КОМИАЦ КО от 15.07.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены





Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.7	ПК		В Кемеровской области утвердили планы по внедрению централизованных систем «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год	15.07.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем в сфере здравоохранения КО" Письмо ГАУЗ КОМИАЦ КО от 15.07.2019г. №б/н, приложен файл.
2.7.1	РРП		В Кемеровской области утвердили планы по внедрению централизованных систем «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год	15.07.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем в сфере здравоохранения КО" Письмо от 15.07.2019г. №б/н, приложен файл.
2.8	ПК		В Кемеровской области утвердили планы по внедрению централизованных систем «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год	15.07.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем в сфере здравоохранения КО" письмо ГАУЗ КОМИАЦ КО от 15.07.2019г. №б/н, приложен файл.
2.8.1	РРП		Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области в части внедрения централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»	15.07.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем в сфере здравоохранения КО" Письмо ГАУЗ КОМИАЦ КО от 15.07.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.




№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.9	ПК		В Кемеровской области утвердили планы по внедрению централизованных систем «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год	15.07.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем в сфере здравоохранения КО" Письмо ГАУЗ КОМИАЦ КО от 15.07.2019г. №б/н, приложен файл.
2.9.1	РПП		В Кемеровской области утвердили планы по внедрению централизованных систем «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год	15.07.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем в сфере здравоохранения КО" Письмо ГАУЗ КОМИАЦ КО от 15.07.2019г. №б/н, приложен файл.
2.10	ПК		В Кемеровской области утвердили планы по внедрению централизованных систем «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год	15.07.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем в сфере здравоохранения КО" Письмо ГАУЗ КОМИАЦ КО от 15.07.2019г. №б/н, приложен файл.
2.10.1	РПП		В Кемеровской области утвердили планы по внедрению централизованных систем «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год	15.07.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем в сфере здравоохранения КО" Письмо ГАУЗ КОМИАЦ КО от 15.07.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.11	ПК		Утвержден план по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области на соответствие требованиям Минздрава России	01.08.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении планов по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения КО на соответствие требованиям Минздрава России" Письмо ГАУЗ КОМИАЦ КО от 15.07.2019г. №б/н, приложен файл.
2.11.1	РПП		Проведение работ по оценке соответствия государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области требованиям Минздрава России	01.08.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении планов по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения КО на соответствие требованиям Минздрава России" Письмо ГАУЗ КОМИАЦ КО от 15.07.2019г. №б/н, приложен файл.
2.12	ПК		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующие с «Системой 112», к которым подключены 55 процентов отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольных точек за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. № б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.12.1	РРП		Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области, в части внедрения централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующей с «Системой 112»	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольных точек за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. № б/н, приложен файл.
2.13	ПК		К централизованным системам «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области 58 процентов структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций и 73 процентов аптечных пунктов и организаций	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольных точек за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. № б/н, приложен файл.
2.13.1	РРП		Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области, в части внедрения централизованной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением»	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольных точек за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. № б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.14	ПК		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Управление потоками пациентов», к которым подключены 47 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь	15.10.2019	15.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольных точек за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. № б/н, приложен файл.
2.14.1	РРП		Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области, в части внедрения централизованной системы «Управление потоками пациентов»	15.10.2019	15.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольных точек за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. № б/н, приложен файл.
2.15	ПК		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключены 27 процентов клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области и 33 процента структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольных точек проекта за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. № б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.15.1	РРП		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключены 27 процентов клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области и 33 процента структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольных точек проекта за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. № б/н, приложен файл.
2.16	ПК		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 60 процентов структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольных точек проекта за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. № б/н, приложен файл.
2.16.1	РРП		Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области, в части внедрения региональных централизованных систем «Интегрированная электронная медицинская карта»	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольных точек проекта за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. № б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.17	ПК		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены 30 процентов государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольных точек проекта за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. № б/н, приложен файл.
2.17.1	РПП		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены 30 процентов государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольных точек проекта за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. № б/н, приложен файл.
2.18	ПК		К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области подключены 31 процентов структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольных точек проекта за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. № б/н, приложен файл.
2.18.1	РПП		Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области, в части внедрения централизованной системы «Телемедицинские консультации»	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольных точек проекта за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. № б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.19	ПК		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены 35 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольных точек проекта за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. №б/н, приложен файл.
2.19.1	РРП		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены 35 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольных точек проекта за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. № б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.20	ПК		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключены 26 процентов структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольных точек проекта за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. № б/н, приложен файл.
2.20.1	РПП		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключены 26 процентов структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольных точек проекта за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. № б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений






Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения





№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.21	ПК		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены 32 процента структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об исполнении контрольных точек проекта за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. № б/н, приложен файл.
2.21.1	РПП		Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области в части внедрения централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " об исполнении контрольных точек проекта за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. № б/н, приложен файл.
2.22	ПК		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены 16 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об исполнении контрольных точек проекта за октябрь" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. № б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.





№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.22.1	РРП		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены 16 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями	15.10.2019	14.10.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об исполнении контрольных точек проекта за октябрь" Отчет ГАУЗ КОИИАЦ КО от 14.10.2019г. № б/н, приложен файл.
2.23	ПК		Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области	30.11.2019	17.12.2019	Малин М. В.	Выполнено. Просрочка 17 дней. Подтверждающие документы: 1. " об осуществлении закупок и вводе в эксплуатацию серверного оборудования" Отчет ДОЗН КО от 17.12.2019г. №8288, приложен файл. Риск снят: Несвоевременное предоставление отчета о закупке и вводе в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования, Причина риска: Несвоевременное предоставление отчета, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. Будет сформирован и предоставлен отчет, срок исполнения 20.12.2019, Возникновение риска.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.23.1	РРП		Проведение закупки серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области	30.11.2019	17.12.2019	Малин М. В.	Выполнено. Просрочка 17 дней. Подтверждающие документы: 1. " об осуществлении закупок и вводе в эксплуатацию серверного оборудования" Отчет ДОЗН КО от 17.12.2019г. №8288, приложен файл.
2.24	ПК		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующие с «Системой 112», к которым подключены 65 процентов отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.
2.24.1	РРП		Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области, в части внедрения централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующей с «Системой 112»	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.25	ПК		к централизованным системам «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области 67 процентов структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций и 78 процентов аптечных пунктов и организаций	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.
2.25.1	РПП		Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области, в части внедрения централизованной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением»	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.
2.26	ПК		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Управление потоками пациентов», к которым подключены 59 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений





 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.26.1	РРП		Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области, в части внедрения централизованной системы «Управление потоками пациентов»	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.
2.27	ПК		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключены 41 процент клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области и 45 процентов структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.
2.27.1	РРП		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключены 41 процент клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области и 45 процентов структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.28	ПК		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 70 процентов структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.
2.28.1	РПП		Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области, в части внедрения региональных централизованных систем «Интегрированная электронная медицинская карта»	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.
2.29	ПК		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены 43 процента государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.29.1	РРП		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены 43 процента государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.
2.30	ПК		К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области подключены 35 процентов структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.
2.30.1	РРП		Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области, в части внедрения централизованной системы «Телемедицинские консультации»	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.31	ПК		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены 47 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.
2.31.1	РРП		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены 47 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.32	ПК		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключены 33 процента структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.
2.32.1	РПП		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключены 33 процента структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.33	ПК		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены 43 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.
2.33.1	РПП		Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области в части внедрения централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.
2.34	ПК		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены 28 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.34.1	РРП		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены 28 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями	15.01.2020	15.01.2020	Малин М. В.	В работе.
3			Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет). Значение: 80, на дату 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Малин М. В.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1	ПК		Сформирована потребность и график закупок средств криптографической защиты информации и услуг для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)	15.04.2019	15.04.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " о формировании потребности в дооснащении" Письмо ДОЗН КО от 15.04.2019г. №2375, приложен файл.
3.1.1	РПП		Проведение обследования территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) и определение объемов закупки средств криптографической защиты информации и услуг для их подключения к защищенной сети передачи данных	31.03.2019	15.04.2019	Малин М. В.	Выполнено. Просрочка 15 дней. Подтверждающие документы: 1. " о формировании потребности в дооснащении" Письмо ДОЗН КО от 15.04.2019г. №2375, приложен файл.
3.2	ПК		Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2019 году объявлены	30.06.2019	17.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Просрочка 17 дней. Подтверждающие документы: 1. " о проведении закупочных процедур" Письмо ДОЗН КО от 17.07.2019г. №4517, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.2.1	РРП		Разработка технического задания, объявление закупок для обеспечения в 2019 году подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет), исполнение контрактов	30.06.2019	17.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Просрочка 17 дней. Подтверждающие документы: 1. " о проведении закупочных процедур и заключении контрактов" Письмо ДОЗН КО от 17.07.2019г. №4517, приложен файл.
3.3	ПК		Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2019 году заключены	31.08.2019	12.08.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " о достижении контрольных точек" Письмо ДОЗН КО от 12.08.2019г. №5218, приложен файл.
3.3.1	РРП		Разработка технического задания, объявление закупок для обеспечения в 2019 году подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет), исполнение контрактов	31.08.2019	12.08.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " о достижении контрольных точек" Письмо ДОЗН КО от 12.08.2019г. №5218, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.4	ПК		Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2019 году исполнены. Запланированные на 2019 год территориально-выделенные структурные подразделения медицинских организаций подключены к защищенной сети передачи данных.	20.12.2019	17.12.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О выполненных работах по государственным контрактам" Отчет ДОЗН КО от 17.12.2019г. №8290, приложен файл.
3.4.1	РРП		Разработка технического задания, объявление закупок для обеспечения в 2019 году подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет), исполнение контрактов	20.12.2019	17.12.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " о выполненных работах по государственным контрактам" Отчет ДОЗН КО от 17.12.2019г. №8290, приложен файл. 2. " о выполненных работах по государственным контрактам" Отчет ДОЗН КО от 17.12.2019г. №8290, приложен файл.
3.5	ПК		Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году объявлены	31.03.2020	31.03.2020	Малин М. В.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений





 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.5.1	РРП		Разработка технического задания, объявление закупок для обеспечения в 2020 году подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет), исполнение контрактов	31.03.2020	31.03.2020	Малин М. В.	В работе.
4			<i>Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Значение: 20, на дату 31.12.2019</i>	31.12.2019	17.12.2019	Малин М. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " об исполнении контрольных точек" Информация ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. №б/н, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
4.1	ПК		Внесены изменения в нормативные и правовые акты, определяющие порядок межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций Кемеровской области, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.	01.05.2019	25.06.2019	Малин М. В.	Выполнено. Просрочка 55 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение об информационном взаимодействии" Письмо Министерство труда и социальной защиты РФ, ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по КО" от 25.06.2019г. № 3179/2019, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.1.1	РРП		Разработка и актуализация, нормативных и правовых актов, определяющих порядок межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций Кемеровской области, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.	01.05.2019	25.06.2019	Малин М. В.	Выполнено. Просрочка 55 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение об информационном взаимодействии" Письмо Министерство труда и социальной защиты РФ, ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по КО" от 25.06.2019г. № 3179/2019, приложен файл.
4.2	ПК		Закупки на оказание услуг по модернизации и развитию медицинских информационных систем, государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия объявлены, контракты заключены	01.08.2019	12.08.2019	Малин М. В.	Выполнено. Просрочка 11 дней. Подтверждающие документы: 1. "о заключении контрактов на оказание услуг по модернизации и развитию медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организаций КО для обеспечения межведомственного электронного взаимодействия" Письмо ДОЗН КО от 12.08.2019г. № 05218, приложен файл.
4.2.1	РРП		Формирование технического задания, объявление закупок и заключение контракта на оказание услуг по модернизации и развитию медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия.	01.08.2019	12.08.2019	Малин М. В.	Выполнено. Просрочка 11 дней. Подтверждающие документы: 1. "о заключении контрактов на оказание услуг по модернизации и развитию медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организаций КО для обеспечения межведомственного электронного взаимодействия" Письмо ДОЗН КО от 12.08.2019г. № 05218, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений






Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.3	ПК		Закупки на оказание услуг по модернизации и развитию медицинских информационных систем, государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия объявлены, контракты заключены	01.08.2019	12.08.2019	Малин М. В.	Выполнено. Просрочка 11 дней. Подтверждающие документы: 1. "о заключении контрактов на оказание услуг по модернизации и развитию медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организаций КО для обеспечения межведомственного электронного взаимодействия" Письмо ДОЗН КО от 12.08.2019г. № 05218, приложен файл.
4.3.1	РПП		Формирование технического задания, объявление закупок и заключение контракта на оказание услуг по модернизации и развитию медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия.	01.08.2019	12.08.2019	Малин М. В.	Выполнено. Просрочка 11 дней. Подтверждающие документы: 1. "о заключении контрактов на оказание услуг по модернизации и развитию медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организаций КО для обеспечения межведомственного электронного взаимодействия" Письмо ДОЗН КО от 11.08.2019г. № 05218, приложен файл.
4.4	ПК		20% государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы	15.01.2020	17.12.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " об исполнении контрольных точек" Информация ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. №б/н, приложен файл.
4.4.1	РПП		Проведение модернизации и развития медицинских информационных систем, государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия.	15.01.2020	17.12.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " об исполнении контрольных точек" Информация ГАУЗ КОМИАЦ КО от 14.10.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5			Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации. Значение: 17132, на дату 31.12.2019	31.12.2019	17.12.2019	Малин М. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о количестве автоматизированных рабочих мест" Отчет ДОЗН КО от 17.12.2019г. №8294, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
5.1	ПК		Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	15.04.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Просрочка 91 дней. Подтверждающие документы: 1. "о проведении мероприятий по организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников" Письмо ДОЗН КО от 15.07.2019г. №955/1, приложен файл. Существует риск: Несвоевременное исполнение мероприятия, Причина риска: Документы для проведения закупочных процедур находятся на стадии разработки, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 15.07.2019г. Предлагаемые решения: 1. Разработать документы, заключить контракты на поставку автоматизированных рабочих мест, срок исполнения 15.07.2019.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.1.1	РРП		В медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области проведены мероприятия по организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	15.04.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Просрочка 91 дней. Подтверждающие документы: 1. "о проведении мероприятий по организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников" Письмо ДОЗН КО от 15.07.2019г. №955/1, приложен файл. Существует риск: Несвоевременное выполнения мероприятия, Причина риска: Документы для проведения закупочных процедур находятся на стадии разработки, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 15.07.2019г. Предлагаемые решения: 1. Провести закупочные процедуры, заключить контракты на поставку автоматизированных рабочих мест, срок исполнения 15.07.2019.
5.2	ПК		Не менее 1621 автоматизированное рабочее место организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	15.01.2020	17.12.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о количестве автоматизированных рабочих мест" Отчет ДОЗН КО от 17.12.2019г. №8294, приложен файл.
5.2.1	РРП		В медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области проведены мероприятия по организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	31.12.2019	17.12.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о создании автоматизированных рабочих мест" Отчет ДОЗН КО от 17.12.2019г. №8293, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6			85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ Значение: 1, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Малин М. В.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.
6.1	ПК		100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь Кемеровской области предоставляют возможность записи на прием к врачу, диспансеризацию (профилактический осмотр) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ.	01.02.2020	01.02.2020	Малин М. В.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.1.1	РРП		Проведение работ по подключению структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Кемеровской области для обеспечения оказания электронных услуг и сервисов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ.	01.02.2020	01.02.2020	Уфимцев О. Б.	В работе.
6.2	ПК		Сформированы концепция и план развития медицинских информационных систем медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации на период 2019-2024 гг., с учетом необходимости использования базовых и перспективных платформ и сервисов Электронного Правительства, включая национальную систему управления данными.	15.05.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Просрочка 61 дней. Подтверждающие документы: 1. " план по развитию (созданию и модернизации) медицинских и централизованных информационных систем" Письмо ГАУЗ КОМИАЦ от 15.07.2019г. №6/н, приложен файл.
6.2.1	РРП		Проведение обследования медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации с целью определения потребности в дооснащении информационно-телекоммуникационным оборудованием и проведение работ по оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в медицинских организациях на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России.	01.04.2019	15.04.2019	Малин М. В.	Выполнено. Просрочка 14 дней. Подтверждающие документы: 1. "О формировании потребности в дооснащении" Письмо ДОЗН КО от 15.04.2019г. №02375, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.2.2	РРП		Формирование концепции и плана развития медицинских информационных систем медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации для обеспечения информационного взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ при оказании медицинской помощи гражданам и с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС) на период 2019-2024 гг.	15.05.2019	15.07.2019	Малин М. В.	Выполнено. Просрочка 61 дней. Подтверждающие документы: 1. " об утверждении планов по развитию (созданию и модернизации) медицинских и централизованных информационных систем" Письмо ГАУЗ КОИИАЦ КО от 15.07.2019г. №6/н, приложен файл. Существует риск: Несвоевременное исполнение мероприятия, Причина риска: Документ находится на стадии разработки, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 15.07.2019г. Предлагаемые решения: 1. Сформировать концепцию и план развития медицинских информационных систем медицинских организаций, срок исполнения 15.07.2019.
6.3	ПК		Утверждены планы дооснащения информационно-телекоммуникационным оборудованием и программно-техническими средствами, обеспечивающими функционирование защищенной сети передачи данных всех структурных подразделений медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации.	15.05.2019	21.03.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утверждение планов" Письмо ДОЗН КО от 21.03.2019г. №1661, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.3.1	РРП		Формирование плана дооснащения информационно-телекоммуникационным оборудованием и программно-техническими средствами, обеспечивающими функционирование защищенной сети передачи данных всех структурных подразделений медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации.	15.05.2019	21.03.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утверждение планов" Письмо ДОЗН КО от 21.03.2019г. №1661, приложен файл.
6.4	ПК		100% граждан, застрахованных по ОМС, получивших медицинскую помощь в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области имеют возможность получения сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ.	30.11.2019	17.12.2019	Малин М. В.	Выполнено. Просрочка 17 дней. Подтверждающие документы: 1. "Акты" Акт ГАУЗ КОМИАЦ от 17.12.2019г. №6/н, приложен файл. Риск снят: Несвоевременное предоставление отчета о доступности сервиса для граждан на ЕПГУ, Причина риска: Несвоевременно предоставлен отчет, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. Будет сформирован и предоставлен отчет, срок исполнения 20.12.2019, Возникновение риска.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.4.1	РРП		Проведение работ по развитию Государственной информационной системы обязательного медицинского страхования, интеграции информационных систем ТФОМС Кемеровской области и государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области и медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организаций, для обеспечения оказания электронных услуг и сервисов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций) (далее – ЕПГУ) с использованием ЕГИСЗ.	30.11.2019	17.12.2019	Уфимцев О. Б.	Выполнено. Просрочка 17 дней. Подтверждающие документы: 1. "Акт" Акт ГАУЗ КОМИАЦ от 14.08.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Акт" Акт ГАУЗ КОМИАЦ от 08.08.2019г. №б/н, приложен файл. 3. "Акт" Акт ГАУЗ КОМИАЦ от 12.09.2019г. №б/н, приложен файл. 4. "Акт" Акт ГАУЗ КОМИАЦ от 08.08.2019г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Несвоевременное предоставление отчета о проведении работ по развитию ГИС ОМС, интеграции информационных систем ОМС, Причина риска: Несвоевременное предоставление отчета, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. Будет сформирован и предоставлен отчет, срок исполнения 20.12.2019, Возникновение риска.
6.5	ПК		Выполнены работы по государственному контракту на развитие подсистем ЕГИСЗ в 2019 году.	31.12.2019	17.12.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акты" Акт ГАУЗ КО от 17.12.2019г. №б/н, приложен файл.
6.5.1	РРП		Развитие подсистем ЕГИСЗ в 2019 году в целях реализации Федерального проекта.	31.12.2019	17.12.2019	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акты" Акт ГАУЗ КОМИАЦ от 17.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Динамика достижения контрольных точек

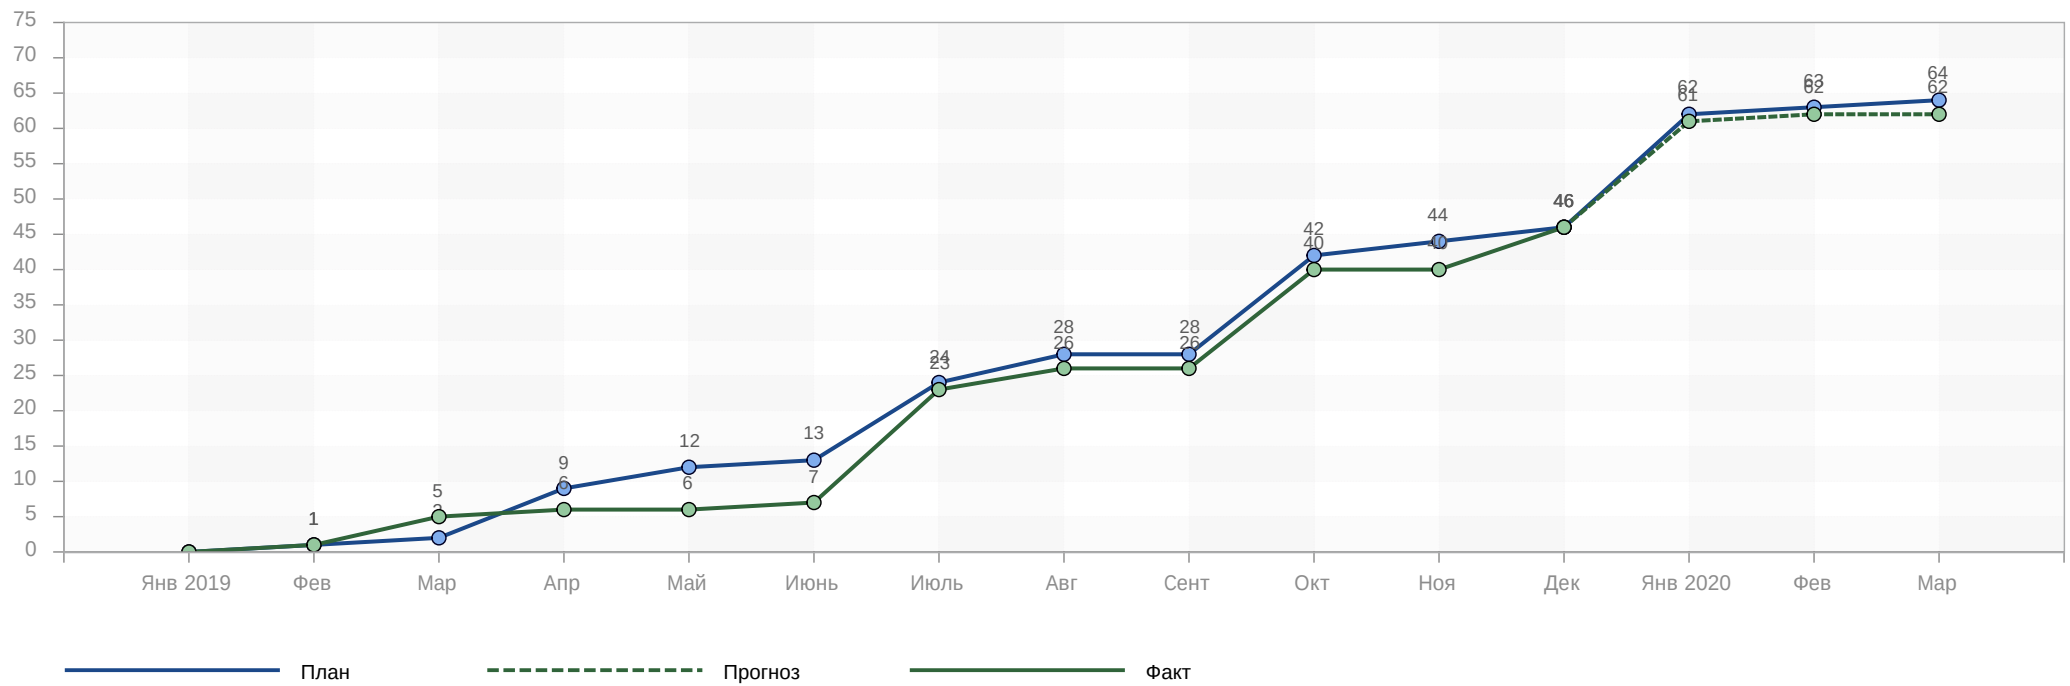

ис. 1. "(N7-32) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Кемеровская область)"




График достижения показателя

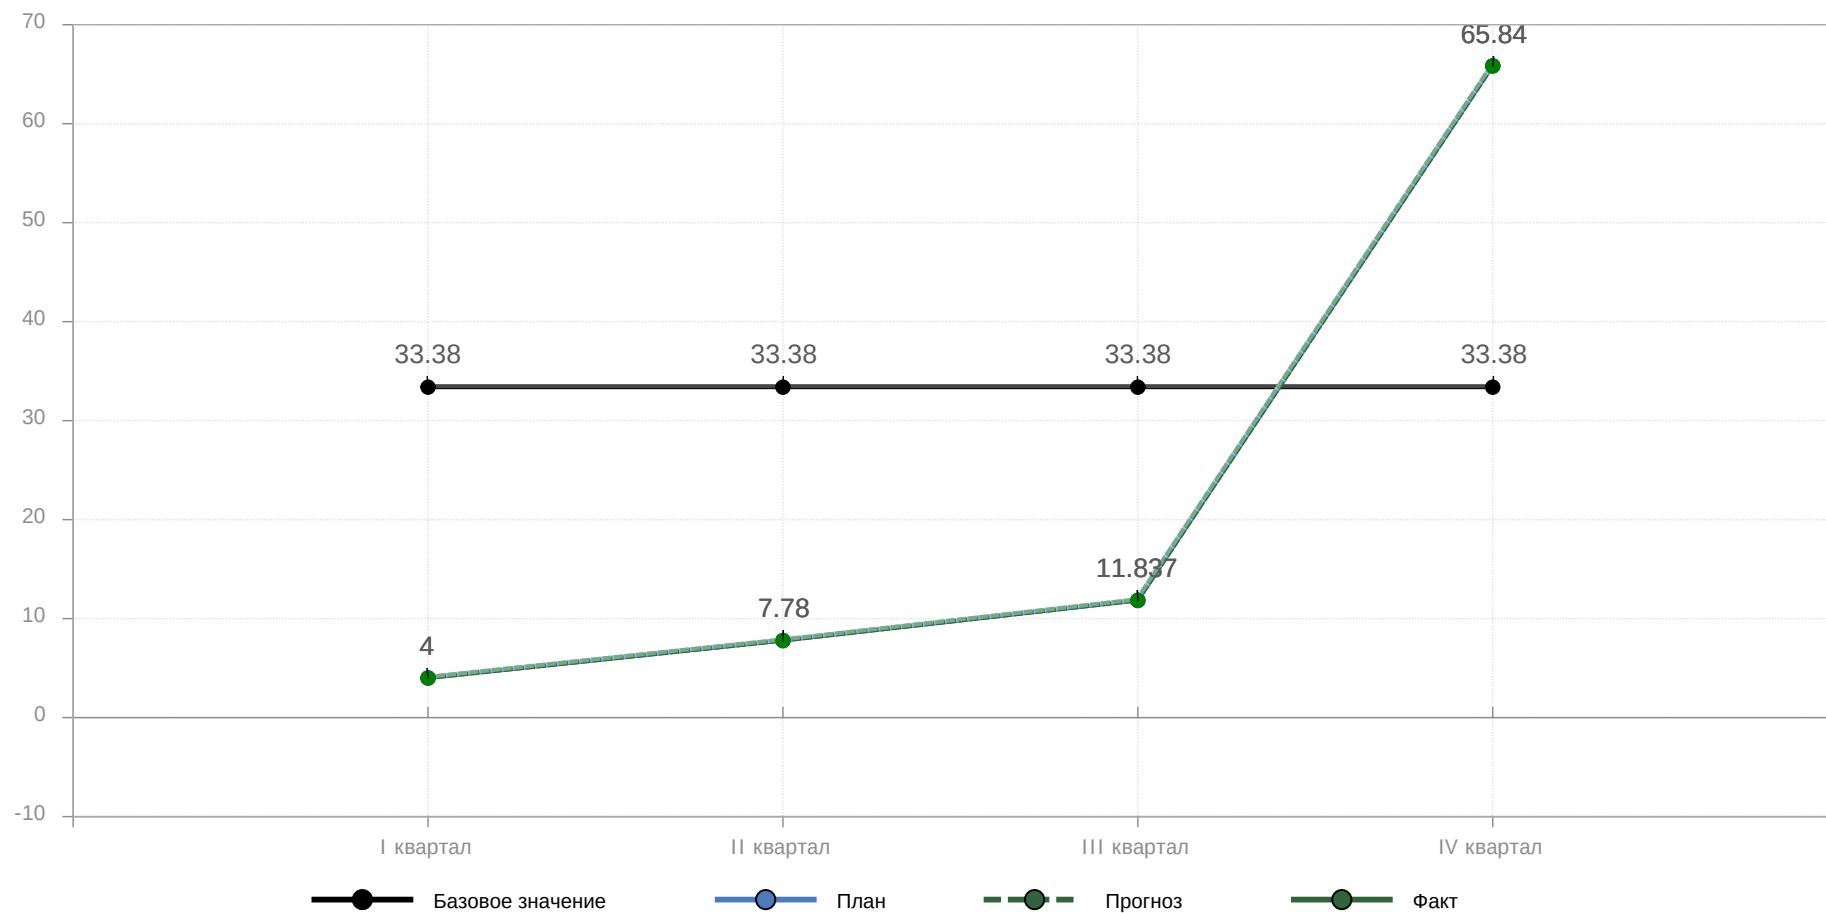


Рис. 1. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году.

Диаграмма достижения показателя

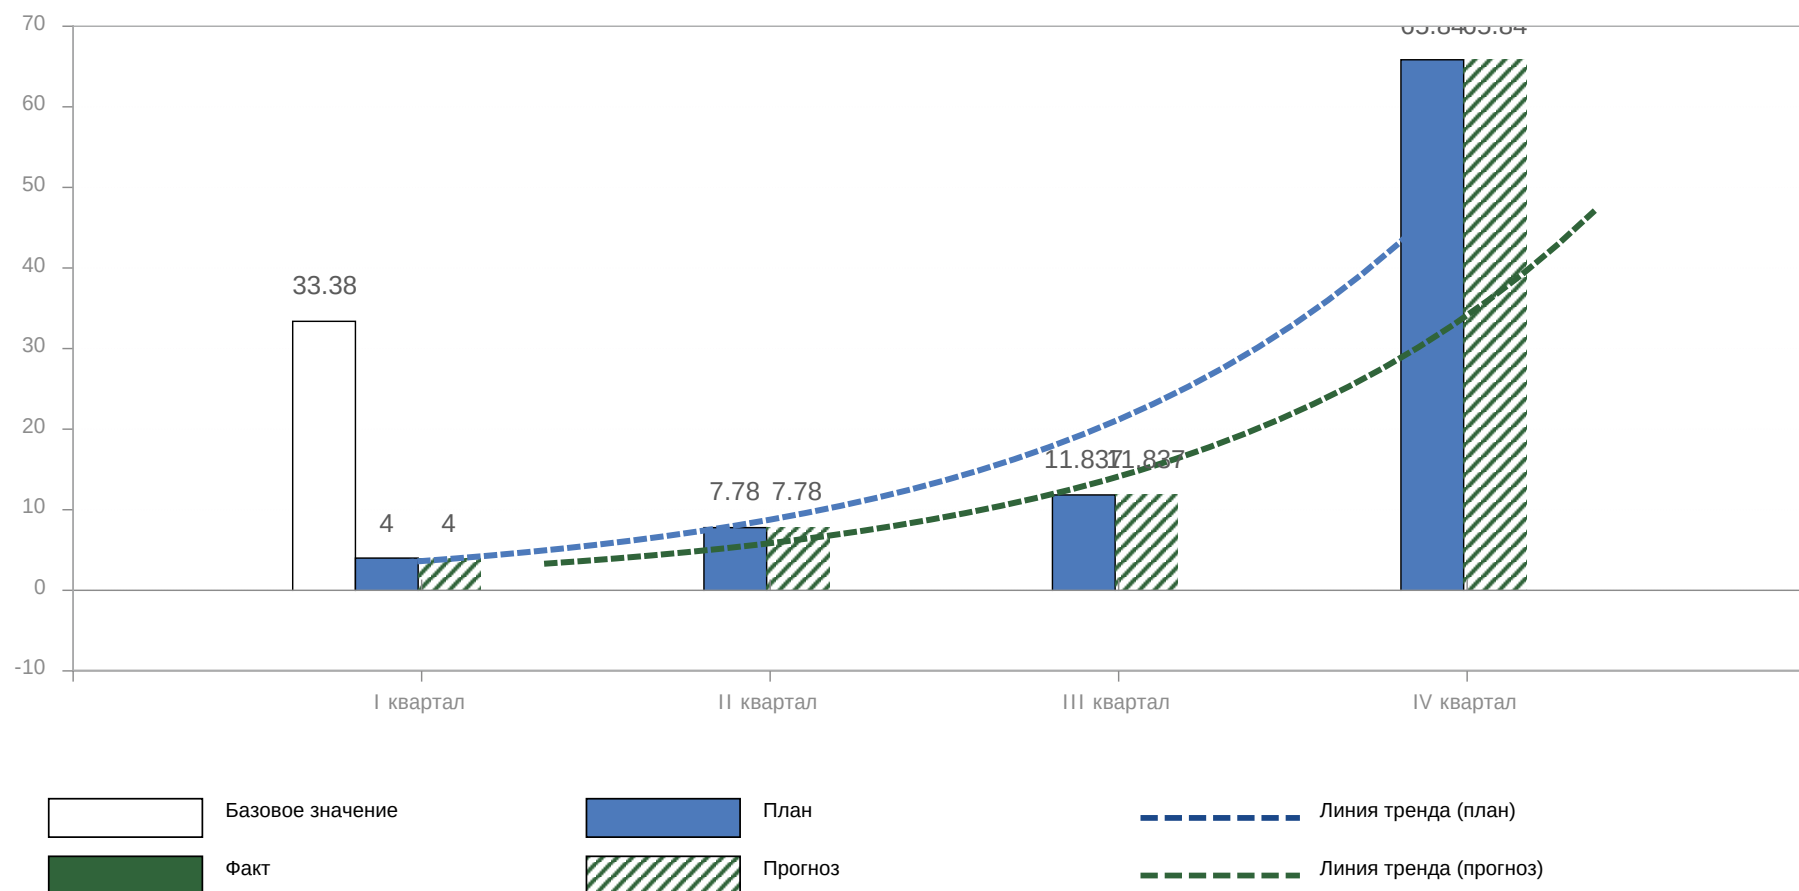


Рис. 2. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году.

График достижения показателя

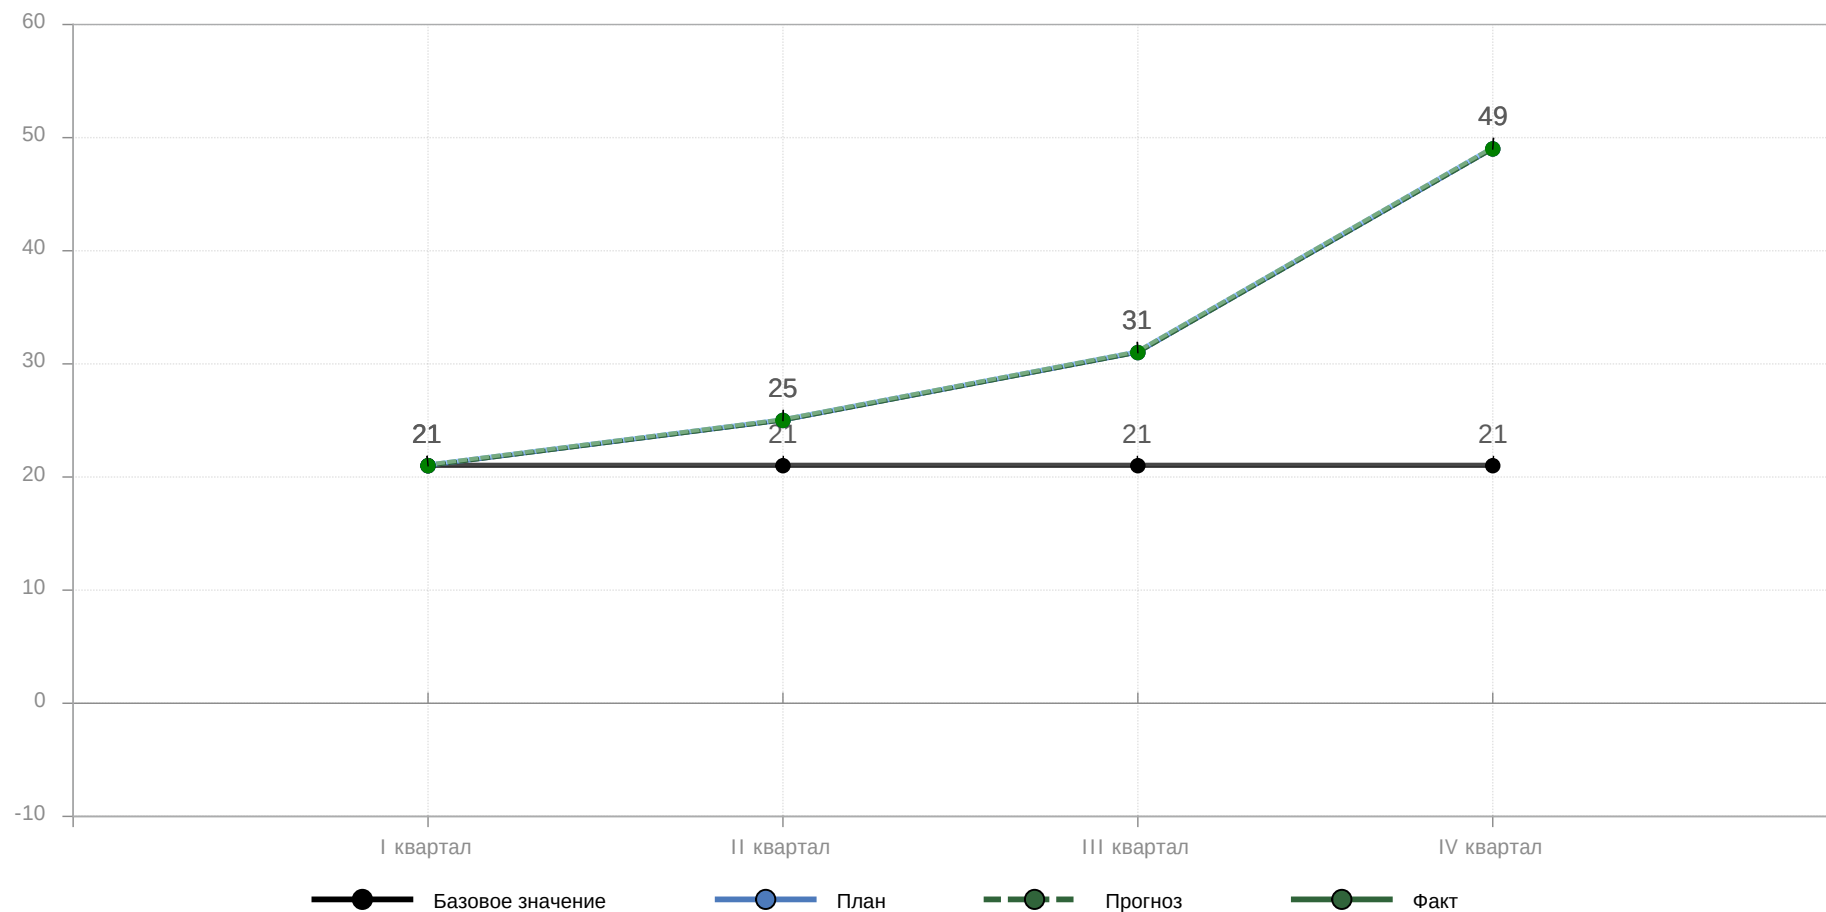


Рис. 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %

Диаграмма достижения показателя

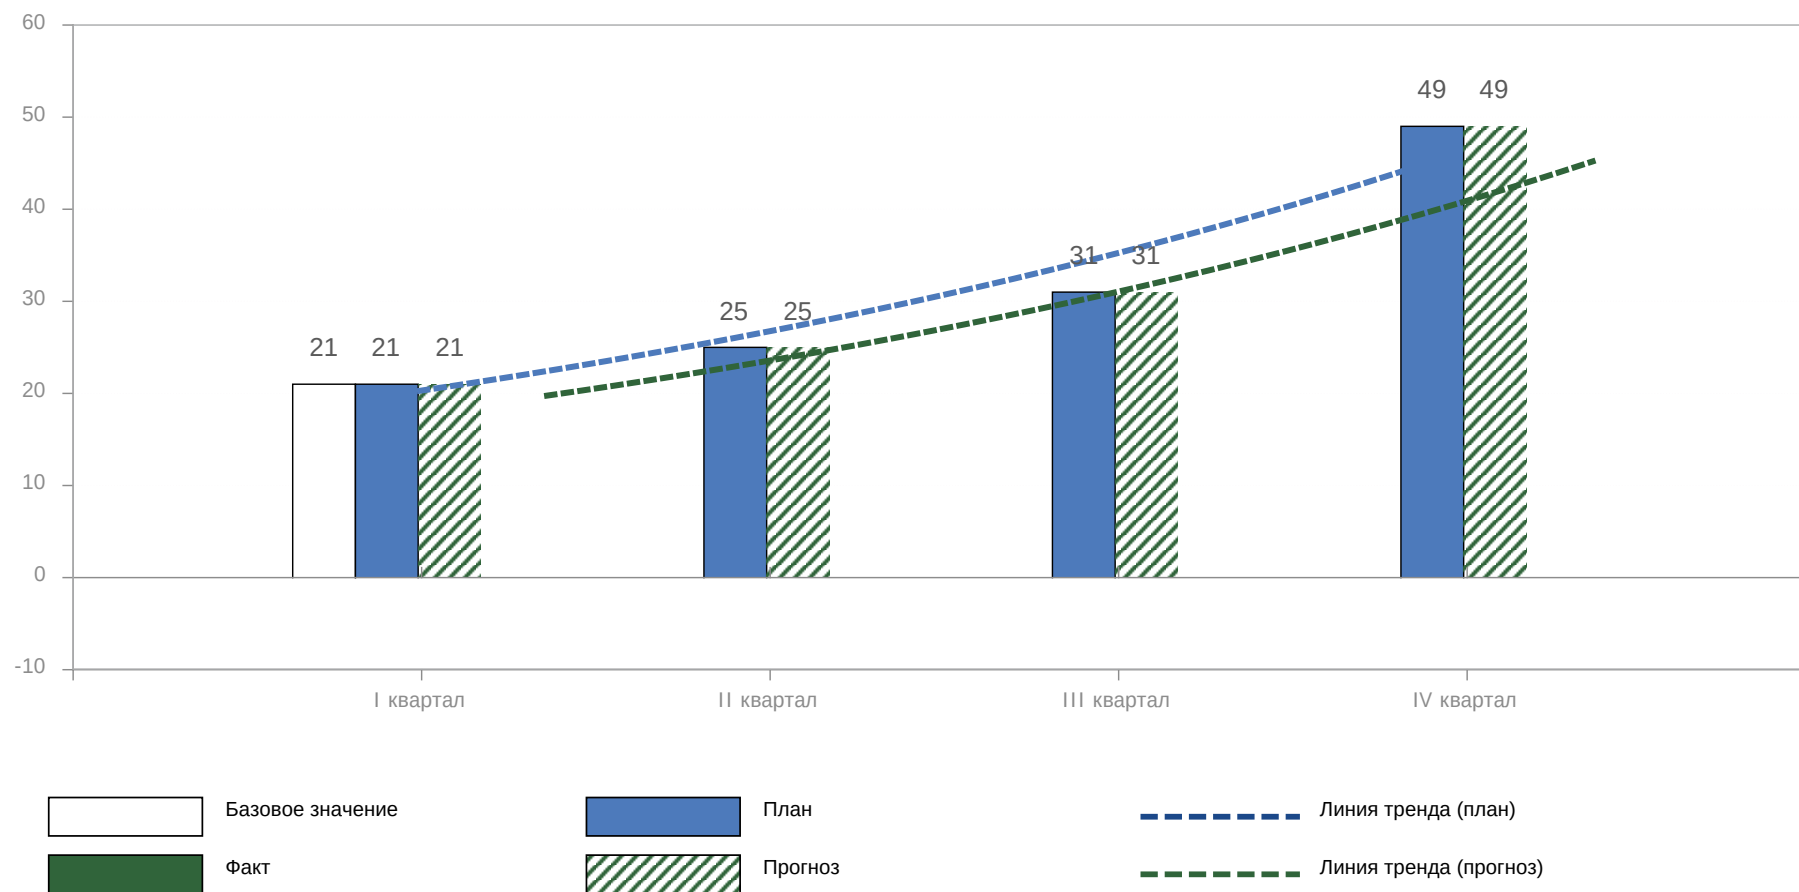


Рис. 4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %

График достижения показателя

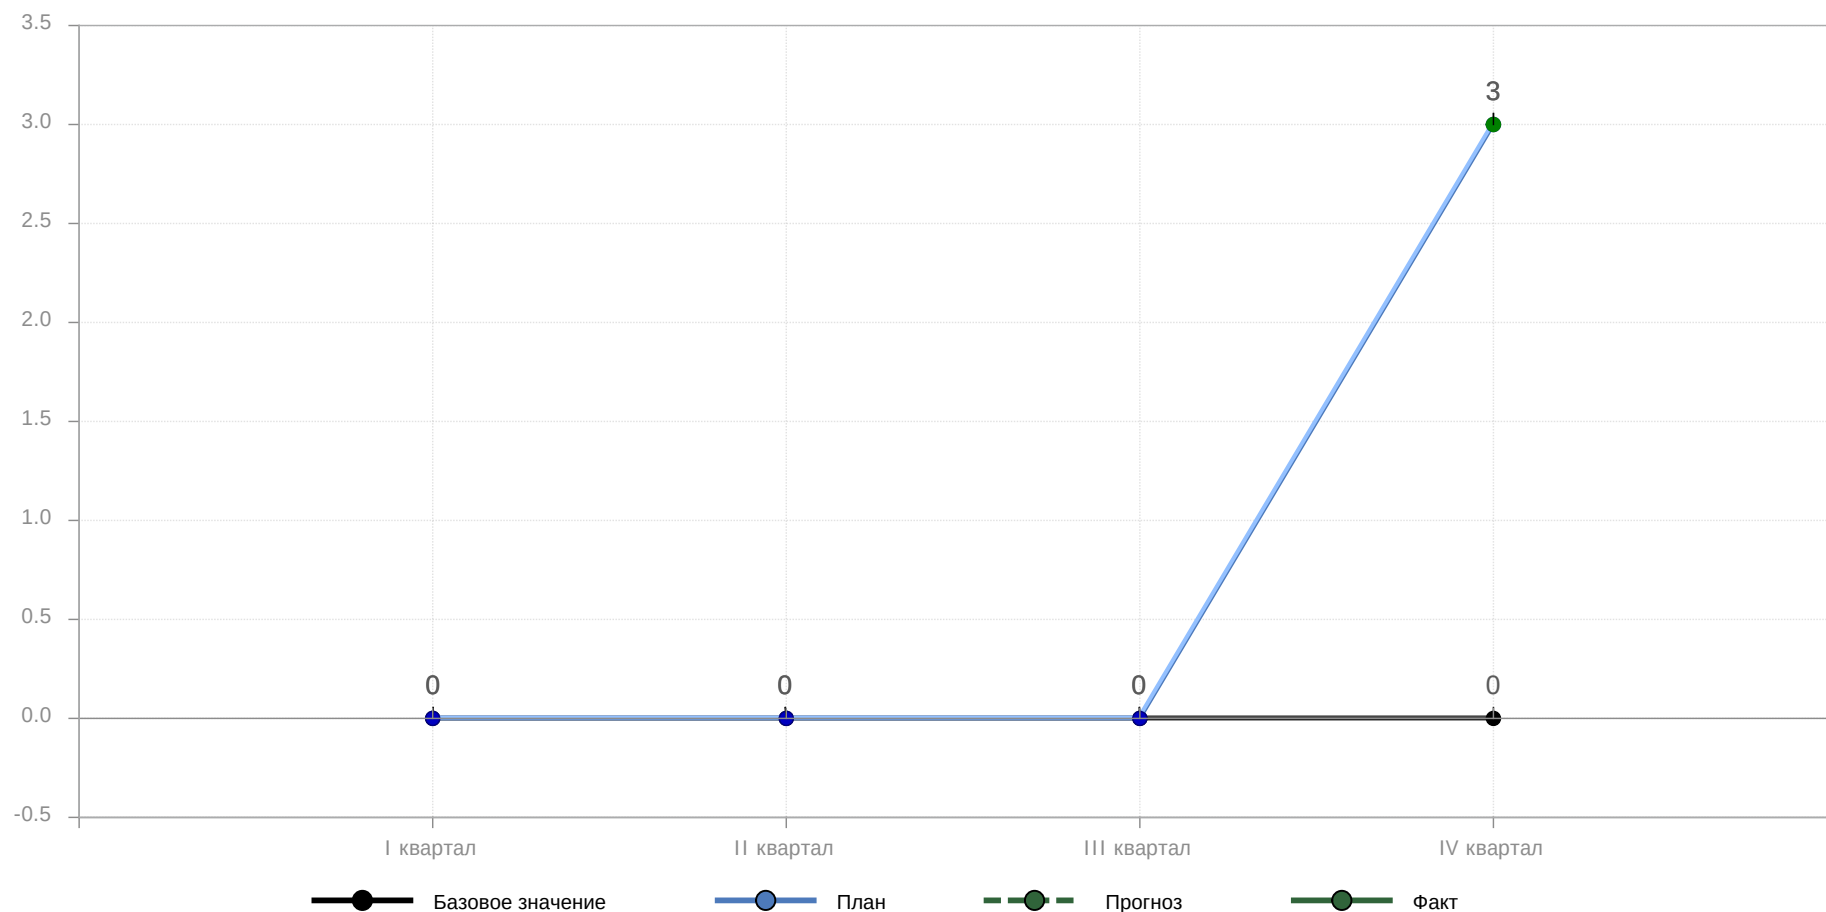


Рис. 5. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

Диаграмма достижения показателя

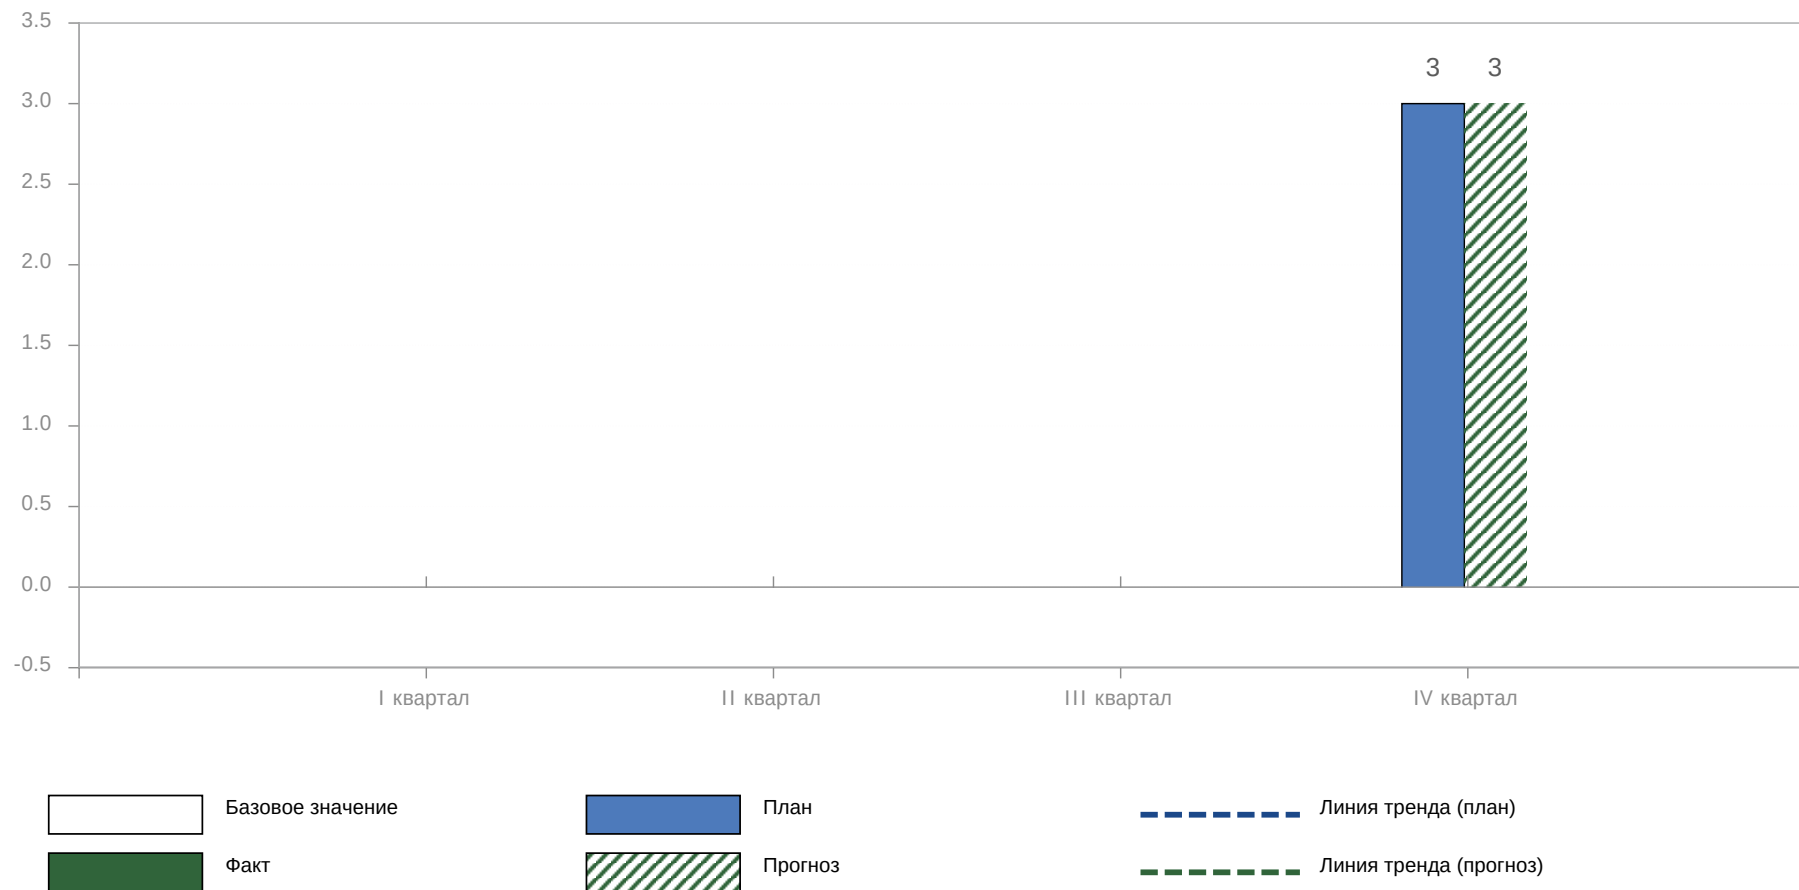


Рис. 6. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

График достижения показателя

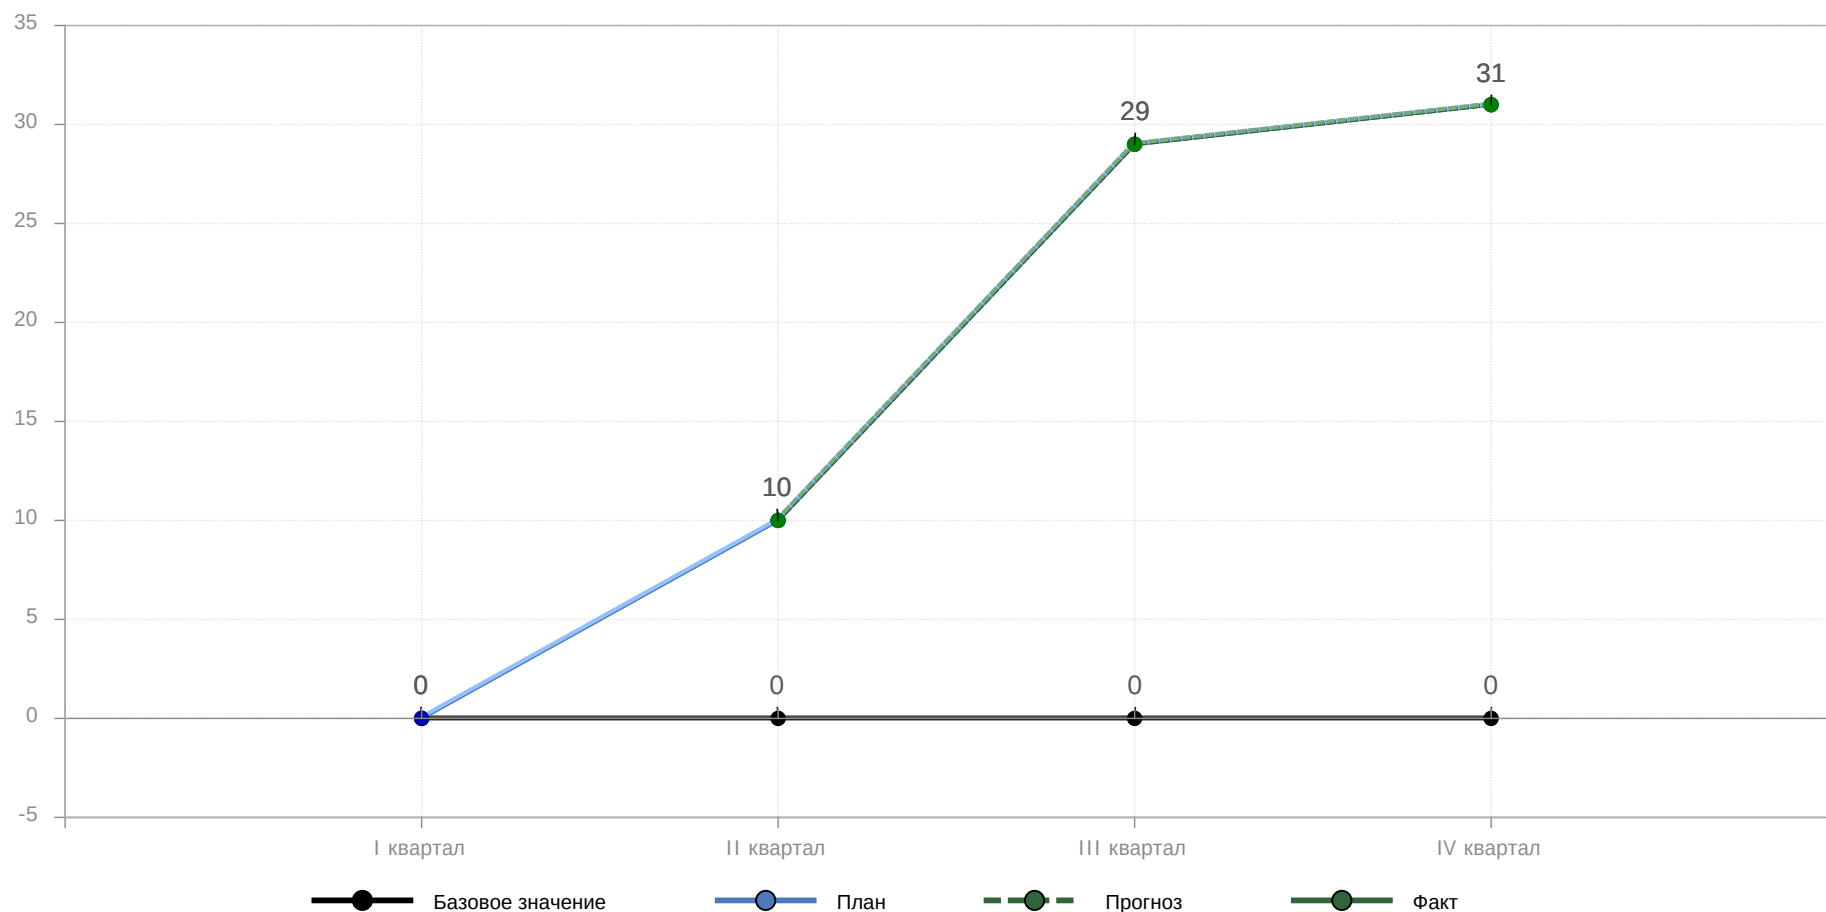


Рис. 7. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

Диаграмма достижения показателя

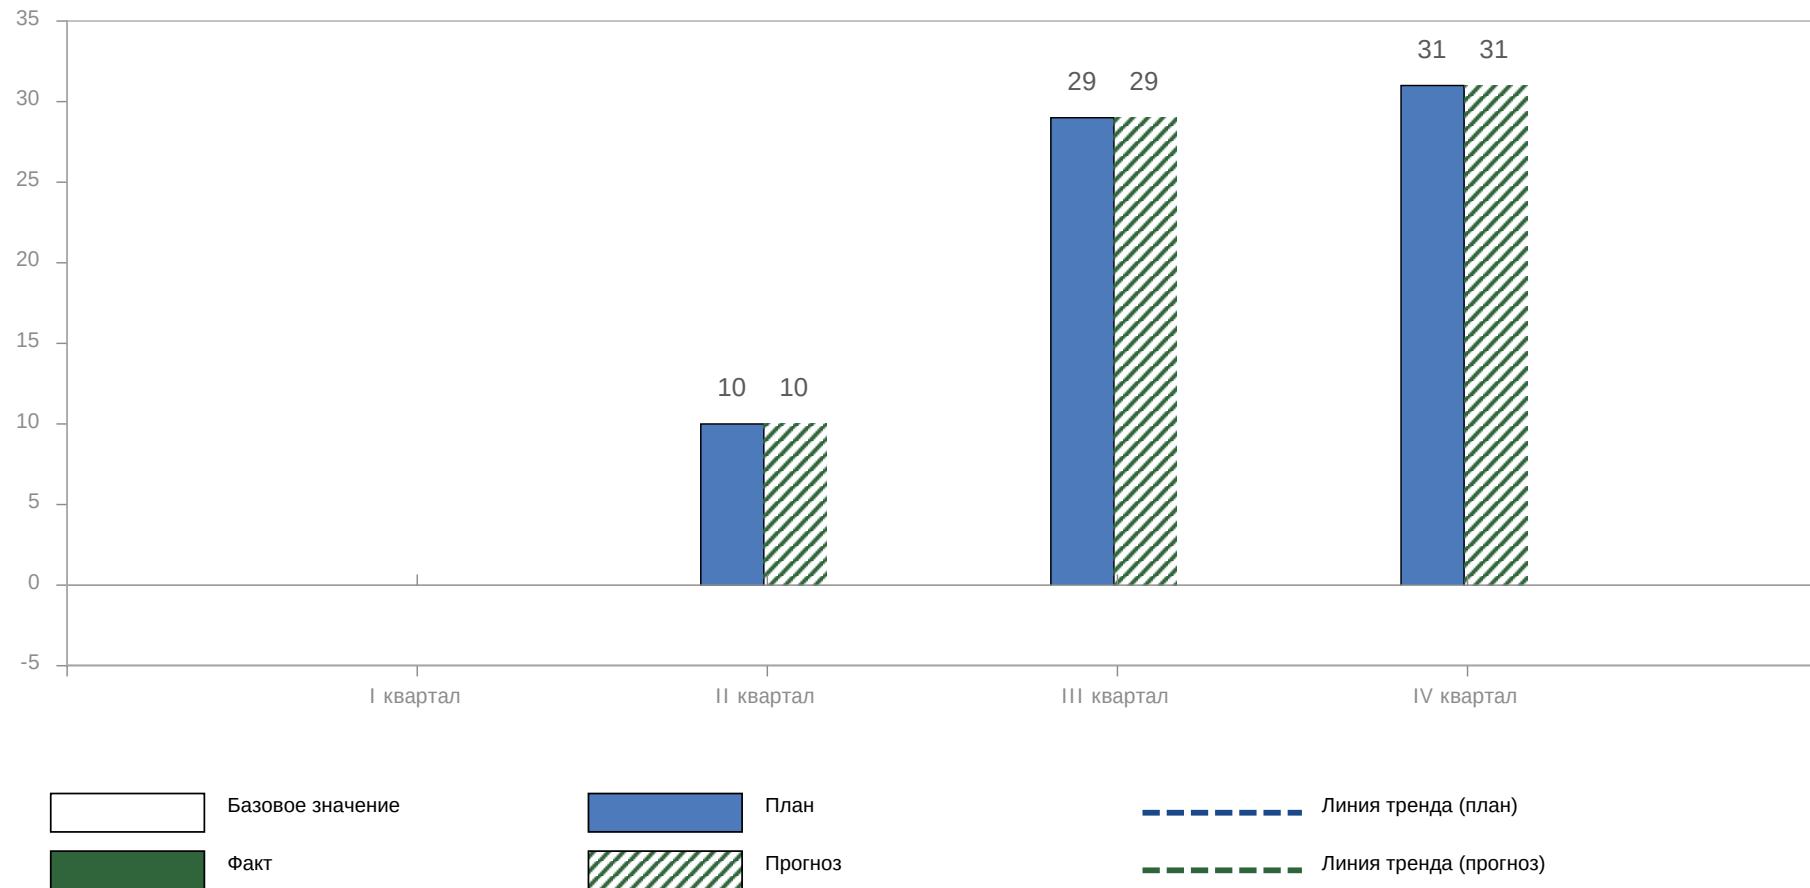


Рис. 8. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации
