
(подпись)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(I5-32) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства "

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Наличие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1		3. Цели и показатели	Риск неисполнения показателя , Причина риска: Отмена прямых контактов с зарубежными партнерами, бизнес- миссий, командировок в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Перевод всех контактов с зарубежными партнерами в он-лайн формат. , Вероятность: 50%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.04.2021г.	1. Продление срока достижения показателя в первом квартале 2020 года , срок исполнения 01.04.2021, Поскольку показатель формируется нарастающим итогом, пр реализации мероприятия в 2021 году показатель будет достигнут. ;
2		4. Результаты	Риск недостижения показателя., Причина риска: Прекращение прямых контактов экспортеров с зарубежными партнерами, бизнес-миссий, командировок, выставочно-ярмарочных мероприятий вследствие ситуации с распространением коронавирусной инфекции, перевод всех мероприятий в он-лайн формат , Вероятность: 50%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.04.2021г.	1. Продление срока реализации на 2021 год , срок исполнения 01.04.2021, Принимая во внимание, что расчет значения показателя осуществляется нарастающим итогом, начиная с 01.01.2019, реализация мероприятия в 2021 году позволит достигнуть плановых значений результата 2020-2021 годов. ;

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом	Тысяча единиц	1.186	0	0	0	1.73	1.68	102,98%	Подтверждающие документы:1. "Отчет о достижении показателей " Отчет государственного автономного учреждения Кемеровской области-Кузбасса "Мой бизнес" от 20.12.2020г. №б/н , приложен файл.Участниками мероприятий, проводимых в рамках регионального проекта стали 1730 граждан и предпринимателей Кузбасса
2		Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки	Единица	29	0	0	0	45	65	69,23%	Подтверждающие документы:1. "Отчет " Отчет Автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 20.12.2020г. №б/н , приложен файл.Существует риск:Риск неисполнения

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
		экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом									показателя , Причина риска: Отмена прямых контактов с зарубежными партнерами, бизнес- миссий, командировок в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Перевод всех контактов с зарубежными партнерами в он-лайн формат. , Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2021г.Предлагаемые решения:1. Продление срока достижения показателя в первом квартале 2020 года , срок исполнения 01.04.2021, Поскольку показатель формируется нарастающим итогом, пр реализации мероприятия в 2021 году показатель будет достигнут. .Показатель формируется нарастающим итогом с 01.01.2019. В подтверждение приложена информация о выполнении показателя в 2020 году



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений




Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения


3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 610 451,32 тыс. руб

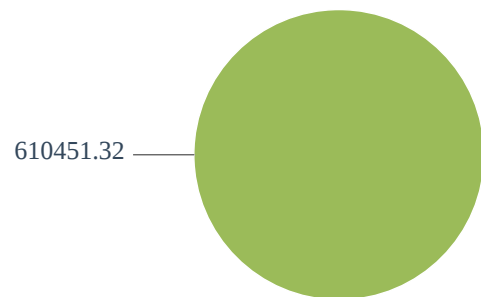


Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 92 700,00 тыс. руб

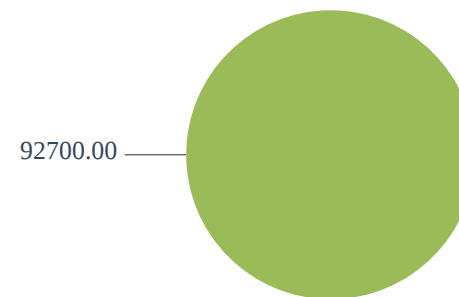

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 82 965,80 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний путем строительства объектов инженерной инфраструктуры промышленных парков. При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 4,814 млрд. рублей.	339 702,96	257 731,96	257 731,96	257 731,96	339 702,96	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	257 731,96	257 731,96	257 731,96	257 731,96	257 731,96	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	257 731,96	257 731,96	257 731,96	257 731,96	257 731,96	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	81 971,00	0,00	0,00	0,00	81 971,00	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(01) Создан и осуществляет деятельность единый оператор организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	704,70	700,00	700,00	700,00	704,70	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(03) В Кемеровской области - Кузбассе организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Кемеровской области - Кузбасса в Центре "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%	77 065,46	77 065,46	77 065,46	77 065,46	77 065,46	100,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	77 065,46	77 065,46	77 065,46	77 065,46	77 065,46	100,00	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	77 065,46	77 065,46	77 065,46	77 065,46	77 065,46	100,00	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		(06) Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Кемеровской области -Кузбасса. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 295 единиц (нарастающим итогом)	110 749,43	109 794,23	109 794,23	109 794,23	110 749,43	100,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	109 794,23	109 794,23	109 794,23	109 794,23	109 794,23	100,00	
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	109 794,23	109 794,23	109 794,23	109 794,23	109 794,23	100,00	
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2		внебюджетные источники	955,20	0,00	0,00	0,00	955,20	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		(06) Создан региональный экспортный центр. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта Кемеровской области- Кузбасса , достигло к 2024 году 141 единиц	54 631,77	54 598,97	54 598,97	54 598,97	54 631,77	100,00	
5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	54 598,97	54 598,97	54 598,97	54 598,97	54 598,97	100,00	
5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	54 598,97	54 598,97	54 598,97	54 598,97	54 598,97	100,00	
5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2		внебюджетные источники	32,80	0,00	0,00	0,00	32,80	100,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		(10) Реализовано мероприятие по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства	92 700,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	100,00	
6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	92 700,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	100,00	
6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	
6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	
6.2.3		бюджеты муниципальных образований	92 700,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	100,00	
6.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7		(13) Создан региональный экспортный центр.	3 299,80	3 297,70	3 297,70	3 297,70	3 299,80	100,00	
7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 297,70	3 297,70	3 297,70	3 297,70	3 297,70	100,00	
7.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 297,70	3 297,70	3 297,70	3 297,70	3 297,70	100,00	
7.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2		внебюджетные источники	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10	100,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8		(14) Организовано оказание услуг в центре "Мой бизнес"	17 263,00	17 263,00	17 263,00	17 263,00	17 263,00	100,00	
8.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	17 263,00	17 263,00	17 263,00	17 263,00	17 263,00	100,00	
8.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	17 263,00	17 263,00	17 263,00	17 263,00	17 263,00	100,00	
8.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			696 117,12	613 151,32	613 151,32	613 151,32	696 117,12	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			613 151,32	613 151,32	613 151,32	613 151,32	613 151,32	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			610 451,32	610 451,32	610 451,32	610 451,32	610 451,32	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	
бюджеты муниципальных образований			92 700,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	100,00	
внебюджетные источники			82 965,80	0,00	0,00	0,00	82 965,80	100,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Создан и осуществляет деятельность единый оператор организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Значение: 700,0000 Дата: 20.12.2020	
2		Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний путем строительства объектов инженерной инфраструктуры промышленных парков. При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 4,814 млрд. рублей. Значение: 1,0030 Дата: 20.12.2020	
3		В Кемеровской области - Кузбассе организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Кемеровской области - Кузбасса в Центре "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10% Значение: 4,0000 Дата: 20.12.2020	
4		В Кемеровской области - Кузбассе организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Кемеровской области - Кузбасса в Центре "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10% Значение: 5,0000 Дата: 20.12.2021	
5		Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Кемеровской области -Кузбасса. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 295 единиц (нарастающим итогом) Значение: 61,0000 Дата: 20.12.2020	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
6		Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Кемеровской области -Кузбасса. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 295 единиц (нарастающим итогом) Значение: 60,0000 Дата: 20.12.2021	 1
7		Создан региональный экспортный центр. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта Кемеровской области- Кузбасса , достигло к 2024 году 141 единиц Значение: 0,0650 Дата: 20.12.2020	 3
8		Создан региональный экспортный центр. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта Кемеровской области- Кузбасса , достигло к 2024 году 141 единиц Значение: 0,0840 Дата: 20.12.2021	 1
9		Реализовано мероприятие по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства Значение: 300,0000 Дата: 31.12.2020	 5
10		Создан региональный экспортный центр. Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020	 5
11		Организовано оказание услуг в центре "Мой бизнес" Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020	 6

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены




 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			<i>Создан и осуществляет деятельность единый оператор организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Значение: 700,0000 Дата: 20.12.2020</i>	20.12.2020	13.07.2020	Господинко Ю. С.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение о предоставлении субсидии в размере 700 тыс. рублей " Платежное поручение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса от 13.07.2020г. № 879983, приложен файл. Предоставлена субсидия для организации работы Единого оператора организаций, образующих инфраструктуру поддержки. Предоставлена информация : 700 из 700.
1.1.	ПК		<i>Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)</i>	20.12.2020	29.04.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Кемеровской области- Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг для создания и (или) развития единого оператора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства " Постановление Правительства Кемеровской области- Кузбасса от 29.04.2020г. №263, приложен файл.
1.2.	ПК		<i>Обеспечена организация</i>	20.12.2020	29.05.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)				Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии юридическому лицу на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг" Соглашение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса от 25.05.2020г. №1/29 -ЕО, приложен файл.
1.3.	ПК		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	20.12.2020	13.07.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение о предоставлении субсидии " Платежное поручение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса от 13.07.2020г. №879983, приложен файл.
1.4.	ПК		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	20.12.2020	12.11.2019	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов , произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда) выполнением работ, оказанием услуг " Соглашение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 12.11.2019г. №№5/29-ЕО, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.5.	ПК		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	20.12.2020	31.05.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Итоговый отчет Общества с ограниченной ответственностью "Инновационный научно-производственный центр "Иннотех" от 20.12.2019г. № б/н, приложен файл. 2. "Реестр получателей поддержки организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства " Отчет ООО "ИНПЦ "Иннотех" от 31.05.2020г. №б/н, приложен файл. В дополнение представлен Отчет ООО "ИНПЦ "Иннотех" в виде реестра получателей поддержки организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кузбасса за период 01.01.2020 до 31.05.2020
2.			Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний путем строительства объектов инженерной инфраструктуры промышленных парков. При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 4,814 млрд. рублей. Значение: 1,0030 Дата: 20.12.2020	20.12.2020	20.12.2020	Господинко Ю. С.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Сводные данные по инвестициям в основной капитал " Отчет ООО "УК "Экоимпульс" от 20.12.2020г. №№372, приложен файл. 2. "Справка " Отчет ООО УК "Экоимпульс" от 20.12.2020г. №б/н, приложен файл. Согласно отчетным данным, предоставленным управляющей компанией промпарка "Западный" ООО "УК "Экоимпульс", по состоянию на 20.12.2020 объем инвестиций в основной капитал составил 2,1 млрд рублей. Предоставлена информация : 2.1 из 1.003.
2.1.	ПК		Строительно-монтажные работы завершены Строительно-монтажные	20.12.2020	20.12.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			работы завершены				Подтверждающие документы: 1. "Справка " Иное ООО "УК"Экоимпульс" от 20.12.2020г. №б/н, приложен файл. Строительные работы за счет средств областного и федерального бюджетов завершены по состоянию на 20.12.2020. В подтверждение приложена Справка управляющей компании индустриального парка "Западный" с описанием общей ситуации по строительству объектов инженерной инфраструктуры.
2.2.	ПК		Техническая готовность объекта, % Техническая готовность объекта, %	20.12.2020	20.12.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка " Иное ООО "УК "ЭКОИМПУЛЬС" от 20.12.2020г. №б/н, приложен файл. По состоянию на 24.12.2020 техническая готовность объекта составляет 95 процентов. Полное завершение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию с постановкой на кадастровый учет планируется в установленные сроки - первый квартал 2021 года. В подтверждение приложена справка управляющей компании индустриального парка "Западный" - ООО "УК"ЭКОИМПУЛЬС".
2.3.	ПК		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	20.12.2020	20.12.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка " Отчет ООО "УК "Экоимпульс" от 20.12.2020г. №б/н, приложен файл. Ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с федеральным проектом осуществляется в первом квартале 2021 года. Информация о вводе объекта в эксплуатацию отражена в отчете Управляющей компании промпарка "Западный" ООО "УК "Экоимпульс"
2.4.	ПК		Заключено соглашение о предоставлении субсидии	20.12.2020	01.11.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)				Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг. " Соглашение Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса от 23.07.2020г. №10-2020-02812, приложен файл. Дата исполнения контрольной точки - 23.07.2020. В связи с версионированием паспорта проекта информация о контрольной точке может быть внесена только в отчетном периоде за ноябрь 2020 года, Принимая во внимание, что на момент наступления отчетного периода контрольная точка выполнена, в качестве даты исполнения контрольной точки в отчете указан первый день отчетного периода.
2.5.	ПК		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	20.12.2020	20.12.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка " Отчет ООО УК"Экоимпульс" от 20.12.2020г. №б/н , приложен файл. В качестве подтверждающего документа приложена справка, содержащая отчетную информацию по состоянию на 20.12.2020
3.			В Кемеровской области - Кузбассе организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Кемеровской области - Кузбасса в Центре "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию	20.12.2020	20.12.2020	Господинко Ю. С.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет государственного автономного учреждения Кемеровской области- Кузбасса "Мой бизнес" от 20.12.2020г. №б/н, приложен файл. В 2020 году организовано оказание услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре "Мой бизнес". В качестве подтверждающих документов представлен отчет о количестве получателей услуг Центра "Мой

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10% Значение: 4,0000 Дата: 20.12.2020</i>				бизнес" в 2020 году, что составляет 4 процента от общего количества предпринимателей Кузбасса по состоянию на 01.01.2019. Предоставлена информация : 4 из 4.
3.1.	ПК		Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.02.2020	25.12.2019	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 14.02.2019 №139-09-2019-234/2" Соглашение Минэкономразвития России от 25.12.2019г. №139-09-2019-234/2, приложен файл.
3.2.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены) Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2020	03.09.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежные поручения о предоставлении субсидии государственному автономному учреждению Кемеровской области-Кузбасса "Мой бизнес" " Платежное поручение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса от 03.09.2020г. №б/н, приложен файл.
3.3.	ПК		Для оказания услуги (выполнения	20.12.2020	20.12.2020	Господинко Ю. С.	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены







Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение				Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет государственного автономного учреждения Кемеровской области - Кузбасса "Мой бизнес" от 20.12.2020г. №б/н, приложен файл. В 2020 году организовано оказание услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре "Мой бизнес". В качестве подтверждающих документов представлен отчет о количество получателей услуг Центра "Мой бизнес" в 2020 году.
3.3.1	РРП		Оказание комплекса услуг. сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре "Мой бизнес" Оказание комплекса услуг. сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре "Мой бизнес"	20.12.2020	20.12.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет государственное автономное учреждение Кемеровской области - Кузбасса "Мой бизнес" от 20.12.2020г. №б/н, приложен файл. В 2020 году организовано оказание услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре "Мой бизнес". В качестве подтверждающих документов представлен отчет о количество получателей услуг Центра "Мой бизнес" в 2020 году.
4.			В Кемеровской области - Кузбассе организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Кемеровской области - Кузбасса в Центре "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство	20.12.2021	15.02.2021	Господинко Ю. С.	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 5 из 5.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10% Значение: 5,0000 Дата: 20.12.2021				
4.1.	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.02.2021	15.02.2021	Чурина Е. В.	В работе. Отклонения отсутствуют.
5.			Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Кемеровской области -Кузбасса. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 295 единиц (нарастающим итогом) Значение: 61,0000 Дата: 20.12.2020	20.12.2020	18.12.2020	Господинко Ю. С.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии " Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области от 18.12.2020г. №999, приложен файл. Предоставлена информация : 72 из 61.
5.1.	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.03.2020	25.12.2019	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 14.02.2019 №139-09-2019-234"

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Соглашение Минэкономразвития России от 25.12.2019г. №139-09-2019-234/2, приложен файл.
5.2.	ПК		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	20.12.2020	22.07.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии Микрокредитной компании Государственному фонду поддержки предпринимательства Кемеровской области для реализации программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах " Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.07.2020г. №466-р , приложен файл.
5.3.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены) Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2020	13.08.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение о предоставлении субсидии Микрокредитной компании Государственному фонду поддержки предпринимательства Кемеровской области " Платежное поручение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса от 13.08.2020г. №734641, приложен файл.
5.4.	ПК		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	20.12.2020	25.12.2019	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 14.02.2019 №139-09-2019-234" Соглашение Минэкономразвития России от 25.12.2019г.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			трансфертов*				№139-09-2019-234/2, приложен файл.
5.5.	ПК		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	20.12.2020	30.07.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из бюджета Кемеровской области - Кузбасса субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением " Соглашение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса от 30.07.2020г. №40-2020-00940, приложен файл.
5.6.	ПК		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	20.12.2020	18.12.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений показателя результативности предоставления Субсидии " Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области от 18.12.2020г. №999, приложен файл.
6.			Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Кемеровской области -Кузбасса. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 295 единиц (нарастающим итогом) Значение: 60,0000 Дата: 20.12.2021	20.12.2021	20.12.2021	Господинко Ю. С.	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 60 из 60.
							

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.1.	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.02.2021	15.02.2021	Чурина Е. В.	В работе. Отклонения отсутствуют.
7.			Создан региональный экспортный центр. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта Кемеровской области-Кузбасса, достигло к 2024 году 141 единиц Значение: 0,0650 Дата: 20.12.2020	20.12.2020	01.04.2021	Господинко Ю. С.	Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Риск недостижения показателя., Причина риска: Прекращение прямых контактов экспортеров с зарубежными партнерами, бизнес-миссий, командировок, выставочно-ярмарочных мероприятий вследствие ситуации с распространением коронавирусной инфекции, перевод всех мероприятий в он-лайн формат, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2021г. Предлагаемые решения: 1. Продление срока реализации на 2021 год, срок исполнения 01.04.2021, Принимая во внимание, что расчет значения показателя осуществляется нарастающим итогом, начиная с 01.01.2019, реализация мероприятия в 2021 году позволит достигнуть плановых значений результата 2020-2021 годов. . Значение результата считается нарастающим итогом, начиная с 01.01.2019. При поддержке регионального экспортного центра в 2019-2020 годах субъектами малого и среднего предпринимательства Кузбасса заключено 45 экспортных контрактов, В 2020 году 116 предпринимателей Кузбасса получили услуги Центра поддержки экспорта. Срок выполнения показателя - первый квартал 2020 года.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Просрочка 102 дня. Предоставлена информация : 0.065 из 0.065.
7.1.	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.02.2020	25.12.2019	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 14.02.2019 №139-09-2019-234/2" Соглашение Минэкономразвития России от 25.12.2019г. №139-09-2019-234/2, приложен файл.
7.2.	ПК		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.05.2020	20.03.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение между АО "Российский экспортный центр" и департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области о методическом и информационном взаимодействии при реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта в рамках подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №316." Соглашение АО "Российский экспортный центр" от 20.03.2020г. №477-220, приложен файл.
7.3.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены) Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2020	17.09.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежные поручения о предоставлении субсидии

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области" от 07.08.2020 и от 17.09.2020" Платежное поручение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса от 17.09.2020г. №по реестру , приложен файл.
8.			Создан региональный экспортный центр. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта Кемеровской области-Кузбасса , достигло к 2024 году 141 единиц Значение: 0,0840 Дата: 20.12.2021	20.12.2021	20.12.2021	Господинко Ю. С.	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0.084 из 0.084.
8.1.	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.02.2021	15.02.2021	Чурина Е. В.	В работе. Отклонения отсутствуют.
9.			Реализовано мероприятие по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства Значение: 300,0000 Дата: 31.12.2020	31.12.2020	20.12.2020	Господинко Ю. С.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Сводная отчетная информация о предоставлении субсидий муниципальными образованиями Кузбасса " Отчет Муниципальных образований Кузбасса от 20.12.2020г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 371 из 300.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
9.1.	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	20.12.2020	31.03.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядке предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджетам муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства и о признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства Кемеровской области - Кузбасса " Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 31.03.2020г. №193, приложен файл. Отклонения отсутствуют.
9.2.	ПК		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2020	24.09.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии " Соглашение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса от 24.09.2020г. №по реестру , приложен файл. Отклонения отсутствуют.
9.3.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены) Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	25.09.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежные поручения о предоставлении субсидии муниципальным образованиям " Платежное поручение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса от 25.09.2020г. № по реестру , приложен файл. Информация о дате исполнения соответствует дате последнего платежного поручения о предоставлении субсидии муниципальным образованиям.
9.4.	ПК		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по	31.12.2020	15.09.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)				Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджетам муниципальных образований Кемеровской области -Кузбасса на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства " Распоряжение Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 15.09.2020г. №571, приложен файл. Отклонения отсутствуют.
9.5.	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2020	20.12.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная отчетная информация муниципальных образований Кузбасса о предоставлении субсидии " Отчет Муниципальных образований Кемеровской области- Кузбасса от 20.12.2020г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют.
10.			Создан региональный экспортный центр. Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020	20.12.2020	20.12.2020	Господинко Ю. С.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет Автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области" от 20.12.2020г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
10.1.	ПК		утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	01.07.2020	25.12.2019	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			(выполнения работы)				среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 14.02.2019 №139-09-2019-234/2" Соглашение Минэкономразвития России от 25.12.2019г. №139-09-2019-234/2, приложен файл.
10.2.	ПК		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.07.2020	20.03.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение между АО «Российский экспортный центр» и департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области о методическом и информационном взаимодействии при реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №316." Соглашение с АО "Российский экспортный центр" от 20.03.2020г. №477-2020, приложен файл.
10.3.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены) Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2020	17.09.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежные поручения о предоставлении субсидии Автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области" " Платежное поручение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса от 17.09.2020г. №б/н , приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
10.4.	ПК		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.07.2020	28.07.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением "Соглашение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса от 28.07.2020г. №5/28-ЦПЭ, приложен файл.
10.5.	ПК		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	20.12.2020	20.12.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет Автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области" от 20.12.2020г. №6/н, приложен файл.
11.			Организовано оказание услуг в центре "Мой бизнес" Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020	20.12.2020	20.12.2020	Господинко Ю. С.	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет государственного автономного учреждения Кемеровской области- Кузбасса "Мой бизнес" от 20.12.2020г. №6/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1.
11.1.	ПК		Утверждены (одобренны, сформированы) документы,	20.12.2020	30.06.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)				1. " Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным автономным учреждением Кемеровской области-Кузбасса "Мой бизнес" " Приказ Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса от 30.06.2020г. №71/1 -ОД, приложен файл. отклонения отсутствуют.
11.2.	ПК		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	20.12.2020	30.06.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Кемеровской области-Кузбасса "Мой бизнес" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) " Соглашение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса от 30.06.2020г. №4/30-МБ , приложен файл. Отклонения отсутствуют.
11.3.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены) Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2020	22.07.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежные поручения о предоставлении субсидии ГАУ "Мой бизнес" " Платежное поручение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса от 22.07.2020г. №по реестру , приложен файл. Информация о дате выполнения контрольной точке соответствует дате последнего платежного поручения о предоставлении субсидии ГАУ "Мой бизнес"
11.4.	ПК		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение	20.12.2020	30.06.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений






Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)</i> Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)				1. "Государственное задание " Государственное (муниципальное) задание Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют.
11.5.	ПК		<i>Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)</i> Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	20.12.2020	30.06.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Кемеровской области-Кузбасса "Мой бизнес" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) " Соглашение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса от 30.06.2020г. №4/30-МБ, приложен файл. Отклонения отсутствуют.
11.6.	ПК		<i>Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i> Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	20.12.2020	20.12.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об оказанных услугах " Отчет государственного автономного учреждения Кемеровской области -Кузбасса "Мой бизнес" от 20.12.2020г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек

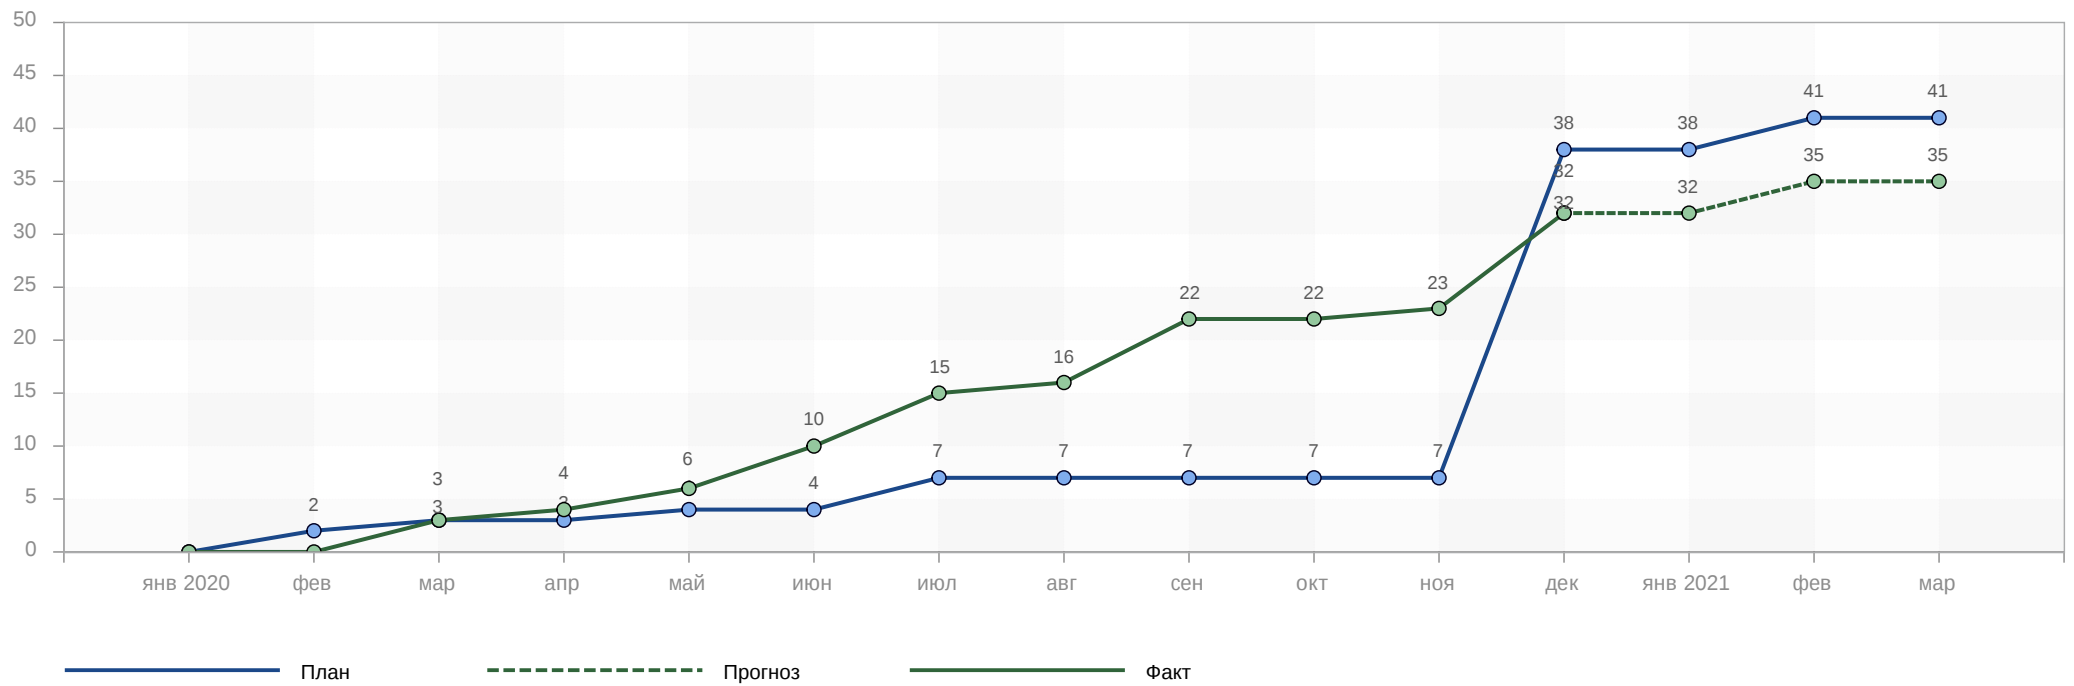


Рис. 1. "(I5-32) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства "

График достижения показателя

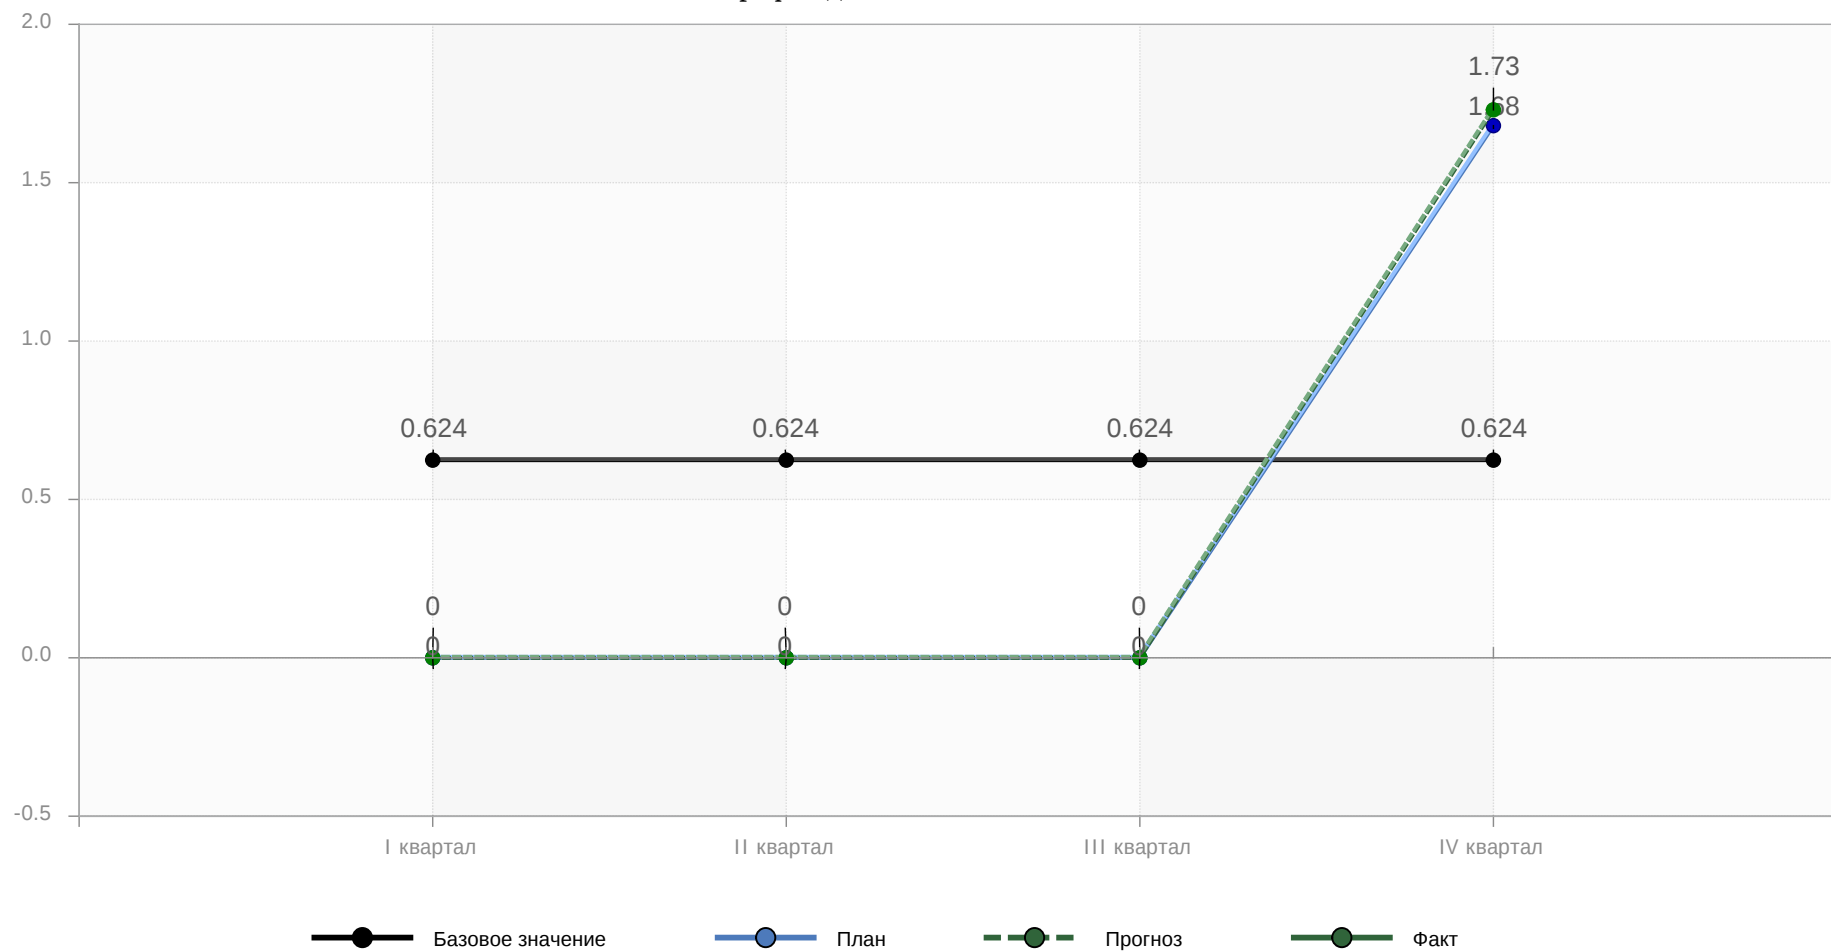


Рис. 1. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя

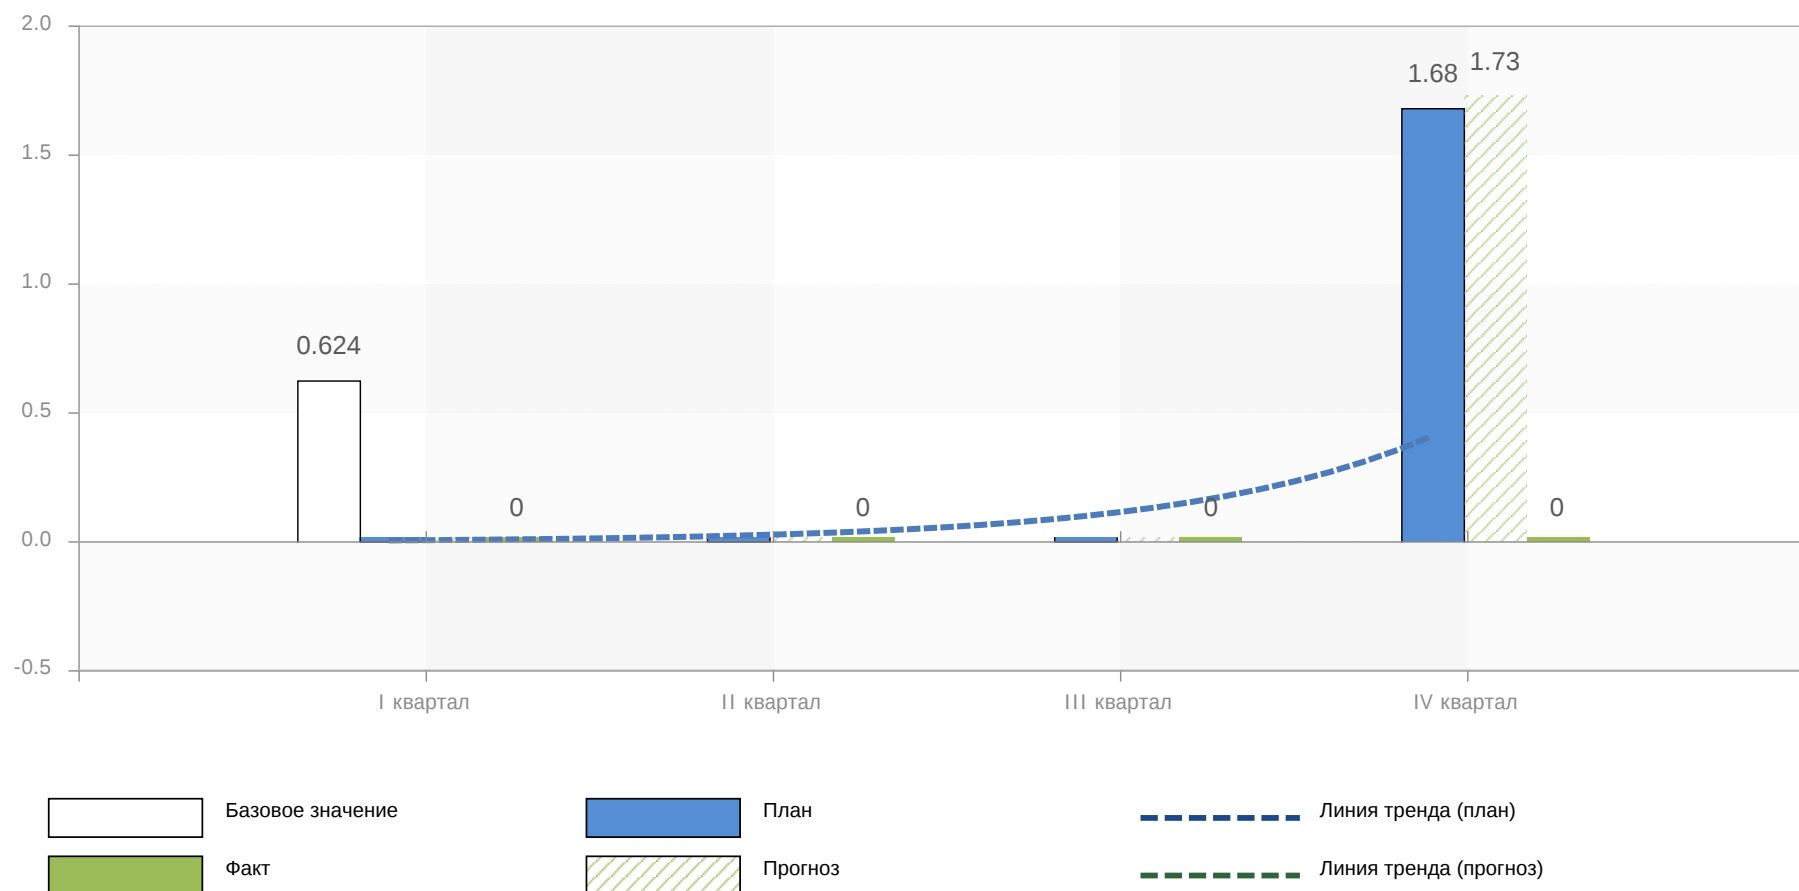


Рис. 2. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом

График достижения показателя

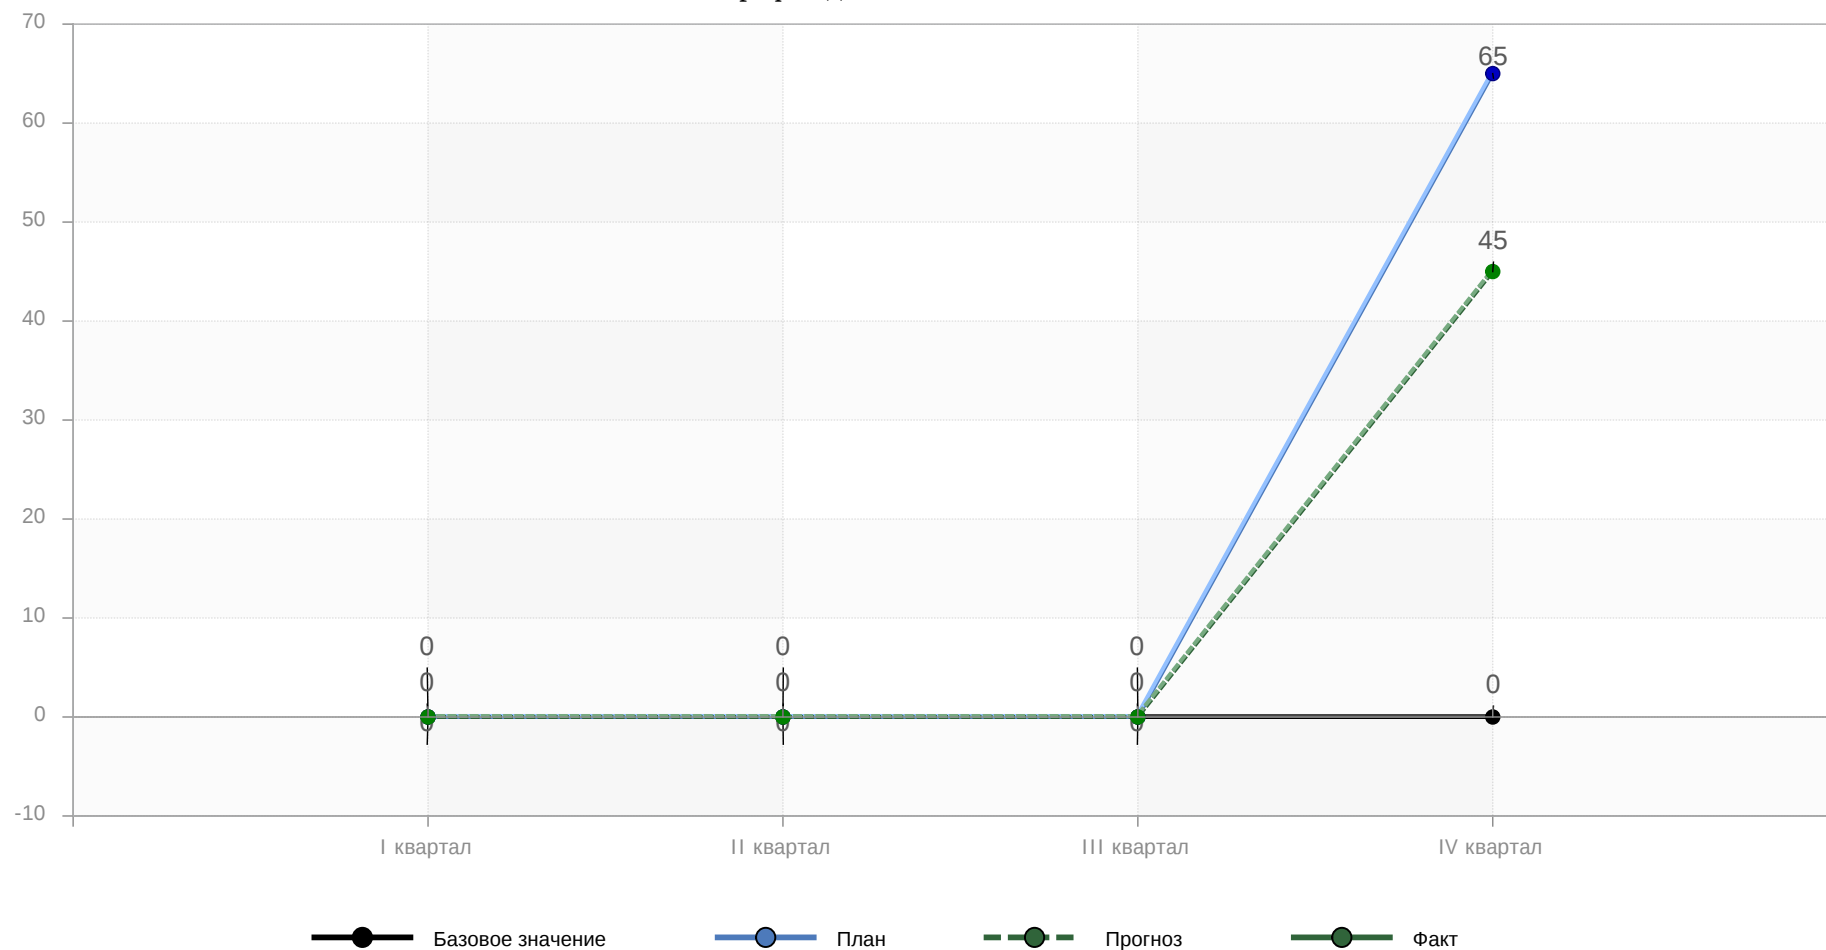


Рис. 3. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя

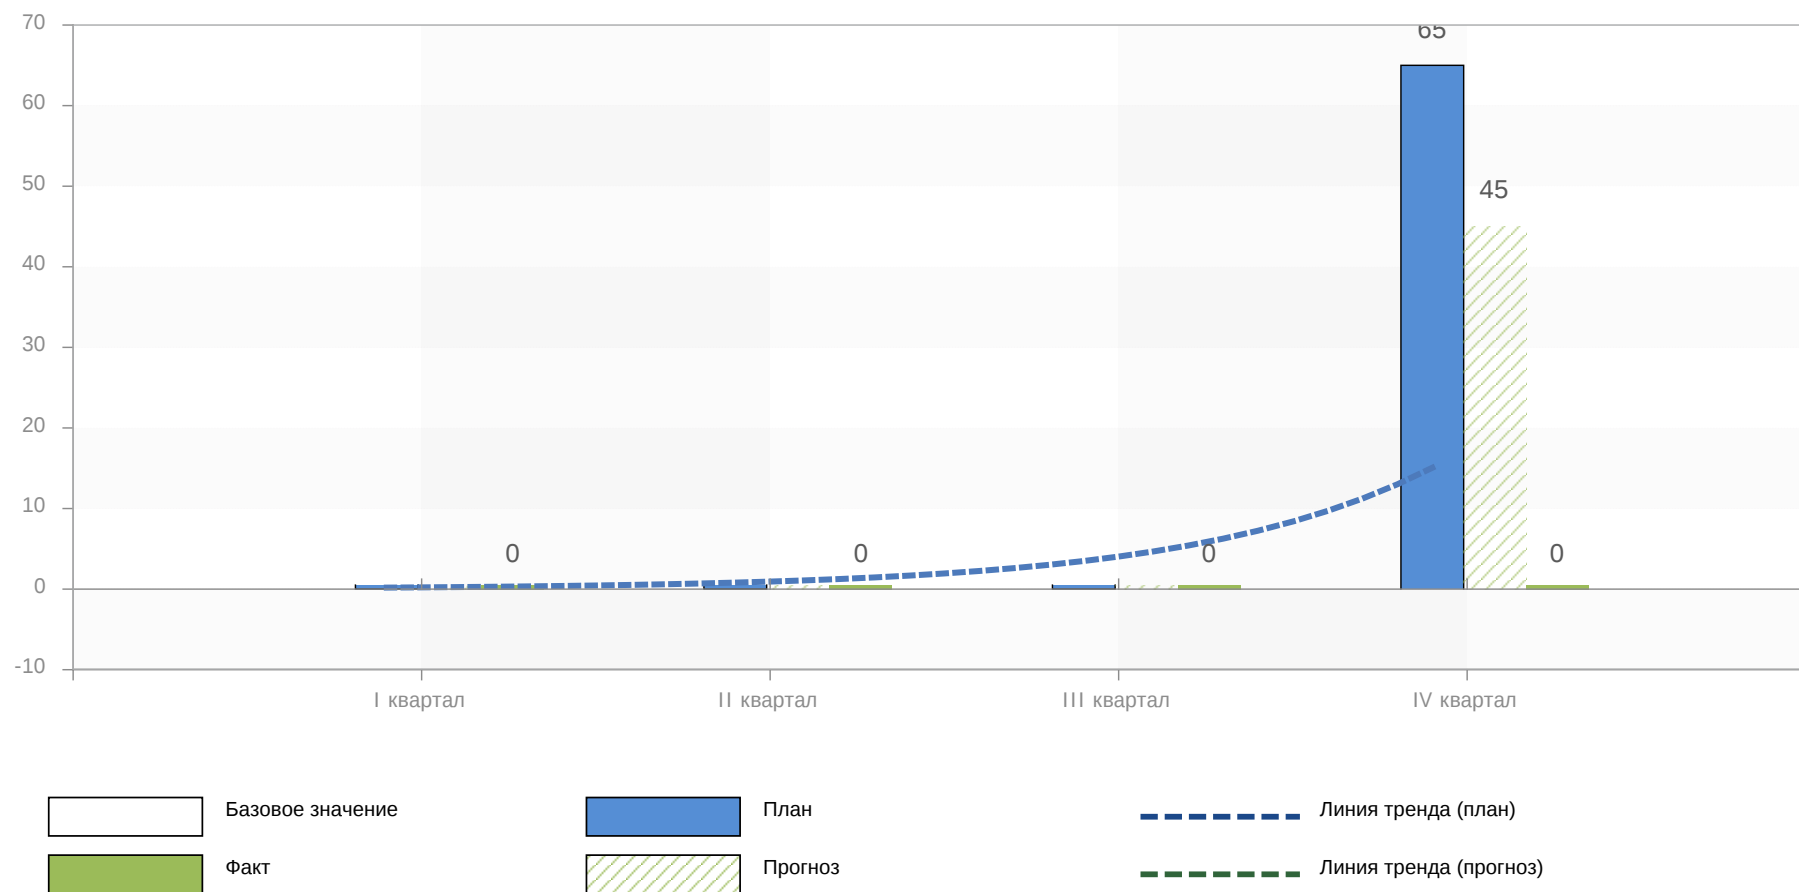


Рис. 4. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом
