

Руководитель
регионального проекта —
Гришин Алексей Сергеевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
075476E128FB6F4ED3A15660F49AFA22F4744D8C

Владелец: Гришин Алексей Сергеевич

Действителен: с 27.05.2021 по 27.08.2022

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

" (L1-32) Системные меры по повышению производительности труда "

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
		-		
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	-	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1		3. Цели и показатели	Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год, Причина риска: Показатель удален от 25.11.2020 №139-2019-L10030-1/2 Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры по повышению производительности труда" на территории Кемеровской области - Кузбасса, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.	1. Показатель удален от 25.11.2020 №139-2019-L10030-1/2 Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры по повышению производительности труда" на территории Кемеровской области - Кузбасса, срок исполнения 31.12.2020;
2		3. Цели и показатели	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом, Причина риска: Показатель удален от 25.11.2020 №139-2019-L10030-1/2 Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры по повышению производительности труда" на территории Кемеровской области - Кузбасса, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.	1. Показатель удален от 25.11.2020 №139-2019-L10030-1/2 Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры по повышению производительности труда" на территории Кемеровской области - Кузбасса, срок исполнения 31.12.2020;

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к предшествующему году	Процент	100	0	0	0	103.59	102.9	100,67%	Подтверждающие документы: 1. "О показателях национального проекта "Производительность труда" за 2020 год" Письмо Минэкономразвития России от 12.11.2021г. №Д28и-35658, приложен файл.Выполнено
2		Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики	Единица	7	0	0	0	43	41	104,88%	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении целей и показателей «Системные меры по повышению производительности труда»" Письмо

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
		в реализацию национального проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе									Минтруд Кузбасса от 10.12.2021г. №б/н, приложен файл.Выполнено



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Оказано информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта о подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов Фонда развития промышленности. Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	
2		Оказано информационное содействие субъектам МСП-участникам регионального проекта в получении мер государственной поддержки (в рамках механизма субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию проектов по повышению производительности труда в приоритетных отраслях по льготной ставке) Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	
3		Получение налоговых преференций предприятиями для стимулирования роста производительности труда Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	
4		Применение на региональном уровне федеральной системы нефинансовой мотивации предприятий к участию в региональном проекте в комплексе с региональными мерами Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	
5		Разработана региональная система сбора и анализа предложений от субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по снижению административных барьеров, сокращению избыточной регуляторной нагрузки Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	
6		Сформированы команды сотрудников предприятий-участников регионального проекта, а также служб занятости населения и других организаций для обучения (нарастающим итогом) Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2020	
7		Оказано информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта в получении акселерационной поддержки по развитию экспортного потенциала на базе АО «Российский экспортный центр» (нарастающим итогом) Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Оказано информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта о подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов Фонда развития промышленности. Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	31.12.2020	27.11.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении займа ООО "ИЦ "АСИ"" Письмо Правительство Кемеровской области-Кузбасса от 26.08.2020г. №И10-18/7030, приложен файл. 2. "Онлайн – вебинар по вопросам участия в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Кузбассе." Письмо Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 10.06.2020г. № 04-05/2474, приложен файл. 3. "Справка об исполнении результата, мероприятия, контрольной точки регионального проекта "Системные меры по повышению производительности труда"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 27.11.2020г. №б/н, приложен файл. 17 июня 2020 проведен онлайн - вебинар по вопросам реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». О системных мерах поддержки предприятий, стимулирующих повышение производительности труда, в том числе о предоставлении льготных займов Фонда развития промышленности, участников семинара проинформировал министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин. Представители бизнеса воспользовались возможностью в режиме реального времени получить ответы на все интересующие вопросы. В рамках достижения целей повышения производительности труда до 2024 года ООО "ИЦ "АСИ" сформировало заявку на программу льготного

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							займа в Фонд развития промышленности Российской Федерации по программе "Производительность труда", направленной на реализацию проекта "Техническое перевооружение и модернизация механического производства весового оборудования". Предоставлена информация : 0 из 0.
1.1.	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2020	27.11.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении займа ООО "ИЦ "АСИ"" Письмо Правительство Кемеровской области-Кузбасса от 26.08.2020г. №И10-18/7030, приложен файл. 2. "Справка об исполнении результата, мероприятия, контрольной точки регионального проекта "Системные меры по повышению производительности труда"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 27.11.2020г. №б/н, приложен файл.
1.1.1	РРП		Оказание информационного содействия предприятиям-участникам регионального проекта в подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов ФРП	31.12.2020	27.11.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении займа ООО "ИЦ "АСИ"" Письмо Правительство Кемеровской области-Кузбасса от 26.08.2020г. №И10-18/7030, приложен файл. 2. "О направлении на комплексную экспертизу (Данные с личного кабинета ООО "ИЦ "АСИ" на сайте ФРП)" Письмо Фонд Развития Промышленности от 14.09.2020г. №б/н, приложен файл. 3. "Справка об исполнении результата, мероприятия, контрольной точки регионального проекта "Системные меры по повышению производительности труда"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 27.11.2020г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.			Оказано информационное содействие субъектам МСП-участникам регионального проекта в получении мер государственной поддержки (в рамках механизма субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию проектов по повышению производительности труда в приоритетных отраслях по льготной ставке) Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	31.12.2020	30.10.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, мероприятия, контрольной точки РП "Системные меры по повышению производительности труда"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0.
2.1.	ПК		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2020	30.10.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, мероприятия, контрольной точки РП "Системные меры по повышению производительности труда"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.
2.1.1	РРП		Информирование предприятий – участников о возможности получения мер государственной поддержки	31.12.2020	30.10.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, мероприятия, контрольной точки РП "Системные меры по повышению производительности труда"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.
3.			Получение налоговых преференций предприятиями для стимулирования роста производительности труда	31.12.2020	30.10.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, мероприятия,

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020</i>				контрольной точки РП "Системные меры по повышению производительности труда"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0.
3.1.	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2020	30.10.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, мероприятия, контрольной точки РП "Системные меры по повышению производительности труда"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл. Утверждены изменения в действующий Закон Кемеровской области № 52-ОЗ «Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций» в части распространения его действия на предприятия, являющиеся участниками национального проекта.
3.1.1	РПП		Разработан план мероприятий по реализации налоговых льгот	30.03.2020	12.03.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План мероприятий по реализации налоговых льгот в рамках РП "Системные меры по повышению производительности труда" на 2020 год" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 12.03.2020г. №б/н, приложен файл.
4.			<i>Применение на региональном уровне федеральной системы нефинансовой мотивации предприятий к участию в региональном проекте в комплексе с региональными мерами Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020</i>	31.12.2020	30.10.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, мероприятия, контрольной точки РП "Системные меры по повышению производительности труда"" Иное Министерство труда и

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							занятости населения Кузбасса от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
4.1.	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2020	30.10.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, мероприятия, контрольной точки РП "Системные меры по повышению производительности труда"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.
4.1.1	РРП		Организация, проведение, подведение итогов регионального конкурса «Лучшие практики наставничества – 2019»	31.12.2020	30.10.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, мероприятия, контрольной точки РП "Системные меры по повышению производительности труда"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.
5.			<i>Разработана региональная система сбора и анализа предложений от субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по снижению административных барьеров, сокращению избыточной регуляторной нагрузки Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020</i>	31.12.2020	30.10.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, мероприятия, контрольной точки РП "Системные меры по повышению производительности труда"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл. Разработка региональной системы не целесообразна, поскольку функционирует федеральная система сбора предложений напрямую от предприятий на сайт производительность.рф. Информации о наличии

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							административных барьеров, предложений по сокращению избыточной регуляторной нагрузки от предприятий региона не поступало. Предоставлена информация : 1 из 1.
5.1.	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2020	30.10.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, мероприятия, контрольной точки РП "Системные меры по повышению производительности труда"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл. Разработка региональной системы не целесообразна, поскольку функционирует федеральная система сбора предложений напрямую от предприятий на сайт производительность.рф. Информации о наличии административных барьеров, предложений по сокращению избыточной регуляторной нагрузки от предприятий не поступало.
5.2.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	30.10.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, мероприятия, контрольной точки РП "Системные меры по повышению производительности труда"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.
5.2.1	РРП		Формирование региональной системы сбора и анализа предложений от субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по	31.12.2020	30.10.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, мероприятия,

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			снижению административных барьеров, сокращению избыточной регуляторной нагрузки				контрольной точки РП "Системные меры по повышению производительности труда"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.
6.			<i>Сформированы команды сотрудников предприятий-участников регионального проекта, а также служб занятости населения и других организаций для обучения (нарастающим итогом) Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Дипломы о профессиональной переподготовке ФГБОУ ВО " Иное Всероссийская академия внешней торговли Министерство экономического развития РФ от 13.11.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Онлайн – вебинар по вопросам участия в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Кузбассе." Письмо Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 10.06.2020г. № 04-05/2474, приложен файл. 3. "Справка об исполнении результата, мероприятия, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное МИНТРУД КУЗБАССА от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл. 17 июня 2020 проведен онлайн - вебинар по вопросам реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». О системных мерах поддержки предприятий, стимулирующих повышение производительности труда в регионе, в том числе участников семинара проинформировал министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин. Заместитель генерального директора по операционной эффективности ФЦК Алексей Байшев, рассказал об адресной поддержке повышения производительности труда. Представители бизнеса воспользовались возможностью в режиме реального времени получить

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							ответы на все интересующие вопросы. Обучено 12 работников предприятий-участников регионального проекта, выданы дипломы о профессиональной переподготовке ФГБОУ ВО "Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации" по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки "Лидеры производительности" в 2019 году. Предоставлена информация : 12 из 10.
6.1.	ПК		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2020	31.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о направлении заявки на участие в программе повышения квалификации управленческих кадров "Лидеры производительности"" Письмо Правительство Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2020г. №И16- 26/4961, приложен файл. 2. "Справка об исполнении результата, мероприятия, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл. Направлена заявка на обучение в программе профессиональной переподготовки управленческого звена «Лидеры производительности»
6.2.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	31.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, мероприятия, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл. Направлена заявка на обучение в программе

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							профессиональной переподготовки управленческого звена «Лидеры производительности»
7.			Оказано информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта в получении акселерационной поддержки по развитию экспортного потенциала на базе АО «Российский экспортный центр» (нарастающим итогом) Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	31.12.2020	30.10.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, мероприятия, контрольной точки РП "Системные меры по повышению производительности труда"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек

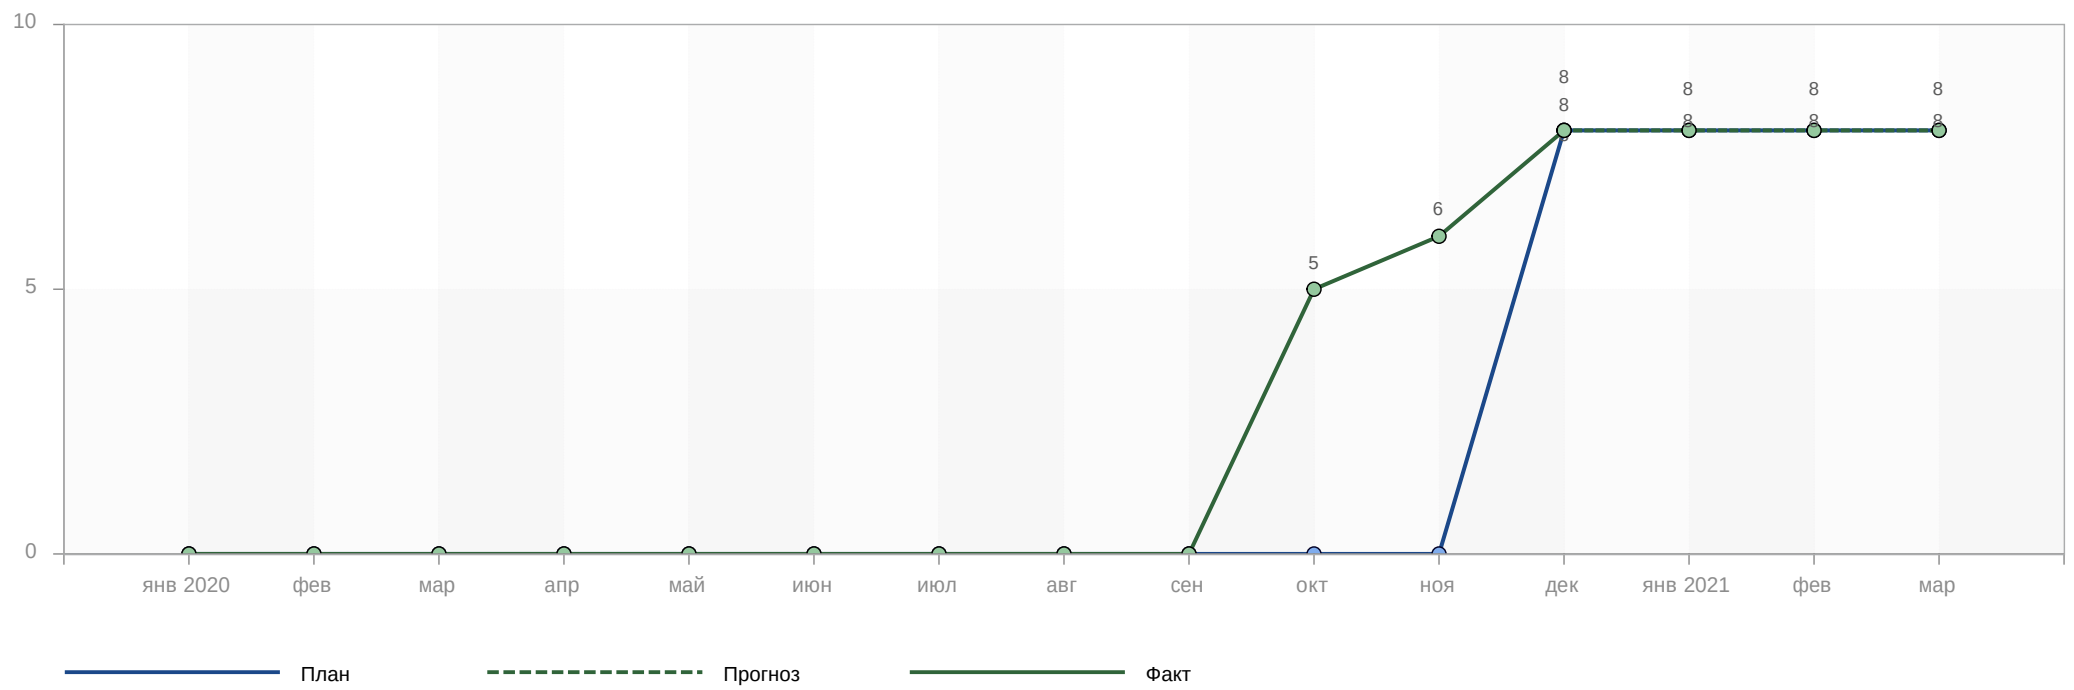


Рис. 1. " (L1-32) Системные меры по повышению производительности труда"

График достижения показателя

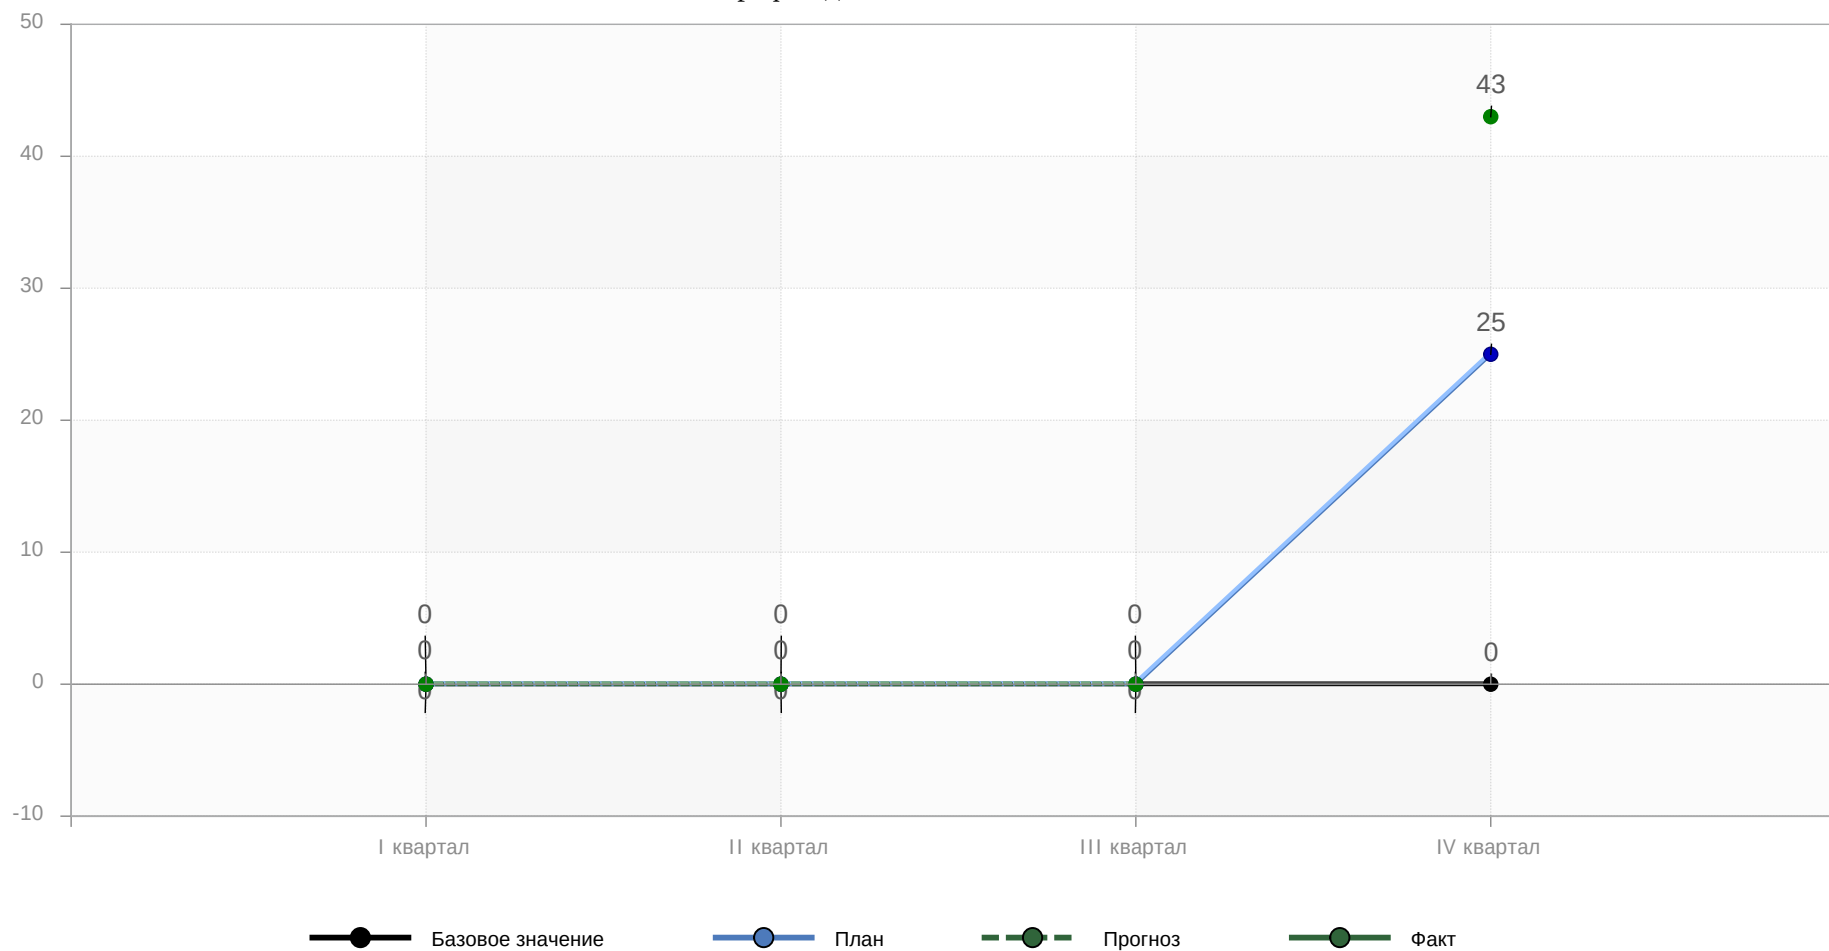


Рис. 1. Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе

Диаграмма достижения показателя

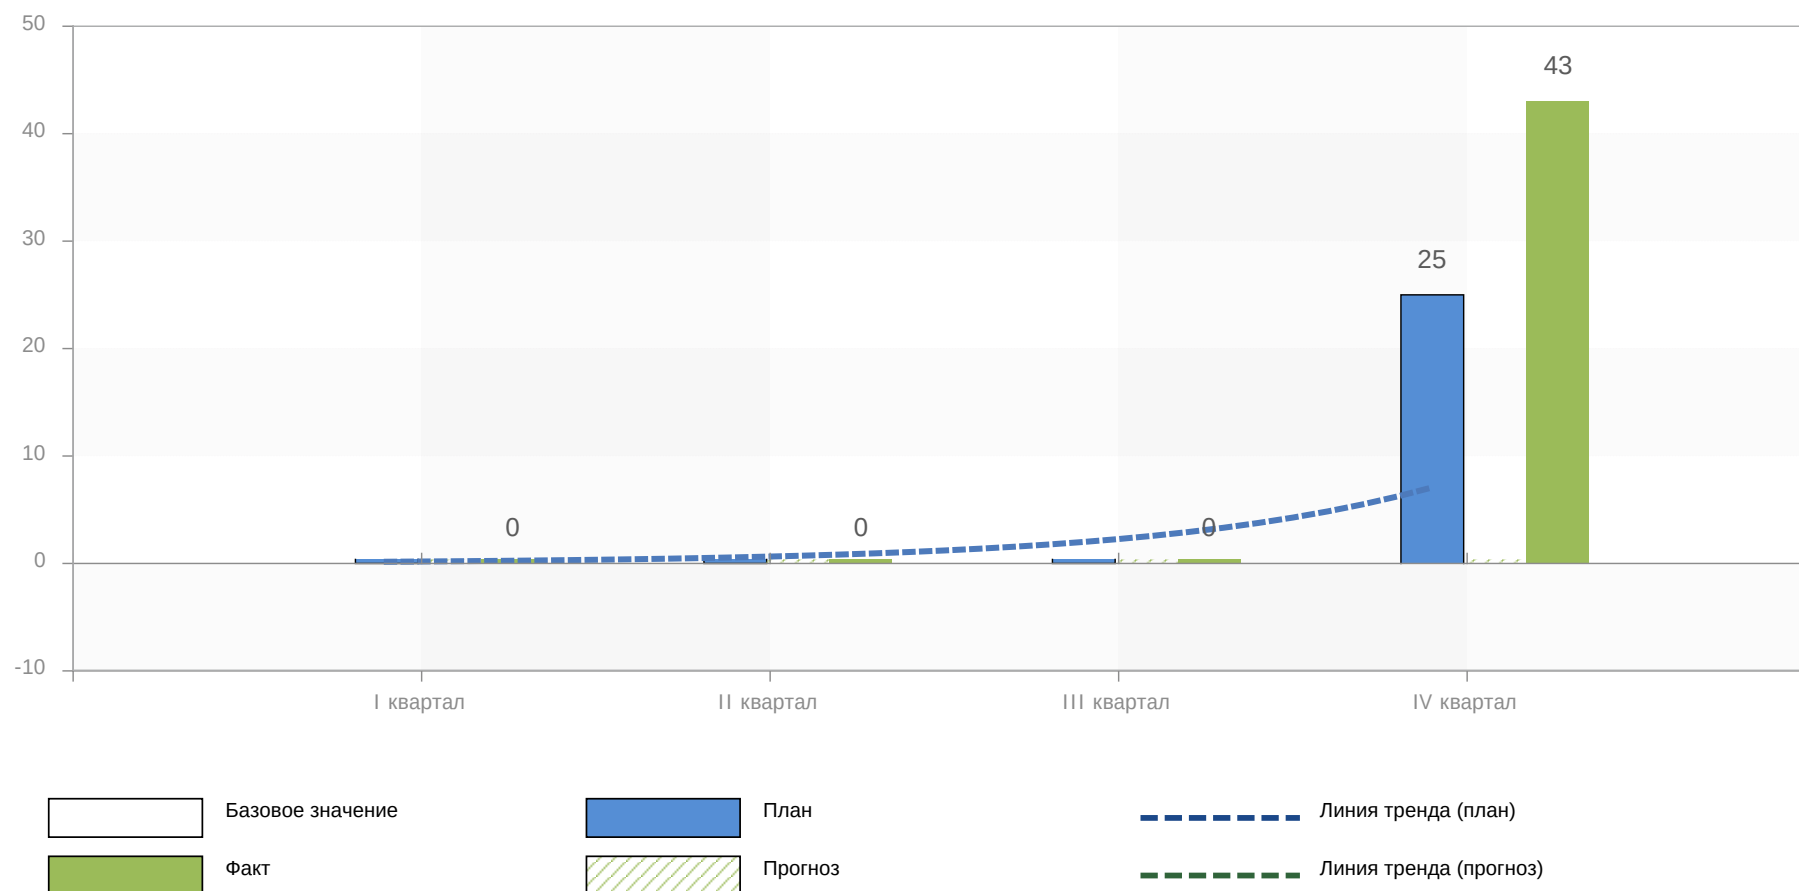


Рис. 2. Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе

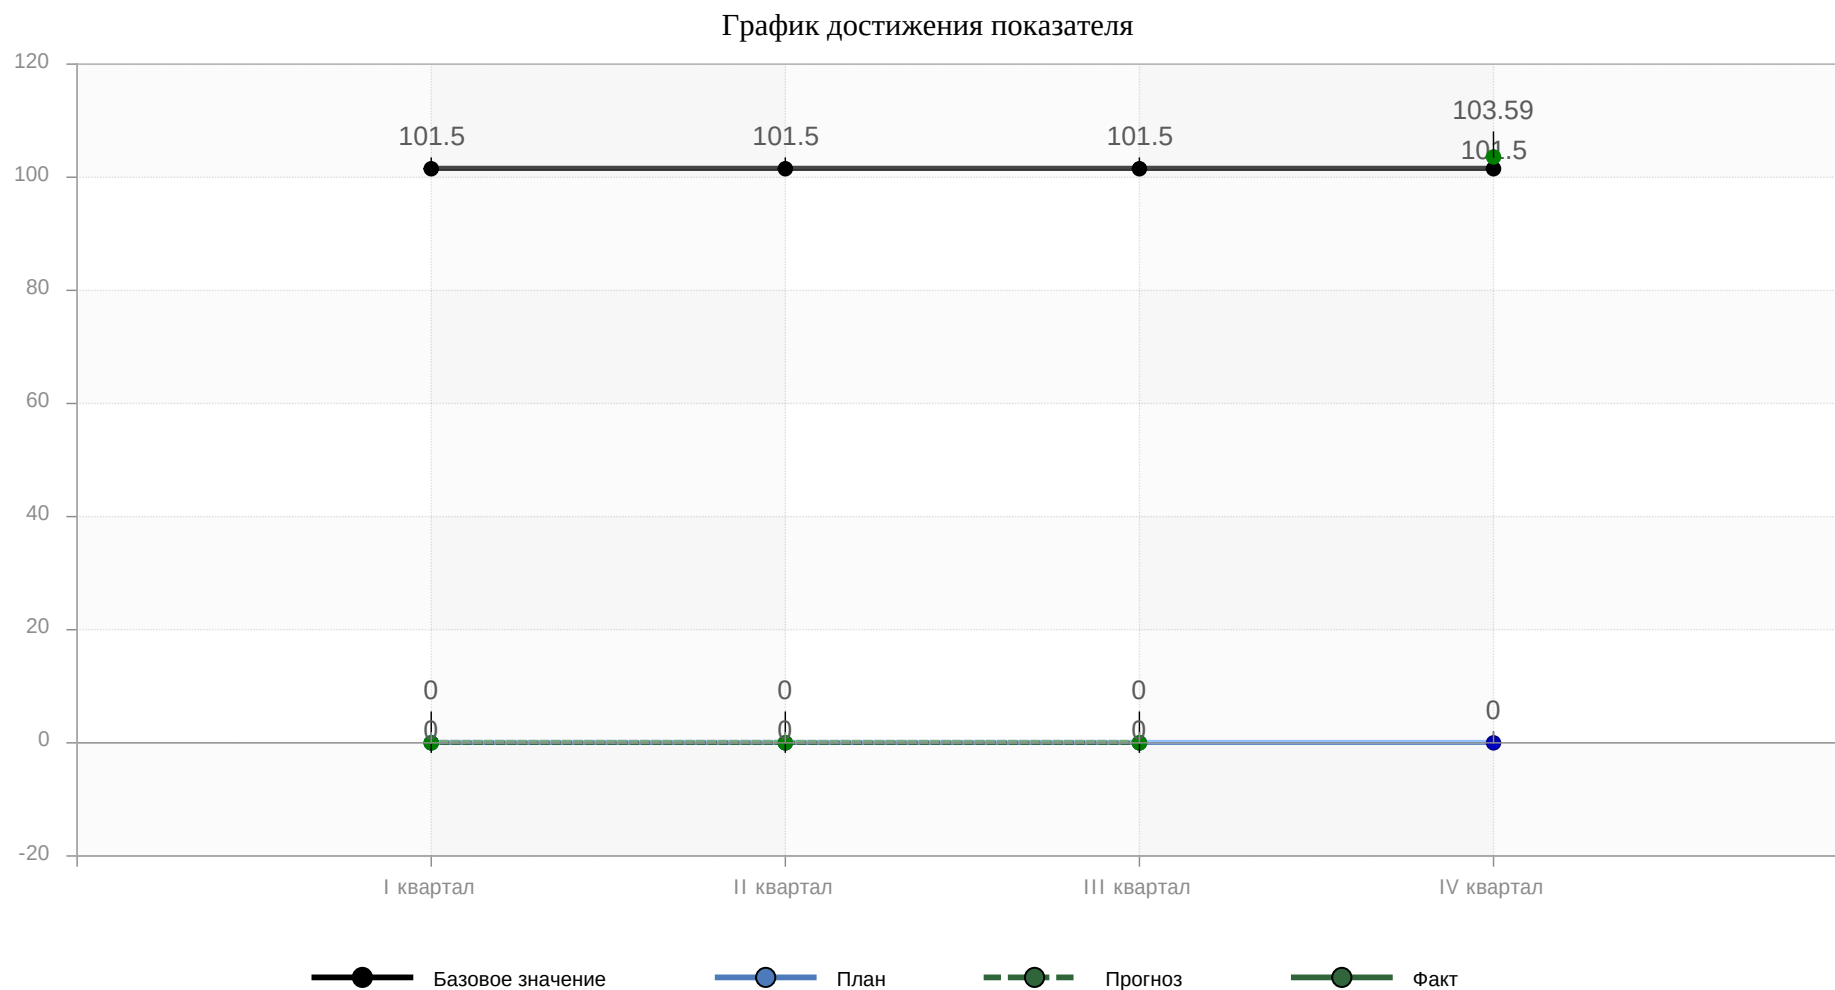


Рис. 3. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к предшествующему году

Диаграмма достижения показателя

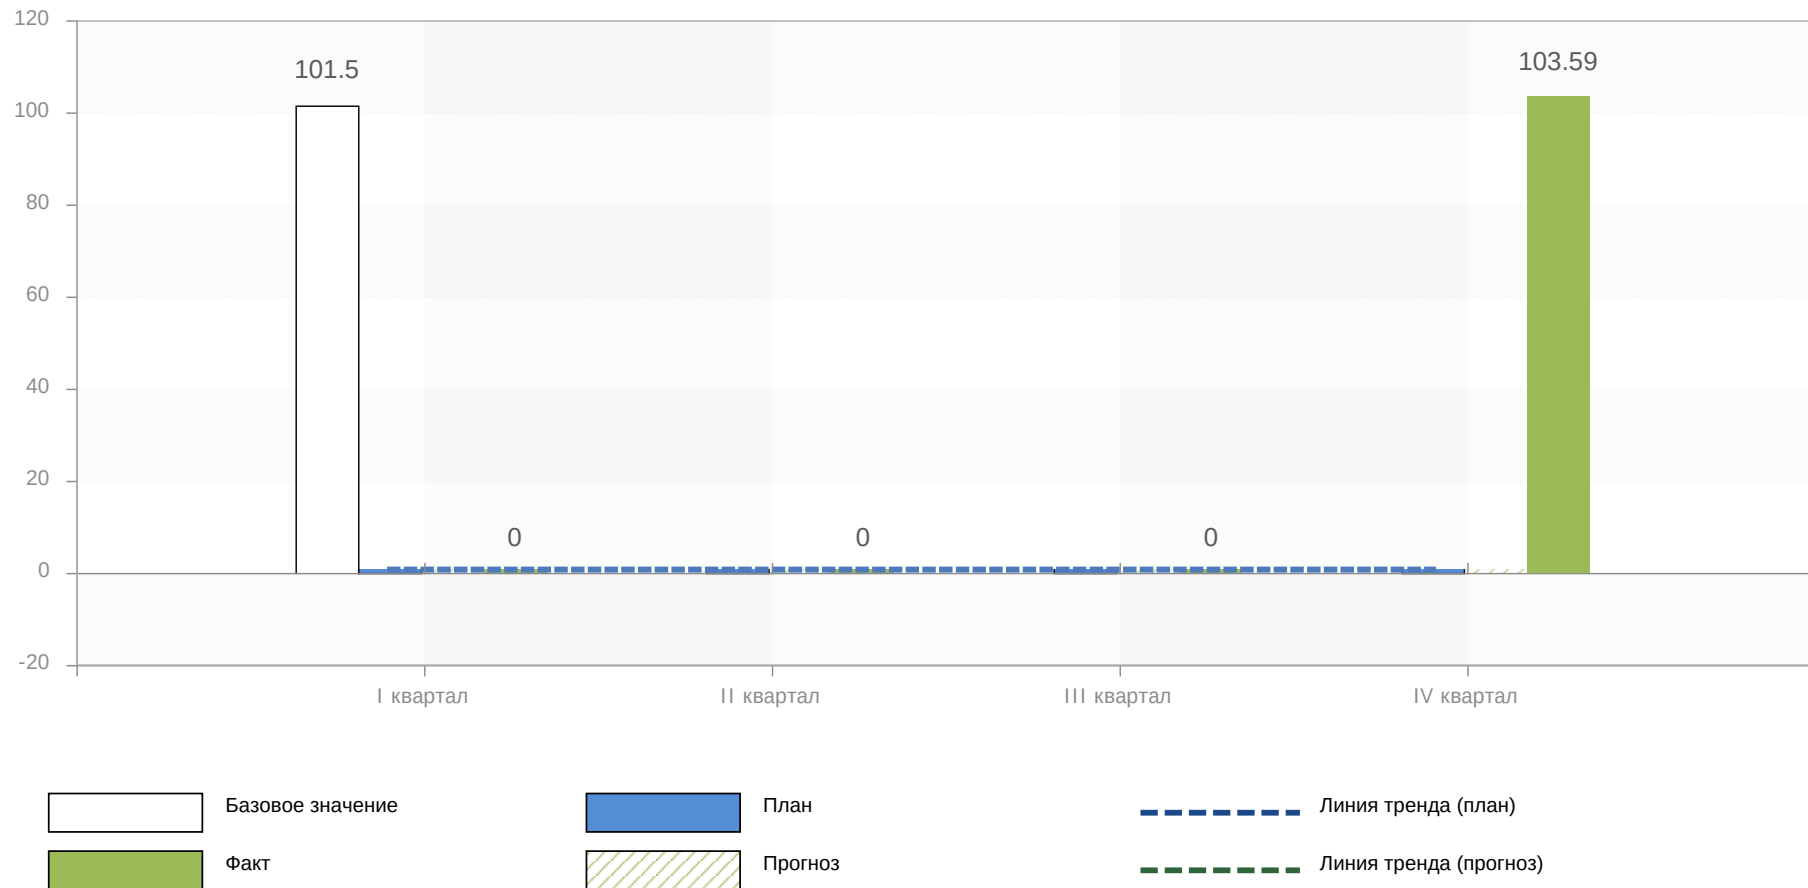


Рис. 4. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к предшествующему году
