

Руководитель
регионального проекта —
Чурина Елена Владимировна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

12.02.2021

Сертификат:

55155198986837ABBEFA0FB4FFAE9743EB2E20B

Владелец: Чурина Елена Владимировна

Действителен: с 13.01.2021 по 13.04.2022

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(18-32) Популяризация предпринимательства"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

В соответствии с дополнительным соглашением от 10 декабря 2020 г. №2019-180042-1/1 срок реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" завершен 31.12.2020

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом	Тысяча человек	0.548	0	0	0	2.193	2.193	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении показателей " Отчет государственного автономного учреждения Кемеровской области-Кузбасса "Мой бизнес" от 20.12.2020г. №б/н, приложен файл. Показатель сформирован нарастающим итогом, начиная с 01.01.2019 года, государственным автономным учреждением Кемеровской области-Кузбасса "Мой бизнес" в подтверждение приложен отчет о значении показателя, достигнутого в 2020 году.
2		Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом	Тысяча единиц	0.162	0	0	0	0.404	0.404	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении показателей " Отчет государственного автономного учреждения Кемеровской области-Кузбасса "Мой бизнес" от 20.12.2020г. №б/н, приложен файл. Информация о достижении показателя сформирована нарастающим итогом, начиная с 01.01.2019, государственным автономным учреждением Кемеровской области-Кузбасса "Мой бизнес" . в качестве подтверждающего документа указана информация о выполнении значения показателя в 2020 году.
3		Количество обученных основам	Тысяча	1.645	0	0	0	3.375	3.362	100,39%	Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении показателей "



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
		ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом	человек								Отчет государственного автономного учреждения Кемеровской области-Кузбасса "Мой бизнес" от 20.12.2020г. №б/н, приложен файл. Информация о выполнении показателя сформирована нарастающим итогом, начиная с 01.01.2019. В качестве подтверждающих документов приложена информация о выполнении показателя в 2020 году.
4		Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом	Тысяча человек	8.988	0	0	0	18.518	18.515	100,02%	Подтверждающие документы: 1. "Информация о выполнении показателей " Отчет государственного автономного учреждения Кемеровской области-Кузбасса "Мой бизнес" от 20.12.2020г. №б/н, приложен файл. Информация о фактическом значении показателя сформирована нарастающим итогом с 01.01.2019. В качестве подтверждающих документов указана информация о выполнении значения показателя в 2020 году.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 21 953,61 тыс. руб



Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед.	21 953,61	21 953,61	21 953,61	21 953,61	21 953,61	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	21 953,61	21 953,61	21 953,61	21 953,61	21 953,61	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	21 953,61	21 953,61	21 953,61	21 953,61	21 953,61	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			21 953,61	21 953,61	21 953,61	21 953,61	21 953,61	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			21 953,61	21 953,61	21 953,61	21 953,61	21 953,61	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			21 953,61	21 953,61	21 953,61	21 953,61	21 953,61	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		В Кемеровской области реализованы образовательные программы, курсы, в том числе, модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для действующих предпринимателей, школьников, лиц возрасте до 30 лет, в том числе, студентов, женщин, военнослужащих, уволенных в запас, лиц старше 45 лет, безработных, инвалидов, выпускников и воспитанников детских домов Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2019	 3
2		Реализовано обучение участников проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как обучающие программы АО "Корпорация "МСП" ("Азбука предпринимателя", "Мама-предприниматель", "Школа предпринимательства", а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам), обучающие программы Банка России и др. К 2024 году в Кемеровской области обучены навыкам предпринимательской деятельности не менее 7,7 тыс. чел. Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2019	 3
3		В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед. Значение: 162,0000 Дата: 20.12.2019	 4

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
4		В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед. Значение: 404,0000 Дата: 20.12.2020	
5		В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед. Значение: 1 115,0000 Дата: 20.12.2024	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			В Кемеровской области реализованы образовательные программы, курсы, в том числе, модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для действующих предпринимателей, школьников, лиц возрасте до 30 лет, в том числе, студентов, женщин, военнослужащих, уволенных в запас, лиц старше 45 лет, безработных, инвалидов, выпускников и воспитанников детских домов Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Форма реестра по показателю «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, тыс. человек» " Итоговый отчет Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. В Кемеровской области - Кузбассе реализованы образовательные программы, курсы, в том числе, модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: Выполнено.
1.1.	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено.
1.1.1	РПП		В Кемеровской области реализованы образовательные программы, курсы, в том числе, модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Форма реестра по показателю «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, тыс. человек» " Итоговый отчет Департамента по развитию

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.
1.2.	ПК		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "на оказание услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по организации и проведению межкластерного форума " Договор объекта инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства от 29.11.2019г. №ЦКР/3-8-1/4, приложен файл. 2. "На оказание услуг по подготовке и проведению предпринимательского поединка "Кто, если не мы? " Контракт Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 15.10.2019г. №ПП-2019, приложен файл. В рамках форума проведено 7 практико-ориентированных мероприятий "Бизнес-старт" и две модульные программы "Школа бизнеса. Управляй собой, командой. бизнесом", способствующих развитию деловой активности и обучению новым компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности, в ходе проведения предпринимательского поединка организовано обучение школьников региона основам ведения предпринимательской деятельности.
1.3.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Форма реестра по показателю «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							деятельности, нарастающим итогом, тыс. человек» "Итоговый отчет Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.
2.			Реализовано обучение участников проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как обучающие программы АО "Корпорация "МСП" ("Азбука предпринимателя", "Мама-предприниматель", "Школа предпринимательства", а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам), обучающие программы Банка России и др. К 2024 году в Кемеровской области обучены навыкам предпринимательской деятельности не менее 7,7 тыс. чел. Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчеты о проведении тренингов АО"Корпорация МСП" " Итоговый отчет тренеров АО "Корпорация МСП" от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: Выполнено.
2.1.	ПК		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты о проведении обучающих программ " Отчет Тренера АО "Корпорация МСП" от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.
2.1.1	РРП		В Кемеровской области реализованы образовательные программы, курсы, в	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			том числе. модульные направленные на развитие предпринимательских компетенций				Подтверждающие документы: 1. "Архив отчетов о проведении образовательных мероприятий " Итоговый отчет Тренера АО "Корпорация МСП" от 20.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "Архив отчетов о проведении образовательных мероприятий " Итоговый отчет Тренера АО "Корпорация МСП" от 20.12.2019г. №Б/н, указана ссылка.
2.2.	ПК		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты о проведении тренингов " Отчет Тренера АО "Корпорация МСП" от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.
2.3.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Форма реестра по показателю «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, тыс. человек» " Отчет Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.
3.			<i>В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие</i>	20.12.2019	20.12.2019	Чурина Е. В.	Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отченная информация о выполнении показателя. " Отчет Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 162 из 162.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед. Значение: 162,0000 Дата: 20.12.2019</i>				
3.1.	ПК		Закупка включена в план закупок	20.12.2019	12.08.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План - график закупок товаров для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации от 09.08.2019, опубликован на ЕИС 12.08.2019" Иное Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 12.08.2019г. №б/н, приложен файл.
3.1.1	РРП		Принято участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета в соответствующем бюджетном году	01.02.2019	29.01.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка субъекта Российской Федерации на получение субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации и участие в рассмотрении мероприятий субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии " Заявка Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.01.2019г. № И10-3/697, приложен файл.
3.1.2	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии с	15.02.2019	14.02.2019	Трихина В. В.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Минэкономразвития России в соответствующем бюджетном году				Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации " Соглашение с Минэкономразвития России от 14.02.2019г. №№ 139-09-2019-022, приложен файл.
3.2.	ПК		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	20.12.2019	18.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр контрактов" Реестр контрактов Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 18.12.2019г. №б/н, приложен файл.
3.3.	ПК		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	20.12.2019	16.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акты приемки оказанных услуг по исполненным государственным контрактам " Акт приема-передачи Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 16.12.2019г. №б/н, приложен файл. Мероприятие реализуется путем заключения и исполнения государственных контрактов. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате приемки выполненных работ по последнему контракту.
3.4.	ПК		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежные поручения " Платежное поручение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							20.12.2019г. №по реестру , приложен файл. Оплата оказанных услуг произведена поэтапно по мере завершения реализации мероприятий и исполнения государственных контрактов. Дата исполнения соответствует дате последнего платежного поручения в декабре 2019 года.
4.			<i>В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед. Значение: 404,0000 Дата: 20.12.2020</i>	20.12.2020	20.12.2020	Чурина Е. В.	Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет государственного автономного учреждения Кемеровской области-Кузбасса "Мой бизнес" " Отчет государственного автономного учреждения Кемеровской области-Кузбасса "Мой бизнес" от 20.12.2020г. №б/н, приложен файл. Результат сформирован нарастающим итогом, начиная с 01.01.2019, государственным автономным учреждением Кемеровской области-Кузбасса "Мой бизнес " в подтверждение приложен отчет о значении результата, достигнутого в 2020 году Предоставлена информация : 404 из 404.
4.1.	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	20.12.2020	01.11.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 14.12.2019 №139-09-2019-022" Соглашение Правительства Кемеровской области-

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Кузбасса от 25.12.2019г. №139-09-2019-022/2, приложен файл. Документы, необходимые для оказания услуги сформированы 25 декабря 2019 года путем подписания соглашения с Минэкономразвития России. Контрольная точка внесена в региональный проект при его корректировке в ноябре 2020 года, как типовая точка вида результата. Поскольку в системе введена функция версионирования, внести корректную дату исполнения контрольной точки не представляется возможным. Принимая во внимание, что контрольная точка выполнена до наступления отчетного периода, в качестве даты исполнения проставлен первый день отчетного периода.
4.2.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2020	01.11.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежные поручения о предоставлении субсидии " Платежное поручение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса от 28.09.2020г. №б/н, приложен файл. Услуга оказана (работы выполнены) путем перечисления средств бюджета государственному автономному учреждению Кемеровской области-Кузбасса "Мой бизнес". Фактически дата исполнения контрольной точки соответствует дате последнего платежного поручения - 28.09.2020, Контрольная точка утверждена в рег проекте , как типовая для данного вида результата при внесении изменений в региональный проект в ноябре 2020 года. Корректную дату исполнения невозможно отобразить в связи с версионированием системы, принимая во внимание, что контрольная точка выполнена до наступления отчетного периода, в качестве даты исполнения проставлен первый день отчетного периода.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.3.	ПК		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	20.12.2020	28.07.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из бюджета Кемеровской области субсидии в соответствии вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации " Соглашение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса от 28.07.2020г. №20-2020-08120, приложен файл.
4.4.	ПК		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	20.12.2020	20.12.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет государственного автономного учреждения Кемеровской области-Кузбасса "Мой бизнес" от 20.12.2020г. №б/н, приложен файл.
5.			<i>В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в</i>	20.12.2024	31.12.2020	Чурина Е. В.	Завершено.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" на территории Кемеровской области-Кузбасса " Соглашение Минэкономразвития России от 10.12.2020г. №2019-180042-1/1, приложен файл. В соответствии с дополнительным соглашением, заключенным с Минэкономразвития России 10.02.2020 № 2019-180042-1/1, реализация проекта прекращена 31.12.2020 Предоставлена информация : 404 из 1115.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			2024 году - 7000 ед. Значение: 1 115,0000 Дата: 20.12.2024				

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек

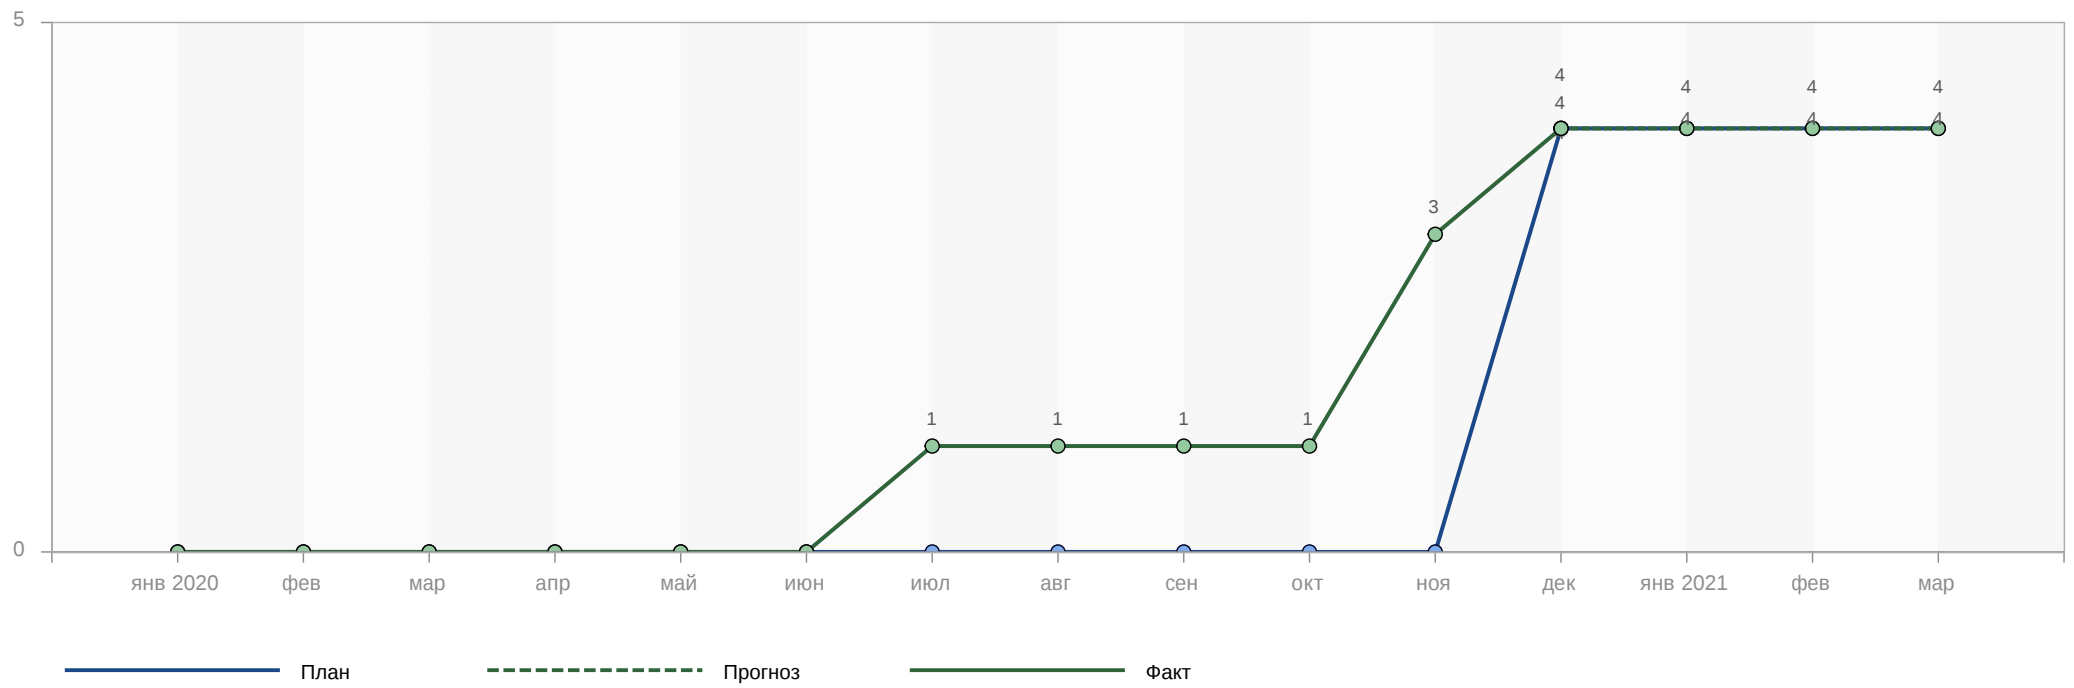


Рис. 1. "(18-32) Популяризация предпринимательства"

График достижения показателя

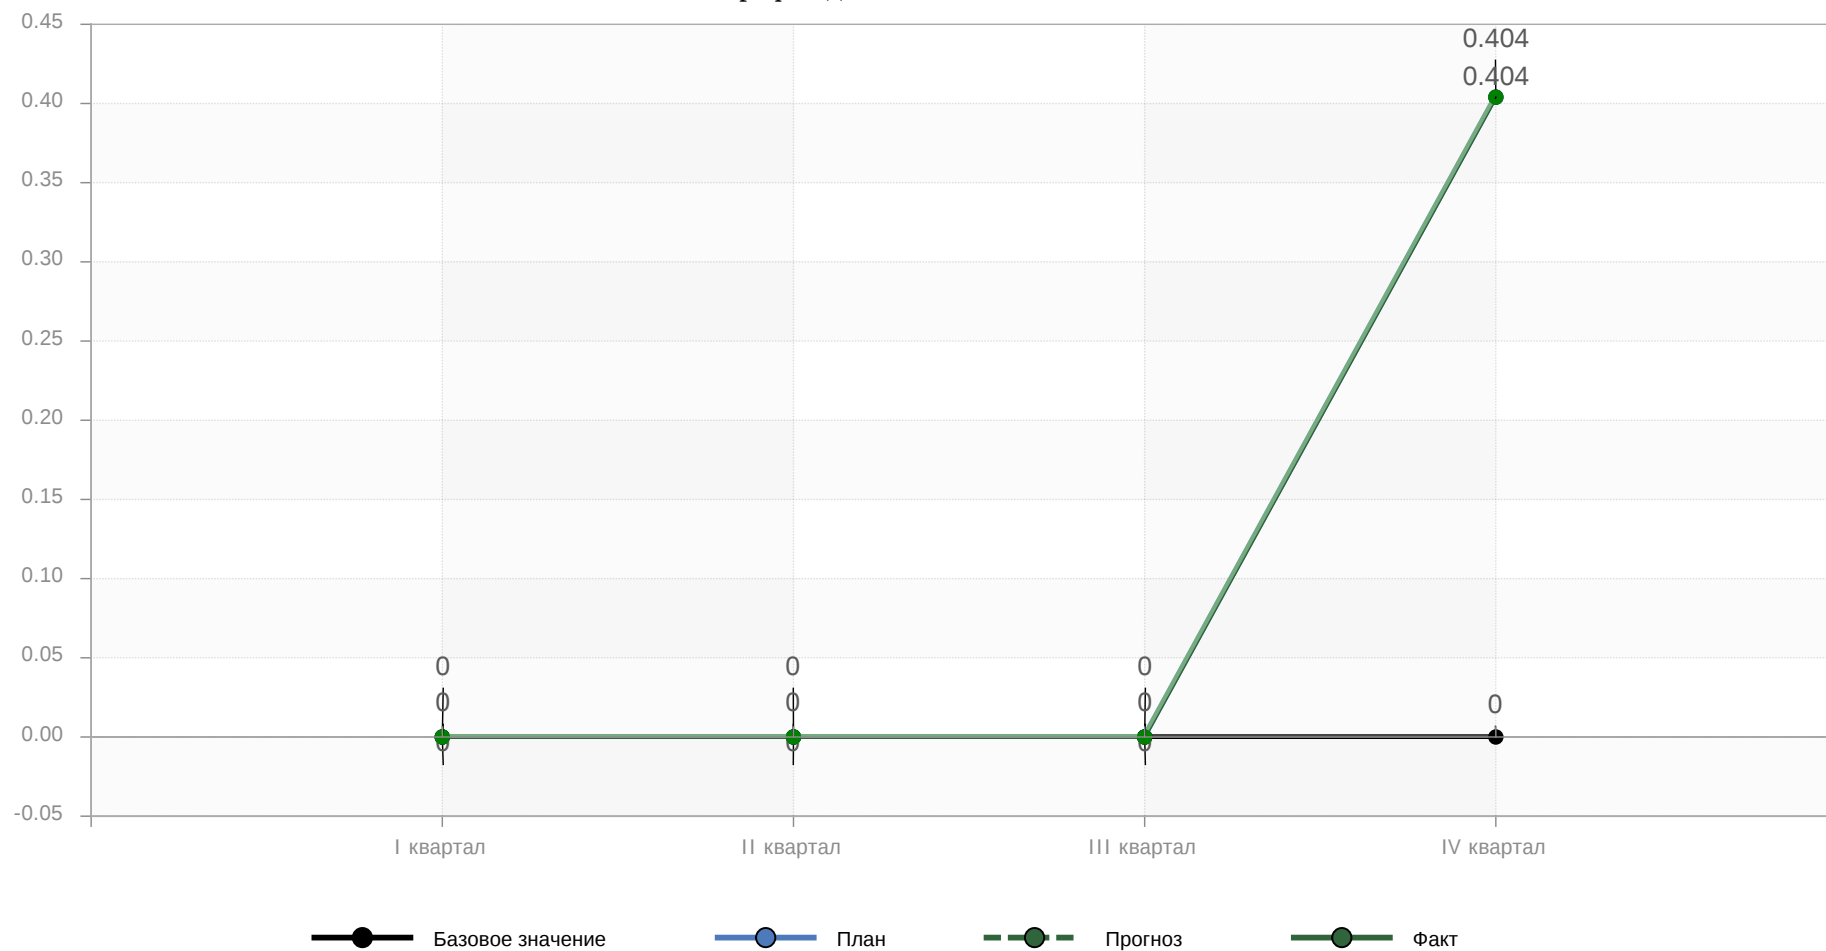


Рис. 1. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя

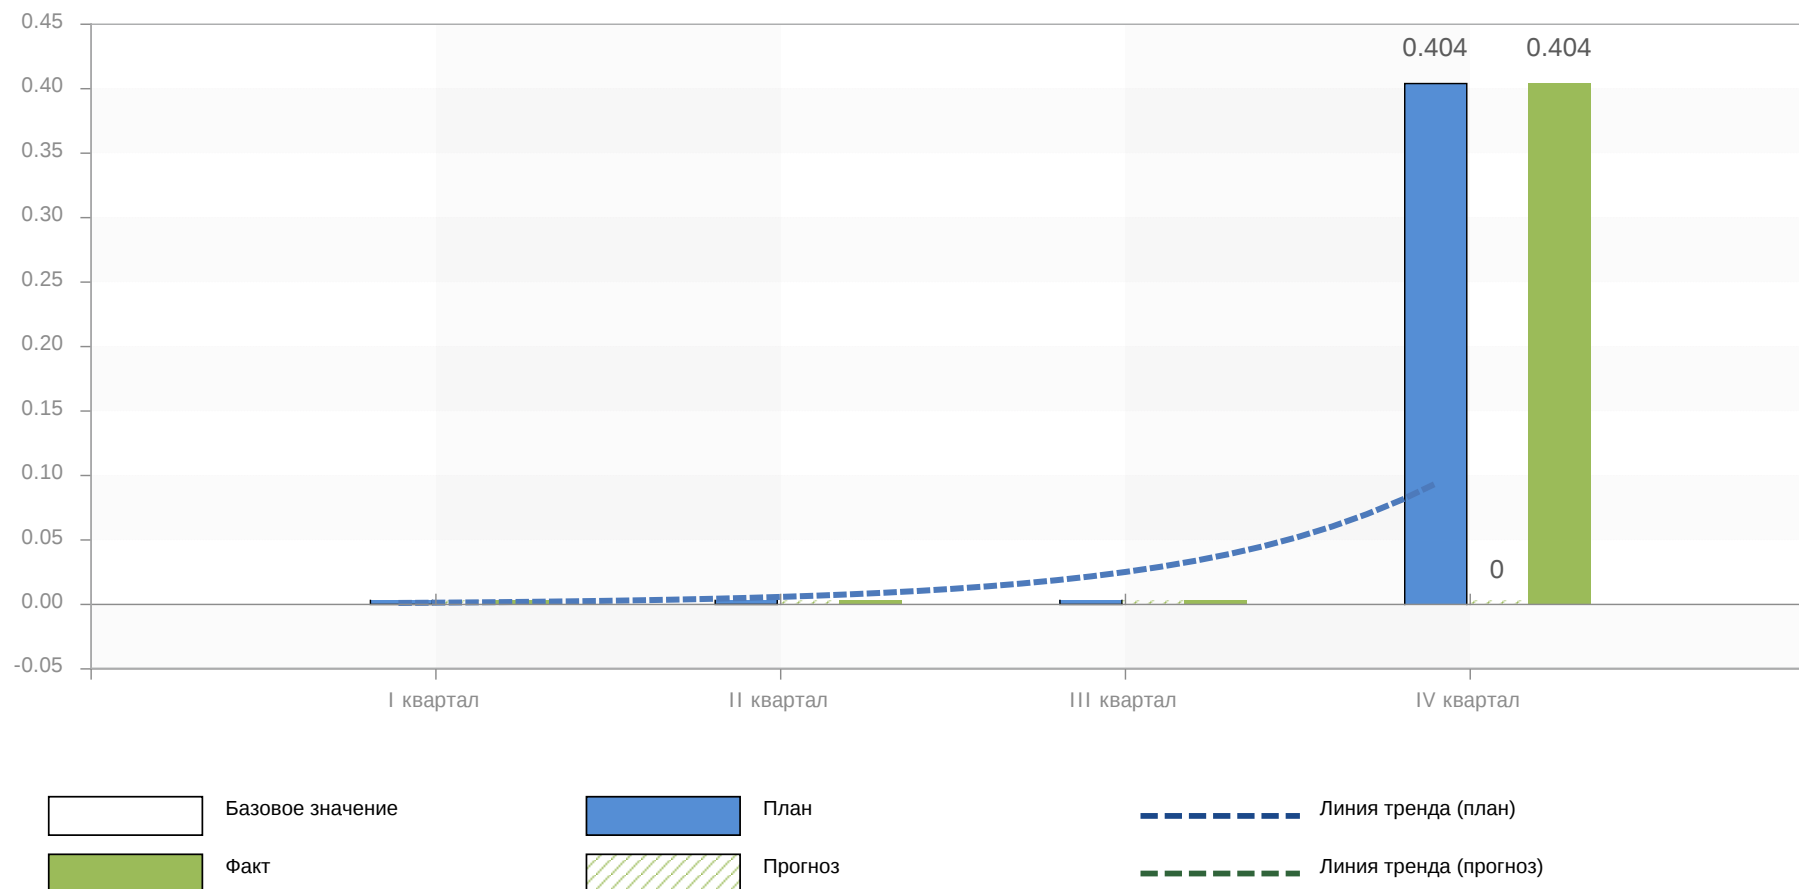


Рис. 2. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом

График достижения показателя

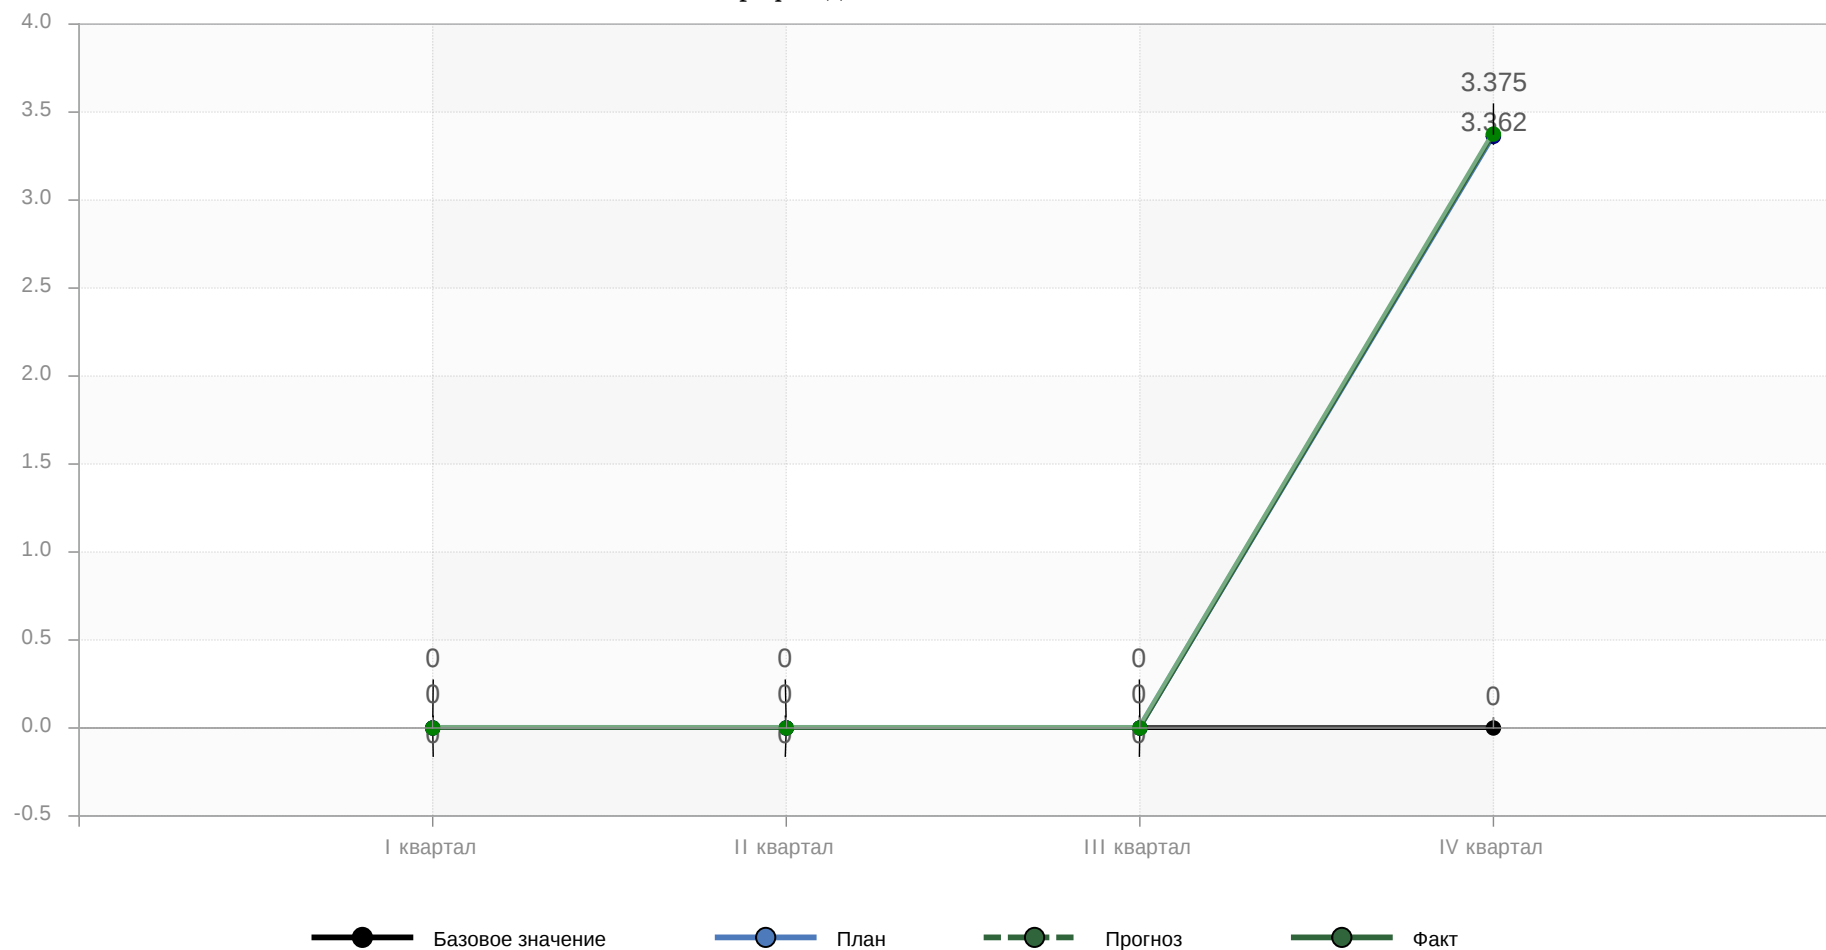


Рис. 3. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя

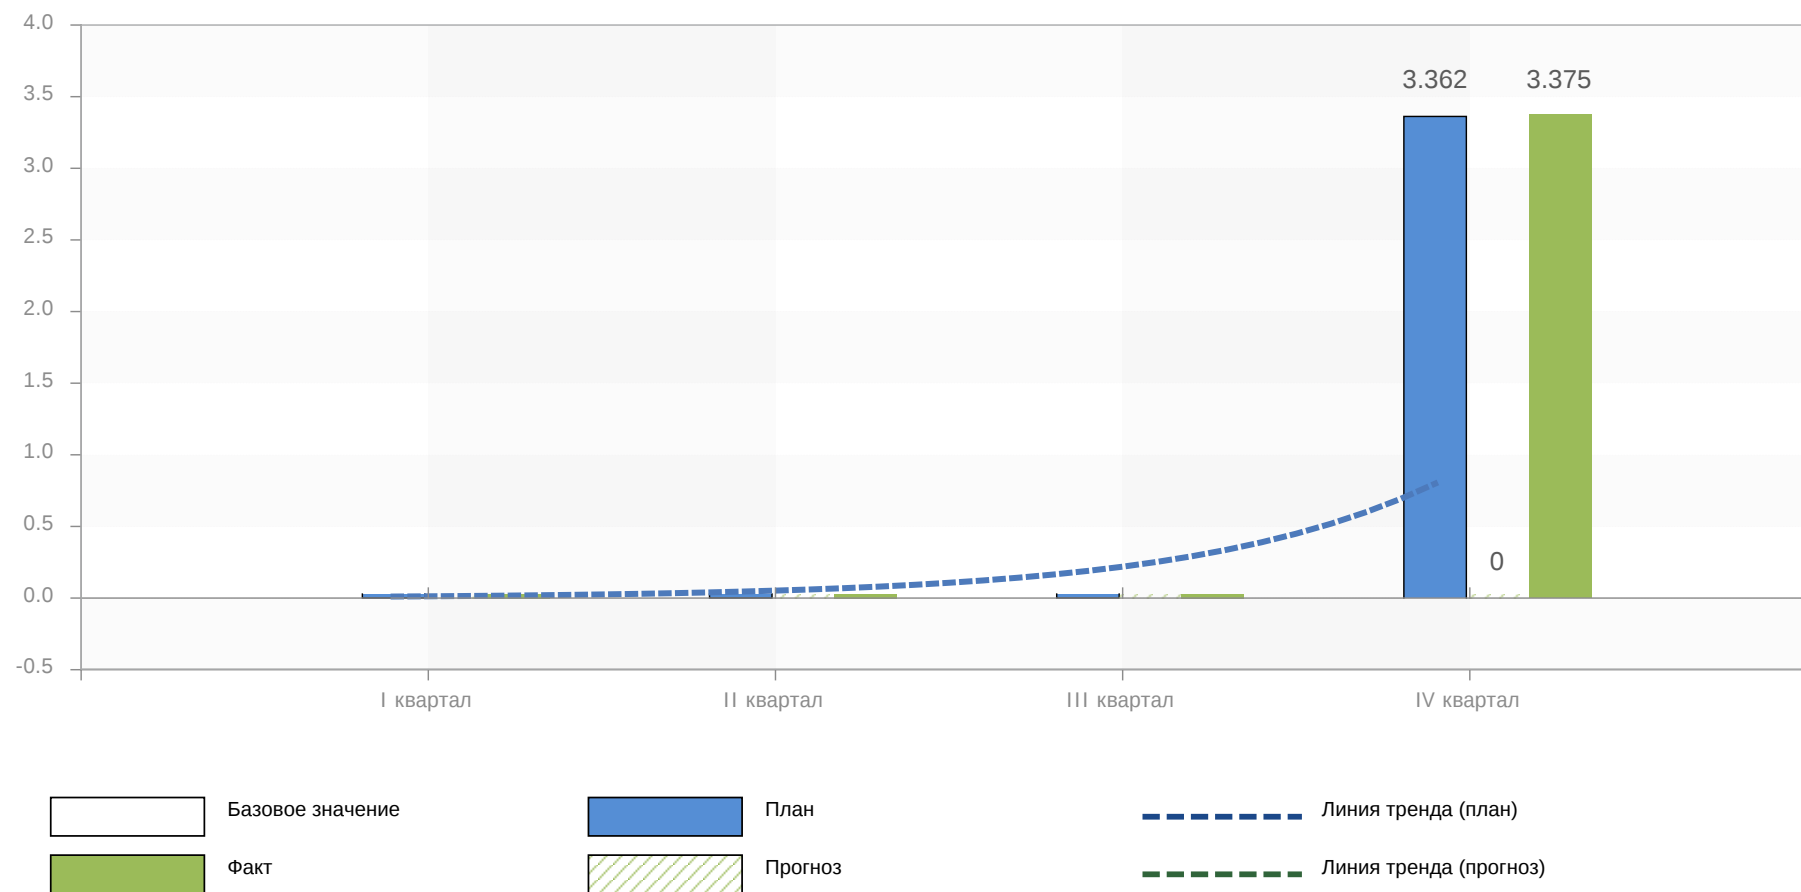


Рис. 4. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом

График достижения показателя

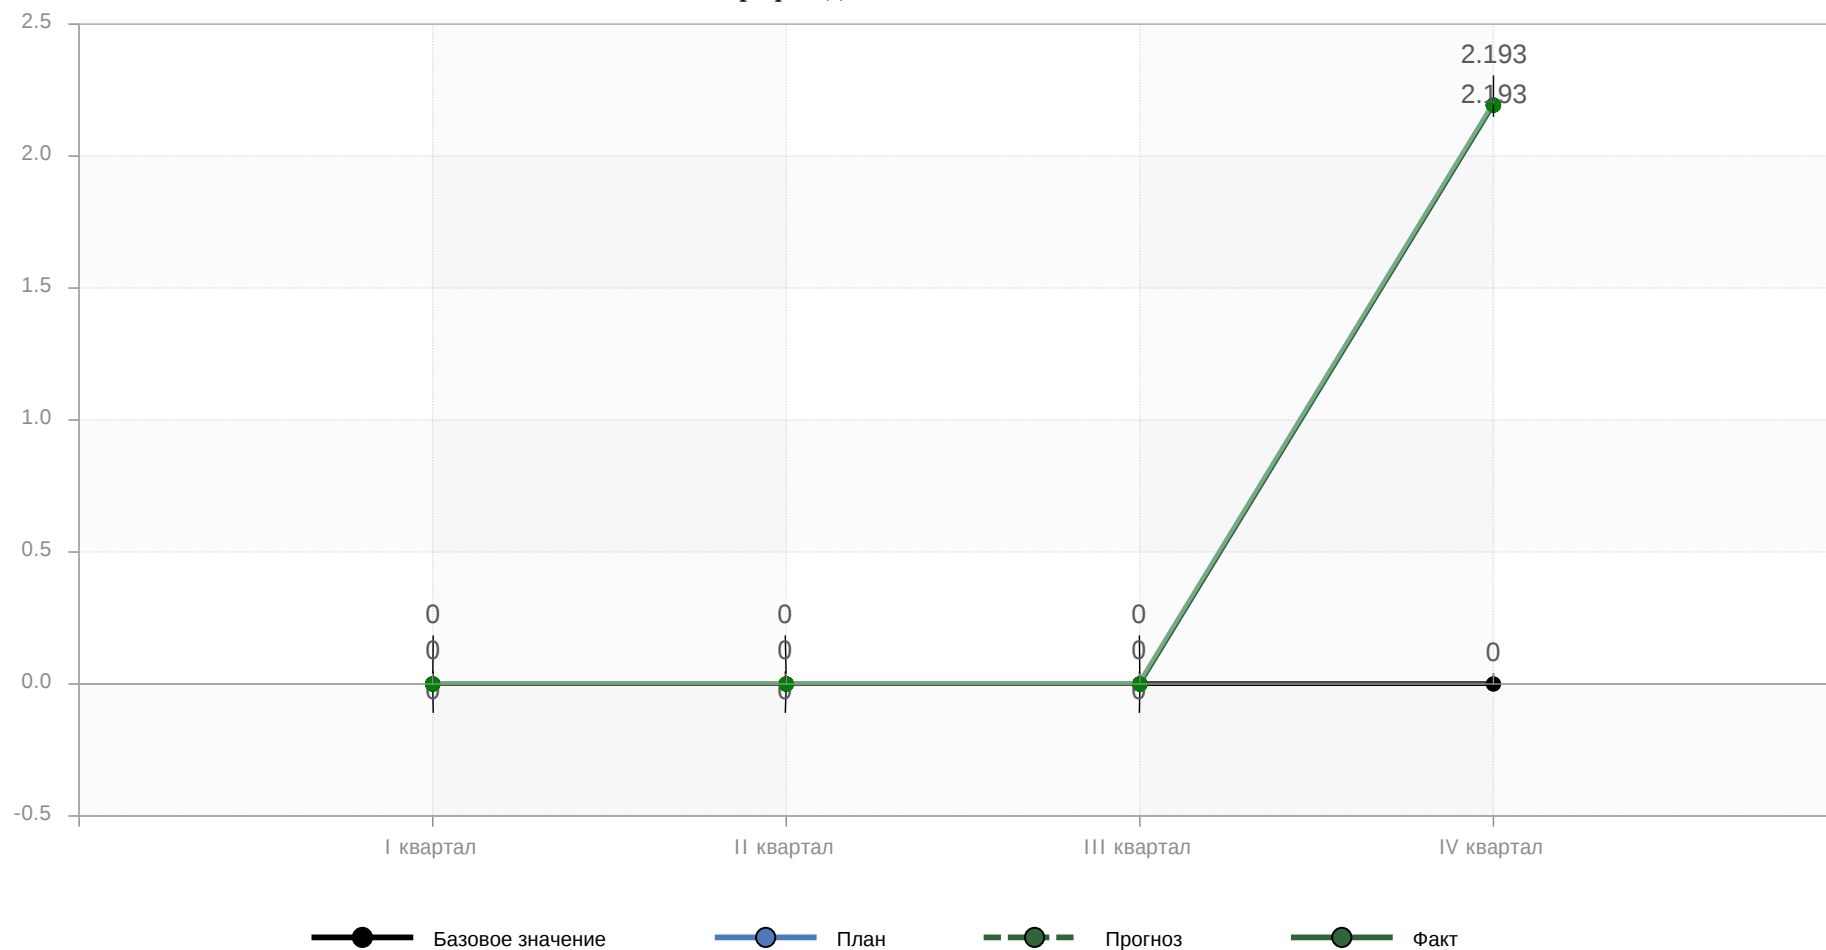


Рис. 5. Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя

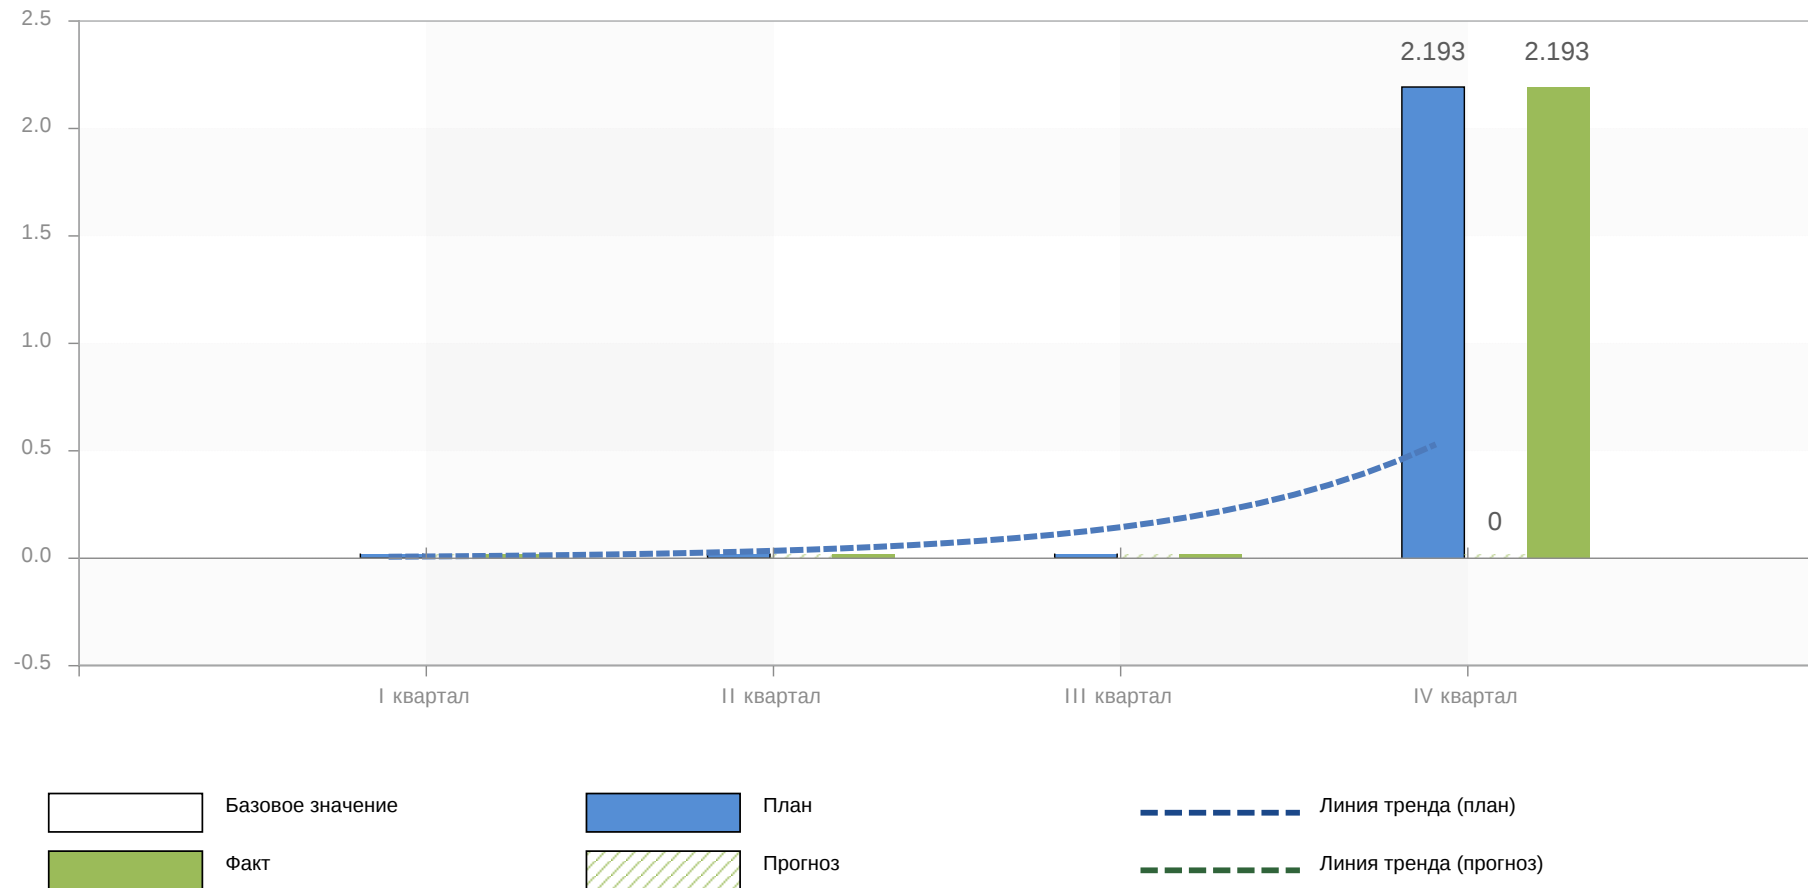


Рис. 6. Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом

График достижения показателя

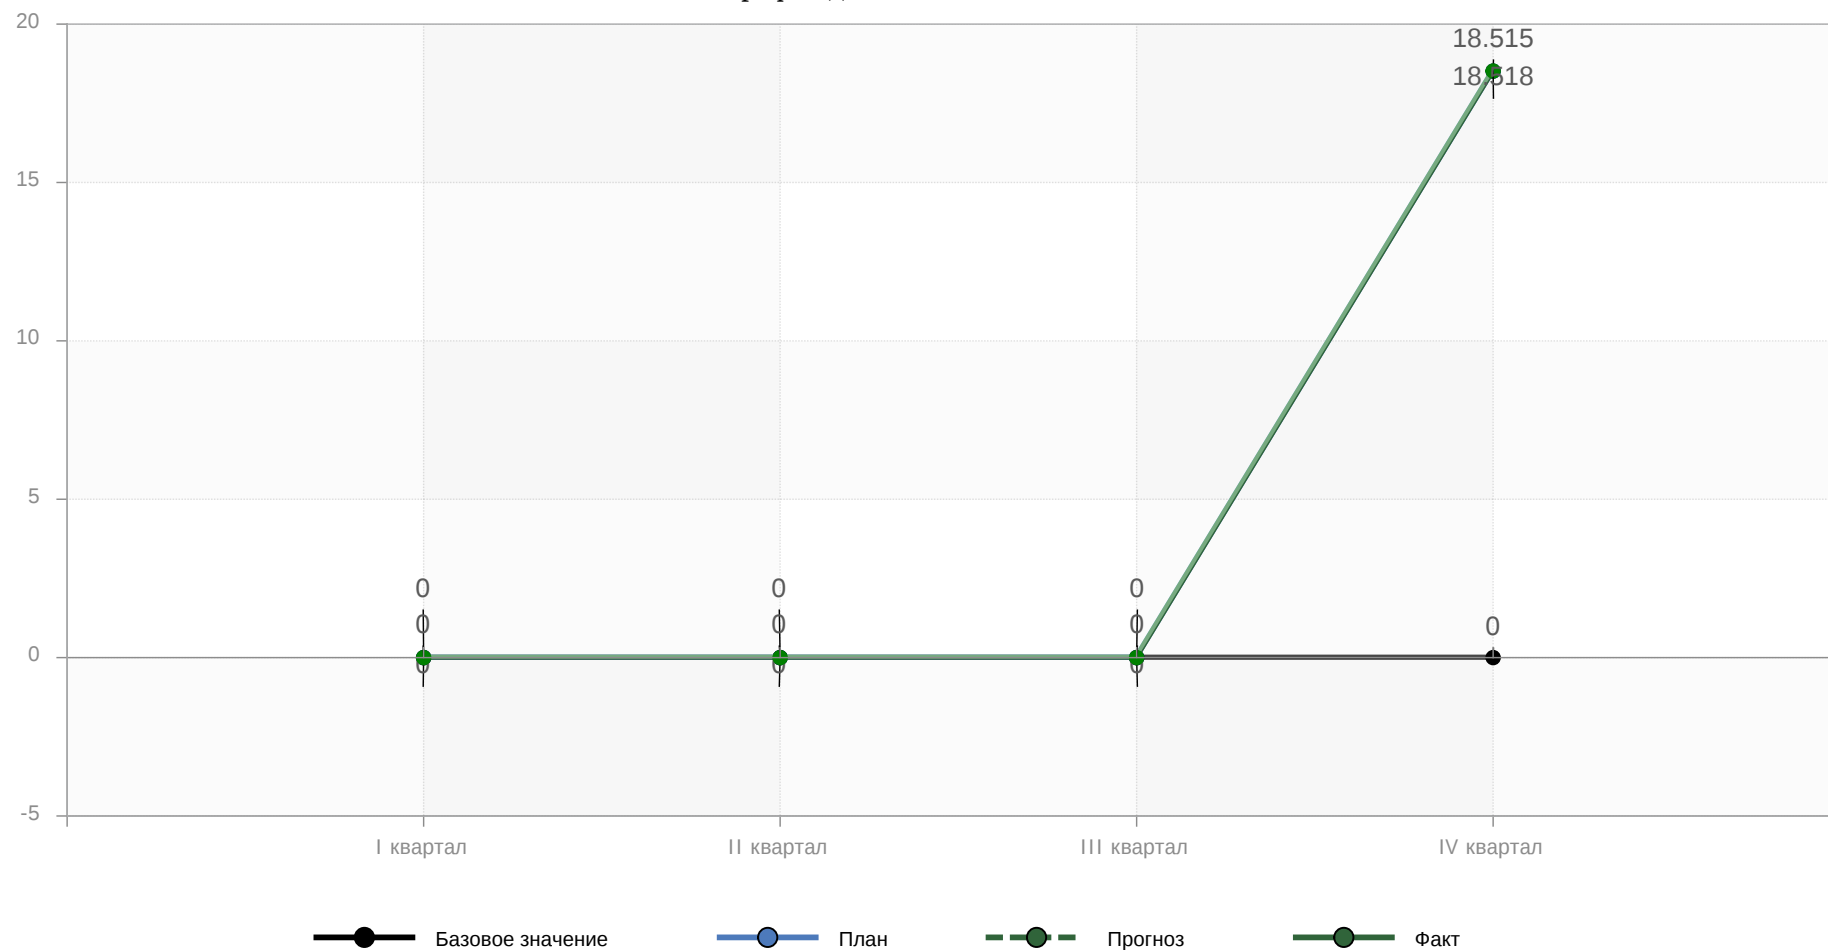


Рис. 7. Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя

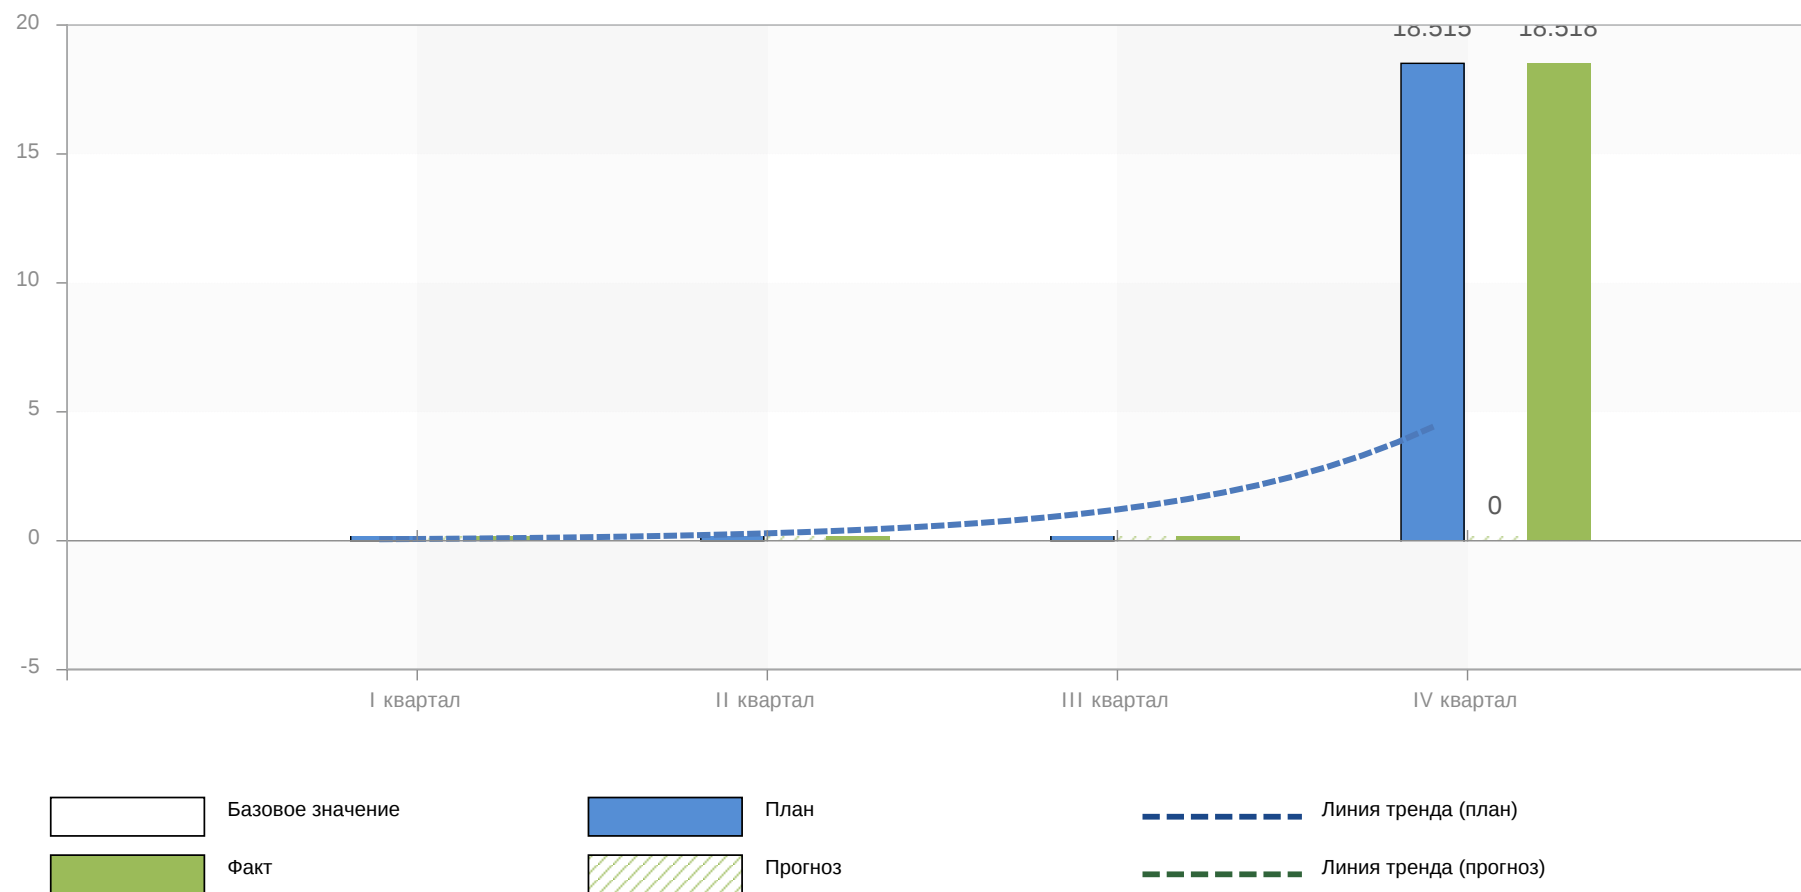


Рис. 8. Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом
