

Руководитель
регионального проекта —
Высоцкий Сергей Васильевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

25.05.2020

Сертификат:
7F77C27B99EABBE04DA4DE1675A3417C7C4D5CD

Владелец: Высоцкий Сергей Васильевич

Действителен: с 10.04.2020 по 10.07.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(G4-32) Чистый воздух (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1		5. Финансовое обеспечение	Неполное освоение средств, Причина риска: Данные по освоенным средствам за декабрь 2019 года не представлены АО «РУСАЛ Новокузнецк». АО «Кузнецкие ферросплавы» освоили 68,04 млн. рублей из запланированных 200 млн. рублей, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Стоимостные: 91900.00 тыс. руб.; Сутевые: несвоевременное выполнение мероприятий	1. Своевременное предоставление отчетов о реализации мероприятий со стороны промышленных предприятий, срок исполнения 31.01.2020;



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год	Процент	100	100	96	96	96	98	100,00%	
2		Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха	Штука	1	1	1	1	1	1	100,00%	
3		Снижение совокупного объема выбросов в городе Новокузнецке за отчетный период	Процент	100	100	96	96	96	96	100,00%	
4		Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха	Штука	1	1	1	1	1	1	100,00%	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2019 год
Всего: 970 500,00 тыс. руб



(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(06) В городе Новокузнецк снижен совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за отчетный год.	970 500,00	0,00	0,00	0,00	878 600,00	90,53	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	970 500,00	0,00	0,00	0,00	878 600,00	90,53	G4.01.06: Существует риск: Неполное освоение средств, Причина риска: Данные по освоенным средствам за декабрь 2019 года не представлены АО «РУСАЛ Новокузнецк».

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									АО «Кузнецкие ферросплавы» освоили 68,04 млн. рублей из запланированных 200 млн. рублей, Вероятность: 10%, Стоимостные: 91 900,00 тыс. руб. Предлагаемые решения: 1. Своевременное предоставление отчетов о реализации мероприятий со стороны промышленных предприятий, срок исполнения 31.01.2020.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			970 500,00	0,00	0,00	0,00	878 600,00	90,53	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			970 500,00	0,00	0,00	0,00	878 600,00	90,53	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Утвержден и актуализирован комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Новокузнецк	
2		Проведен анализ мероприятий, включенных в комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа данных инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха	
3		В городе Новокузнецк снижен совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за отчетный год.	
4		В городе Новокузнецке снижен уровень загрязнения атмосферного воздуха	
5		Сформирован портфель инвестиционных проектов по снижению выбросов в атмосферу в городе Новокузнецке	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены





 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Утвержден и актуализирован комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Новокузнецк. Значение: 1, на дату 01.09.2020	01.09.2020	09.01.2019	Высоцкий С. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке" Иное Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева от 28.12.2018г. №11015п-П6, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
1.1	ПК		Документ утвержден (подписан)	09.01.2019	28.12.2018	Высоцкий С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке" Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева от 28.12.2018г. № 11015п-П6, приложен файл.
1.1.1	РРП		Разработан и утвержден комплексный план снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Новокузнецка	09.01.2019	28.12.2018	Высоцкий С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке" Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева от 28.12.2018г. № 11015п-П6, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2			Проведен анализ мероприятий, включенных в комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа данных инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Значение: 1, на дату 01.06.2019	01.06.2019	30.04.2019	Высоцкий С. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Запрос на внесение изменений в комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Новокузнецка" Сопроводительное письмо Управления Росприроднадзора по Кемеровской области от 30.04.2019г. №04-04/2423, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
2.1			Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	01.06.2019	30.04.2019	Высоцкий С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Запрос на внесение изменений в комплексный план мероприятий" Сопроводительное письмо Управления Росприроднадзора по Кемеровской области от 30.04.2019г. №04-04/2423, приложен файл.
2.2			Проведен анализ мероприятий, включенных в комплексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа данных инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха	01.04.2019	01.04.2019	Высоцкий С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Запрос на внесение изменений в комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке" от г. №, приложен файл.
2.2.1	РРП		Анализ мероприятий, включенных в комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке с учетом инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа данных инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха	01.04.2019	01.04.2019	Высоцкий С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Запрос на внесение изменений в комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке" от г. №, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.3			Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	01.04.2019	01.04.2019	Высоцкий С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Запрос на внесение изменений в комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке" от г. №, приложен файл.
2.3.1	РРП		Согласование изменений, вносимых в комплексный план мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух в г. Новокузнецке	01.04.2019	01.04.2019	Высоцкий С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Запрос на внесение изменений в комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке" от г. №, приложен файл.
2.4			Документ утвержден (подписан)	01.06.2019	30.04.2019	Высоцкий С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Запрос на внесение изменений в комплексный план мероприятий" Сопроводительное письмо Управления Росприроднадзора по Кемеровской области от 30.04.2019г. №04-04/2423, приложен файл.
2.5			Документ опубликован	01.06.2019	30.04.2019	Высоцкий С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Запрос на внесение изменений в комплексный план мероприятий" Сопроводительное письмо Управление Росприроднадзора по Кемеровской области от 30.04.2019г. №04-04/2423, приложен файл.
2.6	ПК		Документ разработан	01.06.2019	30.04.2019	Высоцкий С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Запрос на внесение изменений в комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Новокузнецка" Сопроводительное письмо Управления Росприроднадзора по Кемеровской области от 30.04.2019г. №04-04/2423, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.6.1	РРП		Запрос на внесение изменений в комплексный план мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух в г. Новокузнецке направлен в проектный офис федерального проекта "Чистый воздух"	01.06.2019	30.04.2019	Высоцкий С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Запрос на внесение изменений в комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Новокузнецка" Сопроводительное письмо Управления Росприроднадзора по Кемеровской области от 30.04.2019г. №04-04/2423, приложен файл.
3			<i>В городе Новокузнецк снижен совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за отчетный год. Значение: 95, на дату 31.12.2021</i>	31.12.2021	31.12.2021	Высоцкий С. В.	Информация по значению результата: В работе. В работе Предоставлена информация : 95 из 95. Информация по результату: Существует риск: Неполное освоение средств, Причина риска: Данные по освоенным средствам за декабрь 2019 года не представлены АО «РУСАЛ Новокузнецк». АО «Кузнецкие ферросплавы» освоили 68,04 млн. рублей из запланированных 200 млн. рублей, Вероятность: 10%, Стоимостные: 91 900,00 тыс. руб.
3.1			Реализованы мероприятия, предусмотренные комплексными планами мероприятий по снижению совокупного объема выбросов за плановый период	01.04.2020	01.04.2020	Высоцкий С. В.	В работе.
3.1.1	РРП		Разработка и утверждение проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов на плановый период.	25.12.2019	25.12.2019	Высоцкий С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении регионального проекта" Письмо департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области от 25.12.2019г. №9661-ос, приложен файл.
4			<i>В городе Новокузнецке снижен уровень загрязнения атмосферного воздуха Значение: 1, на дату 31.12.2021</i>	31.12.2021	31.12.2021	Высоцкий С. В.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.1			Реализованы мероприятия, предусмотренные комплексными планами мероприятий по снижению совокупного объема выбросов за плановый период.	31.12.2021	31.12.2021	Высоцкий С. В.	В работе.
4.1.1	РРП		Разработка и утверждение проектно- сметной документации на строительство и реконструкцию объектов на плановый период.	25.12.2019	25.12.2019	Высоцкий С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении регионального проекта" Письмо департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области от 25.12.2019г. №9661-ос, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5			<i>Сформирован портфель инвестиционных проектов по снижению выбросов в атмосферу в городе Новокузнецке Значение: 1, на дату 25.12.2019</i>	25.12.2019	24.12.2019	Высоцкий С. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистый воздух (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Соглашение Руководителя федерального проекта от 24.12.2019г. № 051-2019-G4005 -1/2, приложен файл. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистый воздух (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области - Кузбасса срок достижения результата перенесен на 31.12.2023 Информация по результату: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистый воздух (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Соглашение Руководителя федерального проекта от 24.12.2019г. №051-2019-G4005 -1/2, приложен файл. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистый воздух (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области - Кузбасса срок достижения результата перенесен на 31.12.2023

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.1			Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	25.12.2019	24.12.2019	Высоцкий С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистый воздух (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Соглашение Руководителя федерального проекта от 24.12.2019г. № 051-2019-G4005-1/2" Соглашение Руководителя федерального проекта от 24.12.2019г. №051-2019-G4005-1/2, приложен файл. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистый воздух (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области - Кузбасса срок достижения результата перенесен на 31.12.2023.
5.2			Документ разработан	25.12.2019	24.12.2019	Высоцкий С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистый воздух (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области - Кузбасса"" Соглашение Соглашение Руководителя федерального проекта от 24.12.2019г. № 051-2019-G4005-1/2, приложен файл. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистый воздух (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области - Кузбасса срок достижения результата перенесен на 31.12.2023.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.3			Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	25.12.2019	24.12.2019	Высоцкий С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистый воздух (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Руководителя федерального проекта от 24.12.2019г. №051-2019-G4005-1/2, приложен файл. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистый воздух (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области - Кузбасса срок достижения результата перенесен на 31.12.2023.
5.4			Документ опубликован	25.12.2019	24.12.2019	Высоцкий С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистый воздух (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Руководителя федерального проекта от 24.12.2019г. №051-2019-G4005-1/2, приложен файл. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистый воздух (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области - Кузбасса срок достижения результата перенесен на 31.12.2023.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.5	ПК		Сформирован портфель инвестиционных проектов по снижению выбросов в атмосферу г. Новокузнецка	25.12.2019	24.12.2019	Высоцкий С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистый воздух (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Соглашение Руководителя федерального проекта от 24.12.2019г. №051-2019-G4005 -1/2, приложен файл. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистый воздух (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области - Кузбасса срок достижения контрольной точки перенесен на 31.12.2023
5.5.1	РПП		Формирование портфеля инвестиционных проектов по снижению выбросов в атмосферу г. Новокузнецка	25.12.2019	24.12.2019	Высоцкий С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистый воздух (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Соглашение Руководителя федерального проекта от 24.12.2019г. №051-2019-G4005 -1/2, приложен файл. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистый воздух (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области - Кузбасса срок реализации данного мероприятия перенесено на 31.12.2023

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.6			Документ утвержден (подписан)	25.12.2019	24.12.2019	Высоцкий С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистый воздух (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Руководителя федерального проекта от 24.12.2019г. №051-2019-G4005-1/2, приложен файл. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистый воздух (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области - Кузбасса срок достижения результата перенесен на 31.12.2023.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек

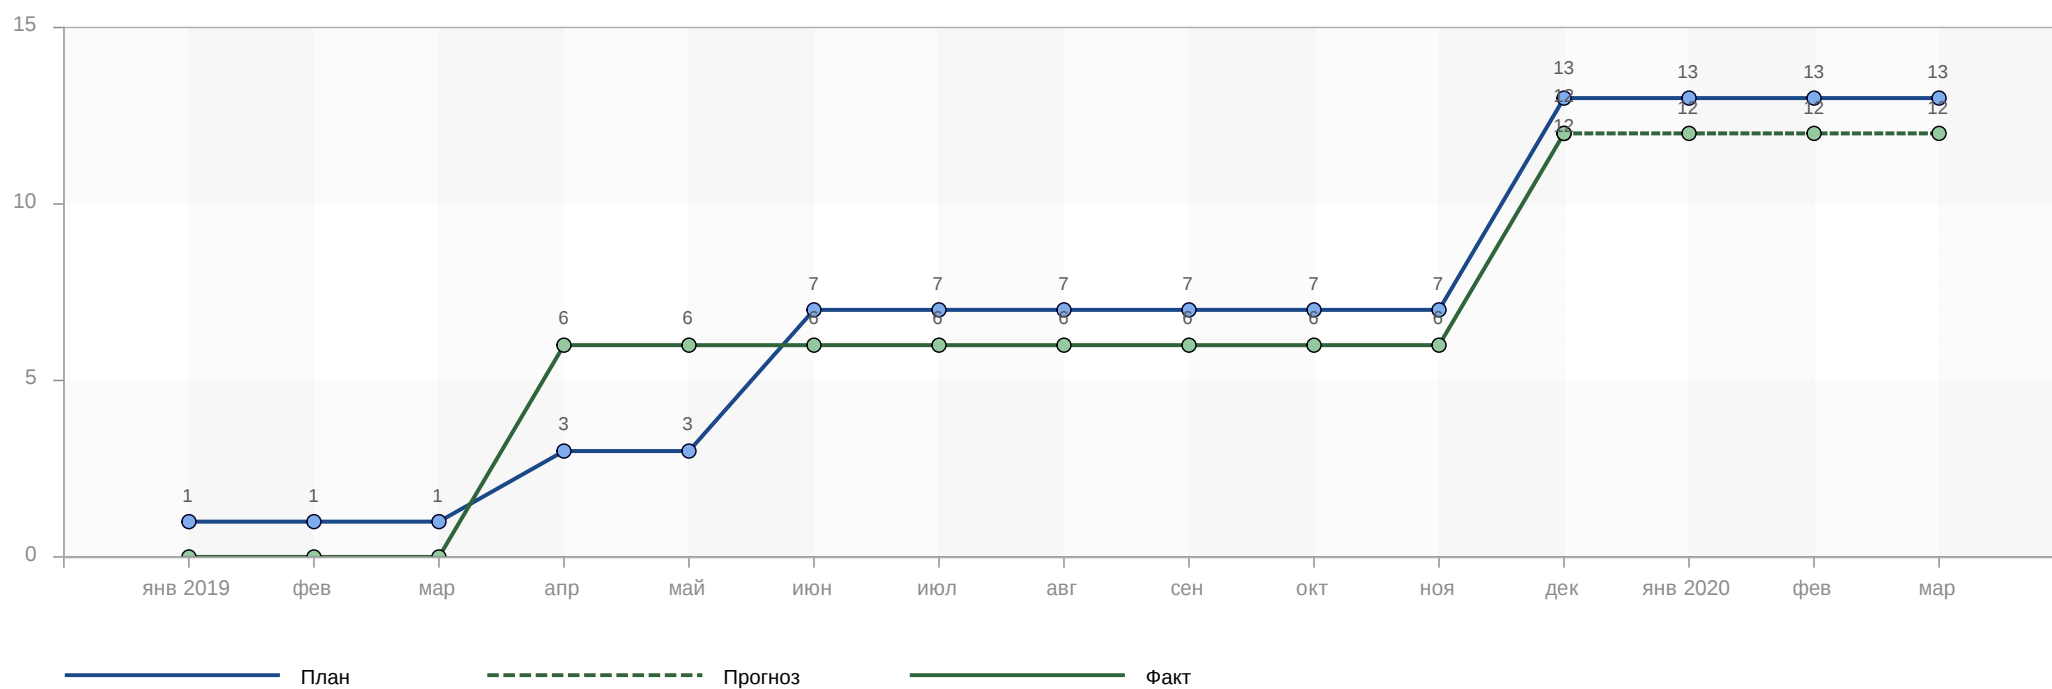


Рис. 1. "(G4-32) Чистый воздух (Кемеровская область)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

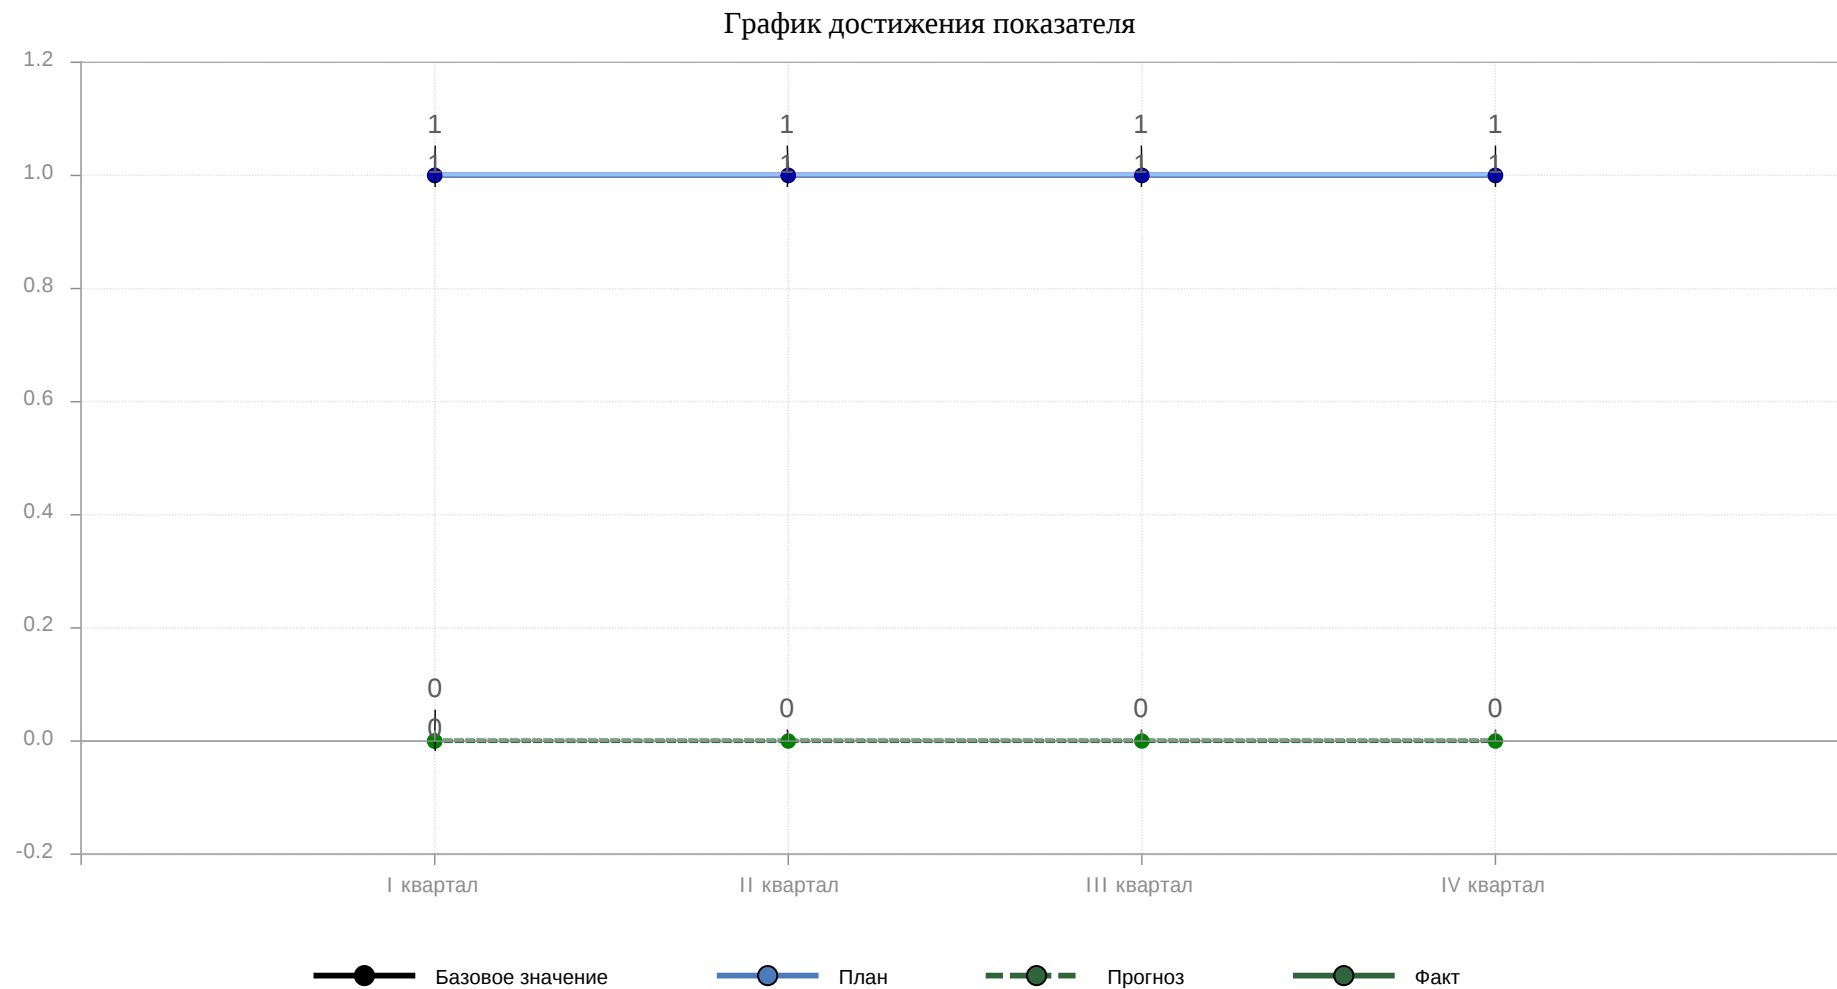


Рис. 1. Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха

Диаграмма достижения показателя

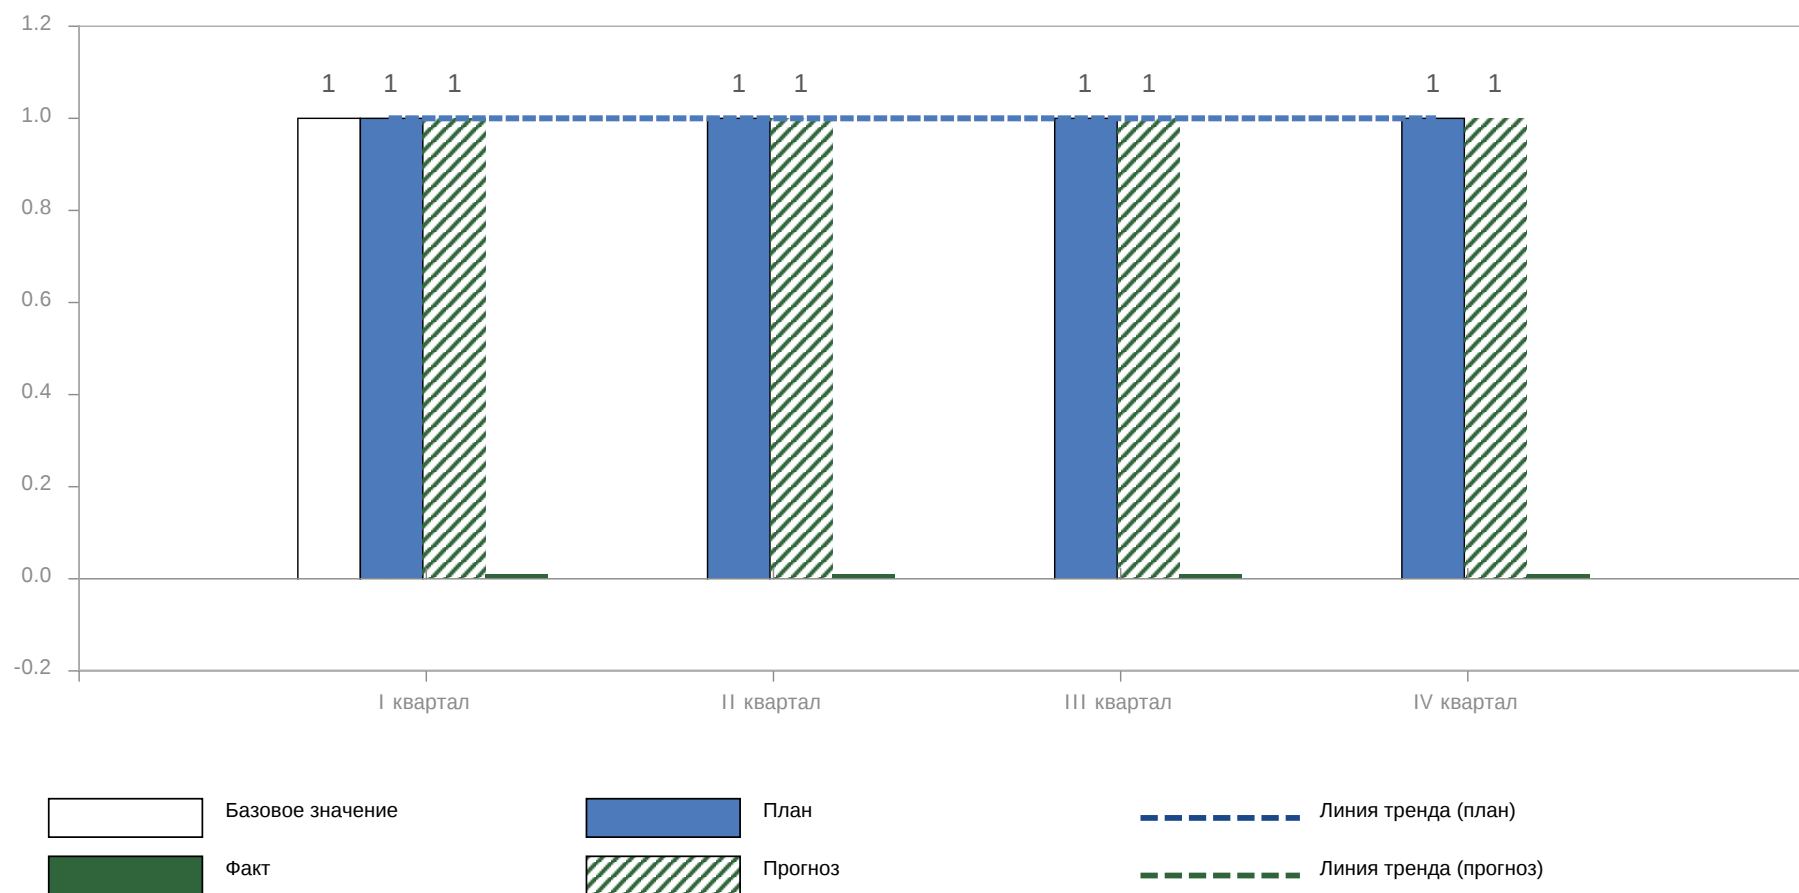


Рис. 2. Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха

График достижения показателя

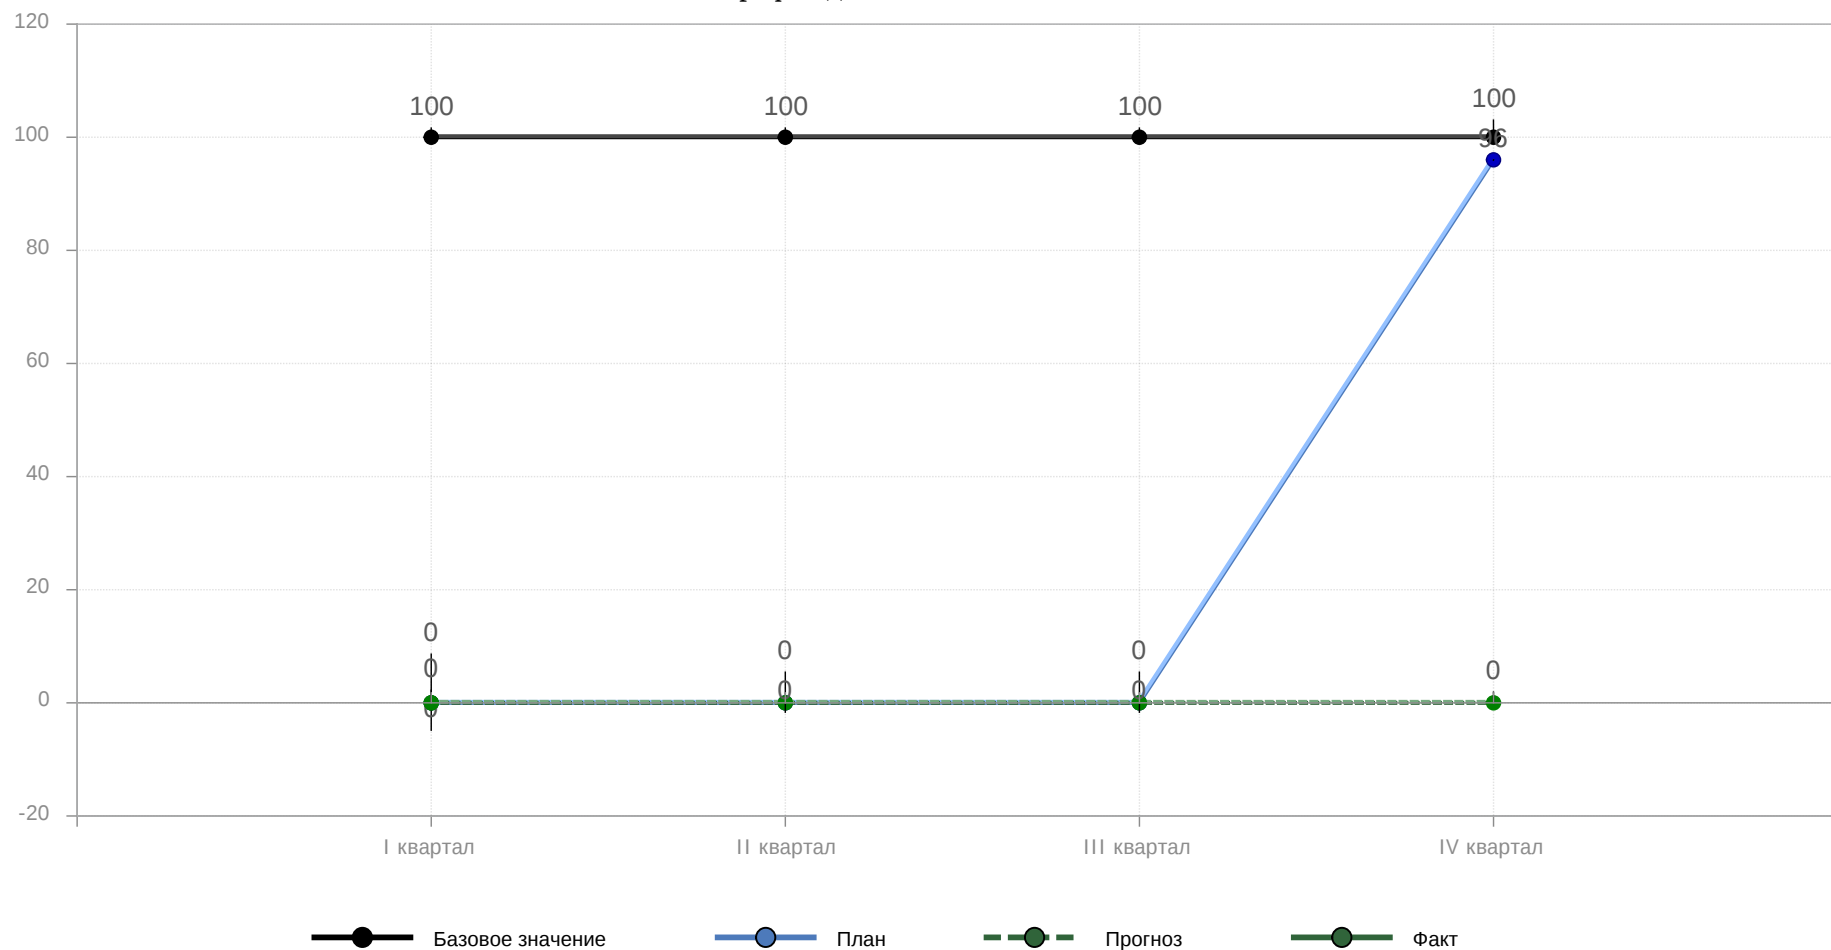


Рис. 3. Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год

Диаграмма достижения показателя

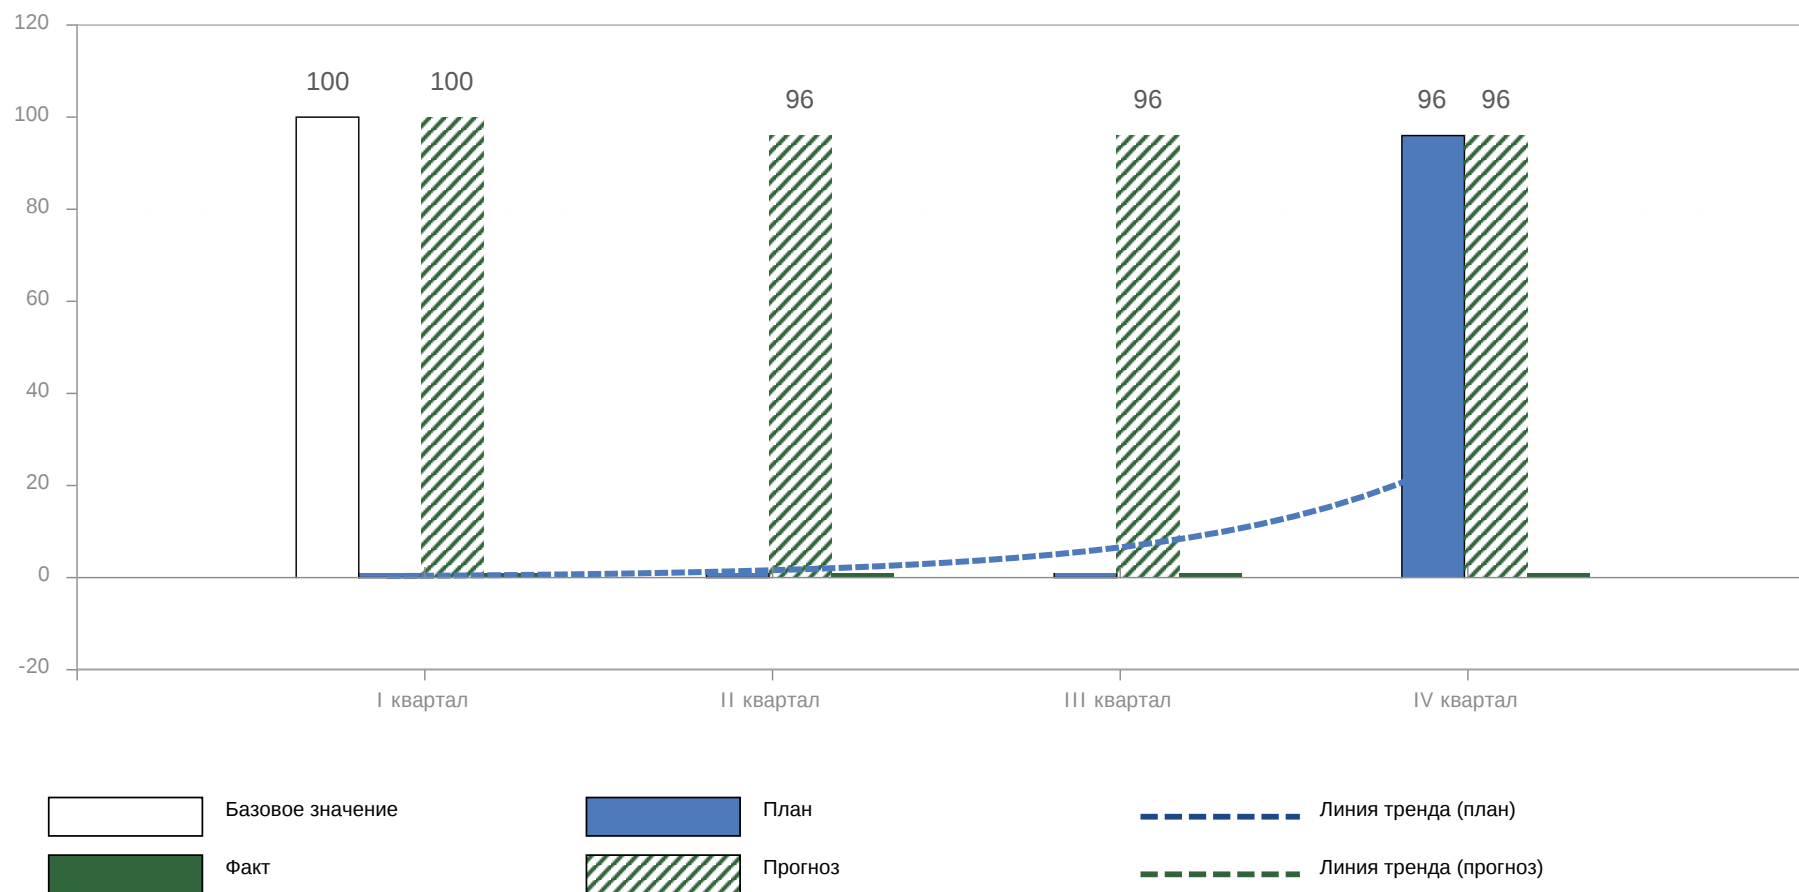


Рис. 4. Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год

График достижения показателя

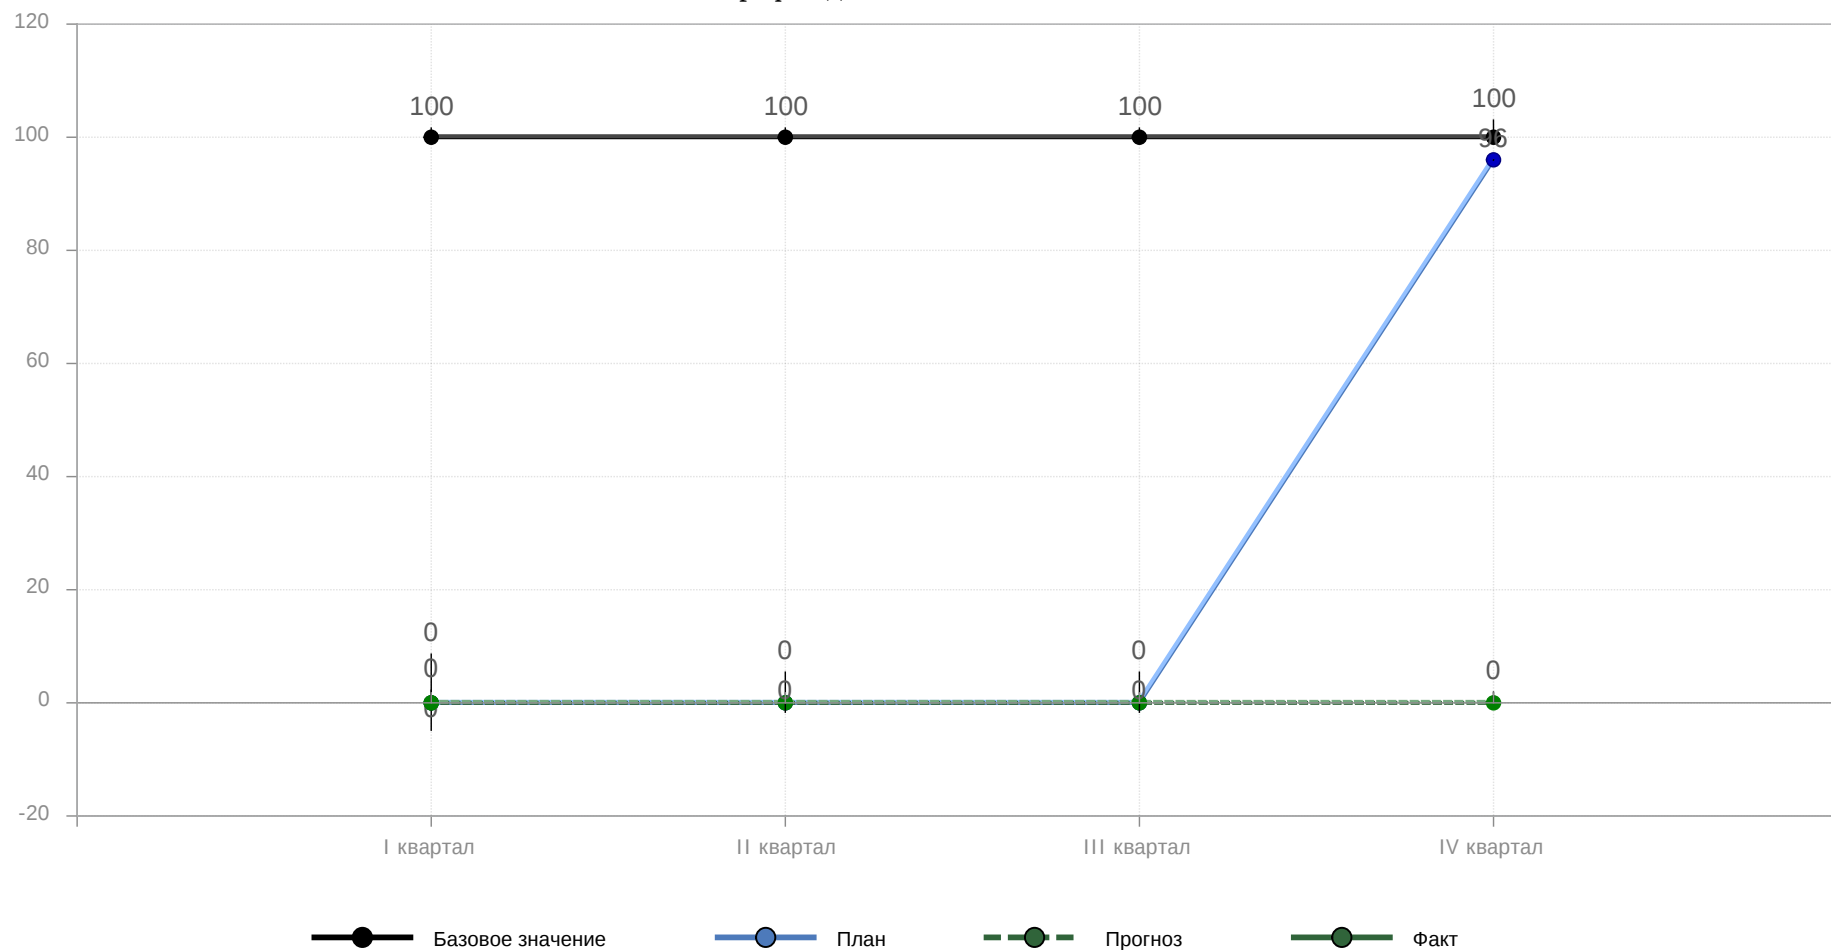


Рис. 5. Снижение совокупного объема выбросов в городе Новокузнецке за отчетный период

Диаграмма достижения показателя

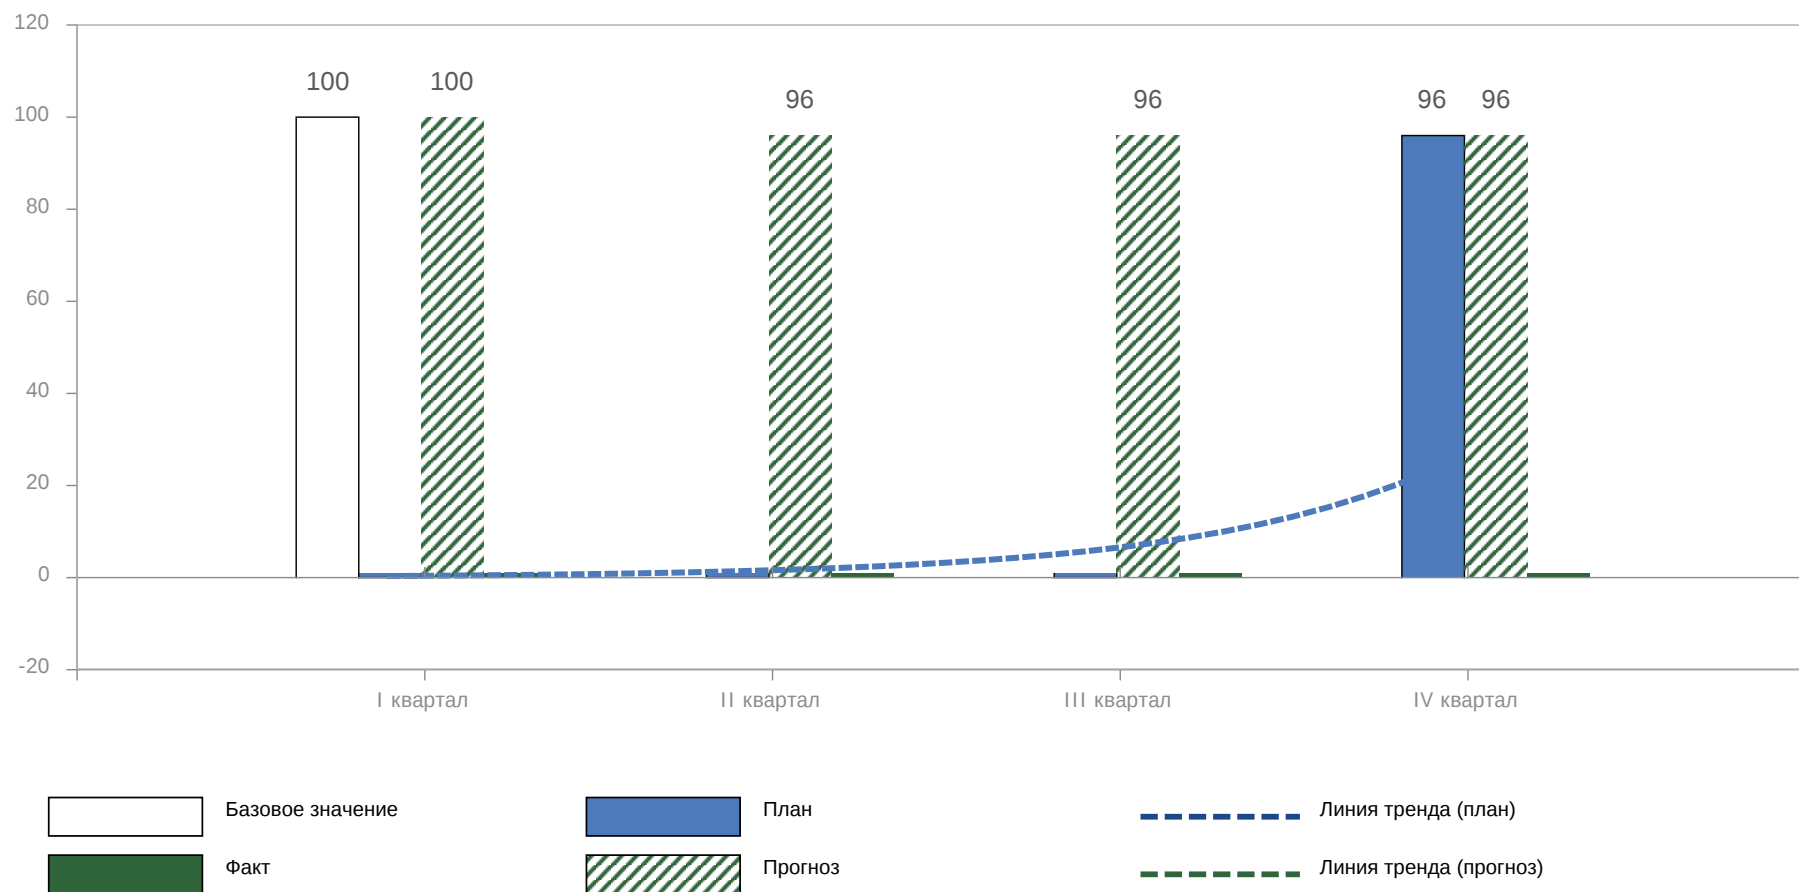


Рис. 6. Снижение совокупного объема выбросов в городе Новокузнецке за отчетный период

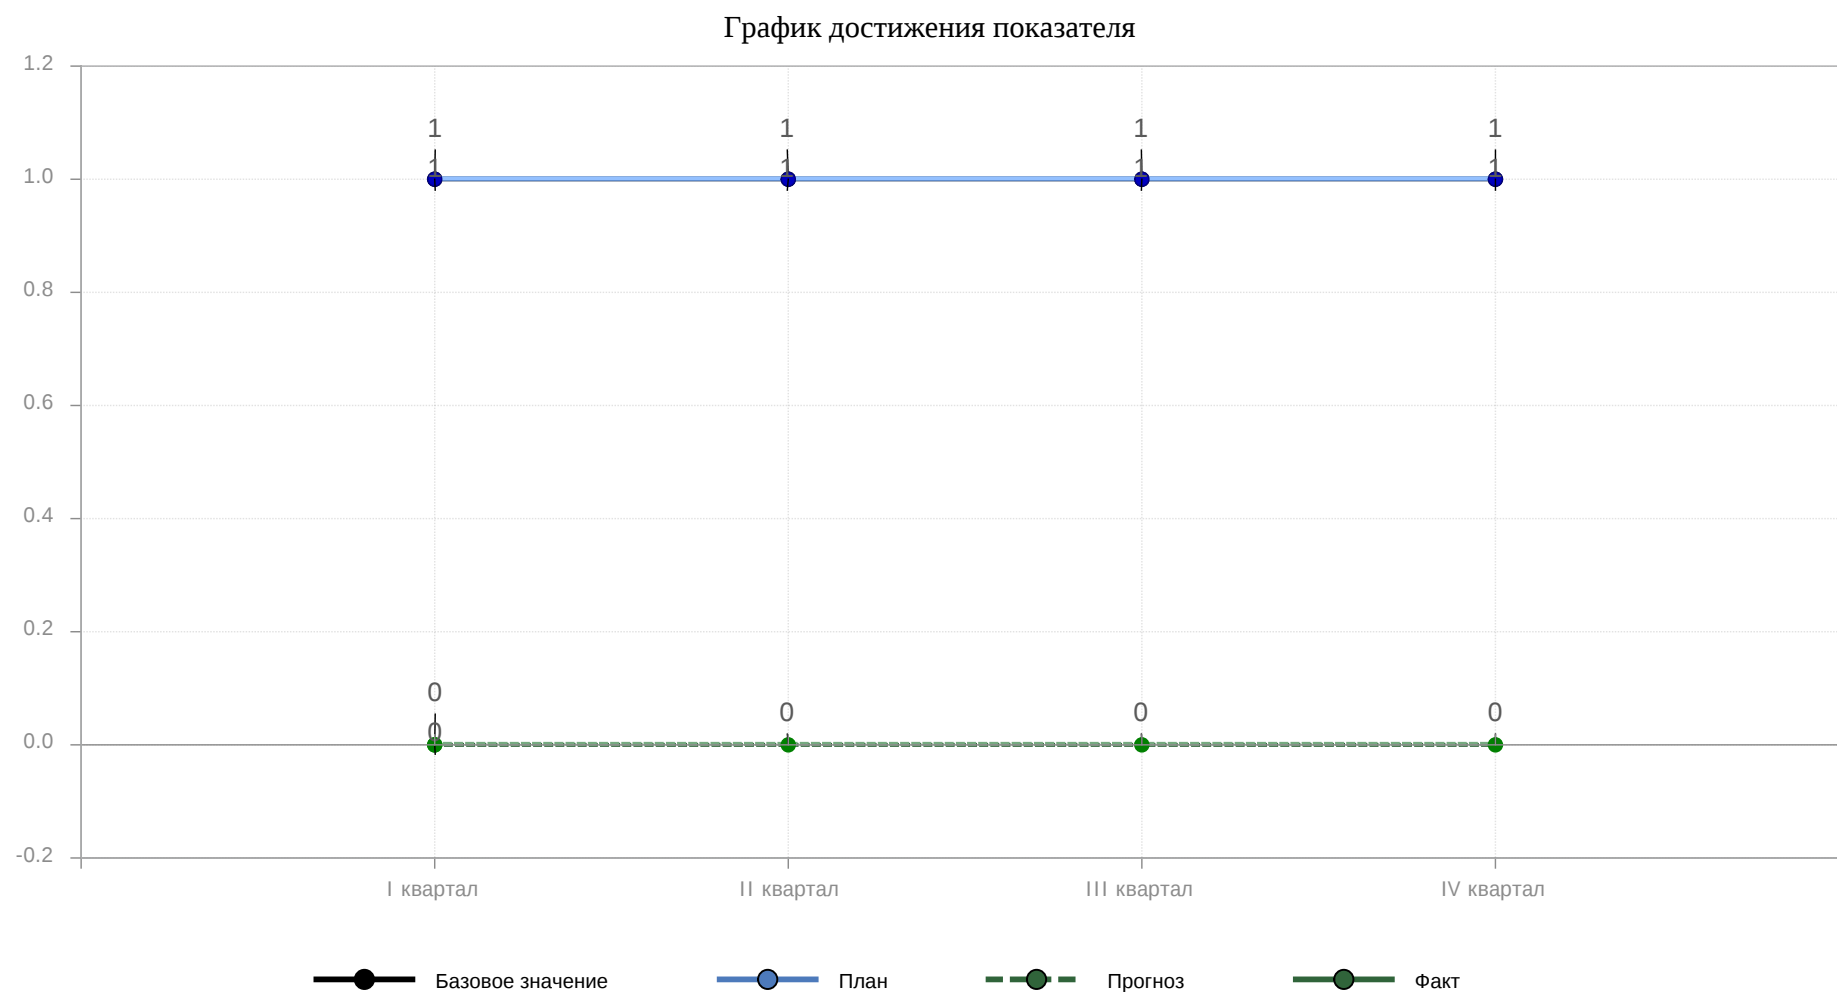


Рис. 7. Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха

Диаграмма достижения показателя

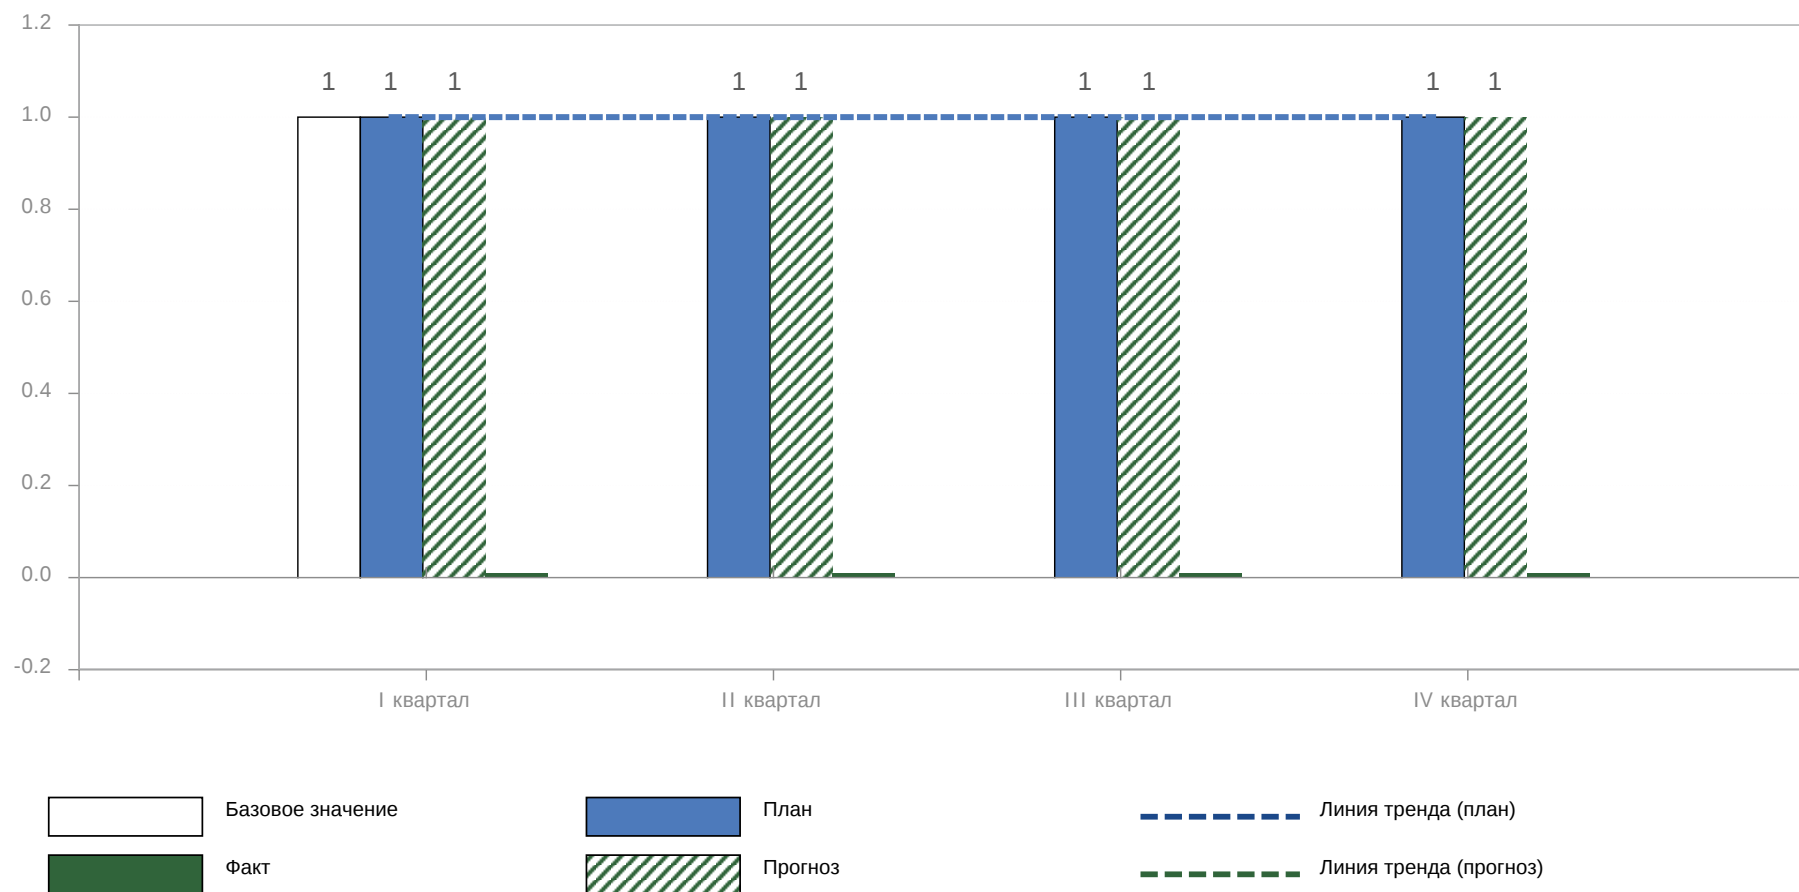


Рис. 8. Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха
