

Руководитель
регионального проекта —
Документ: София Юрьевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

28.04.2020

Сертификат:

67C9EAABV2CEED7E9223F8F382B6BBA10D409DFB

Владелец: Балакирева София Юрьевна

Действителен: с 02.03.2020 по 02.06.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(Р2-32) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста	Процент	64.3	0	0	0	66.2	66.2	100,00%	
2		Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование	Человек	393	0	0	0	0	0	0,00%	
3		Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных	Человек	24542	24456	24456	26960	26602	25775	100,00%	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

		округов									
4		Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	Человек	277	192	192	198	198	198	100,00%	
5		Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	Процент	85.8	89	89.5	90	90	90	100,00%	


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

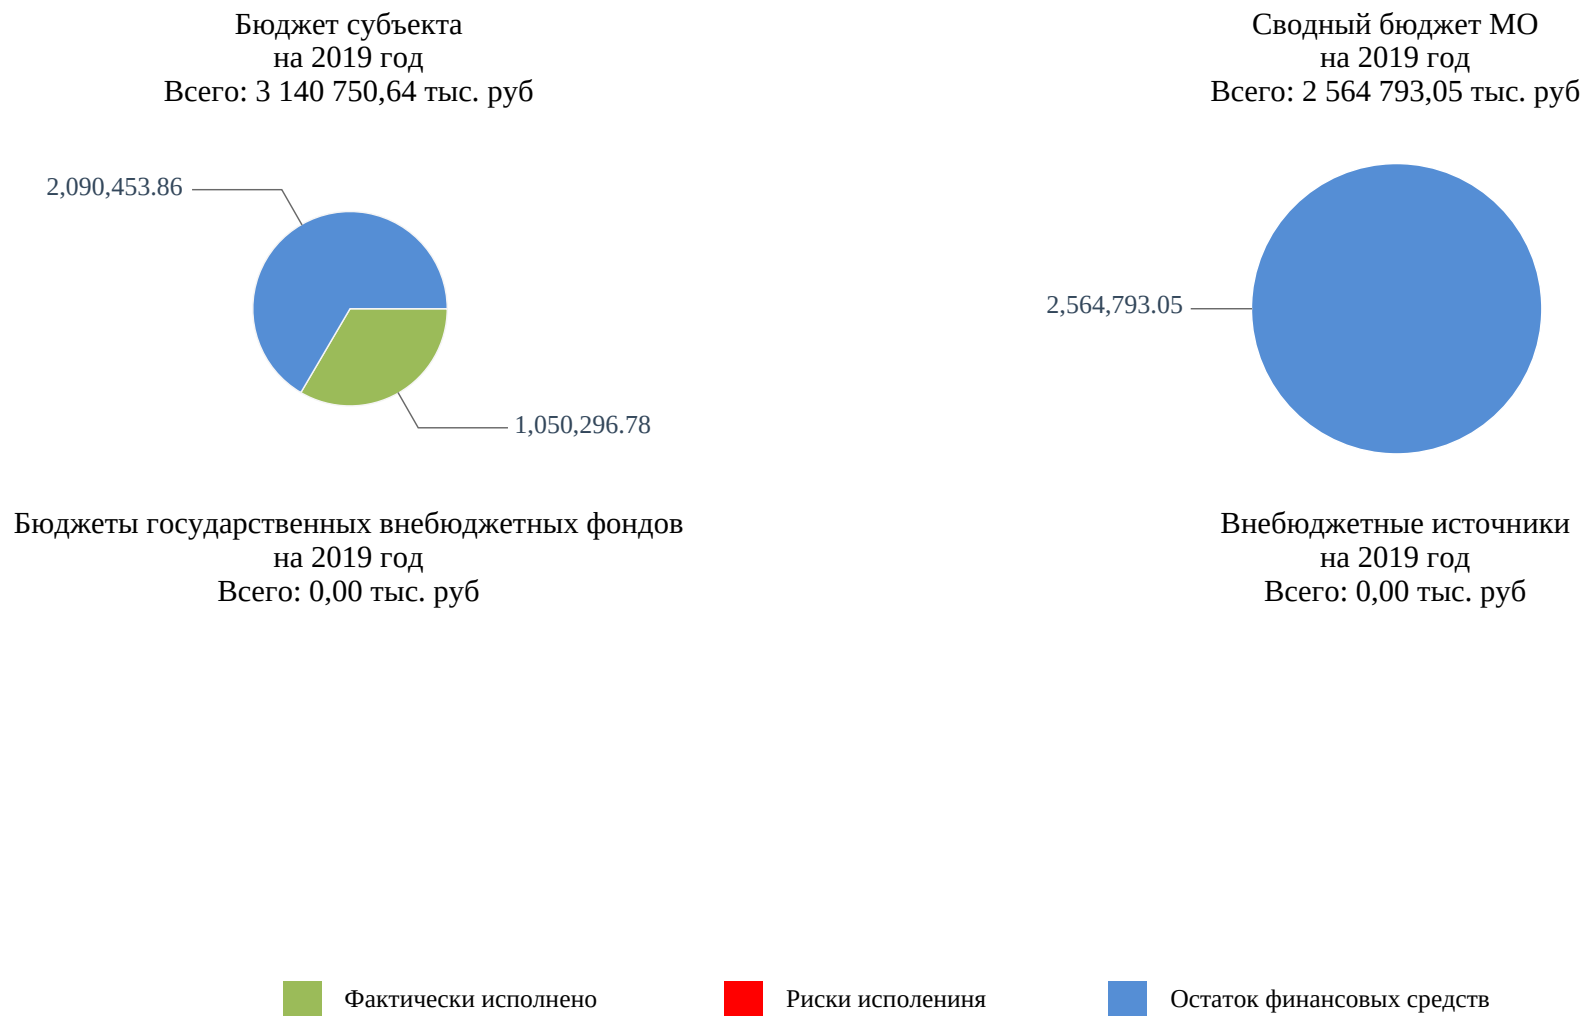3. Статус исполнения бюджета²

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений



 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(13) Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом	523 266,99	523 266,99	523 266,99	523 266,99	106 913,20	20,43	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	523 266,99	523 266,99	523 266,99	523 266,99	106 913,20	20,43	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	523 266,99	523 266,99	523 266,99	523 266,99	523 266,99	100,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	523 266,99	523 266,99	523 266,99	523 266,99	416 353,79	79,57	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	523 266,99	523 266,99	523 266,99	523 266,99	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(15) Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом	2 617 483,65	2 617 483,65	2 617 483,65	2 576 991,42	527 029,79	20,13	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 617 483,65	2 617 483,65	2 617 483,65	2 576 991,42	527 029,79	20,13	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 617 483,65	2 617 483,65	2 617 483,65	2 576 991,42	527 029,79	20,13	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	2 041 526,06	2 041 526,06	2 041 526,06	2 041 526,06	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	2 041 526,06	2 041 526,06	2 041 526,06	2 041 526,06	0,00	0,00	
3.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		(17) Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 140 750,64	3 140 750,64	3 140 750,64	3 100 258,41	633 942,99	20,18	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			3 140 750,64	3 140 750,64	3 140 750,64	3 100 258,41	633 942,99	20,18	
бюджет субъекта Российской Федерации			3 140 750,64	3 140 750,64	3 140 750,64	3 100 258,41	1 050 296,78	33,44	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			2 564 793,05	2 564 793,05	2 564 793,05	2 564 793,05	416 353,79	16,23	
бюджеты муниципальных образований			2 564 793,05	2 564 793,05	2 564 793,05	2 564 793,05	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости	
2		Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом	
3		Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом	
4		Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			<i>Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости Значение: 662, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	30.12.2019	Гришин А. С.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 662 из 662.
1.1	ПК		Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	25.12.2019	30.12.2019	Гришин А. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 467 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Содействие занятости населения Кузбасса на 2014-2024 годы"" Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2019г. №771, приложен файл.
1.1.1	РНП		Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	25.12.2019	30.12.2019	Гришин А. С.	Выполнено. Просрочка 5 дней. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление" Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2019г. №771, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2			Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом Значение: 1.289, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Печеркина И. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Департамента строительства Кемеровской области от 31.12.2019г. №-, приложен файл. Выполнено. Отклонений нет. Предоставлена информация : 1.289 из 1.289.
2.1	ПК		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	31.12.2019	31.12.2019	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ввод объекта в эксплуатацию" отдела архитектуры и строительства администрации Прокопьевского района от 10.10.2019г. №42-гу42509000-030-2019, приложен файл. 2. "ввод объекта в эксплуатацию" Администрации Киселевского городского округа от 12.12.2019г. №42-гу42306000-62-2018 , приложен файл. 3. "ввод объекта в эксплуатацию" Администрации г. Кемерово от 31.12.2019г. №42-305-82-2019, приложен файл. 4. "ввод объекта в эксплуатацию" Администрации г. Кемерово от 31.12.2019г. №42-305-81-2019, приложен файл. 5. "ввод объекта в эксплуатацию" комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 09.12.2019г. №42-RU42310000-33-2019, приложен файл. 6. "ввод объекта в эксплуатацию" Администрации г. Кемерово от 30.12.2019г. №42-305-74-2019, приложен файл. 7. "ввод объекта в эксплуатацию" Администрации Гурьевского муниципального района от 24.09.2019г. №42-гу42502101-04-2019, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.1	РРП		Ввод объектов недвижимости в эксплуатацию	31.12.2019	31.12.2019	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ввод объекта в эксплуатацию" Администрации г. Кемерово от 30.12.2019г. №42-305-74-2019, приложен файл. 2. "ввод объекта в эксплуатацию" Администрации Гурьевского муниципального района от 24.09.2019г. №42-ru42502101-04-2019, приложен файл. 3. "ввод объекта в эксплуатацию" отдела архитектуры и строительства администрации Прокопьевского района от 10.10.2019г. № 42-ru42509000-030-2019, приложен файл. 4. "ввод объекта в эксплуатацию" Администрации Киселевского городского округа от 12.12.2019г. №42-ru42306000-62-2018, приложен файл. 5. "ввод объекта в эксплуатацию" Администрации г. Кемерово от 31.12.2019г. №42-305-82-2019, приложен файл. 6. "ввод объекта в эксплуатацию" Администрации г. Кемерово от 31.12.2019г. №42-305-81-2019, приложен файл. 7. "ввод объекта в эксплуатацию" комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 09.12.2019г. № 42-ru42310000-33-2019, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.2	ПК		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	31.12.2019	15.02.2019	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и КОЛЛЕГИЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования" между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и Правительством Кемеровской области от 15.02.2019г. № 073-17-2019-048, приложен файл.
2.2.1	РРП		Заключение соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	31.12.2019	15.02.2019	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и КОЛЛЕГИЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования" Соглашение между министерством просвещения Российской Федерации и Коллегией Администрации Кемеровской области от 15.02.2019г. № 073-17-2019-048, приложен файл. 2. "Дополнительное соглашение к соглашению между МИНИСТЕРСТВОМ

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и КОЛЛЕГИЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Кемеровской области-КУЗБАССА на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования от 15.02.2019 № 073-17-2019-048" между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и КОЛЛЕГИЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ от 26.04.2019г. №073-17-2019-048/1, приложен файл. 3. "Дополнительное соглашение к соглашению между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и Правительством Кемеровской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования от 15.02.2019 № 073-17-2019-048" между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и Правительством Кемеровской области от 17.07.2019г. № 073-17-2019-048/2, приложен файл. 4. "Дополнительное соглашение к соглашению между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и КОЛЛЕГИЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ о предоставлении иного межбюджетного

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							трансферта из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования от 15.02.2019 № 073-17-2019-048" между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и Правительством Кемеровской области от 21.08.2019г. №073-17-2019-048/3, приложен файл. 5. "Дополнительное соглашение к соглашению между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и КОЛЛЕГИЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования от 15.02.2019 № 073-17-2019-048" между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и Правительством Кемеровской области от 17.09.2019г. № 073-17-2019-048/4, приложен файл.
2.3	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2019	31.12.2019	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет департамента строительства кемеровской области от 31.12.2019г. №-, приложен файл. Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.3.1	РРП		Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2019	31.12.2019	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет департамента строительства Кемеровской области от 31.12.2019г. №-, приложен файл.
2.4	ПК		Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета (за счет предоставления иного межбюджетного трансферта), бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации	31.12.2019	31.12.2019	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ввод объекта в эксплуатацию" отдела архитектуры и строительства Администрации Прокопьевского района от 10.10.2019г. №42-ru42502101-04-2019, приложен файл. 2. "ввод объекта в эксплуатацию" Администрации Киселевского городского округа от 12.12.2019г. №42-ru42306000-62-2018, приложен файл. 3. "ввод объекта в эксплуатацию" Администрации г. Кемерово от 31.12.2019г. №42-305-82-2019, приложен файл. 4. "ввод объекта в эксплуатацию" Администрации г. Кемерово от 31.12.2019г. №42-305-81-2019, приложен файл. 5. "ввод объекта в эксплуатацию" Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 09.12.2019г. №42-RU42310000-33-2019, приложен файл. 6. "ввод объекта в эксплуатацию" Администрации города Кемерово от 30.12.2019г. №42-305-74-2019, приложен файл. 7. "ввод объекта в эксплуатацию" Администрации Гурьевского муниципального района от 24.09.2019г. №42-ru42502101-04-2019, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.4.1	РРП		Создание не менее 1289 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета (за счет предоставления иного межбюджетного трансферта), бюджета Кемеровской области и местных бюджетов	31.12.2019	31.12.2019	Печеркина И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "на ввод объекта в эксплуатацию" Администрации города Кемерово от 30.12.2019г. №42-305-74-2019, приложен файл. 2. "ввод объекта в эксплуатацию" Администрации Гурьевского муниципального района от 24.09.2019г. №42-гу42502101-04-2019, приложен файл. 3. "ввод объекта в эксплуатацию" отдела архитектуры и строительства администрации Прокопьевского района от 10.10.2019г. № 42-гу42509000030-2019, приложен файл. 4. "ввод объекта в эксплуатацию" Администрации Киселевского городского округа от 12.12.2019г. №42-гу42306000-62-2018, приложен файл. 5. "ввод объекта в эксплуатацию" Администрации г. Кемерово от 31.12.2019г. №42-305-82-2019, приложен файл. 6. "ввод объекта в эксплуатацию" Администрации г. Кемерово от 31.12.2019г. №42-305-81-2019, приложен файл. 7. "ввод объекта в эксплуатацию" Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 09.12.2019г. № 42-RU42310000-33-2019, приложен файл.
3			Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом Значение: 3.173, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Печеркина И. А.	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 3.173 из 3.173.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4			Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми Значение: 50, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Пфетцер С. А.	Информация по значению результата: В работе.В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 50 из 50.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек

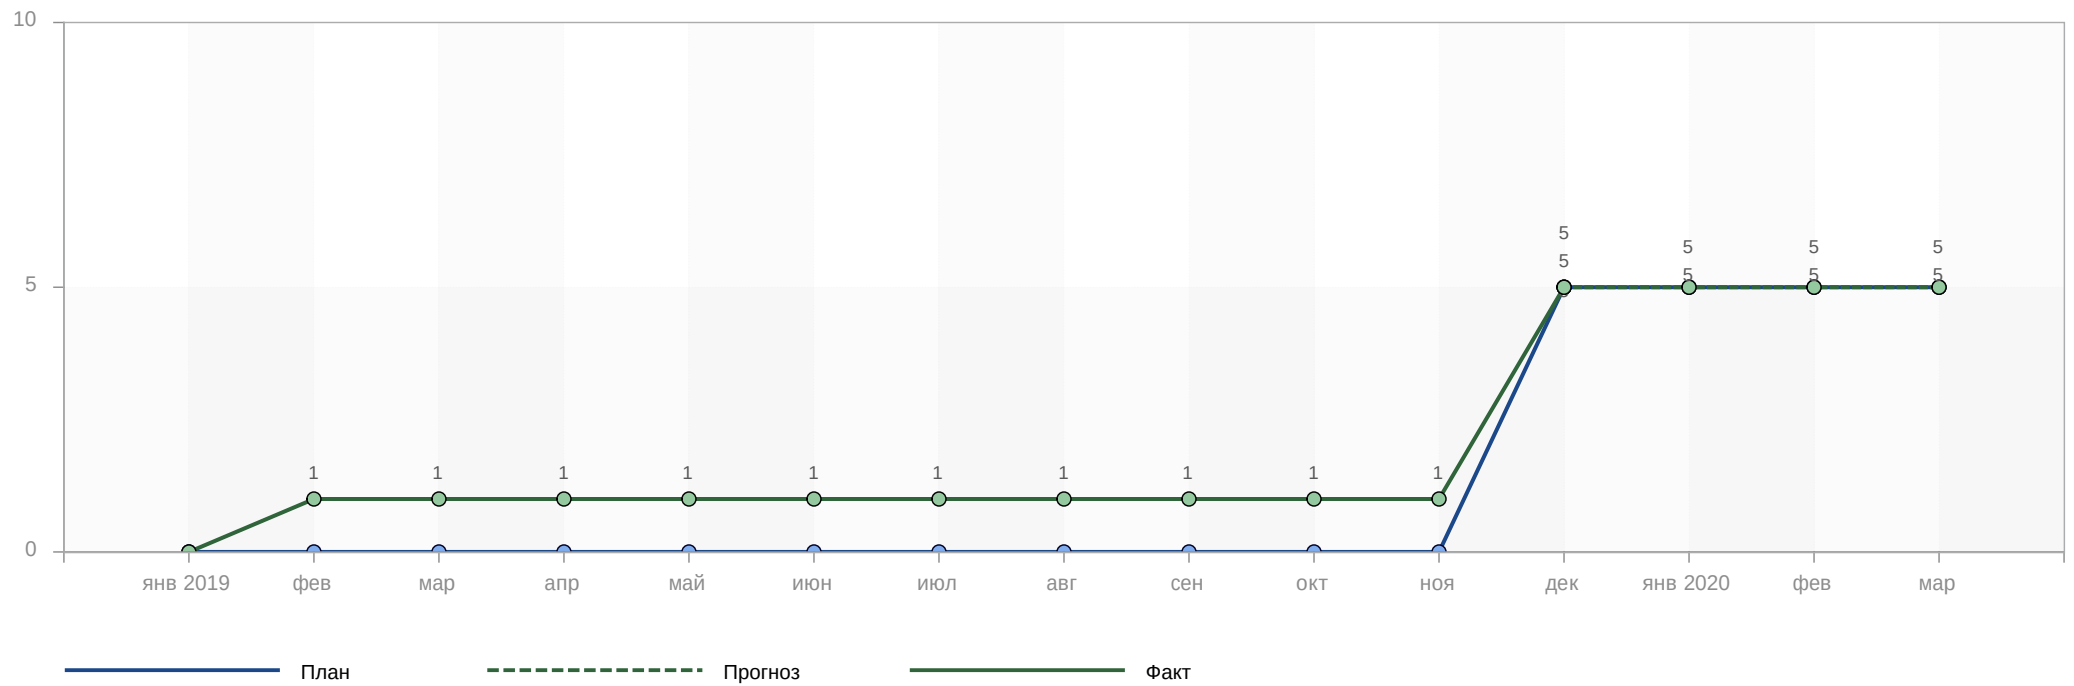


Рис. 1. "(Р2-32) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Кемеровская область)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

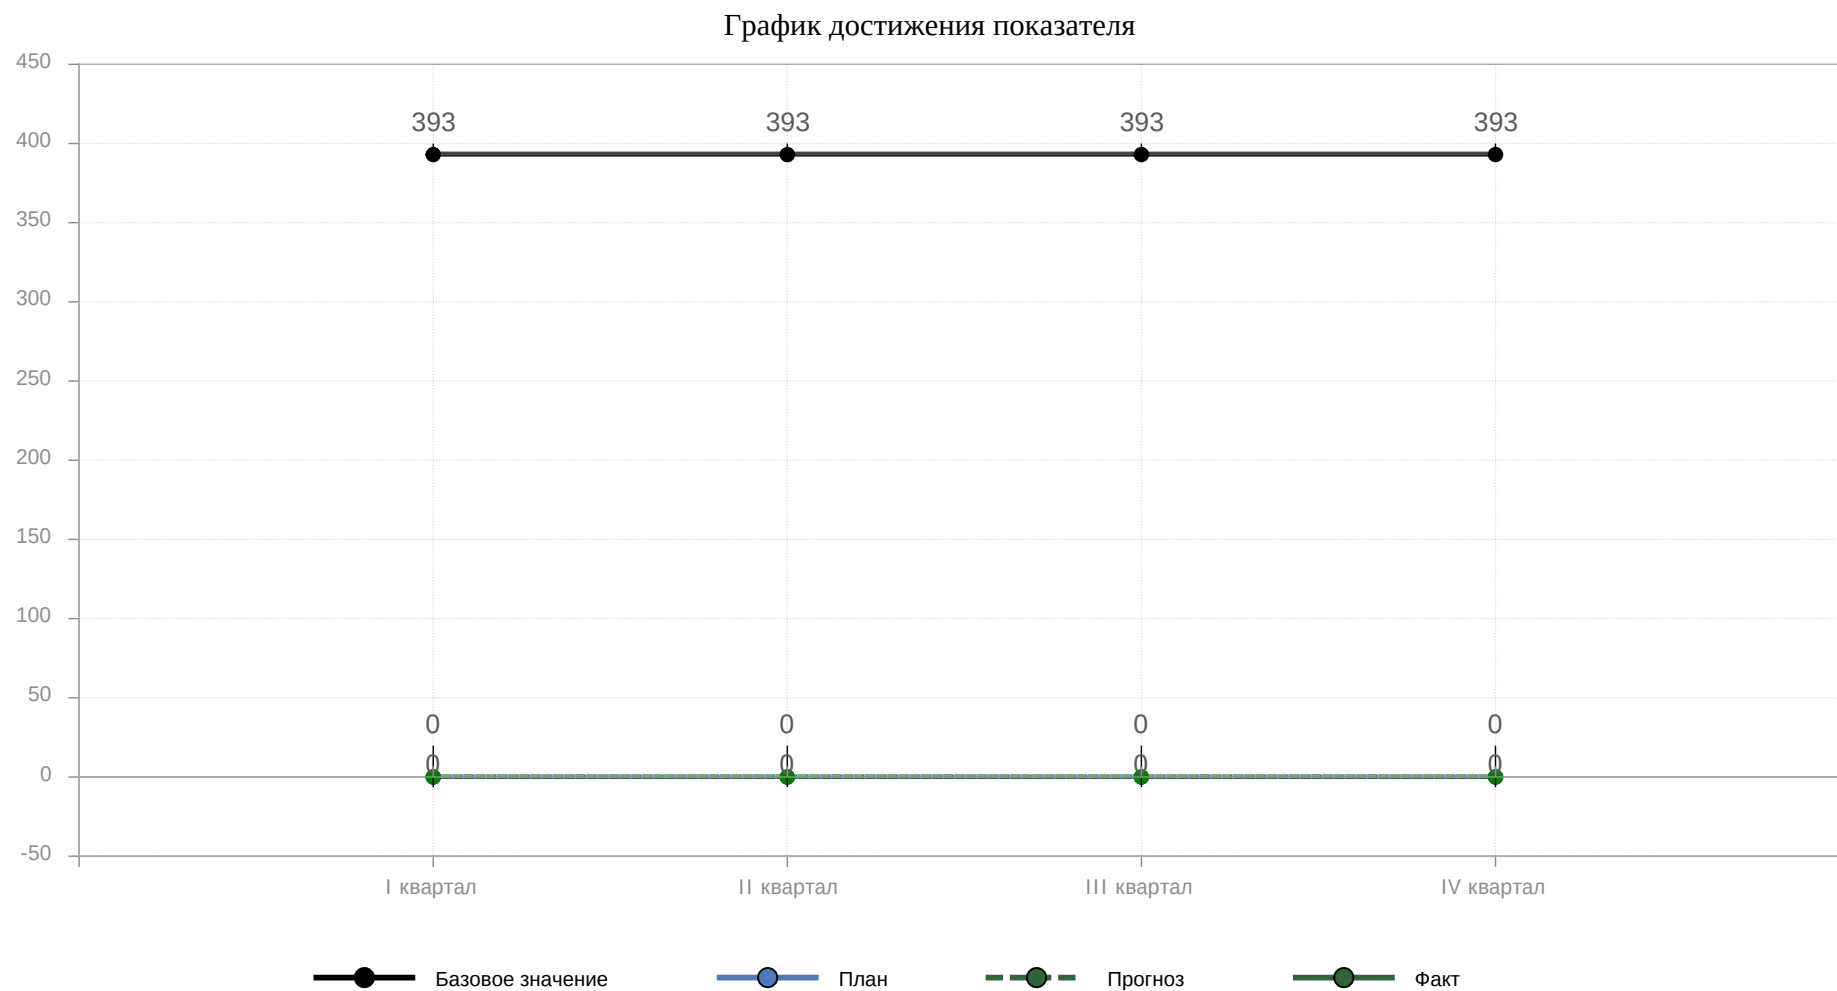


Рис. 1. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование

Диаграмма достижения показателя

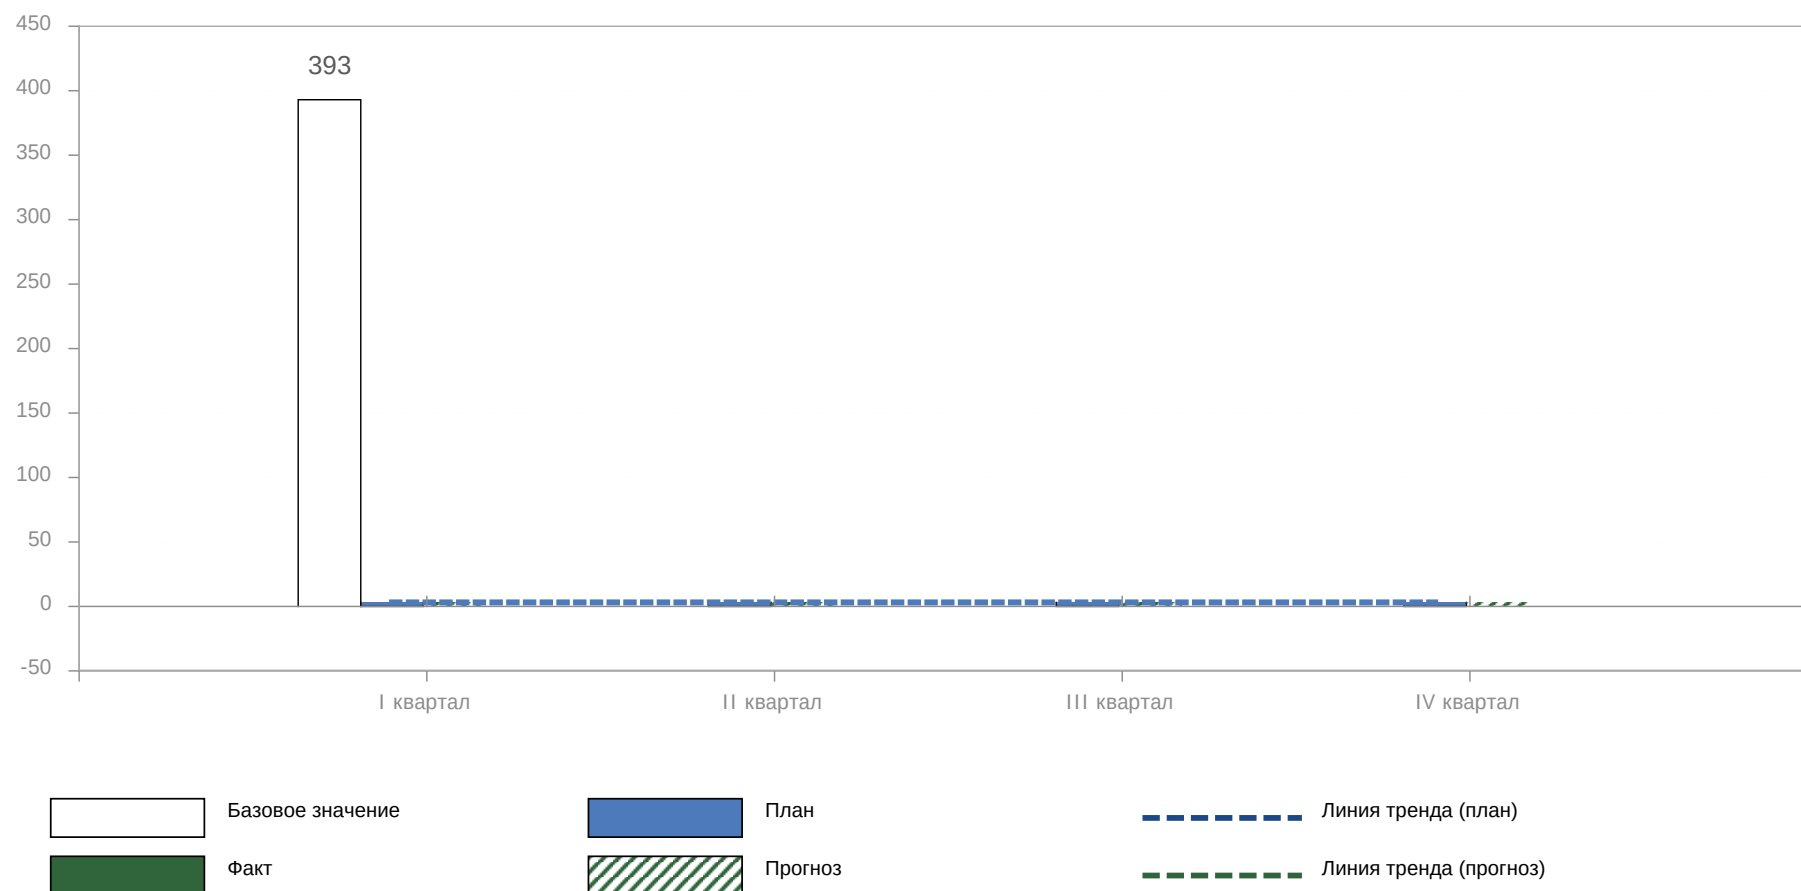


Рис. 2. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование

График достижения показателя

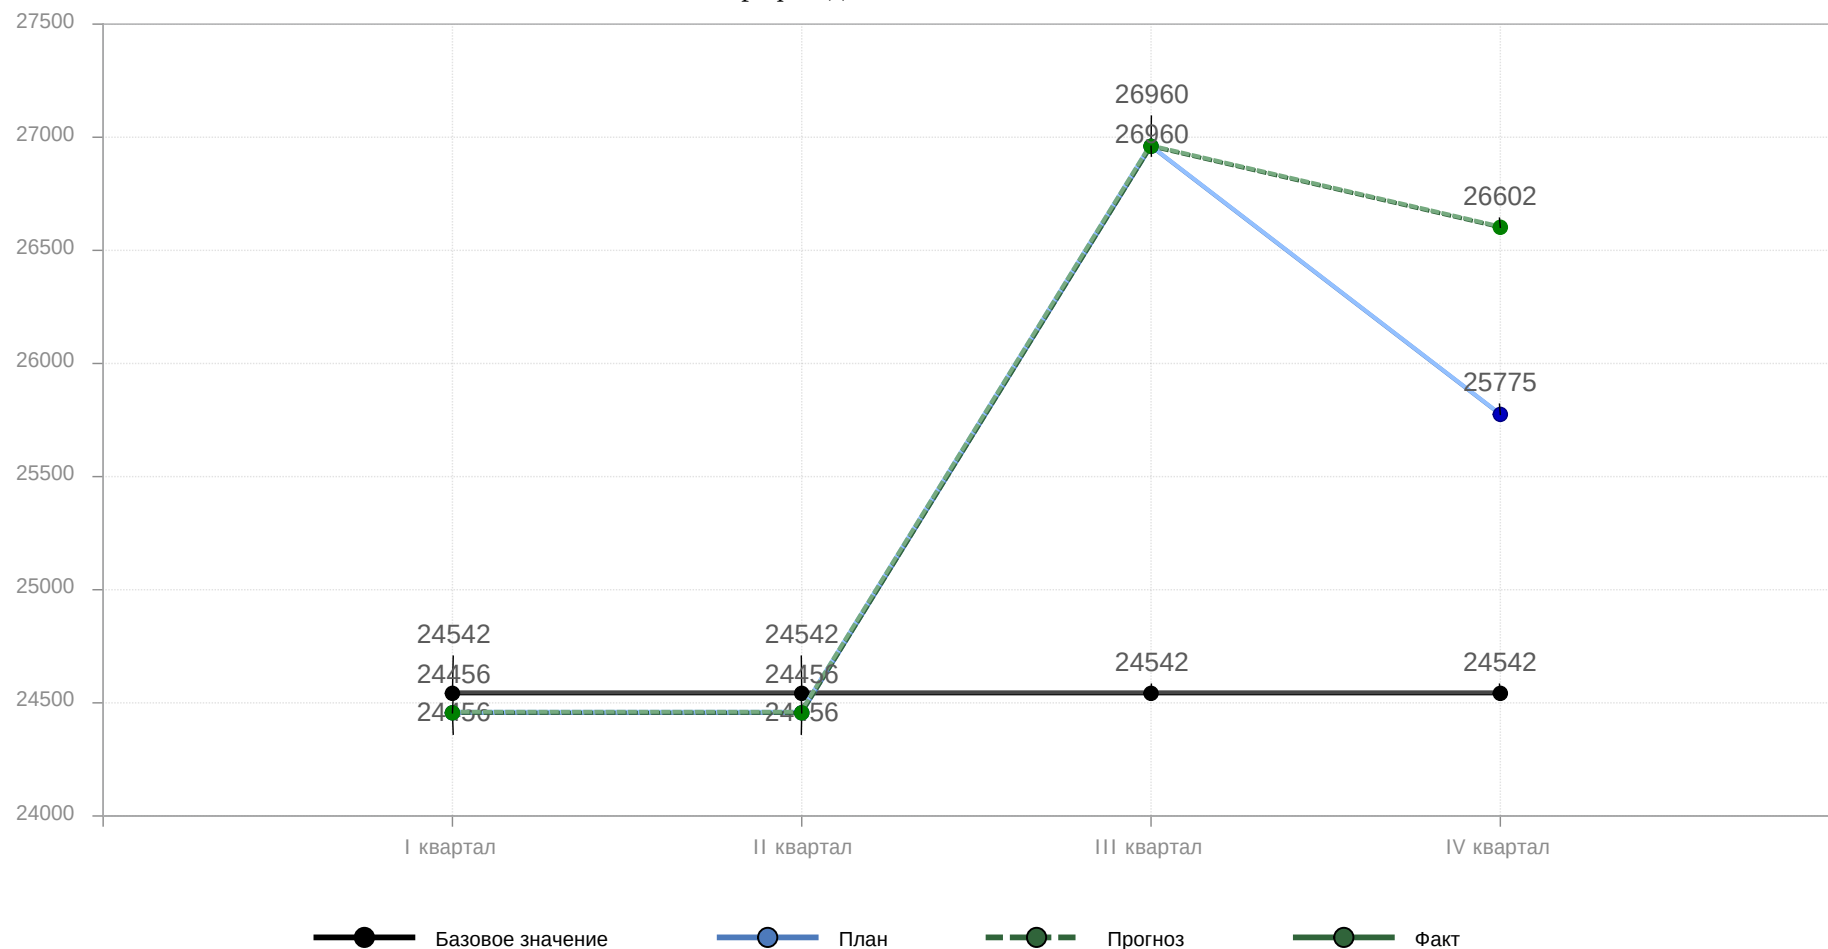


Рис. 3. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

Диаграмма достижения показателя

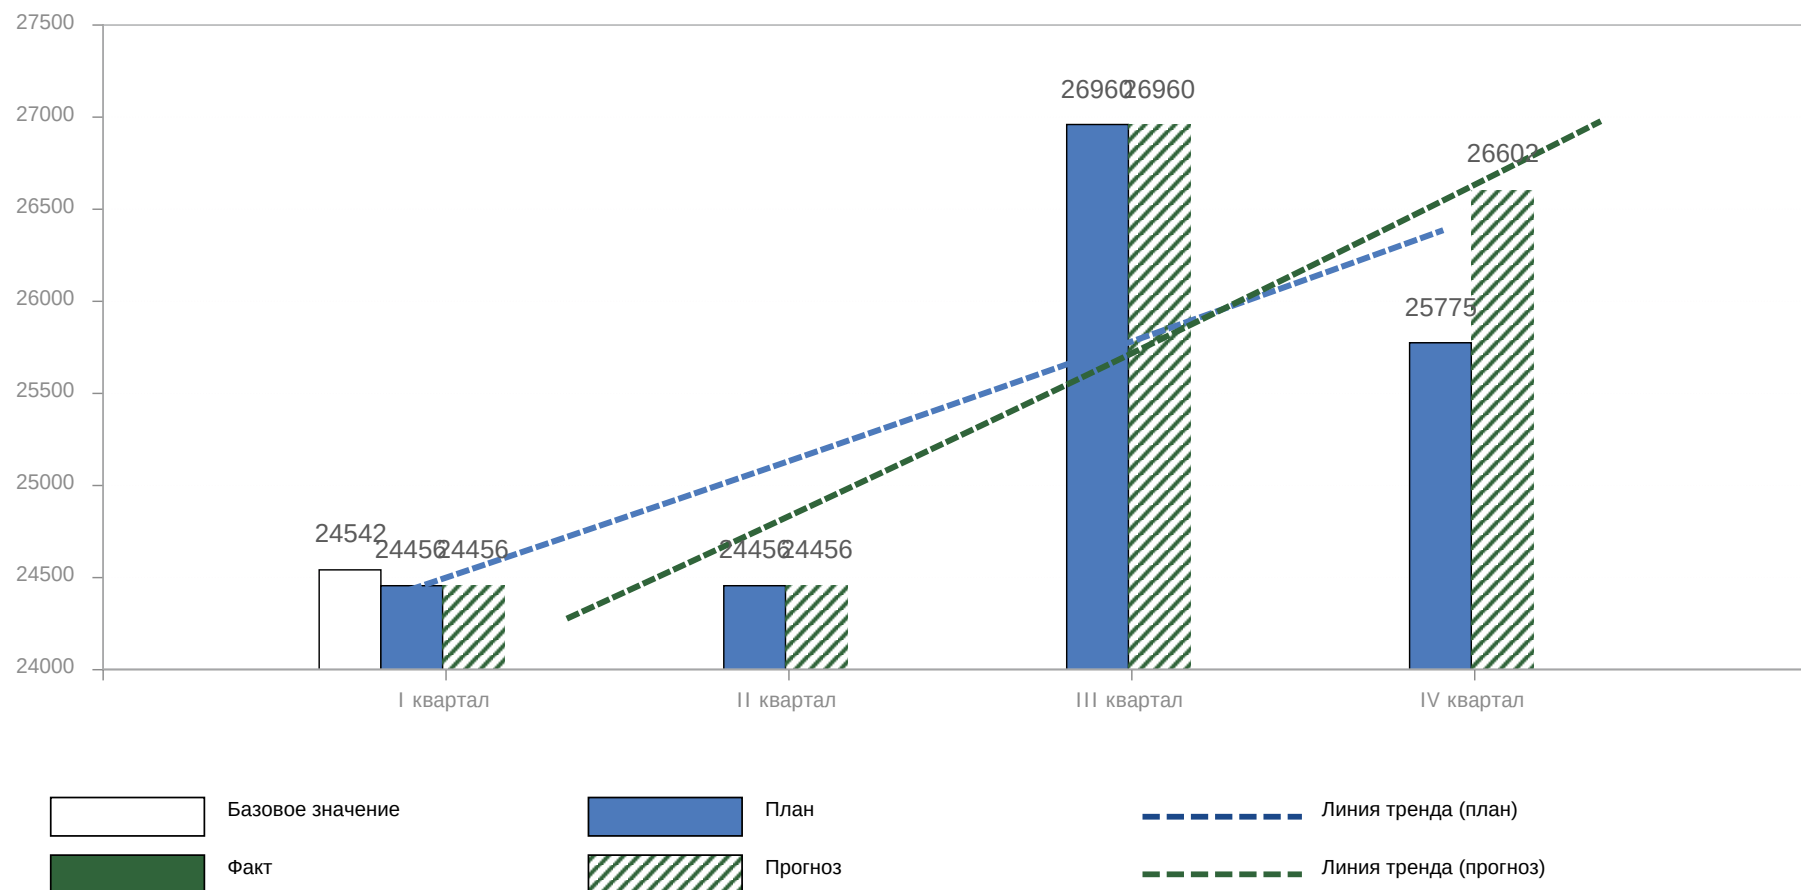


Рис. 4. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

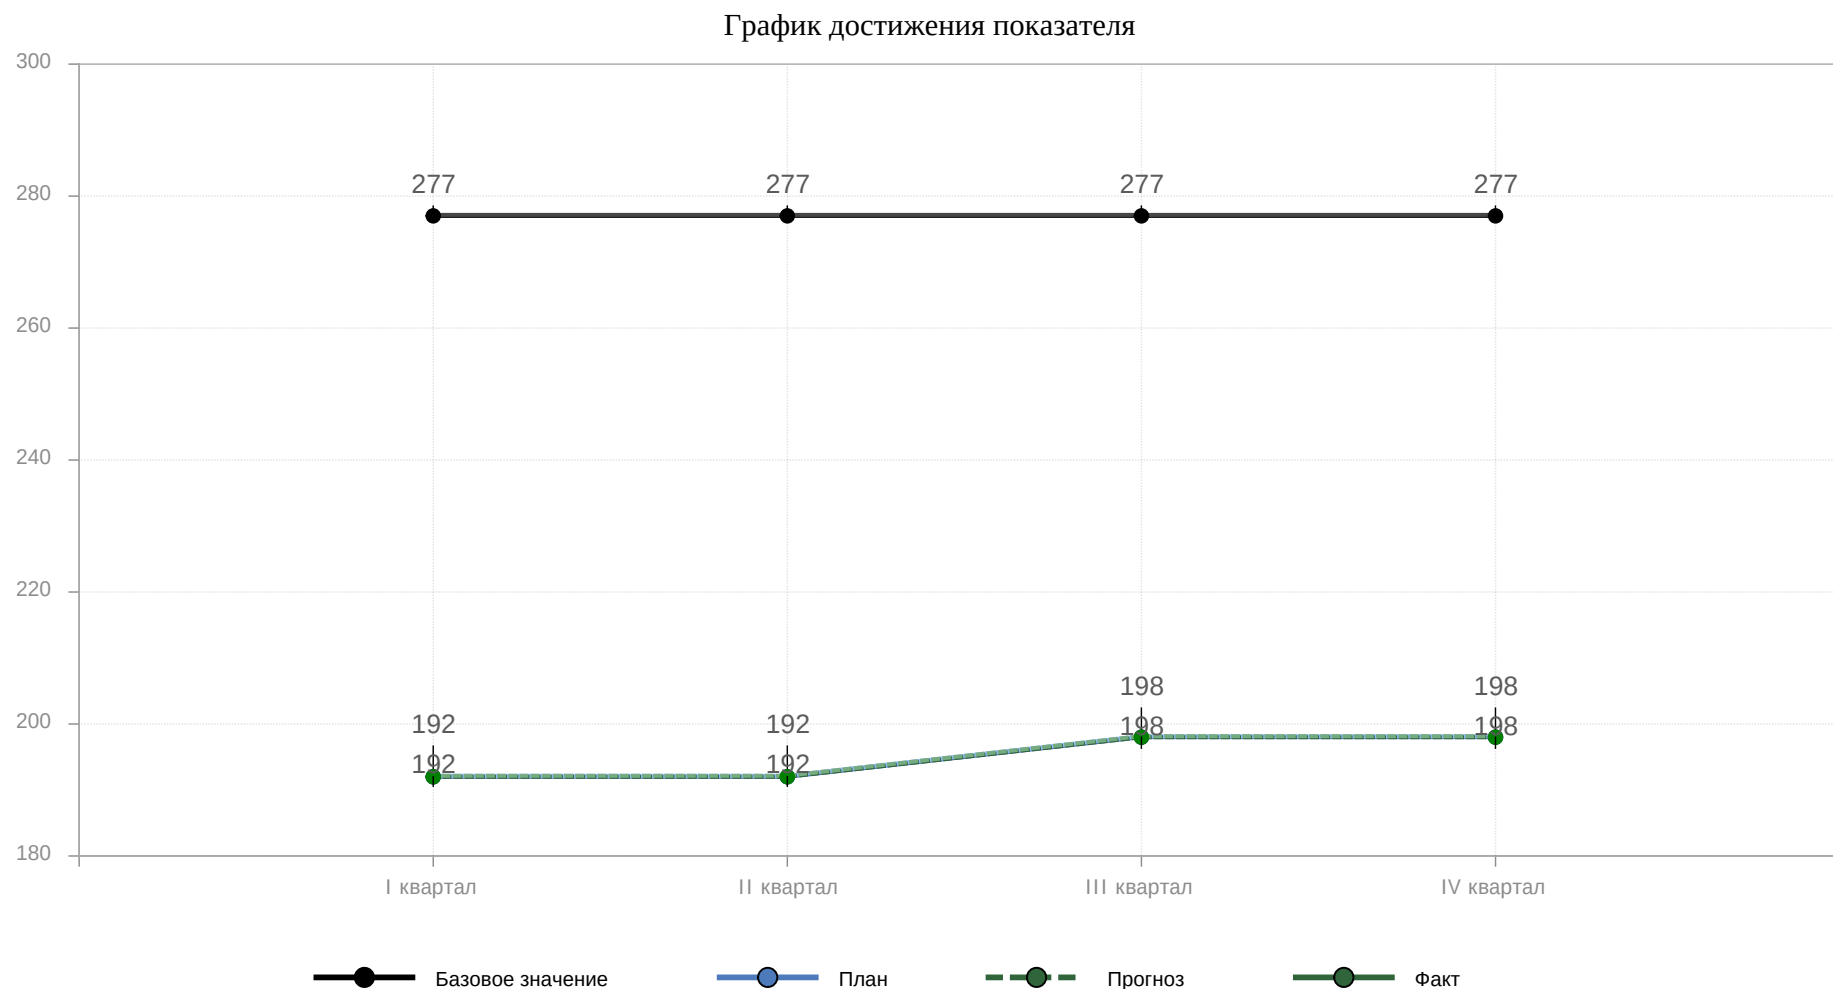


Рис. 5. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

Диаграмма достижения показателя

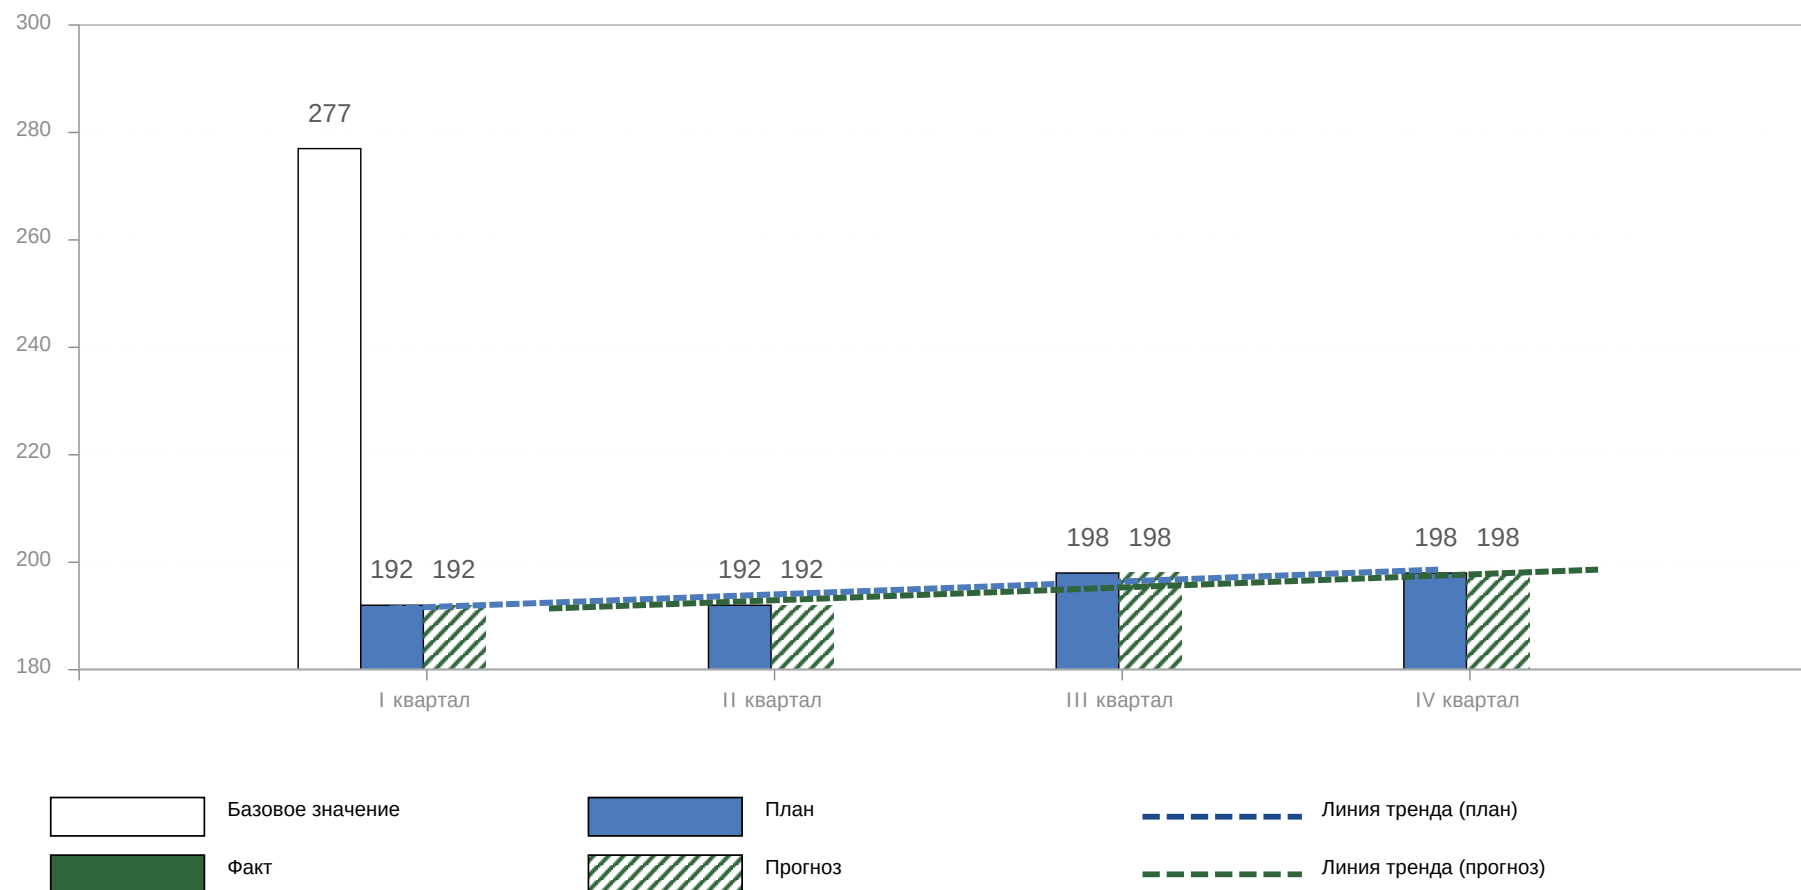


Рис. 6. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

График достижения показателя

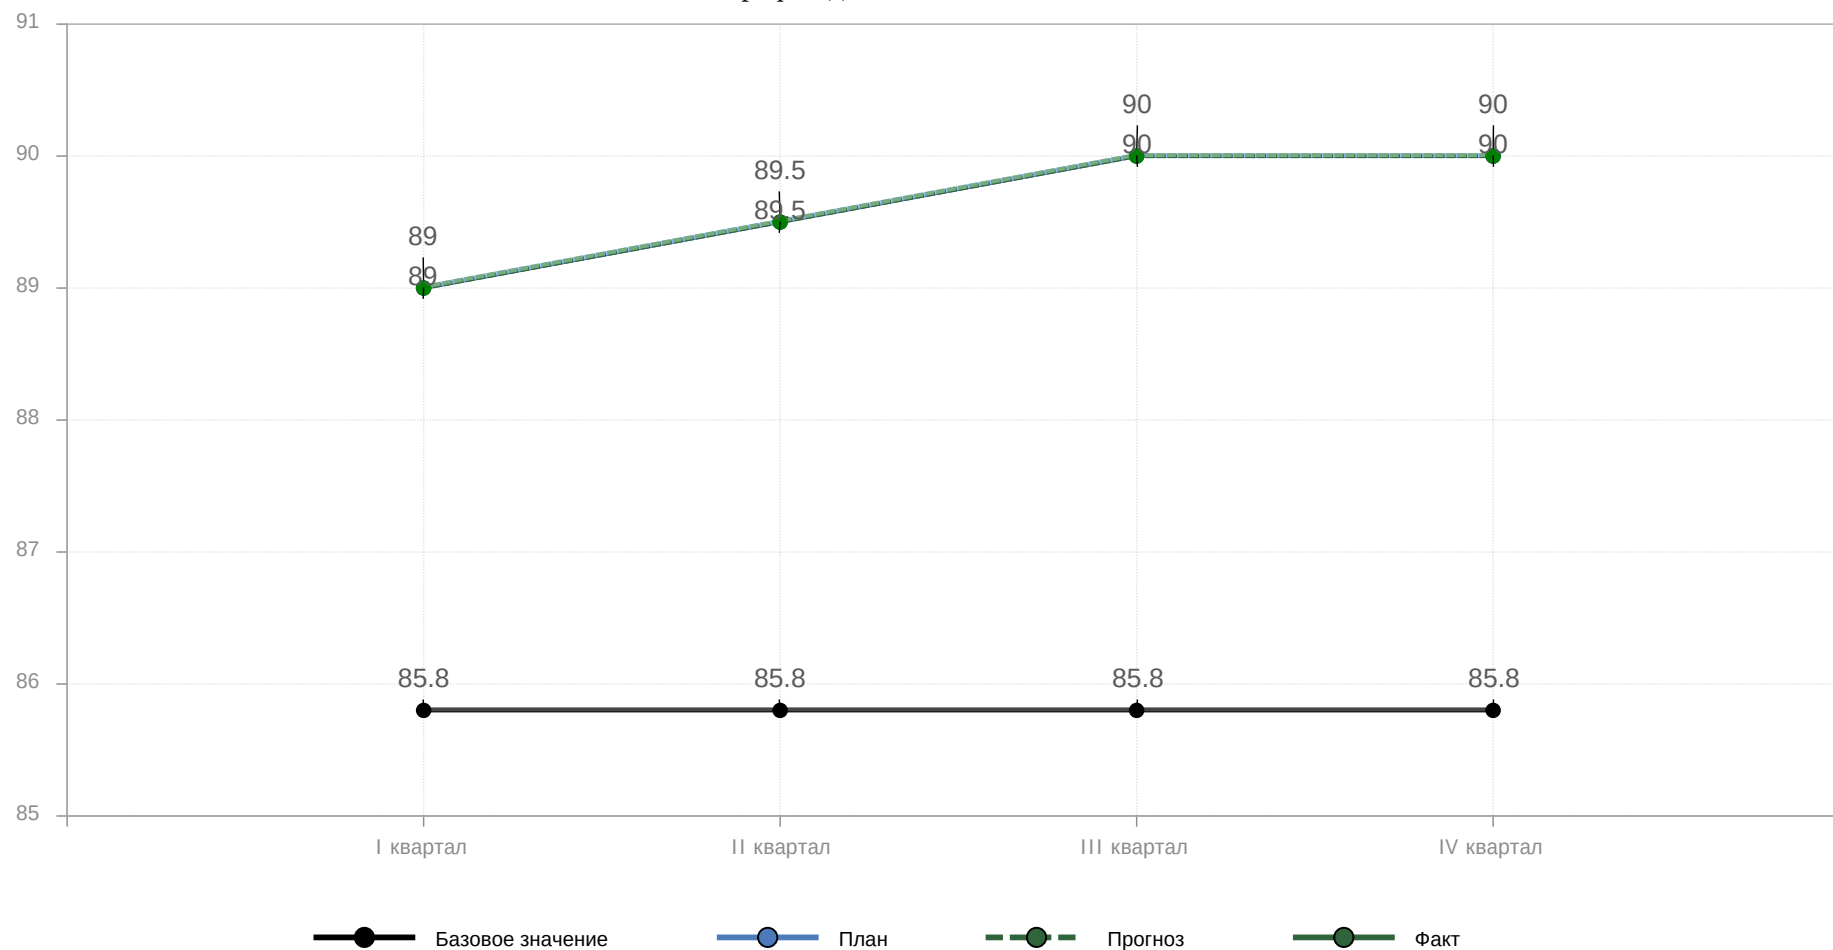


Рис. 7. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

Диаграмма достижения показателя

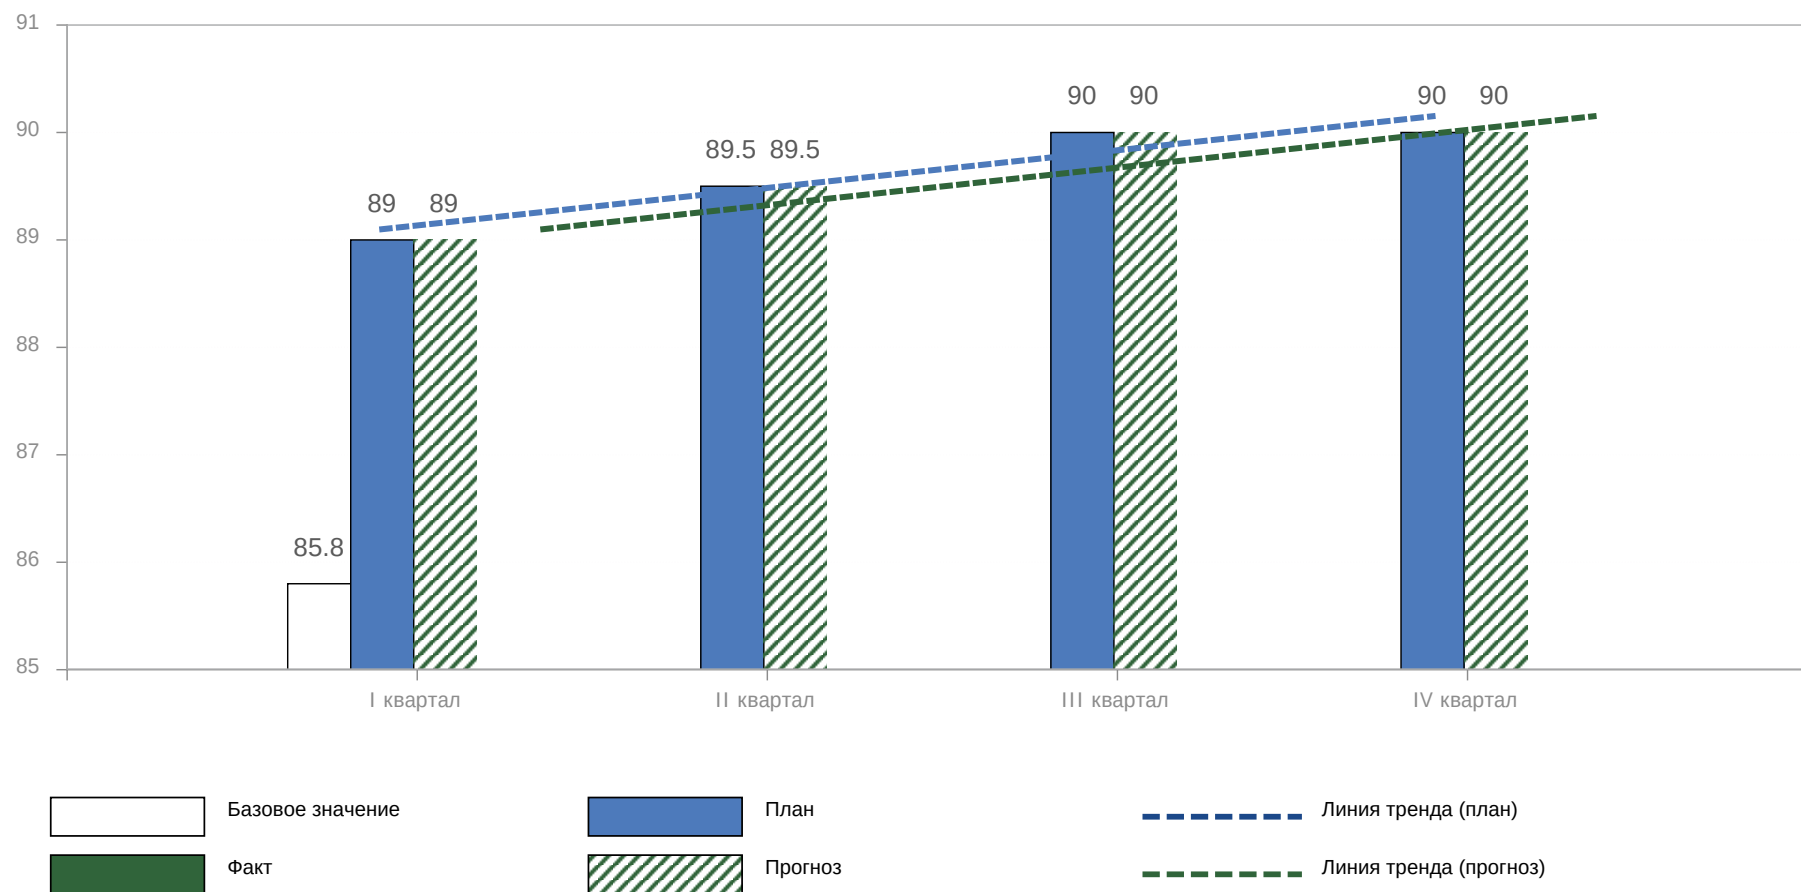


Рис. 8. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

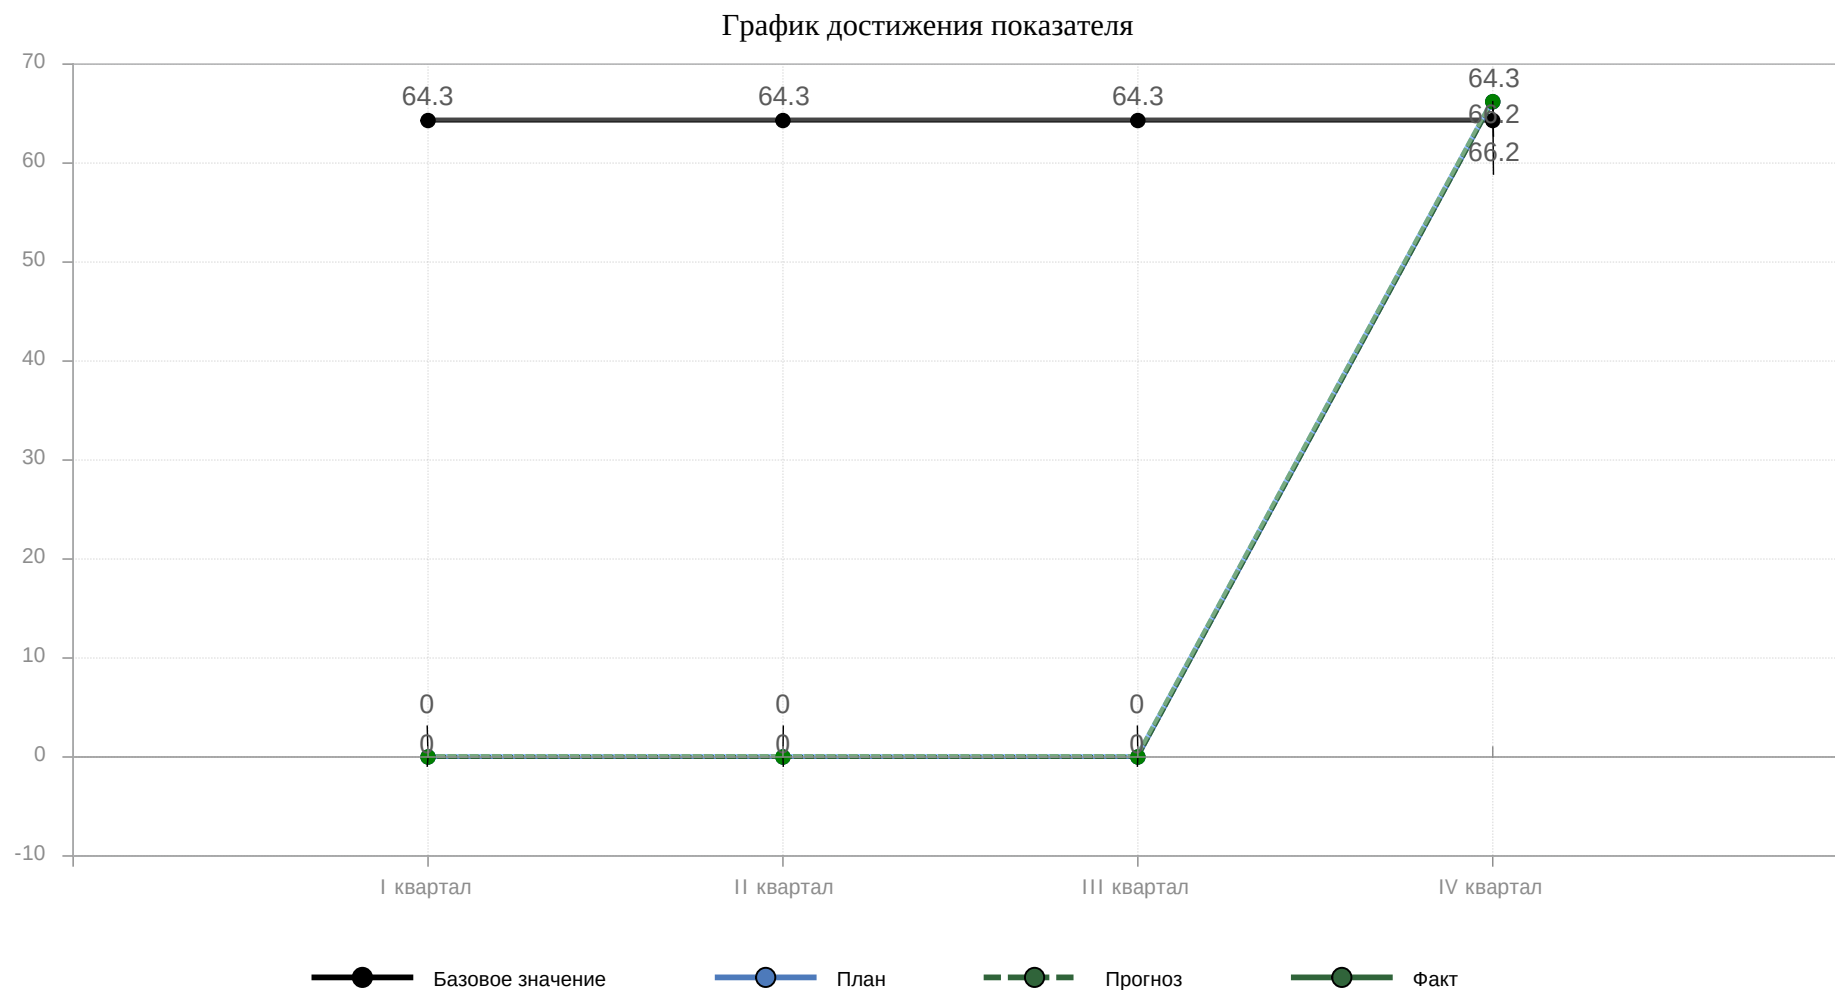


Рис. 9. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

Диаграмма достижения показателя

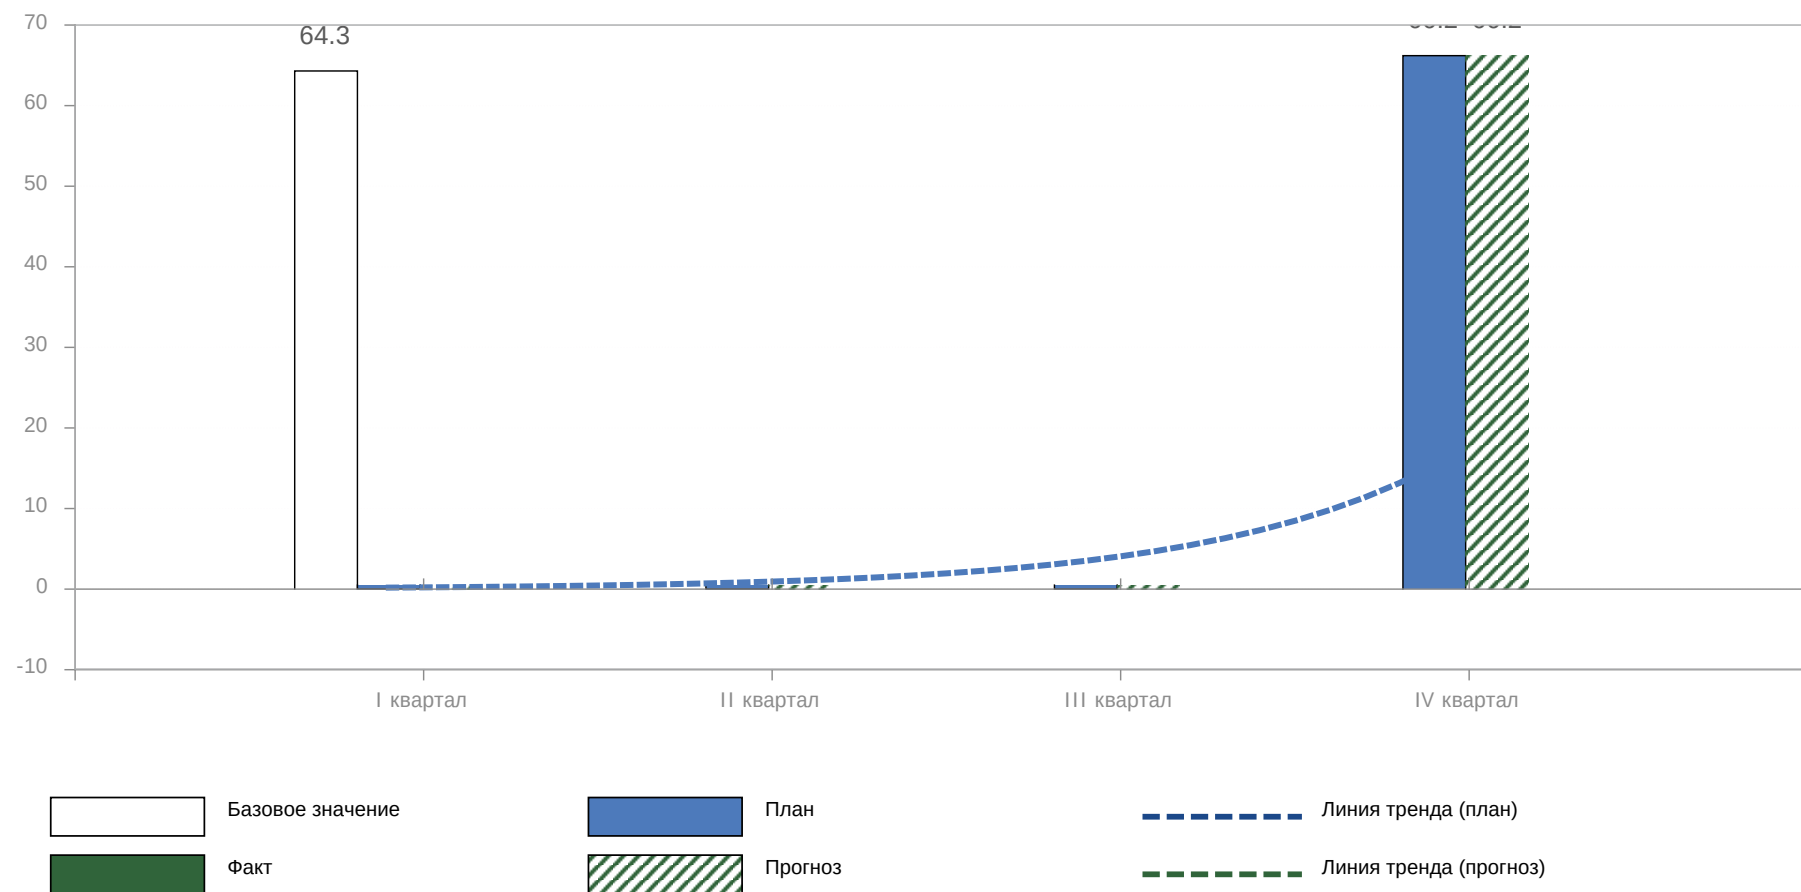


Рис. 10. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
