

Руководитель  
регионального проекта —  
Ваганов Владимир Михайлович  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

15.01.2021

Сертификат:

152140CB0C89CC1FF65A58FA96F6EDAD82FF0E9B

Владелец: Ваганов Владимир Михайлович

Действителен: с 09.11.2020 по 09.02.2022

ОДОБРЕН

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД**

*"(Т6-32) Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области"*

**Общий статус реализации**

| 1. Риски                                                                          | 2. Показатели                                                                     | 3. Бюджет | 4. Результаты                                                                       | 5. Контрольные точки                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | –         |  |  |
| Наличие отклонений                                                                | Наличие отклонений                                                                | --        | Наличие отклонений                                                                  | Наличие отклонений                                                                  |

## 1. Ключевые риски

| № п/п | Статус                                                                              | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Предлагаемые решения                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |    | 6. План мероприятий                                    | Мероприятие: Обеспечение популяризации среди предприятий-экспортеров, органов исполнительной власти Кемеровской области, контролирующих органов формы взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ». Некритические риски невыполнения, Причина риска: Публичное предоставление доступа к сервисам «Одного окна» намечено АО "РЭЦ" на ноябрь 2020 года., Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.                                                                                                                                                                                                             | 1. Проинформировать кузбасских экспортеров о сервисе «Одного окна» АО "РЭЦ" , срок исполнения 31.01.2021;                                 |
| 2     |    | 6. План мероприятий                                    | Мероприятие: Обеспечение популяризации среди предприятий-экспортеров, органов исполнительной власти Кемеровской области, контролирующих органов формы взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ». Некритические риски невыполнения, Причина риска: Система "Одно окно" запущена 26 ноября 2020 г. Ведётся работа по обеспечению популяризации среди предприятий-экспортеров, органов исполнительной власти Кемеровской области, контролирующих органов формы взаимодействия в электронной форме по принципу "одного окна" и на базе цифровой платформы АО "РЭЦ", Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г. | 1. Проинформировать кузбасских экспортеров о сервисе «Одного окна» АО "РЭЦ" , срок исполнения 31.01.2021;                                 |
| 3     |   | 6. План мероприятий                                    | Мероприятие: Проведение информационной кампании по условиям вхождения компаний в реестр экспортеров. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Система "Одно окно" запущена 26 ноября 2020 г. Ведётся работа по проведению информационной кампании по условиям вхождения компаний в реестр экспортеров, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Проинформировать кузбасских экспортеров о сервисе "Одно окно" АО "РЭЦ", срок исполнения 31.01.2021;                                    |
| 4     |  | 6. План мероприятий                                    | Мероприятие: Проведение информационной кампании по условиям вхождения компаний в реестр экспортеров. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Система "Одно окно" запущена 26 ноября 2020 г. Ведётся работа по проведению информационной кампании по условиям вхождения компаний в реестр экспортеров, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Проинформировать кузбасских экспортеров о сервисе "Одно окно" АО "РЭЦ", срок исполнения 31.01.2021;                                    |
| 5     |  | 6. План мероприятий                                    | Мероприятие: Проведение мероприятий (конференций, семинаров) в целях популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области. Некритический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Органу исполнительной власти Кемеровской области, ответственному за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                        | риск невыполнения, Причина риска: Представительством Кузбасса при Правительстве РФ как органом исполнительной власти Кемеровской области, ответственным за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, прорабатывается план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.                                 | предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области, срок исполнения 31.01.2021; |
| 6     |        | 6. План мероприятий                                    | КТ: Информационные материалы о возможностях взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ» размещены в средствах массовой информации. Некритические риски невыполнения, Причина риска: Система "Одно окно" запущена 26 ноября 2020 г. Ведётся работа по размещению информационных материалов о возможностях взаимодействия в электронной форме по принципу "одного окна" и на базе цифровой платформы АО "РЭЦ", Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г. | 1. Проинформировать кузбасских экспортеров о сервисе "Одно окно" АО "РЭЦ", срок исполнения 31.01.2021;                                                                                                                      |
| 7     |        | 6. План мероприятий                                    | КТ: Информационные материалы о возможностях взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ» размещены в средствах массовой информации. Некритические риски невыполнения, Причина риска: Система "Одно окно" запущена 26 ноября 2020 г. Ведётся работа по информированию субъектов ВЭД о возможностях по работе в системе. , Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.                                                                                      | 1. Проинформировать кузбасских экспортеров о сервисе "Одно окно" АО "РЭЦ", срок исполнения 31.01.2021;                                                                                                                      |
| 8     |        | 6. План мероприятий                                    | Контрольная точка: Проведены разъяснения по условиям вхождения компаний в реестр экспортеров. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Сервис «Одно окно» запущен 26 ноября 2020 г. Ведётся работа по разъяснениям условий вхождения компаний в реестр экспортеров, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.                                                                                                                                                                                          | 1. Проинформировать кузбасских экспортеров о сервисе "Одно окно" АО "РЭЦ", срок исполнения 31.01.2021;                                                                                                                      |
| 9     |        | 6. План мероприятий                                    | Контрольная точка: Проведены разъяснения по условиям вхождения компаний в реестр экспортеров. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Сервис "одного окна" запущен 26 ноября 2020 г. Ведётся работа по разъяснениям вхождения компаний в реестр экспортеров, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.                                                                                                                                                                                                | 1. Проинформировать кузбасских экспортеров о сервисе "Одно окно" АО "РЭЦ", срок исполнения 31.01.2021;                                                                                                                      |
| 10    |        | 6. План мероприятий                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Органу исполнительной власти Кемеровской                                                                                                                                                                                 |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                        | Контрольная точка: Сформирован и утвержден план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Представительством Кузбасса при Правительстве РФ как органом исполнительной власти Кемеровской области, ответственным за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, прорабатывается план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г. | области, ответственному за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области, срок исполнения 31.01.2021;                                             |
| 11    |        | 6. План мероприятий                                    | Мероприятие: Обеспечение популяризации среди предприятий-экспортеров, органов исполнительной власти Кемеровской области, контролирующих органов формы взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ». Некритические риски невыполнения, Причина риска: Публичное предоставление доступа к сервисам «Одного окна» намечено АО "РЭЦ" на ноябрь 2020 года., Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.                                                                                                                                                                                                                         | 1. Проинформировать кузбасских экспортеров о сервисе «Одного окна» АО "РЭЦ", срок исполнения 31.01.2021;                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12    |        | 6. План мероприятий                                    | Мероприятие: Проведение информационной кампании по условиям вхождения компаний в реестр экспортеров. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Система "Одно окно" запущена 26 ноября 2020 г. Ведётся работа по информированию субъектов ВЭД о возможностях по работе в системе. , Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Проинформировать кузбасских экспортеров о сервисе "Одно окно" АО "РЭЦ", срок исполнения 31.01.2021;                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13    |        | 6. План мероприятий                                    | Мероприятие: Проведение мероприятий (конференций, семинаров) в целях популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Представительством Кузбасса при Правительстве РФ как органом исполнительной власти Кемеровской области, ответственным за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, прорабатывается план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.  | 1. Органу исполнительной власти Кемеровской области, ответственному за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области, срок исполнения 31.01.2021; |
| 14    |        | 6. План мероприятий                                    | Мероприятие: Проведение мероприятий (конференций, семинаров) в целях популяризации экспортной деятельности среди экономически                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Органу исполнительной власти Кемеровской области, ответственному за координацию развития                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                        | активного населения и молодежи Кемеровской области. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Представительством Кузбасса при Правительстве РФ как органом исполнительной власти Кемеровской области, ответственным за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, прорабатывается план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.                                                                                                                               | сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области, срок исполнения 31.01.2021;                                                                                             |
| 15    |        | 6. План мероприятий                                    | Мероприятие: Обеспечение популяризации среди предприятий-экспортеров, органов исполнительной власти Кемеровской области, контролирующих органов формы взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ». Некритические риски невыполнения, Причина риска: Система "одного окна" запущена 26 ноября 2020 г. Ведётся работа по информированию субъектов ВЭД о возможностях работы в системе. , Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.                                                                                                                                                                                       | 1. Проинформировать кузбасских экспортеров о сервисе «Одного окна» АО "РЭЦ" , срок исполнения 31.01.2021;                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16    |        | 6. План мероприятий                                    | Мероприятие: Проведение мероприятий (конференций, семинаров) в целях популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Представительством Кузбасса при Правительстве РФ как органом исполнительной власти Кемеровской области, ответственным за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, прорабатывается план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г. | 1. Органу исполнительной власти Кемеровской области, ответственному за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области, срок исполнения 31.01.2021; |
| 17    |        | 6. План мероприятий                                    | Контрольная точка: Проведены разъяснения по условиям вхождения компаний в реестр экспортеров. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Система "одного окна" запущена 26 ноября 2020 г. Ведётся работа по информированию субъектов ВЭД о возможностях по работе в системе. , Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Проинформировать кузбасских экспортеров о сервисе "Одно окно" АО "РЭЦ", срок исполнения 31.01.2021;                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18    |        | 6. План мероприятий                                    | Контрольная точка: Сформирован и утвержден план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Представительством Кузбасса при                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Органу исполнительной власти Кемеровской области, ответственному за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области,                                                                                                                                                                               |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Предлагаемые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                        | Правительстве РФ как органом исполнительной власти Кемеровской области, ответственным за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, прорабатывается план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | утвердить план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области, срок исполнения 31.01.2021;                                                                                                                                                                                         |
| 19    |        | 6. План мероприятий                                    | КТ: Информационные материалы о возможностях взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ» размещены в средствах массовой информации. Некритические риски невыполнения, Причина риска: Система "одного окна" запущена 26 ноября 2020 г. Ведётся работа по информированию субъектов ВЭД о возможностях по работе в системе., Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Проинформировать кузбасских экспортеров о сервисе "Одно окно" АО "РЭЦ", срок исполнения 31.01.2021;                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20    |        | 6. План мероприятий                                    | Контрольная точка: Сформирован и утвержден план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Представительством Кузбасса при Правительстве РФ как органом исполнительной власти Кемеровской области, ответственным за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, прорабатывается план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.                                                                                                                 | 1. Органу исполнительной власти Кемеровской области, ответственному за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области, срок исполнения 31.01.2021; |
| 21    |        | 6. План мероприятий                                    | Контрольная точка: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта). Некритический риск невыполнения. , Причина риска: Внедрение РЭС 2.0 в Кузбассе перенесено на 01.12.2021 на основании Дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области" на территории Кемеровской области-Кузбасса от 21.12.2020 № 2019-Т60044-1/1., Вероятность: 10%, Последствия | 1. Актуализация паспорта проекта., срок исполнения 31.01.2021, Актуализация паспорта проекта будет проведена в январе 2021 г.;                                                                                                                                                                                                                                        |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Предлагаемые решения                                                                                                              |
|-------|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                        | наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |
| 22    |        | 4. Результаты                                          | Результат: Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Внедрение РЭС 2.0 в Кузбассе перенесено на 01.12.2021 на основании Дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области" на территории Кемеровской области - Кузбасса от 21.12.2020 № 2019-Т60044-1/1., Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. | 1. Актуализация паспорта проекта., срок исполнения 30.11.2021, Актуализация паспорта проекта будет проведена в январе 2021 г. ;   |
| 23    |        | 3. Цели и показатели                                   | Показатель: Число зарегистрированных уникальных пользователей (организаций и индивидуальных предпринимателей) информационной системы «одного окна». Некритический риск невыполнения, Причина риска: Система "одного окна" запущена 26 ноября 2020 г. Ведётся работа по информированию субъектов ВЭД о возможностях по работе в системе., Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.                                                                                                                                     | 1. Провести информирование потенциальных пользователей о возможностях работы в системе "одного окна", срок исполнения 31.12.2021; |
| 24    |        | 3. Цели и показатели                                   | Показатель: Количество зарубежных бизнес-миссий во главе с Губернатором Кемеровской области или его заместителями. Некритический риск невыполнения, Причина риска: В связи с пандемией Covid-19 осуществление бизнес-миссий было перенесено на 2021 год, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.                                                                                                                                                                                                                     | 1. Провести зарубежные бизнес-миссии после снятия ограничений, связанный с пандемией Covid-19, срок исполнения 31.12.2021;        |

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

| № п/п | Статус | Наименование целей и показателей                                                                                           | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |    |     |    | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----|-----|----|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                            |                             |                                        | I                     | II | III | IV |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     |        | Количество зарубежных бизнес-миссий, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере | Единица                     | 4                                      | 0                     | 0  | 0   | 0  | 2                               | 0,00%              | Существует риск: Показатель: Количество зарубежных бизнес-миссий во главе с Губернатором Кемеровской области или его заместителями. Некритический риск невыполнения, Причина риска: В связи с пандемией Covid-19 осуществление бизнес-миссий было перенесено на 2021 год, Вероятность: 10%, ожидаемая дата |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус                                                                              | Наименование целей и показателей                                                                                                | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |    |     |    | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----|-----|----|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                     |                                                                                                                                 |                             |                                        | I                     | II | III | IV |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |    |                                                                                                                                 |                             |                                        |                       |    |     |    |                                 |                    | наступления: 31.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. Провести зарубежные бизнес-миссии после снятия ограничений, связанный с пандемией Covid-19, срок исполнения 31.12.2021. Проведение бизнес-миссий перенесено на 2021 год в связи с ограничениями, связанными с пандемией Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2     |   | Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году | Процент                     | 0                                      | 0                     | 0  | 0   | 20 | 20                              | 100,00%            | Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области" на территории Кемеровской области - Кузбасса." Соглашение АО "РЭЦ" от 21.12.2020г. №2019-Т60044-1/1, приложен файл. Внедрение РЭС 2.0 в Кузбассе перенесено на 01.12.2021 на основании Дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области" на территории Кемеровской области - Кузбасса от 21.12.2020 № 2019-Т60044-1/1. Решение по дальнейшему исполнению данного показателя в 2021 году будет принято на основании решения Проектного комитета национального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту" |
| 3     |  | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.                          | Штука                       | 0                                      | 0                     | 0  | 0   | 0  | 0                               | 100,00%            | Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области" на территории Кемеровской области - Кузбасса. " Соглашение АО "РЭЦ" от 21.12.2020г. №2019-Т60044-1/1, приложен файл. Внедрение РЭС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус                                                                            | Наименование целей и показателей                                                                                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |    |     |    | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----|-----|----|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                   |                                                                                                                                        |                             |                                        | I                     | II | III | IV |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |  |                                                                                                                                        |                             |                                        |                       |    |     |    |                                 |                    | 2.0 в Кузбассе перенесено на 01.12.2021 на основании Дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области" на территории Кемеровской области - Кузбасса от 21.12.2020 № 2019-Т60044-1/1.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4     |  | Число зарегистрированных уникальных пользователей (организаций и индивидуальных предпринимателей) информационной системы «одного окна» | Единица                     | 0                                      | 0                     | 0  | 0   | 0  | 8                               | 0,00%              | Существует риск: Показатель: Число зарегистрированных уникальных пользователей (организаций и индивидуальных предпринимателей) информационной системы «одного окна». Некритический риск невыполнения, Причина риска: Система "одного окна" запущена 26 ноября 2020 г. Ведётся работа по информированию субъектов ВЭД о возможностях по работе в системе., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г. Предлагаемые решения: 1. Провести информирование потенциальных пользователей о возможностях работы в системе "одного окна", срок исполнения 31.12.2021. |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

## 4. Статус достижения результатов

| №<br>п/п | Статус                                                                             | Наименование результата                                                                                                                                                                                                         | Достижение контрольных точек                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        |   | Создана система институтов поддержки экспорта в Кемеровской области<br>Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020                                                                                                                        |                                                                                      |
| 2        |   | Компании Кемеровской области приняли участие в конкурсе на соискание Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»<br>Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021 |                                                                                      |
| 3        |   | Кузбасские компании-экспортеры проинформированы о возможностях системы «одно окна» и условиях включения в реестр экспортеров на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»<br>Значение: 1,0000 Дата: 06.12.2021                           |                                                                                      |
| 4        |   | Организовано информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах финансовой поддержки экспортной деятельности<br>Значение: 1,0000 Дата: 04.02.2022                                                           |                                                                                      |
| 5        |   | Активизировано международное взаимодействие с иностранными государствами в торгово-экономической сфере<br>Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024                                                                                     |                                                                                      |
| 6        |   | Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.<br>Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2020                                                                                             |   |
| 7        |  | Осуществлена популяризация экспортной деятельности в Кемеровской области<br>Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024                                                                                                                   |                                                                                      |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

## 5. Динамика достижения контрольных точек

## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                    | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                                            | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.    |                               |        | Создана система институтов поддержки экспорта в Кемеровской области Значение: 1, на дату 31.12.2020                                        | 31.12.2020      | 29.12.2020   | Кириллов В. В.            | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о работе в рамках работы единой системы продвижения товаров на экспорт" Отчет Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 29.12.2020г. №20/Т6/1.7, приложен файл.<br>Выполнено.<br>С 2019 года Центр поддержки экспорта Кузбасса подключен к системе MVP, в которой пользователи получают услуги по поиску российских экспортеров, иностранных покупателей. С ноября 2019 года было подано 6 заявок от МПС, по 2 из которых был предоставлен перечень потенциальных покупателей. В разделе "Все услуги" с ноября 2019 года Центр поддержки экспорта Кузбасса обработал 20 заявок по различным направлениям.<br><br>Предоставлена информация : 1 из 1. |
| 1.1.  | ПК                            |        | Обеспечено подключение всех вовлеченных в систему продвижения экспорта товаров и услуг за рубеж элементов к единому программному комплексу | 31.12.2020      | 29.12.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о работе в рамках единой системы продвижения товаров на экспорт" Отчет Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 29.12.2020г. №20/Т6/1.7, приложен файл.<br>Выполнено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.1 | РРП                           |        | Обеспечение участия Кемеровской области в единой системе продвижения                                                                       | 31.12.2020      | 29.12.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                                  |        | экспорта товаров и услуг за рубеж                                                                                                                                                                                                                         |                 |              |                              | Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о работе в рамках единой системы продвижения товаров на экспорт" Отчет Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 29.12.2020г. №20/Т6/1.7, приложен файл.<br>Выполнено.                                                        |
| 1.2.     | ПК                               |        | Сформирована партнерская сеть<br>агентов и сервисных компаний                                                                                                                                                                                             | 31.12.2020      | 29.12.2020   | Кириллов В. В.               | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о работе в рамках работы единой системы продвижения товаров на экспорт" Отчет Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 29.12.2020г. №20/Т6/1.7, приложен файл.<br>Выполнено.                                   |
| 1.2.1    | РПП                              |        | Обеспечение участия Кемеровской<br>области в единой системе продвижения<br>экспорта товаров и услуг за рубеж                                                                                                                                              | 31.12.2020      | 29.12.2020   | Кириллов В. В.               | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о работе в рамках работы единой системы продвижения товаров на экспорт" Отчет Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 29.12.2020г. №20/Т6/1.7, приложен файл.<br>Выполнено.                                   |
| 2.       |                                  |        | <i>Компании Кемеровской области<br/>приняли участие в конкурсе на<br/>соискание Национальной премии<br/>Правительства Российской<br/>Федерации в области международной<br/>кооперации и экспорта «Экспортер<br/>года» Значение: 1, на дату 31.12.2021</i> | 31.12.2021      | 30.12.2021   | Кириллов В. В.               | Информация по значению результата: В<br>работе.Подтверждающие документы:<br>1. "Ссылка на информационный ресурс" Иное<br>Администрации Правительства Кузбасса от 29.09.2020г.<br>№б/н, указана ссылка.<br>В работе.<br>Риск невыполнения отсутствует.<br><br>Предоставлена информация : 0 из 1. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                          | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                                                                  | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.  | ПК                            |        | Проведен региональный этап Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»                 | 01.05.2020      | 29.09.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Просрочка 151 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "ссылка на информационный ресурс" Иное регионального центра поддержки экспорта Кузбасса от 29.09.2020г. №б/н, указана ссылка.<br>2. "программа финального мероприятия" Иное регионального центра поддержки экспорта Кузбасса от 29.09.2020г. №б/н, приложен файл.<br>3. "приглашение на финальное мероприятие" Иное регионального центра поддержки экспорта Кузбасса от 29.09.2020г. №б/н, приложен файл.<br>Выполнено. 29.09.2020 состоялось подведение итогов и награждение победителей регионального этапа конкурса "Экспортер года" |
| 2.1.1 | РРП                           |        | Организация проведения регионального этапа Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» | 01.05.2020      | 29.09.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Просрочка 151 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "ссылка на информационный портал" Иное регионального центра поддержки экспорта Кузбасса от 29.09.2020г. №б/н, указана ссылка.<br>2. "программа финального мероприятия" Иное регионального центра поддержки экспорта Кузбасса от 29.09.2020г. №б/н, приложен файл.<br>3. "приглашение на финальное мероприятие" Иное регионального центра поддержки экспорта Кузбасса от 29.09.2020г. №б/н, приложен файл.<br>Выполнено. 29.09.2020 состоялось подведение итогов и награждение победителей регионального этапа конкурса "Экспортер года" |
| 3.    |                               |        | Кузбасские компании-экспортеры проинформированы о возможностях системы «одно окна» и условиях                                                                    | 06.12.2021      | 06.12.2021   | Кириллов В. В.            | Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                              | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                              | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                         | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                                  |   | <i>включения в реестр экспортеров на<br/>базе цифровой платформы АО «РЭЦ»<br/>Значение: 1, на дату 06.12.2021</i>                                       |                 |              |                              | <p>1. "Отчет об источниках и периодичности освещения информации о цифровой платформе АО "РЭЦ" и взаимодействия по принципу "одного окна"" Иное Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 09.12.2020г. №20/Т6/3.4.1, приложен файл.</p> <p>2. "Письмо заместителя Губернатора Кузбасса - руководителя Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации" Письмо Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 02.12.2020г. №41/189, приложен файл.</p> <p>3. "Письмо заместителя Губернатора Кузбасса - руководителя Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации" Письмо Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 02.12.2020г. №41/188, приложен файл.</p> <p>В работе.<br/>Риск невыполнения отсутствует.<br/>В 2020 г. проведена информационная кампания, которая будет продолжена в 2021 г.</p> <p>Предоставлена информация : 0 из 1.</p> |
| 3.1.     | ПК                               |  | Подготовлены информационные материалы о возможностях взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ» | 01.07.2020      | 01.07.2020   | Кириллов В. В.               | <p>Выполнено.<br/>Подтверждающие документы:<br/>1. "ссылка на информационный ресурс" Иное регионального Центра поддержки экспорта Кузбасса от 01.07.2020г. №6/н, указана ссылка.<br/>Выполнено</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.1.1    | РРП                              |  | Обеспечение популяризации среди предприятий-экспортеров, органов исполнительной власти Кемеровской                                                      | 01.07.2020      | 01.07.2020   | Кириллов В. В.               | <p>Выполнено.<br/>Подтверждающие документы:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                    | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                               | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                  |        | области, контролирующих органов<br>формы взаимодействия в электронной<br>форме по принципу «одного окна» и на<br>базе цифровой платформы АО «РЭЦ»                                                                                                             |                 |              |                              | 1. "ссылка на информационный ресурс" Иное<br>регионального Центра поддержки экспорта Кузбасса от<br>01.07.2020г. №б/н, указана ссылка.<br>Выполнено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.2.     | ПК                               |        | Информационные материалы о<br>возможностях взаимодействия в<br>электронной форме по принципу<br>«одного окна» и на базе цифровой<br>платформы АО «РЭЦ» размещены в<br>средствах массовой информации                                                           | 01.07.2020      | 09.12.2020   | Кириллов В. В.               | Выполнено.<br>Просрочка 161 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет об источниках и периодичности освещения<br>информации о работе цифровой платформы АО "РЭЦ" и<br>взаимодействия по принципу "одного окна"" Иное<br>Представительства Кузбасса при Правительстве<br>Российской Федерации от 09.12.2020г. №20/Т6/3.4.1,<br>приложен файл.<br>Выполнено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2.1    | РНП                              |        | Обеспечение популяризации среди<br>предприятий-экспортеров, органов<br>исполнительной власти Кемеровской<br>области, контролирующих органов<br>формы взаимодействия в электронной<br>форме по принципу «одного окна» и на<br>базе цифровой платформы АО «РЭЦ» | 01.07.2020      | 09.12.2020   | Кириллов В. В.               | Выполнено.<br>Просрочка 161 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет об источниках и периодичности освещения<br>информации о работе цифровой платформы АО "РЭЦ" и<br>взаимодействия по принципу "одного окна"" Иное<br>Представительства Кузбасса при Правительстве<br>Российской Федерации от 09.12.2020г. №20/Т6/3.4.1,<br>приложен файл.<br>Риск снят:<br>Мероприятие: Обеспечение популяризации среди<br>предприятий-экспортеров, органов исполнительной<br>власти Кемеровской области, контролирующих органов<br>формы взаимодействия в электронной форме по<br>принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы<br>АО «РЭЦ». Некритические риски невыполнения,<br>Причина риска: Система "одного окна" запущена 26<br>ноября 2020 г. Ведётся работа по информированию |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                      | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                 | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                  |        |                                                                                 |                 |              |                              | субъектов ВЭД о возможностях работы в системе. ,<br>Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:<br>31.12.2020г.<br>Предлагаемые решения:<br>1. Проинформировать кузбасских экспортеров о сервисе<br>«Одного окна» АО "РЭЦ" , срок исполнения 31.12.2020.<br>Выполнено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.3.     | ПК                               |        | Проведены разъяснения по условиям<br>вхождения компаний в реестр<br>экспортеров | 01.08.2020      | 09.12.2020   | Кириллов В. В.               | Выполнено.<br>Просрочка 130 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет об источниках и периодичности освещения<br>информации о цифровой платформе АО "РЭЦ" и<br>взаимодействию по принципу "одного окна"" Иное<br>Представительства Кузбасса при Правительстве<br>Российской Федерации от 09.12.2020г. №20/Т6/3.4.1,<br>приложен файл.<br>2. "Письмо заместителя Губернатора Кузбасса -<br>руководителя Представительства Кузбасса при<br>Правительстве Российской Федерации В.В. Кириллова"<br>Письмо Представительства Кузбасса при Правительстве<br>Российской Федерации от 02.12.2020г. №41/189,<br>приложен файл.<br>3. "Письмо заместителя Губернатора Кузбасса -<br>руководителя Представительства Кузбасса при<br>Правительстве Российской Федерации" Письмо<br>Представительства Кузбасса при Правительстве<br>Российской Федерации от 02.12.2020г. №41/188,<br>приложен файл.<br>Риск снят:<br>Контрольная точка: Проведены разъяснения по условиям<br>вхождения компаний в реестр экспортеров.<br>Некритический риск невыполнения, Причина риска:<br>Система "одного окна" запущена 26 ноября 2020 г. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие  
отклонений

 Наличие  
отклонений

 Наличие критических  
отклонений

 Сведения не  
представлены

 Прогнозные  
сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                        | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                               |        |                                                                                        |                 |              |                           | Ведётся работа по информированию субъектов ВЭД о возможностях по работе в системе. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.<br>Предлагаемые решения:<br>1. Проинформировать кузбасских экспортеров о сервисе "Одно окно" АО "РЭЦ", срок исполнения 31.12.2020. Выполнено.<br>Проведена информационная кампания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.3.1 | РРП                           |        | Проведение информационной кампании по условиям вхождения компаний в реестр экспортеров | 01.08.2020      | 09.12.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Просрочка 130 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет об источниках и периодичности освещения информации о цифровой платформе АО "РЭЦ" и взаимодействии по принципу "одного окна"" Иное Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 09.12.2020г. №20/Т6/3.4.1, приложен файл.<br>2. "Письмо заместителя Губернатора Кузбасса - руководителя Представительства Кузбаса при Правительстве Российской Федерации В.В. Кириллова" Письмо Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 02.12.2020г. №41/189, приложен файл.<br>3. "Письмо заместителя Губернатора Кузбасса - руководителя Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации В.В. Кириллова" Письмо Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 02.12.2020г. №41/188, приложен файл.<br>Риск снят:<br>Мероприятие: Проведение информационной кампании по условиям вхождения компаний в реестр экспортеров.<br>Некритический риск невыполнения, Причина риска: |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                              | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                                                                                         | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                  |        |                                                                                                                                                         |                 |              |                              | Система "одного окна" запущена 26 ноября 2020 г. Ведётся работа по информированию субъектов ВЭД о возможностях по работе в системе. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.<br>Предлагаемые решения:<br>1. Проинформировать кузбасских экспортеров о сервисе "Одно окно" АО "РЭЦ", срок исполнения 31.12.2020. Выполнено.<br>Проведена информационная кампания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.4.     | ПК                               |        | Подготовлены информационные материалы о возможностях взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ» | 31.12.2020      | 09.12.2020   | Кириллов В. В.               | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет об источниках и периодичности освещения информации о работе цифровой платформы АО "РЭЦ" и взаимодействия по принципу "одного окна"" Иное Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 09.12.2020г. №20/Т6/3.4.1, приложен файл.<br>2. "Письмо заместителя Губернатора Кузбасса - руководителя Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации" Письмо Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 02.12.2020г. №41/189, приложен файл.<br>3. "Письмо заместителя Губернатора Кузбасса - руководителя Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации" Письмо Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 02.12.2020г. №41/188, приложен файл.<br>Выполнено. |
| 3.4.1    | РРП                              |        | Обеспечение популяризации среди предприятий-экспортеров, органов исполнительной власти Кемеровской                                                      | 31.12.2020      | 09.12.2020   | Кириллов В. В.               | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                                                          | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                                                     | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                  |        | области, контролирующих органов<br>формы взаимодействия в электронной<br>форме по принципу «одного окна» и на<br>базе цифровой платформы АО «РЭЦ»                                                   |                 |              |                              | 1. "Отчет об источниках и периодичности освещения<br>информации о работе цифровой платформы АО "РЭЦ" и<br>взаимодействия по принципу "одного окна" " Иное<br>Представительства Кузбасса при Правительстве<br>Российской Федерации от 09.12.2020г. №20/Т6/3.4.1,<br>приложен файл.<br>2. "Информационное письмо заместителя Губернатора<br>Кузбасса-руководителя Представительства Кузбасса при<br>Правительстве Российской Федерации В.В. Кириллова"<br>Письмо Представительства Кузбасса при Правительстве<br>Российской Федерации от 02.12.2020г. №41/189,<br>приложен файл.<br>3. "Письмо заместителя Губернатора Кузбасса -<br>руководителя Представительства Кузбасса при<br>Правительстве Российской Федерации В.В. Кириллова"<br>Письмо Представительства Кузбасса при Правительстве<br>Российской Федерации от 02.12.2020г. №41/188,<br>приложен файл. |
| 3.5.     | ПК                               |        | Информационные материалы о<br>возможностях взаимодействия в<br>электронной форме по принципу<br>«одного окна» и на базе цифровой<br>платформы АО «РЭЦ» размещены в<br>средствах массовой информации | 31.12.2020      | 09.12.2020   | Кириллов В. В.               | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет об источниках и периодичности освещения<br>информации о цифровой платформе АО "РЭЦ" и<br>взаимодействию по принципу "одного окна"" Иное<br>Представительства Кузбасса при Правительстве<br>Российской Федерации от 09.12.2020г. №20/Т6/3.4.1,<br>приложен файл.<br>2. "Письмо заместителя Губернатора Кузбасса -<br>руководителя Представительства Кузбасса при<br>Правительстве Российской Федерации" Письмо<br>Представительства Кузбасса при Правительстве<br>Российской Федерации от 02.12.2020г. №41/189,<br>приложен файл.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                     | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                             | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                 |              |                           | 3. "Письмо заместителя Губернатора Кузбасса - руководителя Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации" Письмо Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 02.12.2020г. №41/188, приложен файл.<br>Выполнено.<br>Проведена информационная кампания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.5.1 | РРП                           |        | Обеспечение популяризации среди предприятий-экспортеров, органов исполнительной власти Кемеровской области, контролирующих органов формы взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ» | 31.12.2020      | 09.12.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет об источниках и периодичности освещения информации о цифровой платформе АО "РЭЦ" и взаимодействия по принципу "одного окна"" Иное Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 09.12.2020г. №20/Т6/3.4.1, приложен файл.<br>2. "Письмо заместителя Губернатора Кузбасса - руководителя Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации" Письмо Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 02.12.2020г. №41/189, приложен файл.<br>3. "Письмо заместителя Губернатора Кузбасса - руководителя Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации" Письмо Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 02.12.2020г. №41/188, приложен файл. |
| 4.    |                               |        | Организовано информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах финансовой поддержки экспортной                                                                                                                         | 04.02.2022      | 04.02.2022   | Кириллов В. В.            | Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о проведенных консультациях и поддержке,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений






Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                              | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                   | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                                                                                     |                                                                                                              | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                  |    | деятельности Значение: 1, на дату<br>04.02.2022                                                              |                 |              |                              | оказанной кузбасским товаропроизводителям-экспортерам по линии АО "РЭЦ" и Центра поддержки экспорта Кузбасса" Отчет Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 29.12.2020г. №20/Т6/5.3, приложен файл.<br>В работе.<br>Риск невыполнения отсутствует.<br><br>Предоставлена информация : 0 из 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.1.     | ПК                               |   | Проведены консультации кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ» | 01.01.2020      | 01.01.2020   | Кириллов В. В.               | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "ссылка на сайт" Ссылка регионального экспортного центра Кузбасса от 01.01.2020г. №б/н, указана ссылка. Выполнено. Центром поддержки экспорта Кемеровской области на постоянной основе проводятся консультации кузбасским товаропроизводителям–экспортерам о мерах финансовой поддержки АО «РЭЦ» (www.export42.ru). Дополнительно в рамках состоявшихся 31.07.2019 в г. Кемерово межрегионального экспортного агрофорума, 01.08.2019 в г. Новокузнецке межрегионального форума «Экспорт в приоритете», международной конференции по ВЭД 26.11.2019 в г. Кемерово спикерами выступили представители АО "РЭЦ", которые рассказали о реализуемых мерах поддержки экспортеров |
| 4.1.1    | РПП                              |  | Оказание содействия кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»    | 01.01.2020      | 01.01.2020   | Кириллов В. В.               | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "ссылка на сайт" Ссылка регионального центра поддержки Кузбасса от 01.01.2020г. №б/н, указана ссылка. Выполнено. Центром поддержки экспорта Кемеровской области на постоянной основе проводятся консультации кузбасским товаропроизводителям–экспортерам о мерах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                    | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                                               | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                  |        |                                                                                                               |                 |              |                              | финансовой поддержки АО «РЭЦ» ( <a href="http://www.export42.ru">www.export42.ru</a> ). Дополнительно в рамках состоявшихся 31.07.2019 в г. Кемерово межрегионального экспортного агрофорума, 01.08.2019 в г. Новокузнецке межрегионального форума «Экспорт в приоритете», международной конференции по ВЭД 26.11.2019 в г. Кемерово спикерами выступили представители АО "РЭЦ", которые рассказали о реализуемых мерах поддержки экспортеров |
| 4.2.     | ПК                               |        | Проведены консультации кузбасским товаропроизводителям– экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ» | 01.07.2020      | 01.07.2020   | Кириллов В. В.               | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "ссылка на информационный ресурс" Иное регионального Центра поддержки экспорта Кузбасса от 01.07.2020г. №б/н, указана ссылка.<br>Выполнено. Региональный Центр поддержки экспорта Кузбасса на постоянной основе оказывает консультативную поддержку по мерам поддержки АО "РЭЦ"                                                                                                                 |
| 4.2.1    | РПП                              |        | Оказание содействия кузбасским товаропроизводителям– экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»    | 01.07.2020      | 01.07.2020   | Кириллов В. В.               | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "ссылка на информационный ресурс" Иное регионального Центра поддержки экспорта Кузбасса от 01.07.2020г. №б/н, указана ссылка.<br>Выполнено. Региональный Центр поддержки экспорта Кузбасса на постоянной основе оказывает консультативную поддержку по мерам поддержки АО "РЭЦ"                                                                                                                 |
| 4.3.     | ПК                               |        | Проведены консультации кузбасским товаропроизводителям– экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ» | 01.01.2021      | 29.12.2020   | Кириллов В. В.               | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о проведенных консультациях и поддержке, оказанной кузбасским товаропроизводителям-экспортерам по линии АО "РЭЦ" и Центра поддержки                                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                       | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                                               | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                               |        |                                                                                                                                               |                 |              |                           | экспорта Кузбасса" Отчет Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 29.12.2020г. №20/Т6/5.3, приложен файл. Выполнено.                                                                                                                                                                                          |
| 4.3.1 | РРП                           |        | Оказание содействия кузбасским товаропроизводителям– экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»                                    | 01.01.2021      | 29.12.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о проведенных консультациях и поддержке, оказанной кузбасским товаропроизводителям-экспортерам по линии АО "РЭЦ" и Центра поддержки экспорта Кузбасса" Отчет Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 29.12.2020г. №20/Т6/5.3, приложен файл. Выполнено. |
| 5.    |                               |        | <i>Активизировано международное взаимодействие с иностранными государствами в торгово-экономической сфере Значение: 1, на дату 31.12.2024</i> | 31.12.2024      | 31.12.2024   | Кириллов В. В.            | Информация по значению результата: В работе.В работе. Риск невыполнения отсутствует.<br><br>Предоставлена информация : 0 из 1.                                                                                                                                                                                                            |
| 5.1.  | ПК                            |        | Определены приоритетные задачи развития международного взаимодействия в торгово-экономической сфере                                           | 31.10.2020      | 31.10.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Перечень приоритетных задач развития международного взаимодействия в торгово-экономической сфере " Иное Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 31.10.2020г. №б/н, приложен файл.                                                                             |
| 5.1.1 | РРП                           |        | Формирование перечня иностранных компаний, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс                  | 31.10.2020      | 31.10.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Перечень иностранных компаний, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс" Иное Представительства                                                                                                                                                   |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                              | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                                      | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                               |        |                                                                                                                                      |                 |              |                           | Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 31.10.2020г. №б/н, приложен файл. Выполнено.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.2.  | ПК                            |        | Сформирован план-график проведения зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год, целью которых                              | 31.10.2020      | 01.07.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "ссылка на интернет-ресурс" Иное регионального Центра поддержки экспорта Кузбасса от 01.07.2020г. № б/н, указана ссылка.<br>Выполнено. Сформирован план-график проведения зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год                                                            |
| 5.2.1 | РПП                           |        | Реализация ежегодных зарубежных бизнес-миссий, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере | 31.10.2020      | 01.07.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "ссылка на интернет-ресурс" Иное регионального Центра поддержки экспорта Кузбасса от 01.07.2020г. № б/н, указана ссылка.<br>Выполнено. Сформирован план-график проведения зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год                                                            |
| 5.3.  | ПК                            |        | Налажено взаимодействие с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс | 31.12.2020      | 22.12.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "План мероприятий по налаживанию взаимодействия с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс" Иное Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 22.12.2020г. №20/Т6/6.3, приложен файл. Выполнено. |
| 5.3.1 | РПП                           |        | Презентация экспортного потенциала Кемеровской области                                                                               | 31.12.2020      | 22.12.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "План мероприятий по налаживанию взаимодействия с                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                            | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                                                                                                                    | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                               |        |                                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                           | иностранными компаниями, в развитии сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс" Иное Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 22.12.2020г. №20/Т6/6.3, приложен файл. Выполнено.                                                                                                                                                          |
| 5.4.  | ПК                            |        | Сформирован перечень продукции, ее производителей в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс                                                                         | 31.12.2020      | 25.12.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Перечень продукции, ее производителей, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс" Иное Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 25.12.2020г. №20/Т6/6.4, приложен файл. Выполнено.                                                                                      |
| 5.4.1 | РПП                           |        | Определение целевых потребителей                                                                                                                                                                                   | 31.12.2020      | 25.12.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Перечень продукции, ее производителей, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс" Иное Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 25.12.2020г. №20/Т6/6.4, приложен файл. Выполнено.                                                                                      |
| 5.5.  | ПК                            |        | Сформирован план мероприятий по продвижению информации о номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс | 31.12.2020      | 22.12.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "План мероприятий по продвижению информации о номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании производства и экспорта которой заинтересован Кузбасс" Иное Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 22.12.2020г. №20/Т6/6.5, приложен файл. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                             | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                               |   |                                                                                                                                                                                                     |                 |              |                           | Выполнено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.5.1 | РРП                           |   | Формирование плана мероприятий по развитию сотрудничества между кузбасскими поставщиками продукции, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс, с их иностранными партнерами | 31.12.2020      | 22.12.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "План мероприятий по налаживанию взаимодействия с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс" Иное Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 22.12.2020г. №20/Т6/6.3, приложен файл.<br>Выполнено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.    |                               |  | <i>Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. Значение: 0, на дату 01.12.2020</i>                                                               | 01.12.2020      | 01.12.2021   | Кириллов В. В.            | Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы:<br>1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области на территории Кемеровской области - Кузбасса"" Соглашение Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации и Российского экспортного центра от 21.12.2020г. №2019-Т60044-1/1, приложен файл.<br>Существует риск:<br>Результат: Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. Некритический риск невыполнения., Причина риска: Внедрение РЭС 2.0 в Кузбассе перенесено на 01.12.2021 на основании Дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области" на территории Кемеровской области - Кузбасса от 21.12.2020 № 2019-Т60044-1/1., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2021г. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений






Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |              |                           | <p>Предлагаемые решения:</p> <p>1. Актуализация паспорта проекта., срок исполнения 30.11.2021, Актуализация паспорта проекта будет проведена в январе 2021 г. .</p> <p>В работе.</p> <p>Наличие некритических отклонений.</p> <p>В соответствии с Дополнительным соглашением между Представительством Кузбасса при Правительстве Российской Федерации и АО "РЭЦ" РЭС 2.0 подлежит внедрению в Кузбассе в 2021 г.</p> <p>Просрочка 364 дня.</p> <p>Предоставлена информация : 0 из 0.</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.1.  |                               |        | Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | 01.10.2020      | 21.12.2020   | Кириллов В. В.            | <p>Выполнено.</p> <p>Просрочка 81 дней.</p> <p>Подтверждающие документы:</p> <p>1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области"" Соглашение Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 21.12.2020г. №2019-Т60044-1/1, приложен файл.</p> <p>Выполнено.</p> <p>В соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области" от 21.12.2020 № 2019-Т60044-1/1 на территории Кемеровской области-Кузбасса внедрение РЭС 2.0 перенесено на 01.12.2021.</p> |
| 6.2.  |                               |        | Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.12.2020      | 01.12.2021   | Кириллов В. В.            | <p>В работе.</p> <p>Просрочка 365 дней.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                  |        | регионального проекта,<br>обеспечивающего достижение целей,<br>показателей и результатов<br>соответствующего федерального<br>проекта, обработка и формирование<br>заключений на отчеты, представляемые<br>участниками федерального проекта в<br>рамках мониторинга реализации<br>федерального проекта (результата<br>федерального проекта) |                 |              |                              | <p>Подтверждающие документы:</p> <p>1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области"" Соглашение Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 21.12.2020г. №2019-Т60044-1/1, приложен файл.</p> <p>Существует риск:</p> <p>Контрольная точка: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта). Некритический риск невыполнения. , Причина риска: Внедрение РЭС 2.0 в Кузбассе перенесено на 01.12.2021 на основании Дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области-Кузбасса от 21.12.2020 № 2019-Т60044-1/1., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.</p> <p>Предлагаемые решения:</p> <p>1. Актуализация паспорта проекта., срок исполнения 31.01.2021, Актуализация паспорта проекта будет проведена в январе 2021 г..</p> <p>В работе.</p> <p>Внедрение РЭС 2.0 в Кузбассе перенесено на 01.12.2021 на основании Дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта</p> |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                        | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                                                                | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                               |        |                                                                                                                                                                |                 |              |                           | "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области" на территории Кемеровской области - Кузбасса от 21.12.2020 № 2019-Т60044-1/1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.    |                               |        | Осуществлена популяризация экспортной деятельности в Кемеровской области Значение: 1, на дату 31.12.2024                                                       | 31.12.2024      | 31.12.2024   | Кириллов В. В.            | Информация по значению результата: В работе.В работе. В 2020 г. реализован комплекс мероприятий, направленных на популяризацию экспортной деятельности в Кемеровской области и на выход товаропроизводителей на внешние рынки, выявлены «истории успеха» региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки, осуществлено продвижение указанных «историй успеха» в средствах массовой информации Кемеровской области.<br><br>Предоставлена информация : 0 из 1.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.1.  | ПК                            |        | Сформирован и утвержден план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области | 01.11.2019      | 25.12.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Просрочка 420 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о реализации мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области в 2020 г." Отчет Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 25.12.2020г. №20/Т6/7.13-7.14, приложен файл.<br>Риск снят:<br>Контрольная точка: Сформирован и утвержден план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Представительством Кузбасса при Правительстве РФ как органом исполнительной власти Кемеровской области, |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                          | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                     | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                     |                 |              |                              | ответственным за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, прорабатывается план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.<br>Предлагаемые решения:<br>1. Органу исполнительной власти Кемеровской области, ответственному за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области, срок исполнения 31.12.2020.<br>Выполнено.<br>В связи с пандемией COVID-19 планирование мероприятий по популяризации экспорта было ограничено. В этой связи мероприятия организовывались, исходя из текущей эпидемиологической обстановки. Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях. |
| 7.1.1    | РРП                              |        | Проведение мероприятий (конференций, семинаров) в целях популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области | 01.11.2019      | 25.12.2020   | Кириллов В. В.               | Выполнено.<br>Просрочка 420 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о реализации мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области в 2020 г." Отчет Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 25.12.2020г. №20/Т6/7.13-7.14, приложен файл.<br>Риск снят:<br>Мероприятие: Проведение мероприятий (конференций,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                         | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                                                                                    | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                  |        |                                                                                                                                                    |                 |              |                              | семинаров) в целях популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Представительством Кузбасса при Правительстве РФ как органом исполнительной власти Кемеровской области, ответственным за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, прорабатывается план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.<br>Предлагаемые решения:<br>1. Органу исполнительной власти Кемеровской области, ответственному за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области, срок исполнения 31.12.2020.<br>Выполнено.<br>В связи с пандемией COVID-19 планирование мероприятий по популяризации экспорта было ограничено. В этой связи мероприятия организовывались, исходя из текущей эпидемиологической обстановки. Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях. |
| 7.2.     | ПК                               |        | Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации | 01.01.2020      | 01.01.2020   | Кириллов В. В.               | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "ссылка на видеосюжет" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 01.01.2020г. №б/н, указана ссылка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                             | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                     | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                               |        |                                                                                     |                 |              |                           | <p>2. "ссылка на видеосюжет" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 01.01.2020г. №б/н, указана ссылка.</p> <p>3. "ссылка на видеосюжет" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 01.01.2020г. №б/н, указана ссылка.</p> <p>Выполнено.</p> <p>31.07.2019 в г. Кемерово состоялся межрегиональный экспортный агрофорум.</p> <p>Информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний размещены, в том числе, в средствах массовой информации в телеграм-чате @exportkuzbassa, ВКонтakte <a href="https://vk.com/public184036690">https://vk.com/public184036690</a>, Facebook <a href="https://www.facebook.com/pg/innoteh42/posts/?ref=page_internal">https://www.facebook.com/pg/innoteh42/posts/?ref=page_internal</a></p> <p>Также подготовлены и выпущены в эфир видеосюжеты "Истории успешного бизнеса" об опыте предпринимательской деятельности экспортно ориентированных кузбасских компаний: <a href="https://yadi.sk/i/_U-UZ4d1fvGh1g">https://yadi.sk/i/_U-UZ4d1fvGh1g</a><br/> <a href="https://yadi.sk/i/MTv2qpiCEic7rg">https://yadi.sk/i/MTv2qpiCEic7rg</a><br/> <a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&amp;v=iQP046xtuZs&amp;feature=emb_logo">https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&amp;v=iQP046xtuZs&amp;feature=emb_logo</a></p> |
| 7.2.1 | РРП                           |        | Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки | 01.01.2020      | 01.01.2020   | Кириллов В. В.            | <p>Выполнено.</p> <p>Подтверждающие документы:</p> <p>1. "ссылка на видеосюжет" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 01.01.2020г. №б/н, указана ссылка.</p> <p>2. "ссылка на видеосюжет" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 01.01.2020г. №б/н, указана ссылка.</p> <p>3. "ссылка на видеосюжет" Ссылка департамента</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия          | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                     | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                  |        |                                                                     |                 |              |                              | инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 01.01.2020г. №б/н, указана ссылка.<br>Выполнено.<br>31.07.2019 в г. Кемерово состоялся межрегиональный экспортный агрофорум.<br>Информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний размещены, в том числе, в средствах массовой информации в телеграм-чате @exportkuzbassa, ВКонтakte <a href="https://vk.com/public184036690">https://vk.com/public184036690</a> , Facebook <a href="https://www.facebook.com/pg/innoteh42/posts/?ref=page_internal">https://www.facebook.com/pg/innoteh42/posts/?ref=page_internal</a><br>Также подготовлены и выпущены в эфир видеосюжеты "Истории успешного бизнеса" об опыте предпринимательской деятельности экспортно ориентированных кузбасских компаний: <a href="https://yadi.sk/i/_U-UZ4d1fvGh1g">https://yadi.sk/i/_U-UZ4d1fvGh1g</a><br><a href="https://yadi.sk/i/MTv2qpiCEic7rg">https://yadi.sk/i/MTv2qpiCEic7rg</a><br><a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&amp;v=iQP046xtuZs&amp;feature=emb_logo">https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&amp;v=iQP046xtuZs&amp;feature=emb_logo</a> |
| 7.3.     | ПК                               |        | Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация | 01.01.2020      | 01.01.2020   | Кириллов В. В.               | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "ссылка на сайт" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 01.01.2020г. №б/н, указана ссылка.<br>2. "ссылка на сайт" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 01.01.2020г. №б/н, указана ссылка.<br>Выполнено. На Инвестиционном портале Кемеровской области сформирован раздел, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области<br><a href="https://keminvest.ru/ru/pages/5d405446be3319630a000015">https://keminvest.ru/ru/pages/5d405446be3319630a000015</a><br>Также сформирован раздел на официальном сайте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                            | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                                                    | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                               |        |                                                                                                                                                    |                 |              |                           | департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области <a href="http://dep.keminvest.ru/">http://dep.keminvest.ru/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.3.1 | РРП                           |        | Создание раздела на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области                          | 01.01.2020      | 01.01.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "ссылка на сайт" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 01.01.2020г. №б/н, указана ссылка.<br>2. "ссылка на сайт" Ссылка департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области от 01.01.2020г. №б/н, указана ссылка.<br>Выполнено. На Инвестиционном портале Кемеровской области сформирован раздел, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области <a href="https://keminvest.ru/ru/pages/5d405446be3319630a000015">https://keminvest.ru/ru/pages/5d405446be3319630a000015</a><br>Также сформирован раздел на официальном сайте департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области <a href="http://dep.keminvest.ru/">http://dep.keminvest.ru/</a> |
| 7.4.  | ПК                            |        | Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации | 01.07.2020      | 01.07.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "ссылка на информационный ресурс" Иное регионального Центра поддержки экспорта Кузбасса от 01.07.2020г. №б/н, указана ссылка.<br>Выполнено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.4.1 | РРП                           |        | Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки                                                                | 01.07.2020      | 01.07.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "ссылка на информационный ресурс" Иное регионального Центра поддержки экспорта Кузбасса от 01.07.2020г. №б/н, указана ссылка.<br>Выполнено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.5.  | ПК                            |        | Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация                                                                                | 01.07.2020      | 01.07.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                   | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                           | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                               |        |                                                                                                                           |                 |              |                           | 1. "ссылка на информационный ресурс" Иное департамента инвестиционной политики Кузбасса от 01.07.2020г. №б/н, указана ссылка.<br>Выполнено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.5.1 | РРП                           |        | Создание раздела на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области | 01.07.2020      | 01.07.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "ссылка на информационный ресурс" Иное департамента инвестиционной политики Кузбасса от 01.07.2020г. №б/н, указана ссылка.<br>Выполнено                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.6.  | ПК                            |        | Проведен анализ экспортной деятельности компаний Кемеровской области                                                      | 01.10.2020      | 21.08.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "ссылка на интернет-ресурс" Иное департамента инвестиционной политики Кузбасса от 21.08.2020г. №б/н, указана ссылка.<br>Выполнено. 21.08.2020 проведено заседание Совета по развитию экспорта при Губернаторе Кузбасса, на котором, в том числе, руководитель Центра поддержки экспорта Кузбасса доложил об опыте выхода кузбасских компаний на внешние рынки через международные электронные площадки eBay, AliBaba |
| 7.6.1 | РРП                           |        | Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки                                       | 01.10.2020      | 21.08.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "ссылка на интернет-ресурс" Иное департамента инвестиционной политики Кузбасса от 21.08.2020г. №б/н, указана ссылка.<br>Выполнено. 21.08.2020 проведено заседание Совета по развитию экспорта при Губернаторе Кузбасса, на котором, в том числе, руководитель Центра поддержки экспорта Кузбасса доложил об опыте выхода кузбасских компаний на внешние рынки через международные                                    |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                     | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                |                 |              |                              | электронные площадки eBay, AliBaba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.7.     | ПК                               |        | Сформирован и утвержден план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области | 01.11.2020      | 25.12.2020   | Кириллов В. В.               | <p>Выполнено.<br/>Просрочка 54 дней.<br/>Подтверждающие документы:<br/>1. "Отчет о реализации мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области в 2020 г." Отчет Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 25.12.2020г. №20/Т6/7.13-7.14, приложен файл.<br/>Риск снят:<br/>Контрольная точка: Сформирован и утвержден план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Представительством Кузбасса при Правительстве РФ как органом исполнительной власти Кемеровской области, ответственным за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, прорабатывается план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.<br/>Предлагаемые решения:<br/>1. Органу исполнительной власти Кемеровской области, ответственному за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области, срок исполнения</p> |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                          | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                     | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                     |                 |              |                              | 31.12.2020.<br>Выполнено.<br>В связи с пандемией COVID-19 планирование мероприятий по популяризации экспорта было ограничено. В этой связи мероприятия организовывались, исходя из текущей эпидемиологической обстановки. Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.7.1    | РРП                              |        | Проведение мероприятий (конференций, семинаров) в целях популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области | 01.11.2020      | 25.12.2020   | Кириллов В. В.               | Выполнено.<br>Просрочка 54 дней.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о реализации мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области в 2020 г." Отчет Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 25.12.2020г. №20/Т6/7.13-7.14, приложен файл.<br>Риск снят:<br>Мероприятие: Проведение мероприятий (конференций, семинаров) в целях популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области. Некритический риск невыполнения, Причина риска: Представительством Кузбасса при Правительстве РФ как органом исполнительной власти Кемеровской области, ответственным за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, прорабатывается план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.<br>Предлагаемые решения:<br>1. Органу исполнительной власти Кемеровской области, |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                          | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                     | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                     |                 |              |                              | ответственному за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, утвердить план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области, срок исполнения 31.12.2020.<br>Выполнено.                 |
| 7.8.     | ПК                               |        | Реализованы мероприятия в соответствии с утвержденным планом-графиком                                                                                               | 31.12.2020      | 25.12.2020   | Кириллов В. В.               | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о реализации мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области в 2020 г." Отчет Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 25.12.2020г. №20/Т6/7.13-7.14, приложен файл.<br>Выполнено. |
| 7.8.1    | РПП                              |        | Проведение мероприятий (конференций, семинаров) в целях популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области | 31.12.2020      | 25.12.2020   | Кириллов В. В.               | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о реализации мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области в 2020 г." Отчет Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации от 25.12.2020г. №20/Т6/7.13-7.14, приложен файл.<br>Выполнено. |
| 7.9.     | ПК                               |        | Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации                  | 01.01.2021      | 25.12.2020   | Кириллов В. В.               | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Раздел на сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса, посвященный историям успеха экспортеров" Иное Центра поддержки экспорта Кузбасса от 25.12.2020г. №                                                                                                                                          |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                   | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |        |                                                                                                                           | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                               |        |                                                                                                                           |                 |              |                           | б/н, указана ссылка.<br>Выполнено.<br>Создан раздел на сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса, посвященный историям успеха экспортеров.                                                                                                                                                                                                       |
| 7.9.1  | РРП                           |        | Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки                                       | 01.01.2021      | 25.12.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Раздел на сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса, посвященный историям успеха экспортеров" Иное Центра поддержки экспорта Кузбасса от 25.12.2020г. № б/н, указана ссылка.<br>Выполнено.<br>Создан раздел на сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса, посвященный историям успеха экспортеров. |
| 7.10.  | ПК                            |        | Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация                                                       | 01.01.2021      | 25.12.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Ссылка на раздел инвестиционного портала Кузбасса, посвященный экспортной деятельности" Иное Департамента инвестиционной политики Кузбасса от 25.12.2020г. №б/н, указана ссылка.<br>Выполнено.<br>На инвестиционном портале Кузбасса создан раздел, посвященный экспортной деятельности.         |
| 7.10.1 | РРП                           |        | Создание раздела на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области | 01.01.2021      | 25.12.2020   | Кириллов В. В.            | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Ссылка на раздел на инвестиционном портале Кузбасса, посвященный экспортной деятельности" Иное Департамента инвестиционной политики Кузбасса от 25.12.2020г. №б/н, указана ссылка.<br>Выполнено.<br>На инвестиционном портале Кузбасса создан раздел, посвященный экспортной деятельности.       |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

### Динамика достижения контрольных точек

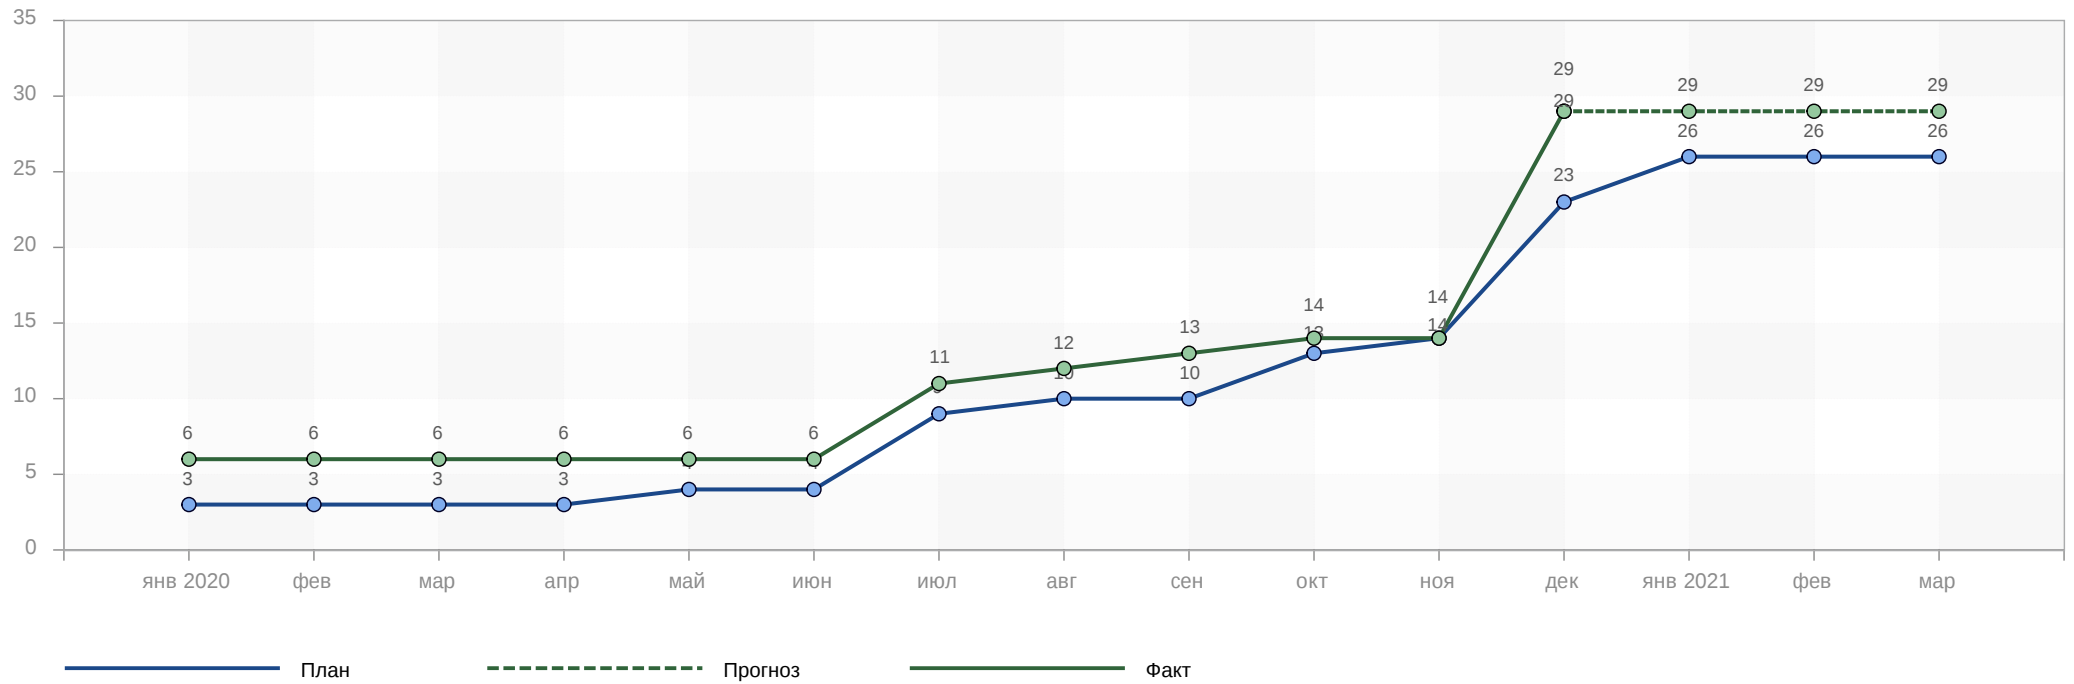


Рис. 1. "(Т6-32) Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области"

График достижения показателя

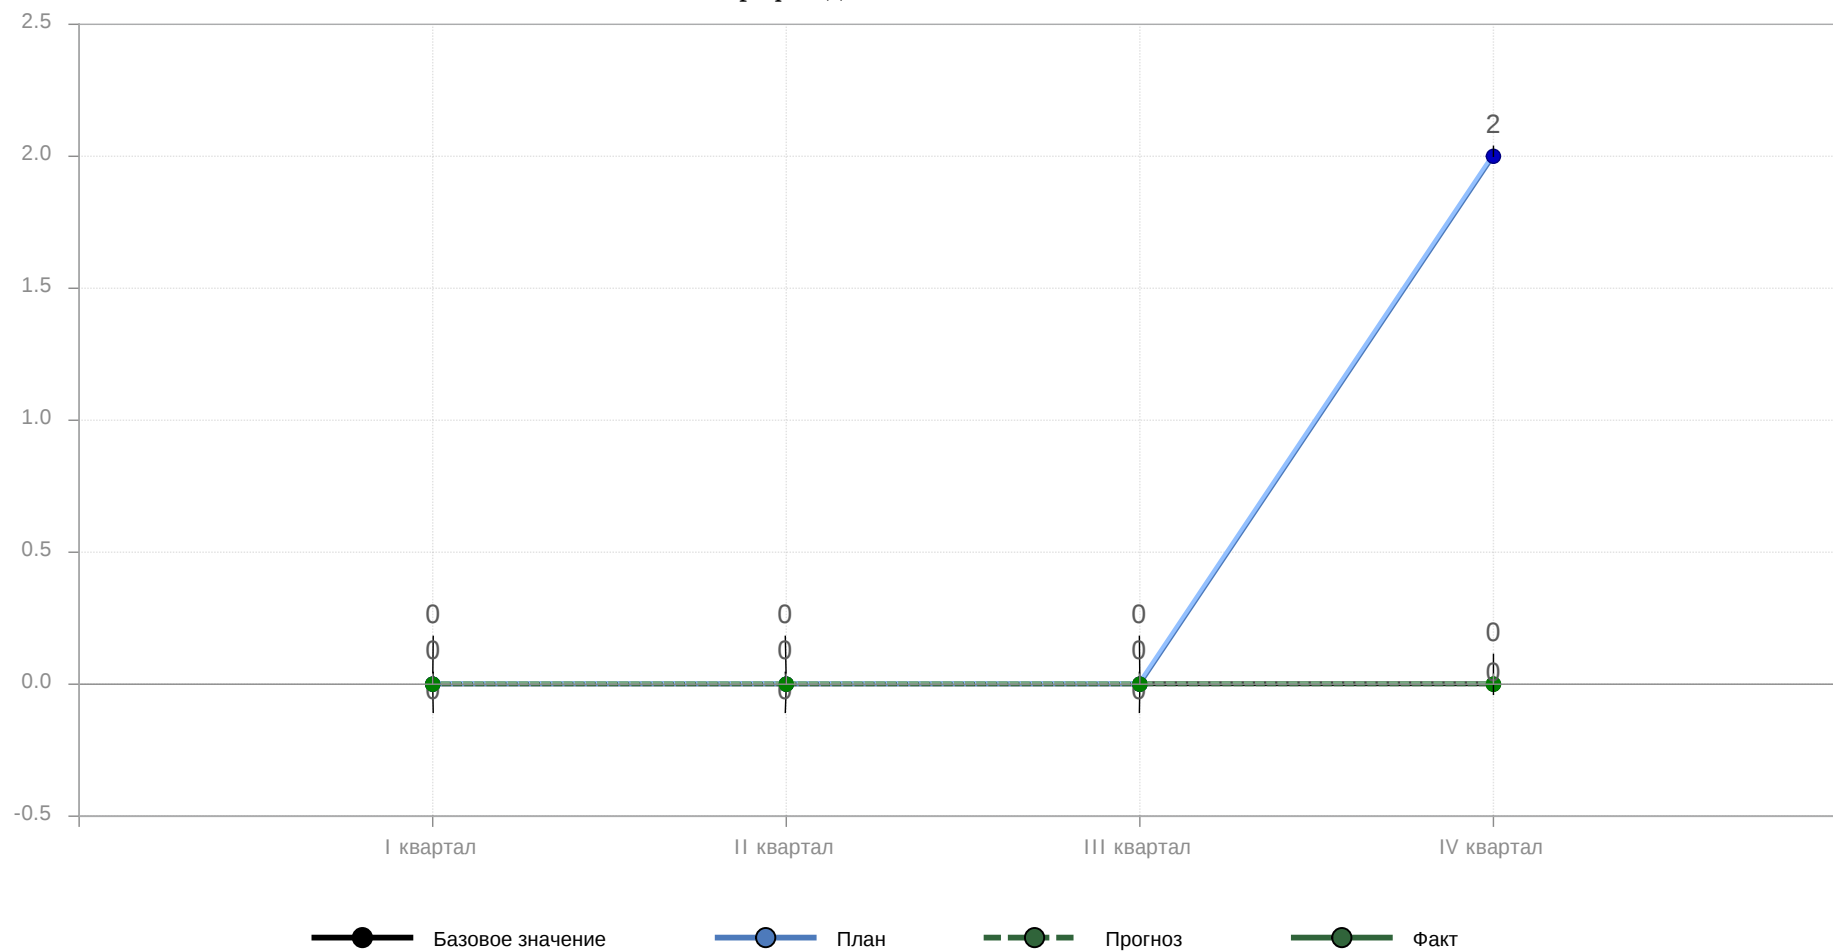


Рис. 1. Количество зарубежных бизнес-миссий, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере

Диаграмма достижения показателя

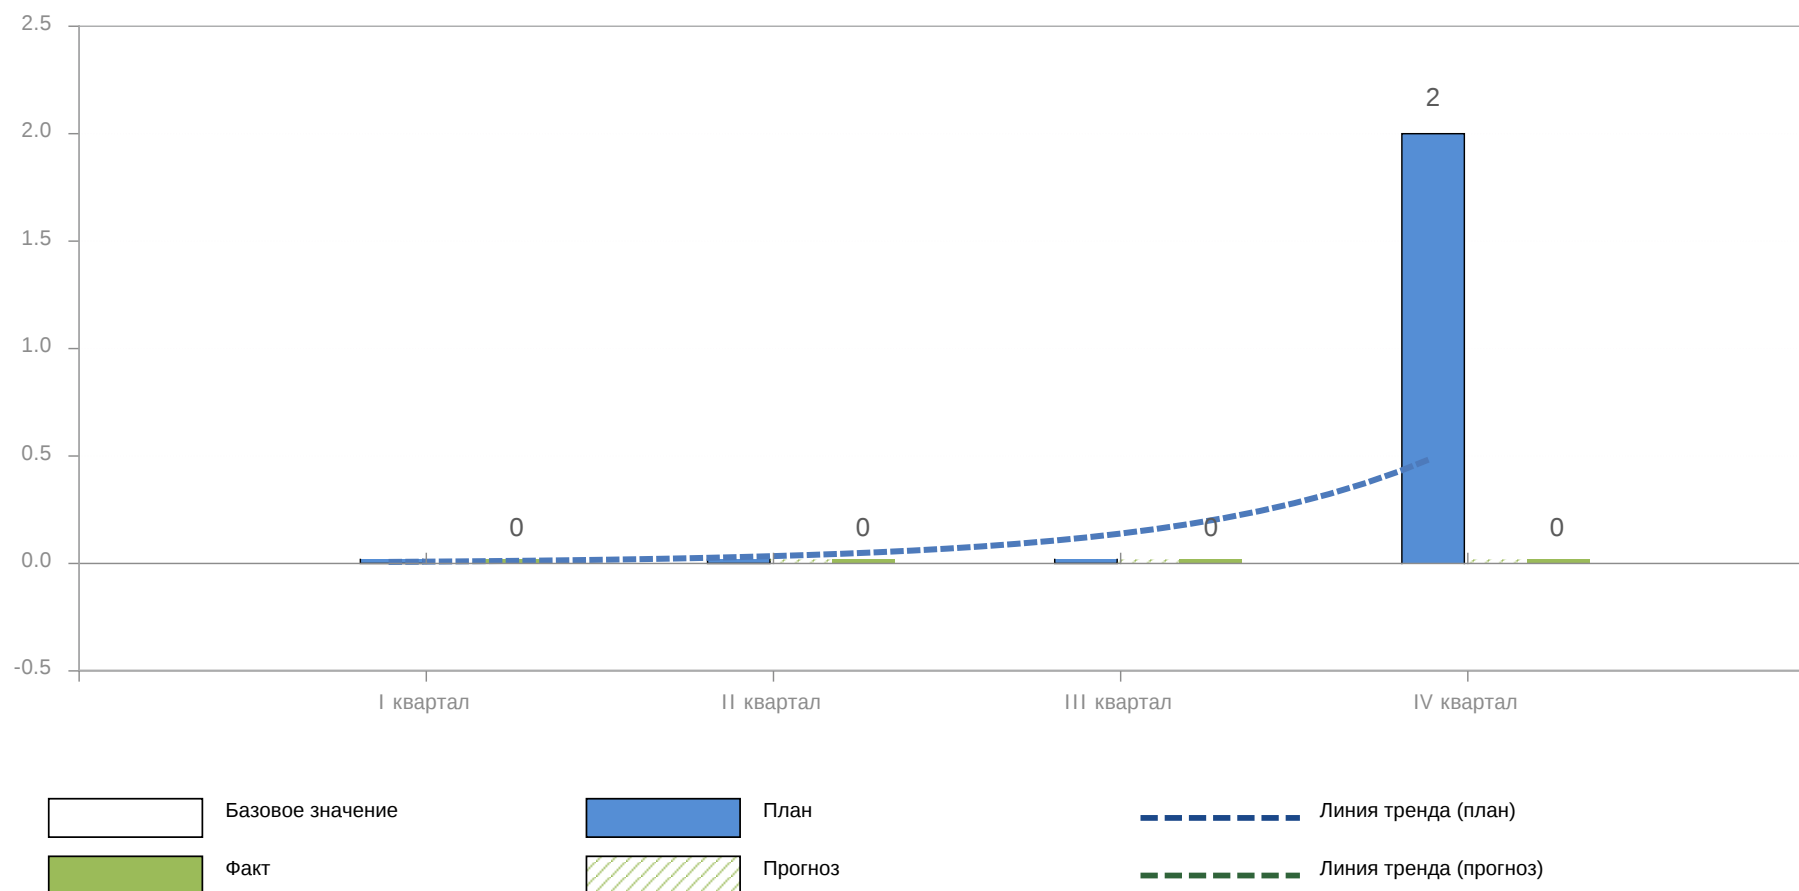


Рис. 2. Количество зарубежных бизнес-миссий, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере

График достижения показателя

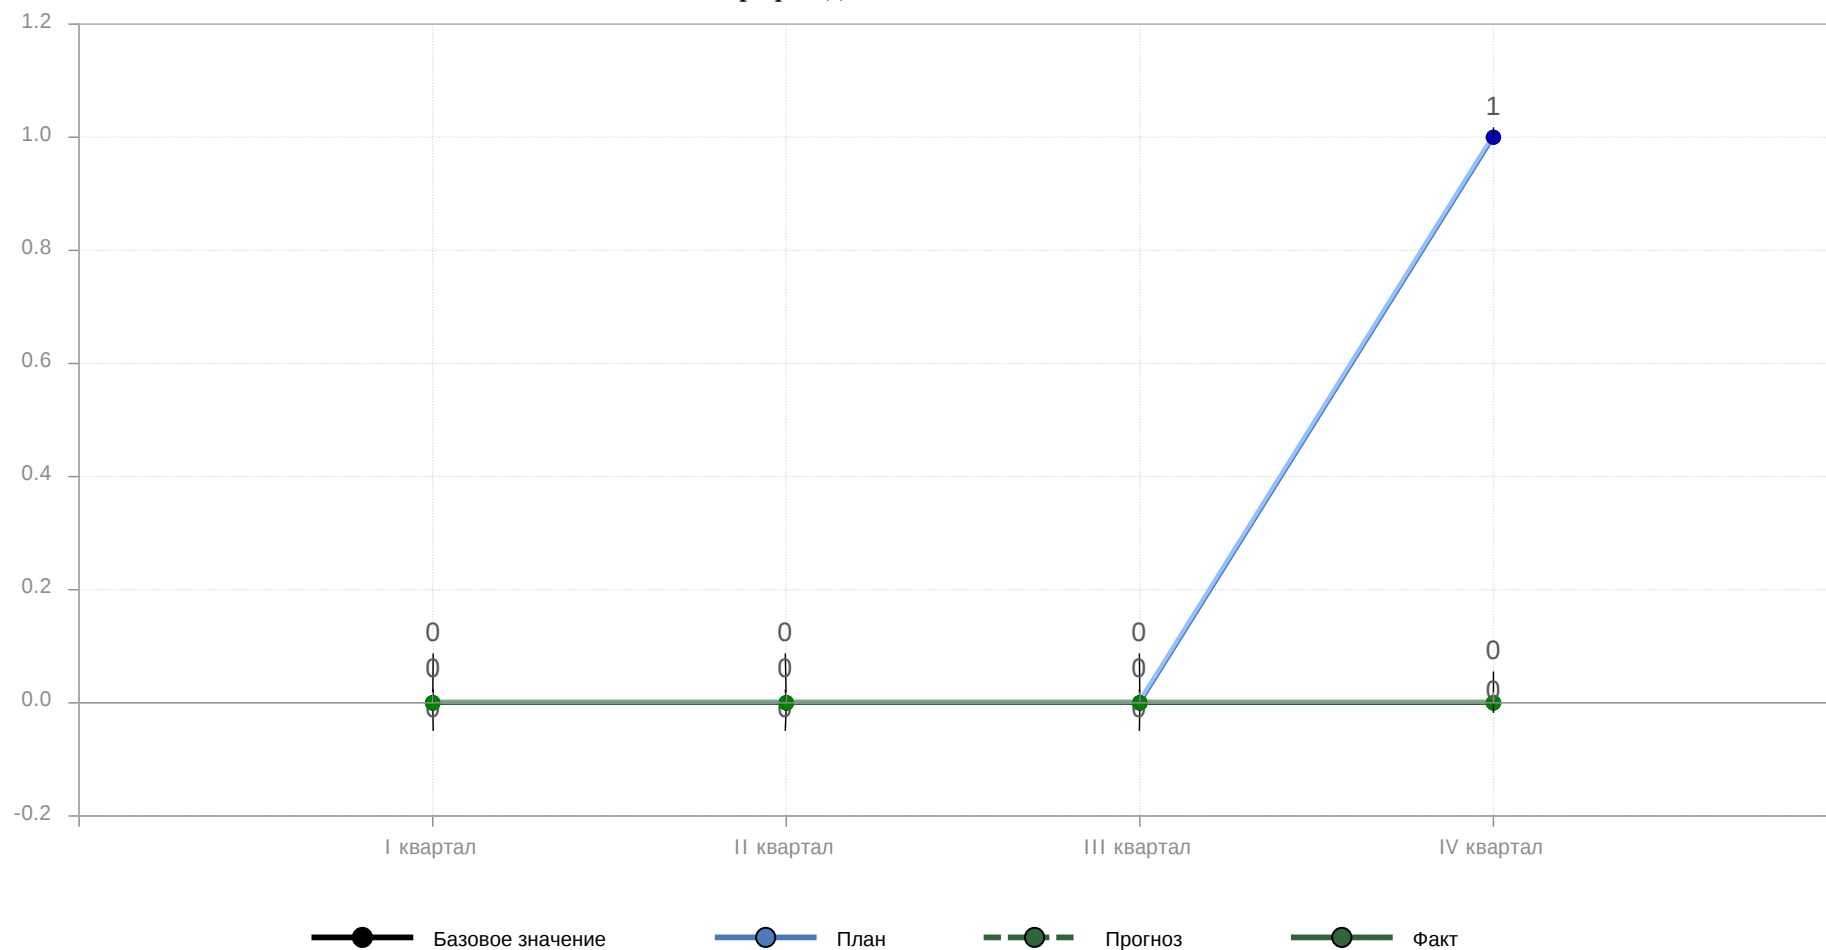


Рис. 3. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

Диаграмма достижения показателя

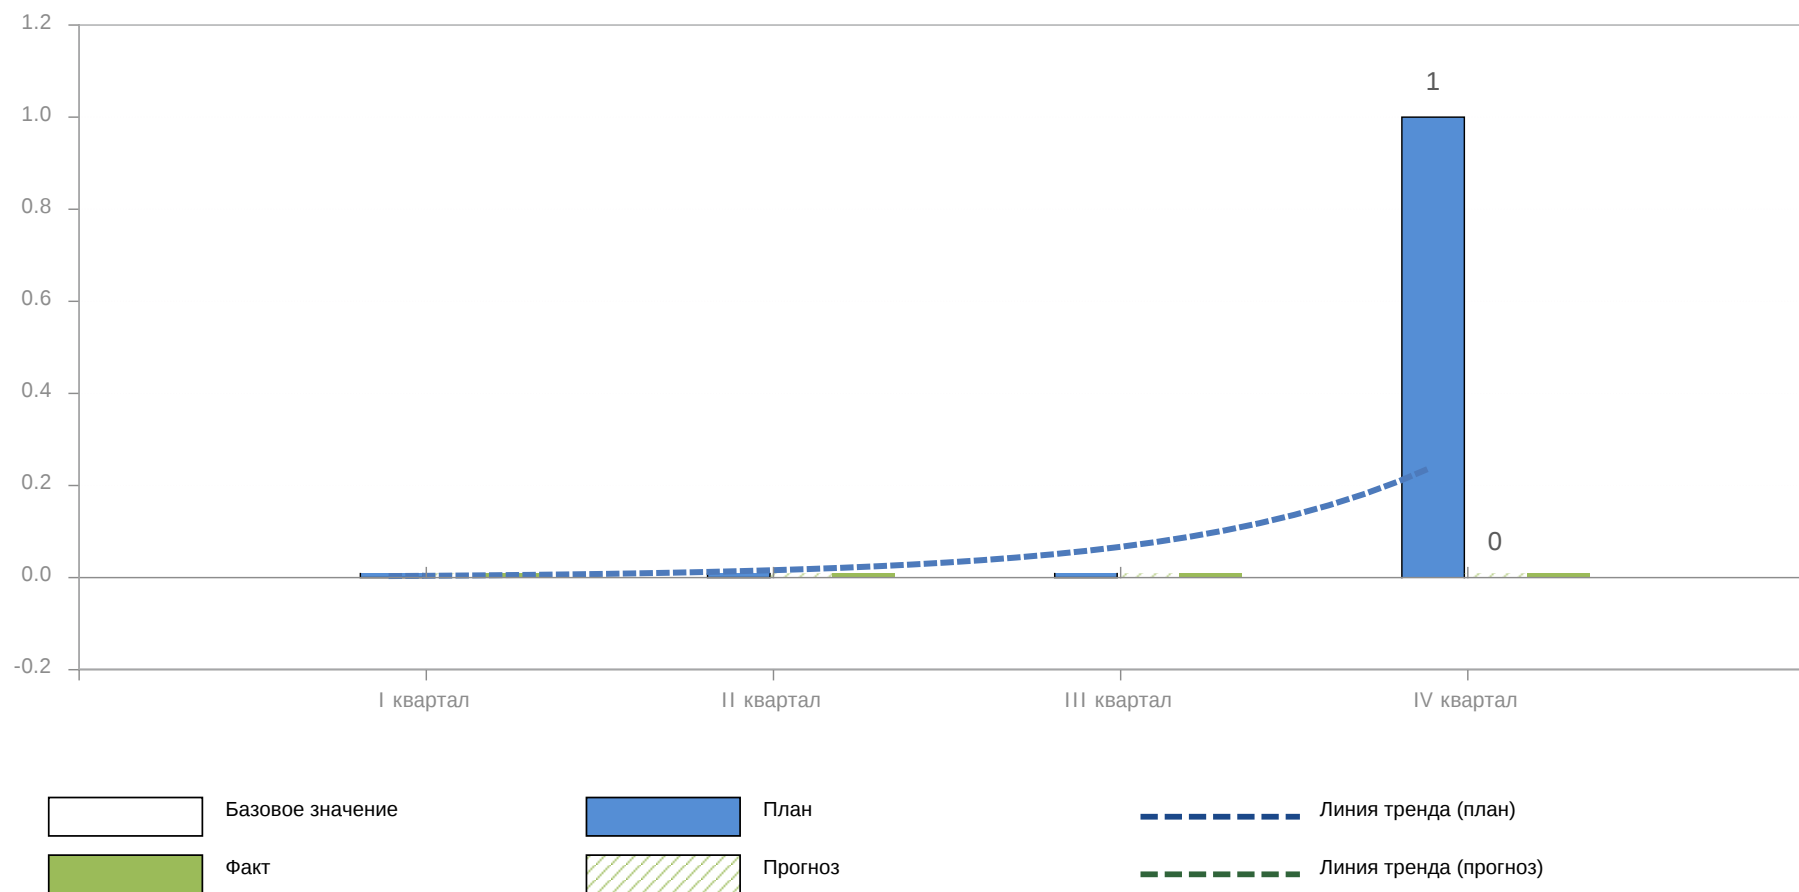


Рис. 4. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

График достижения показателя

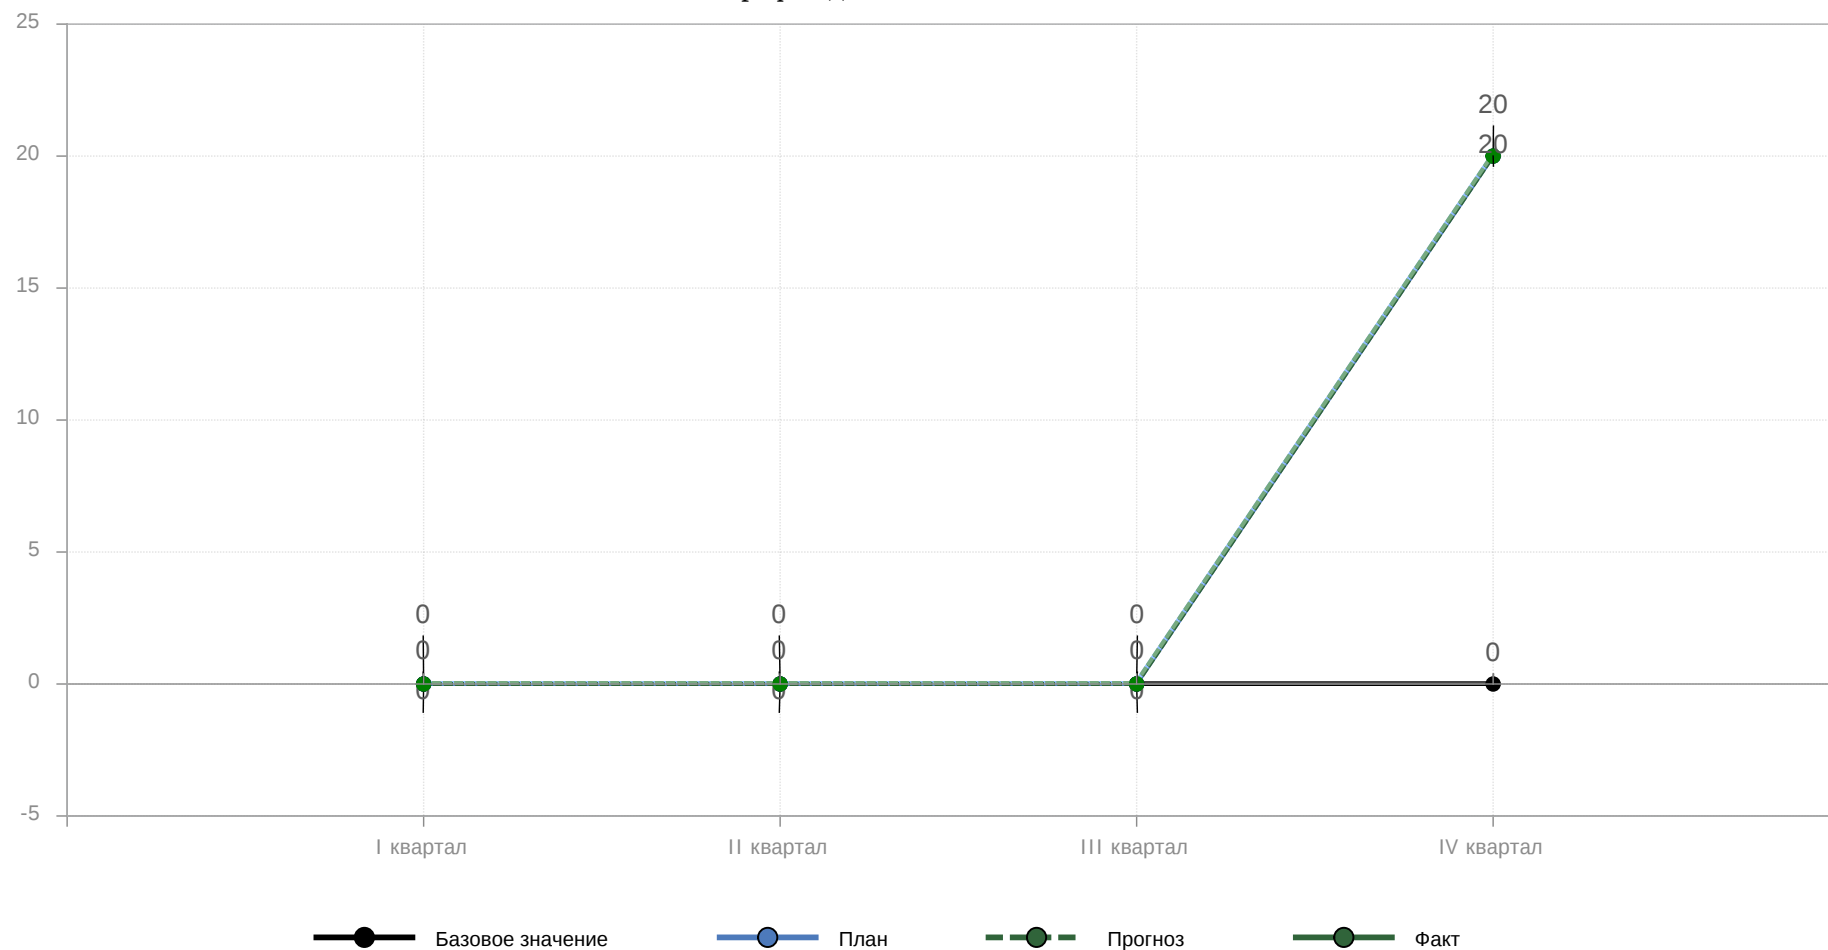


Рис. 5. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,  
% к 2018 году

Диаграмма достижения показателя

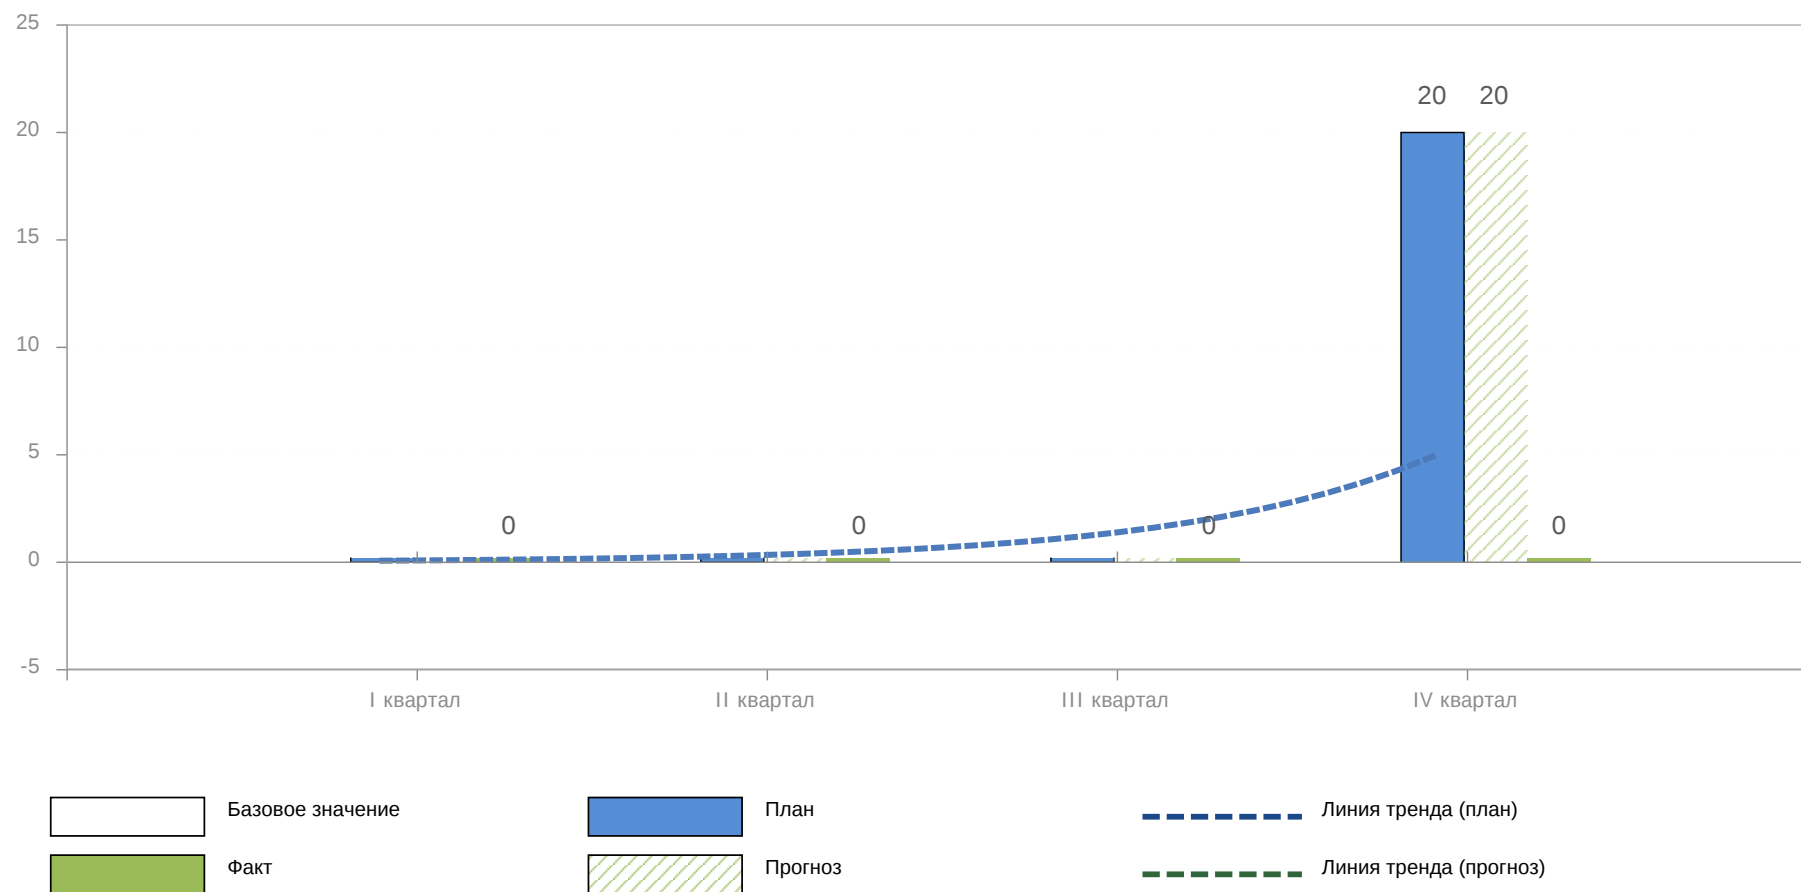


Рис. 6. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году

График достижения показателя

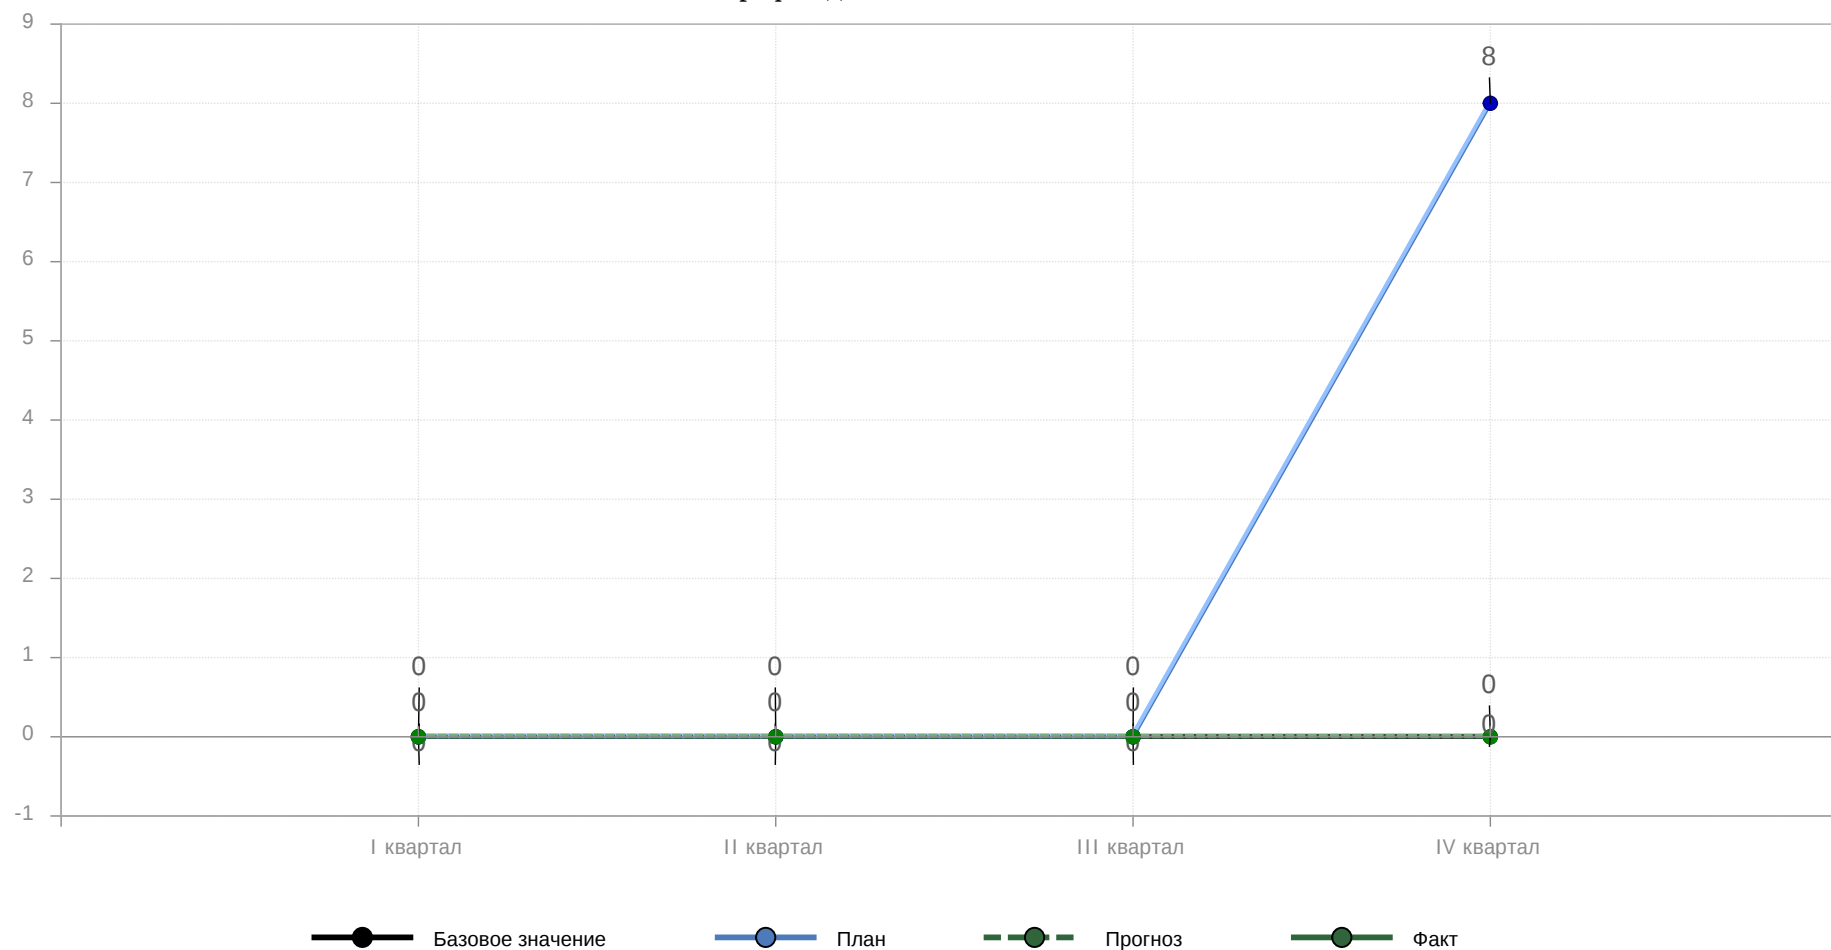


Рис. 7. Число зарегистрированных уникальных пользователей (организаций и индивидуальных предпринимателей) информационной системы «одно окно»

Диаграмма достижения показателя

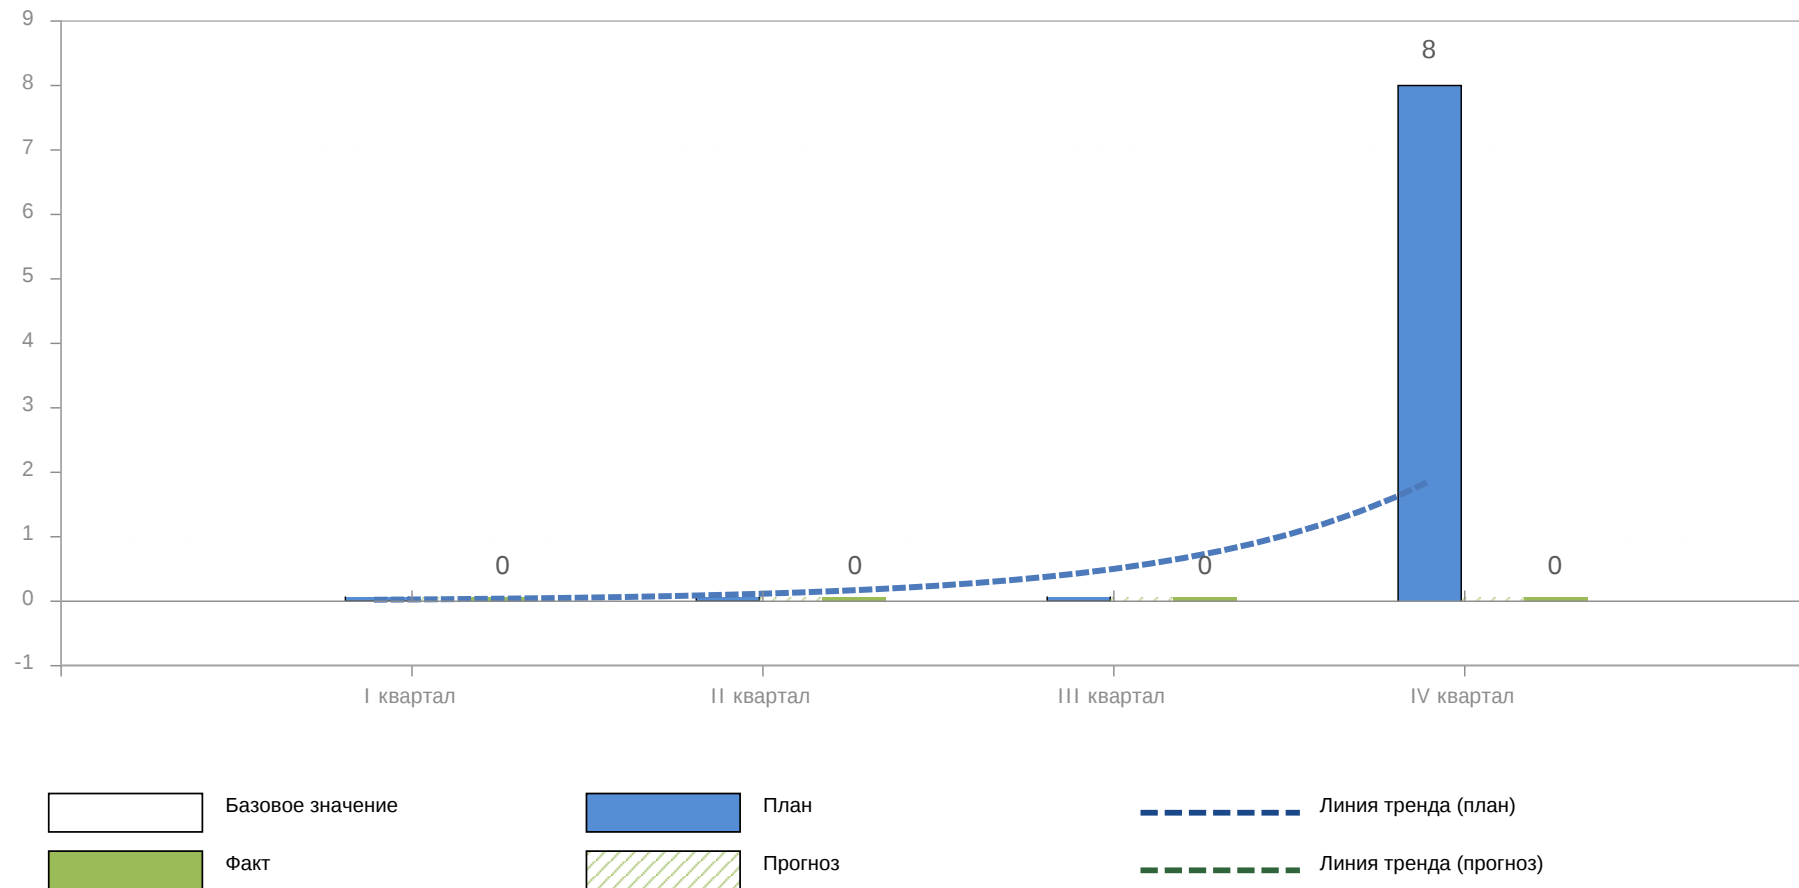


Рис. 8. Число зарегистрированных уникальных пользователей (организаций и индивидуальных предпринимателей) информационной системы «одного окна»
