

Руководитель
регионального проекта —
Аристокле Андрей Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

13.01.2020

Сертификат:

3C2AC6645FAB75F7A947FC292E1FFED72C0E2EAE

Владелец: Аристокле Андрей Владимирович

Действителен: с 19.09.2019 по 19.12.2020

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(Т2-32) Экспорт продукции АПК в Кемеровской области"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд.долл.США	Миллиард долларов	0.0464	0.01	0.024	0.037	0.0445	0.0395	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Оперативная информация Федеральной таможенной службы" Информационная справка ДСХ и ПП Кемеровской области от 10.01.2020г. №б\н, приложен файл.
2		Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд.долл.США	Миллиард долларов	0.0025	0.0005	0.0013	0.002	0.0022	0.0031	70,97%	Подтверждающие документы: 1. "Оперативная информация Федеральной таможенной службы" Информационная справка ДСХ и ПП Кемеровской области от 10.01.2020г. №б\н, приложен файл.
3		Объем экспорта зерновых, млрд.долл.США	Миллиард долларов	0	0.001	0.0016	0.0016	0.0023	0.0013	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Оперативная информация Федеральной таможенной службы" Информационная справка ДСХ и ПП Кемеровской области от 10.01.2020г. №б\н, приложен файл.
4		Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд.долл.США	Миллиард долларов	0.1625	0.06	0.119	0.1845	0.2312	0.2293	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Оперативная информация Федеральной таможенной службы" Информационная справка ДСХ и ПП Кемеровской области от 10.01.2020г. №б\н, приложен файл.
5		Объем экспорта продукции АПК, млрд.долл.США	Миллиард долларов	0.2133	0.0717	0.1465	0.2257	0.281	0.2762	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Оперативная информация Федеральной таможенной службы" Информационная справка ДСХ и ПП от 10.01.2020г. №б\н, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
6		Объем экспорта мясной и молочной продукции, млрд.долл.США	Миллиард долларов	0.0018	0.0003	0.0006	0.0006	0.0008	0.0032	25,00%	Подтверждающие документы: 1. "Оперативная информация Федеральной таможенной службы" Информационная справка ДСХ и ПП Кемеровской области от 10.01.2020г. №б\н, приложен файл.

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Оказано содействие региональным товаропроизводителям продукции АПК в участии выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней	
2		Доведена информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей и оказана консультационная помощь экспортерам в получении государственной поддержки экспортной деятельности	
3		Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены




 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Значение: 1, на дату 31.03.2019	31.03.2019	31.03.2019	Ариткулов А. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "План экспортного развития продукции АПК в Кемеровской области" Прочий тип документа ДСХ и ПП от 31.03.2019г. №б\н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: Выполнено.
1.1	КРП		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	31.03.2019	10.02.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка по видам продукции, объемам экспорта и странам" Информационная справка ДСХ и ПП от 10.02.2019г. №б\н, приложен файл.
1.1.1	РРП		Проведение анализа таможенной статистики по видам продукции, объемам реализации и участникам экспортных операций	10.02.2019	10.02.2019	Караева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитический отчет" Информационная справка департамент сх и пп от 08.02.2019г. №б\н, приложен файл.
1.1.2	РРП		Обозначение (выявление) трейдеров и производителей продукции, видов и объемов продукции, отправленной на экспорт	10.02.2019	10.02.2019	Караева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Список экспортеров региона" Сводная информация департамент сх и пп от 08.02.2019г. №б\н, приложен файл.
1.2	КРП		Документ разработан	31.03.2019	20.03.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проект Плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК по Кемеровской области" ДСХ и ПП от 20.03.2019г. №б\н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2.1	РРП		Разработка плана экспортного развития по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	20.03.2019	20.03.2019	Караева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК" ДСХ и ПП от 20.03.2019г. №б\н, приложен файл.
1.3	РРП		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	31.03.2019	29.03.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Согласованный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК" Общественно-экспертный совет по региональному проекту от 29.03.2019г. №б\н, приложен файл.
1.3.1	РРП		Согласование плана общественно-экспертным советом регионального проекта	29.03.2019	29.03.2019	Караева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК" Общественно-экспертный совет по региональному проекту "Экспорт продукции АПК в Кемеровской области" от 29.03.2019г. №б\н, приложен файл.
1.4	КРП		Документ утвержден (подписан)	31.03.2019	31.03.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК" ДСХ и ПП от 29.03.2019г. №б\н, приложен файл.
1.4.1	РРП		Утверждение плана руководителем регионального проекта	31.03.2019	29.03.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК" План ДСХ и ПП от 29.03.2019г. №б\н, приложен файл.
2			<i>Доведена информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей и оказана консультационная помощь экспортерам в получении государственной поддержки экспортной деятельности Значение: 0, на дату 31.12.2019</i>	31.12.2019	04.12.2019	Ариткулов А. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Презентация "10 шагов к экспорту продукции АПК: меры государственной поддержки экспортеров" 3-4 декабря 2019 года, г. Кемерово" Прочий тип документа ДСХ и ПП от 04.12.2019г. №б\н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 0. Информация по результату: В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1	КРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	04.12.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Материалы презентации Агрофорума, 3-4 декабря 2019, г. Кемерово" Прочий тип документа ДСХ и ПП от 04.12.2019г. №б/н, приложен файл.
2.1.1	РРП		Информирование заинтересованных участников о проведение сессии, семинаров, круглых столов	31.12.2019	25.11.2019	Караева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении Кузбасского агропромышленного форума 3-4 декабря 2019 " Информационное письмо ДСХ и ПП от 25.11.2019г. №01-01/3741, приложен файл.
2.1.2	РРП		Проведены информационные сессии с участием региональных товаропроизводителей, консультантов экспортных центров или представителей, имеющих опыт работы в организации экспортных поставок	31.12.2019	04.12.2019	Караева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Материалы презентации "10 шагов к экспорту продукции АПК: меры государственной поддержки экспортеров"" Прочий тип документа ДСХ и ПП от 04.12.2019г. №б/н, приложен файл.
3			<i>Доведена информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей и оказана консультационная помощь экспортерам в получении государственной поддержки экспортной деятельности Значение: 0, на дату 30.06.2019</i>	30.06.2019	23.05.2019	Ариткулов А. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Материалы по круглому столу г. Новокузнецк" Прочий тип документа ДСХ и ПП Кемеровской области от 23.05.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 0. Информация по результату: В работе.
3.1	КРП		Услуга оказана (работы выполнены)	30.06.2019	23.05.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Презентация и информационные материалы к круглому столу" ДСХ и ППП от 23.05.2019г. №б/н, приложен файл.
3.1.1	РРП		Информирование заинтересованных участников о проведении сессий, семинаров, круглых столов	30.06.2019	21.05.2019	Караева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное птсьмо о проведении круглого стола" Информационное письмо ДСХ и ПП от 13.05.2019г. №01-01/1390, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1.2	РРП		Проведены информационные сессии с участием региональных товаропроизводителей, консультантов экспортных центров или представителей, имеющих опыт работы в организации экспортных поставок	30.06.2019	23.05.2019	Караева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационные материалы по круглому столу " Информационные материалы ДСХ и ПП от 23.05.2019г. №б/н, приложен файл.
4			<i>Доведена информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей и оказана консультационная помощь экспортерам в получении государственной поддержки экспортной деятельности Значение: 0, на дату 30.09.2019</i>	30.09.2019	31.07.2019	Ариткулов А. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Материалы межрегионального экспортного агрофорума" Иной вид документа ДСХ и ПП Кемеровской области от 31.07.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 0. Информация по результату: В работе.
4.1	КРП		Услуга оказана (работы выполнены)	30.08.2019	31.07.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Программа форума " ДСХ и ПП от 31.07.2019г. №б\н, приложен файл.
4.1.1	РРП		Информирование заинтересованных участников о проведение сессии, семинаров, круглых столов	30.08.2019	26.07.2019	Караева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Информационное письмо ДСХ и ПП от 23.07.2019г. №01-01/2160, приложен файл.
4.1.2	РРП		Проведены информационные сессии с участием региональных товаропроизводителей, консультантов экспортных центров или представителей, имеющих опыт работы в организации экспортных поставок	30.08.2019	31.07.2019	Караева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Программа агрофорума" ДСХ и ПП от 23.07.2019г. № б\н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5			Доведена информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей и оказана консультационная помощь экспортерам в получении государственной поддержки экспортной деятельности Значение: 0, на дату 31.03.2020	31.03.2020	31.03.2020	Ариткулов А. В.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по результату: В работе.
5.1	КРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.03.2020	31.03.2020	Ариткулов А. В.	В работе.
5.1.1	РРП		Информирование заинтересованных участников о проведении сессий, семинаров, круглых столов	31.03.2020	31.03.2020	Караева И. В.	В работе.
5.1.2	РРП		Проведены информационные сессии с участием региональных товаропроизводителей, консультантов экспортных центров или представителей, имеющих опыт работы в организации экспортных поставок	31.03.2020	31.03.2020	Караева И. В.	В работе.
6			Оказано содействие региональным товаропроизводителям продукции АПК в участии выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней Значение: 0, на дату 31.12.2019	31.12.2019	12.10.2019	Ариткулов А. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет по участию предприятий АПК в конкурсах 21-ой выставки «Золотая Осень – 2019»" Отчет ДСХ и ПП от 12.10.2019г. №б\н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 0. Информация по результату: Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.1	КРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	12.10.2019	Ариткулов А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об участии сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий АПК в агропромышленной выставке "Золотая осень"" ДСХ И ПП от 12.10.2019г. №б/н, приложен файл.
6.1.1	РРП		Информирование местных товаропроизводителей о выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней	31.12.2019	23.05.2019	Кареева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо о проведении агропромышленной выставке "Золотая осень 2019"" Информационное письмо ДСХ И ПП от 17.05.2019г. №01-01/1391, приложен файл.
6.1.2	РРП		Участие региональных товаропроизводителей продукции АПК в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международных уровней	31.12.2019	12.10.2019	Кареева И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет об участии предприятий АПК Кемеровской области-Кузбасса в агропромышленной выставке" Отчет ДСХ и ПП от 12.10.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек

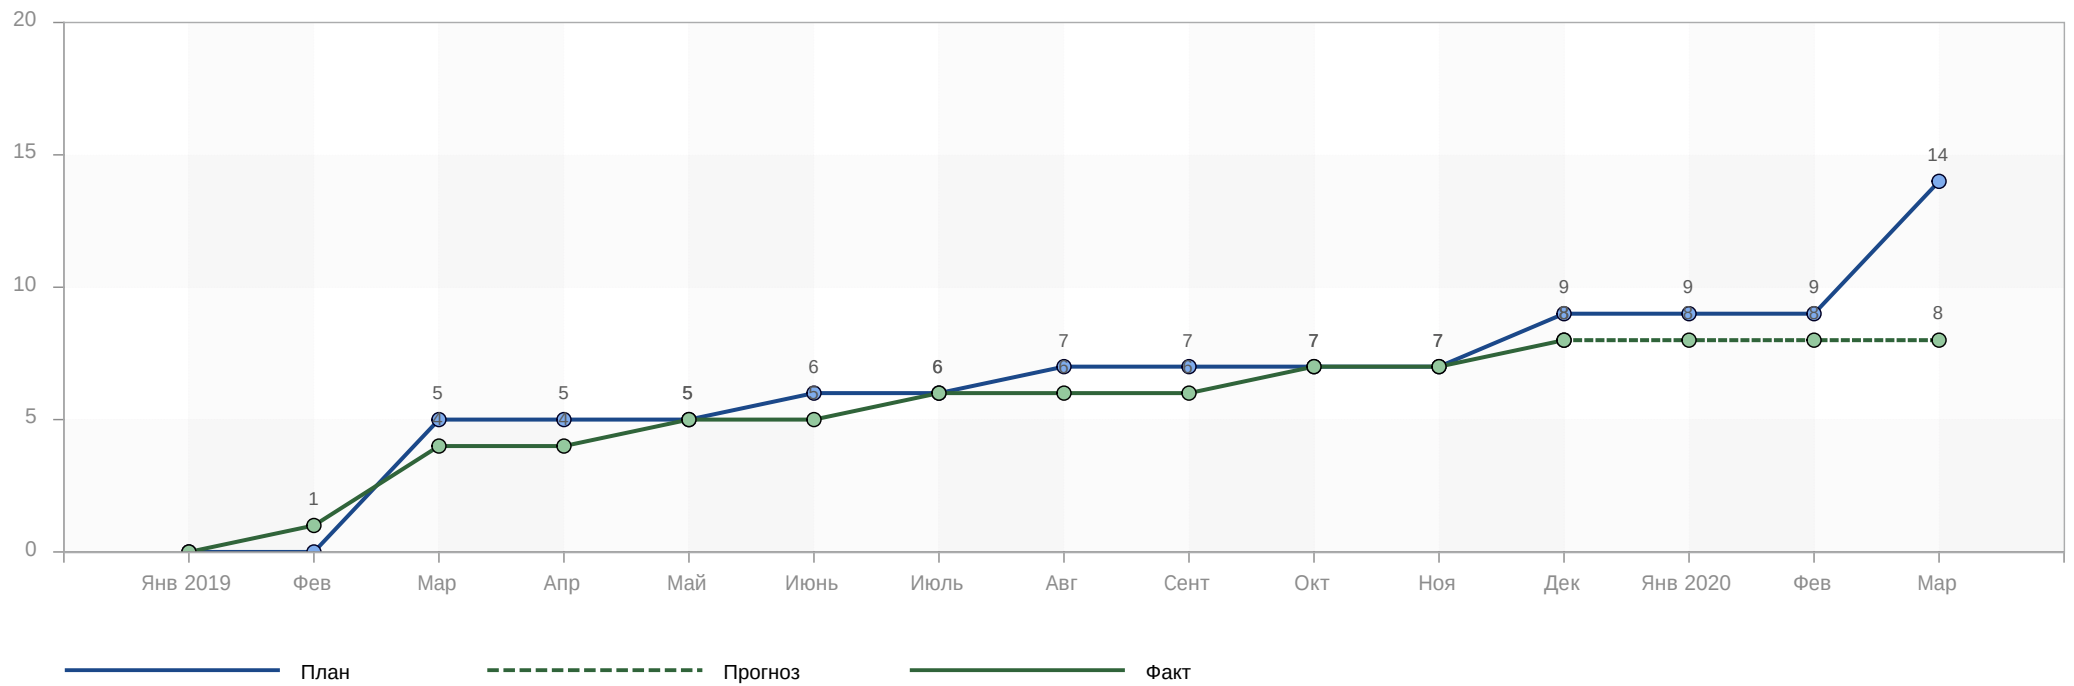


Рис. 1. "(Т2-32) Экспорт продукции АПК в Кемеровской области"

График достижения показателя

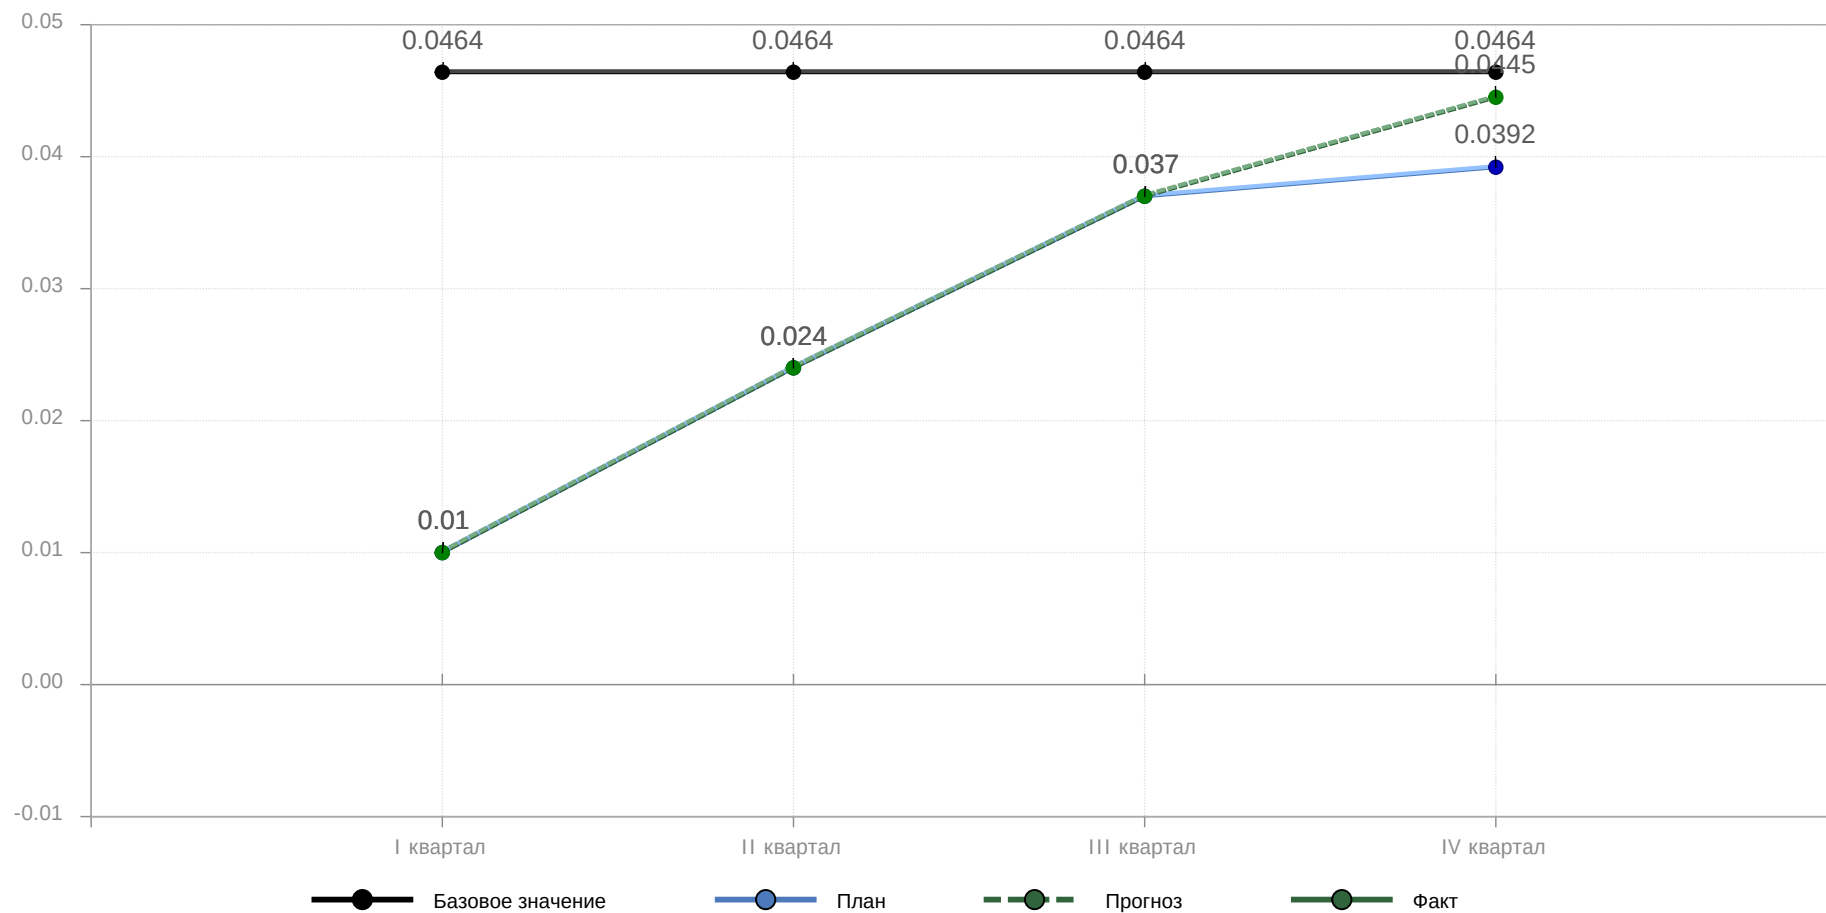


Рис. 1. Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд.долл.США

Диаграмма достижения показателя

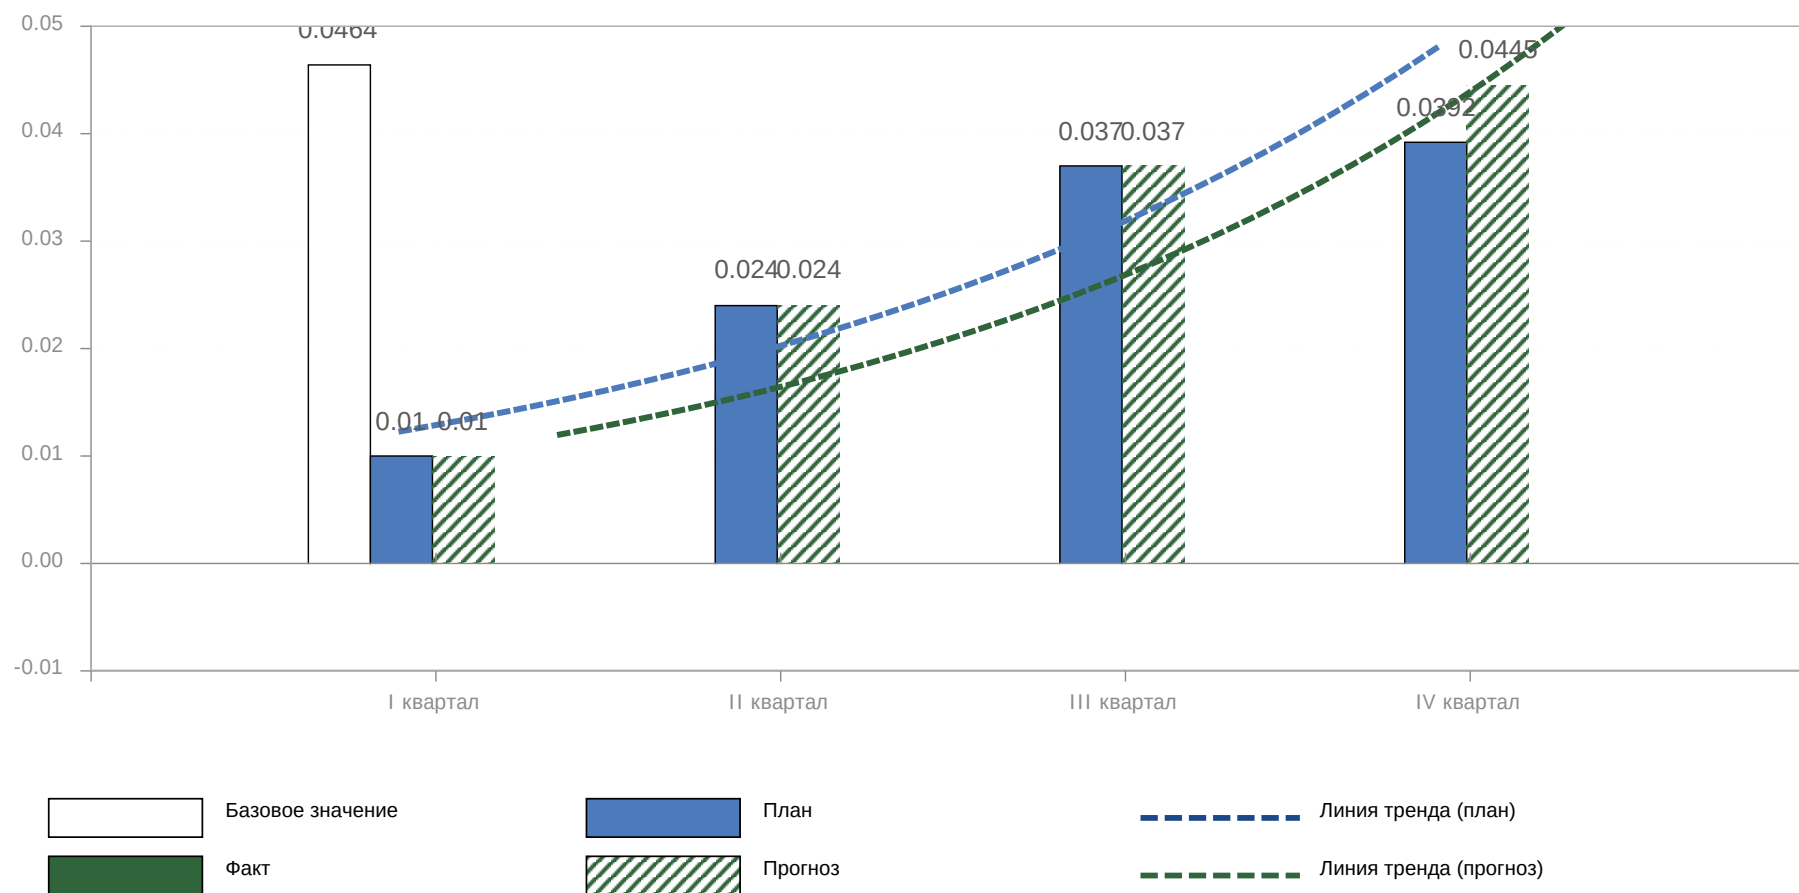


Рис. 2. Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд.долл.США

График достижения показателя

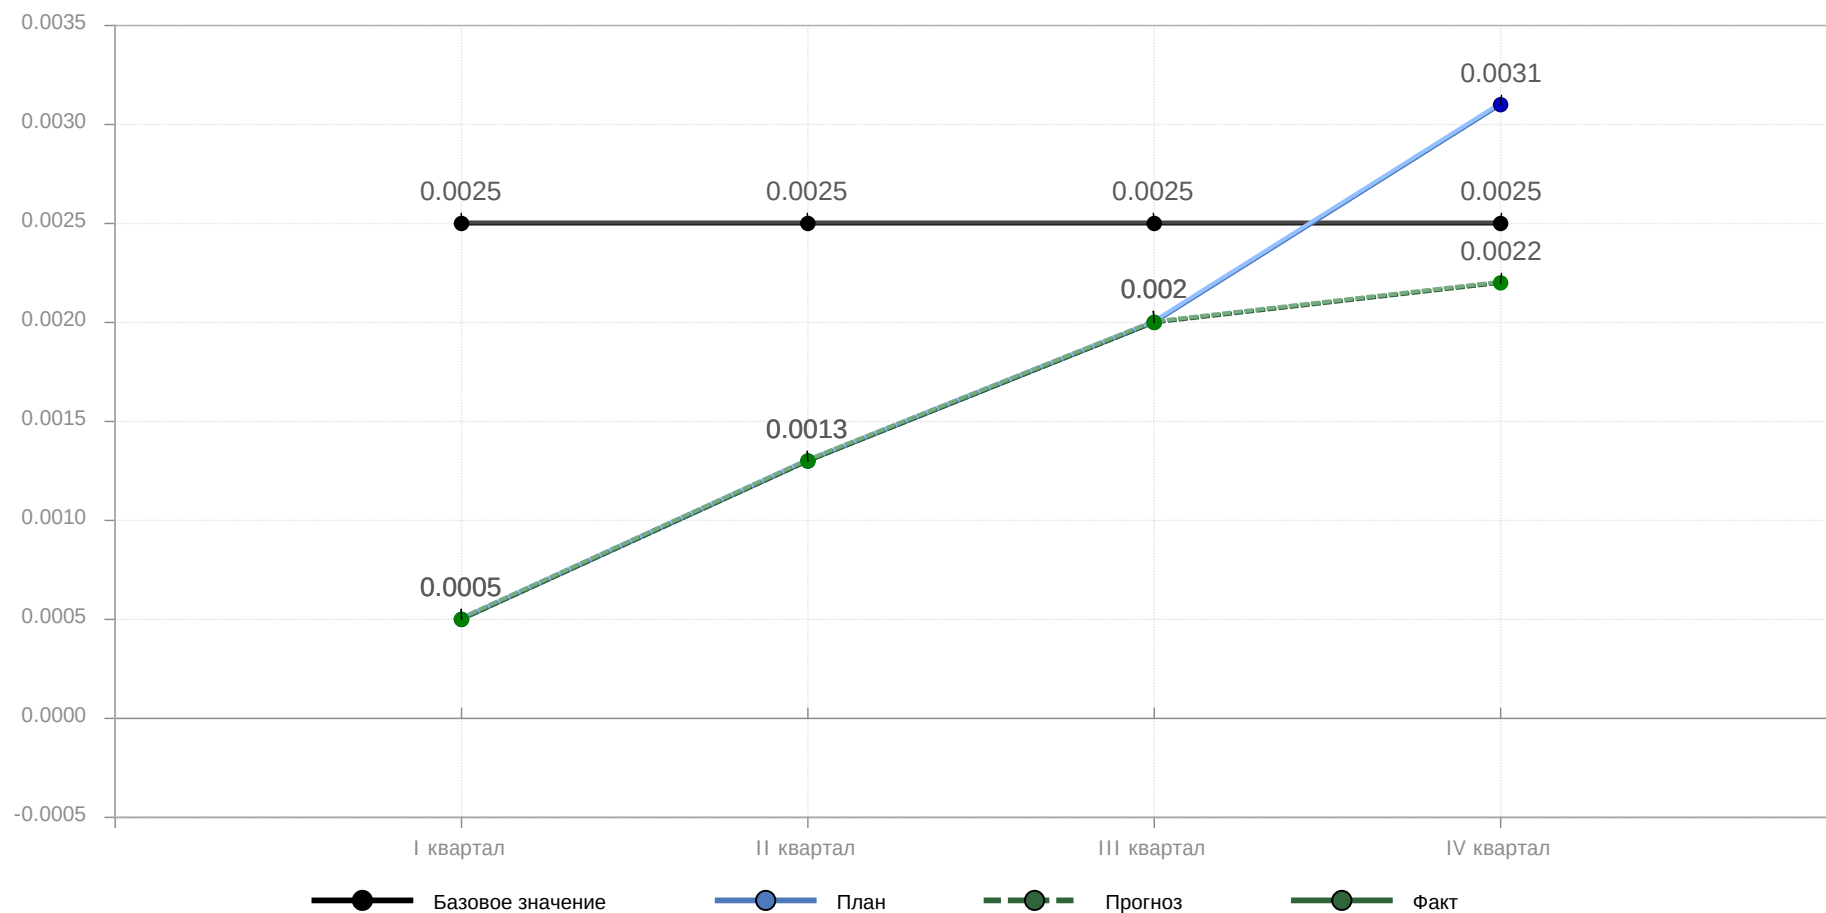


Рис. 3. Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд.долл.США

Диаграмма достижения показателя

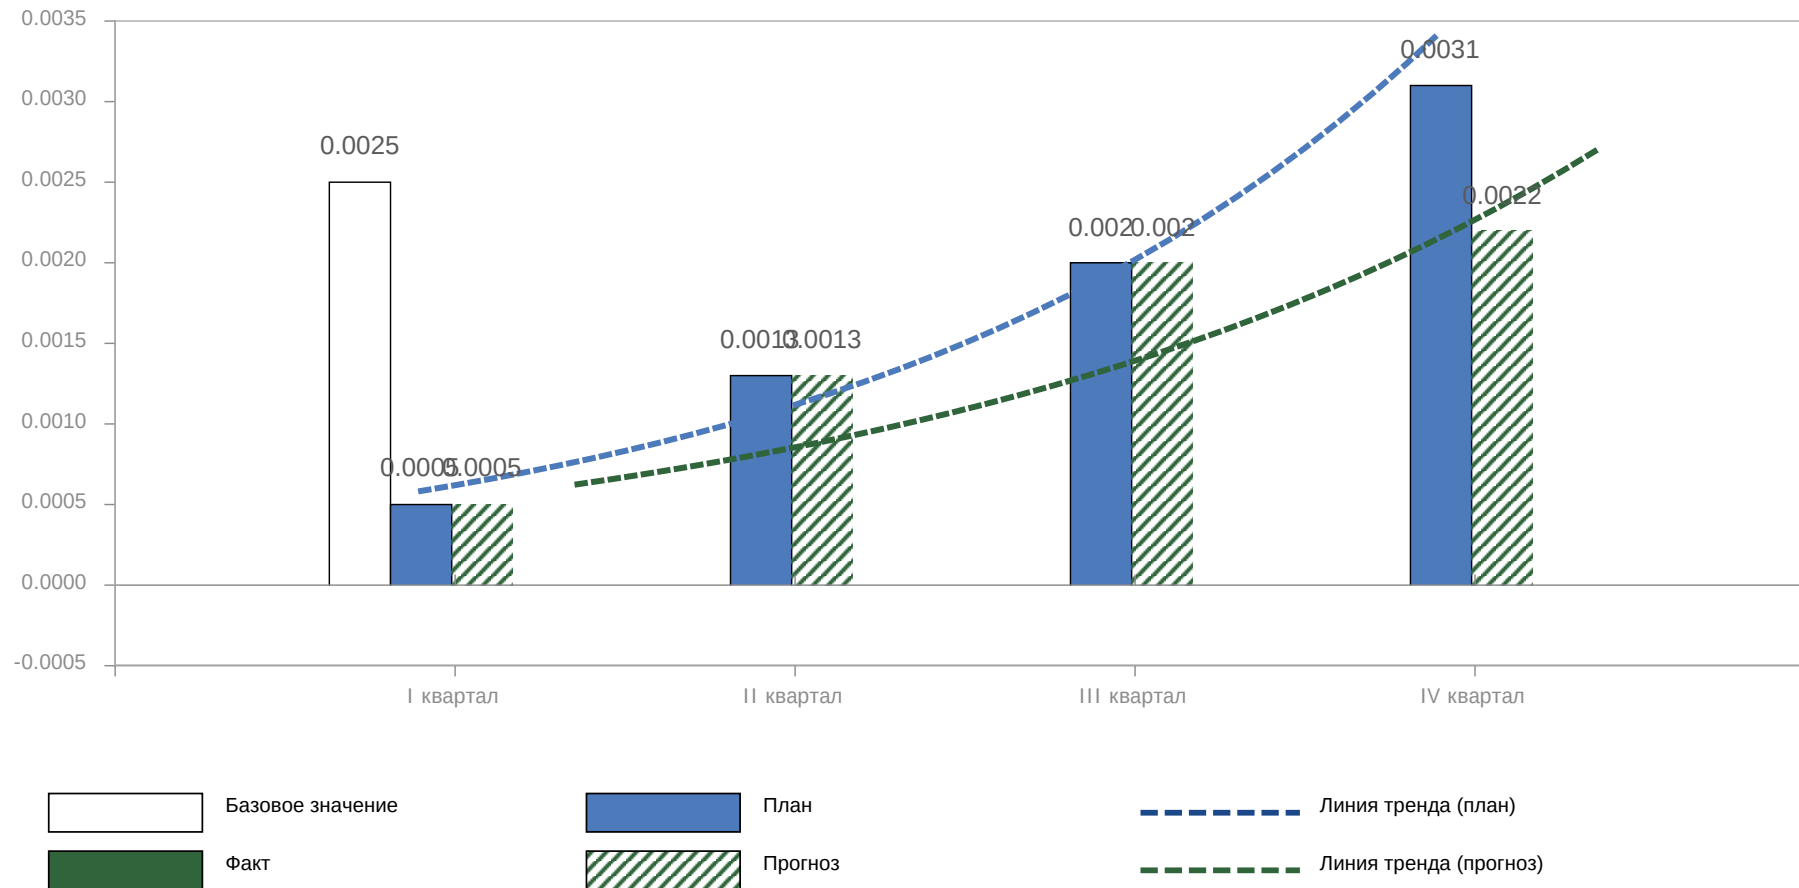


Рис. 4. Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд.долл.США

График достижения показателя

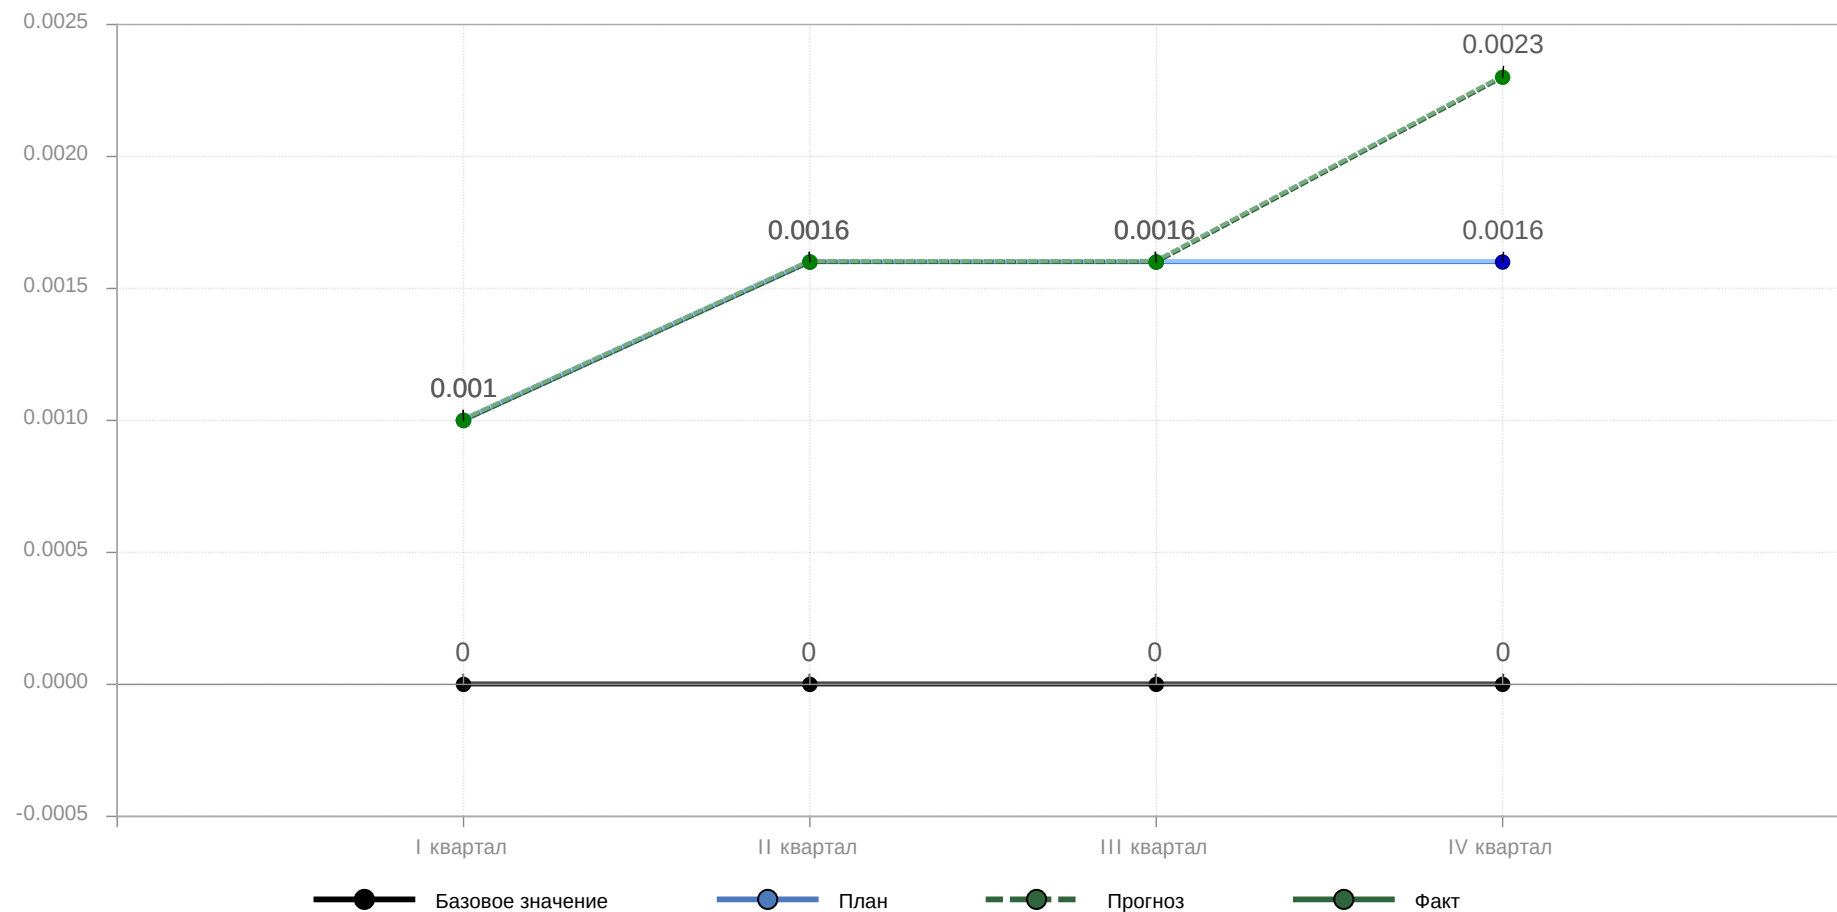


Рис. 5. Объем экспорта зерновых, млрд.долл.США

Диаграмма достижения показателя

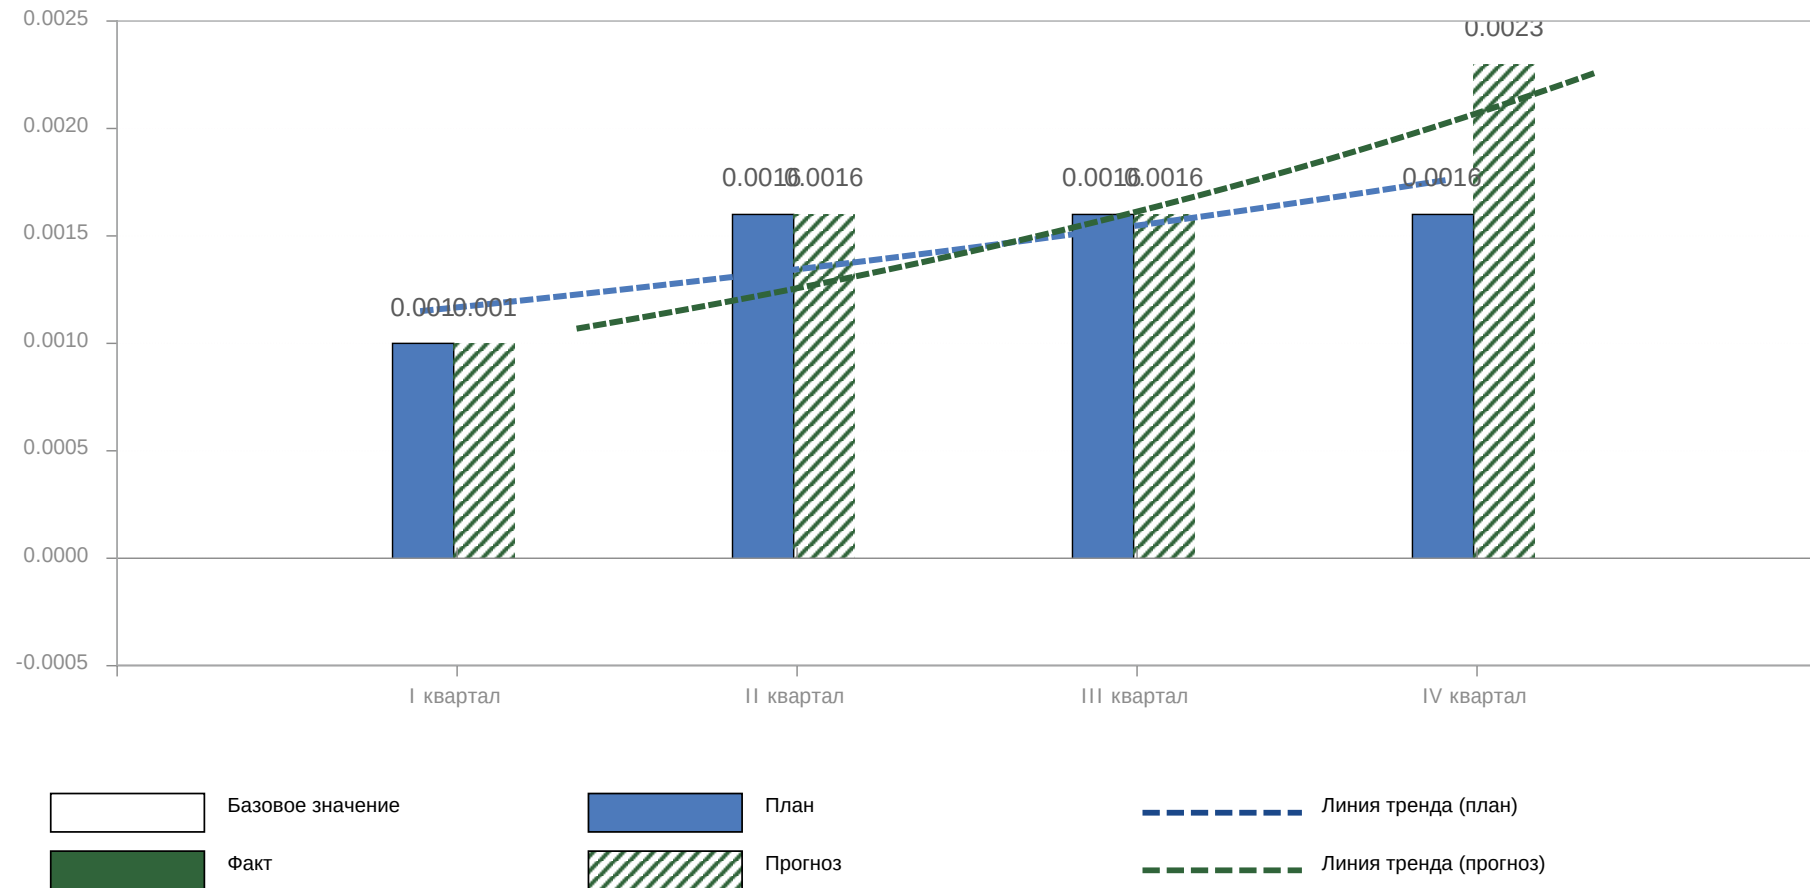


Рис. 6. Объем экспорта зерновых, млрд.долл.США

График достижения показателя

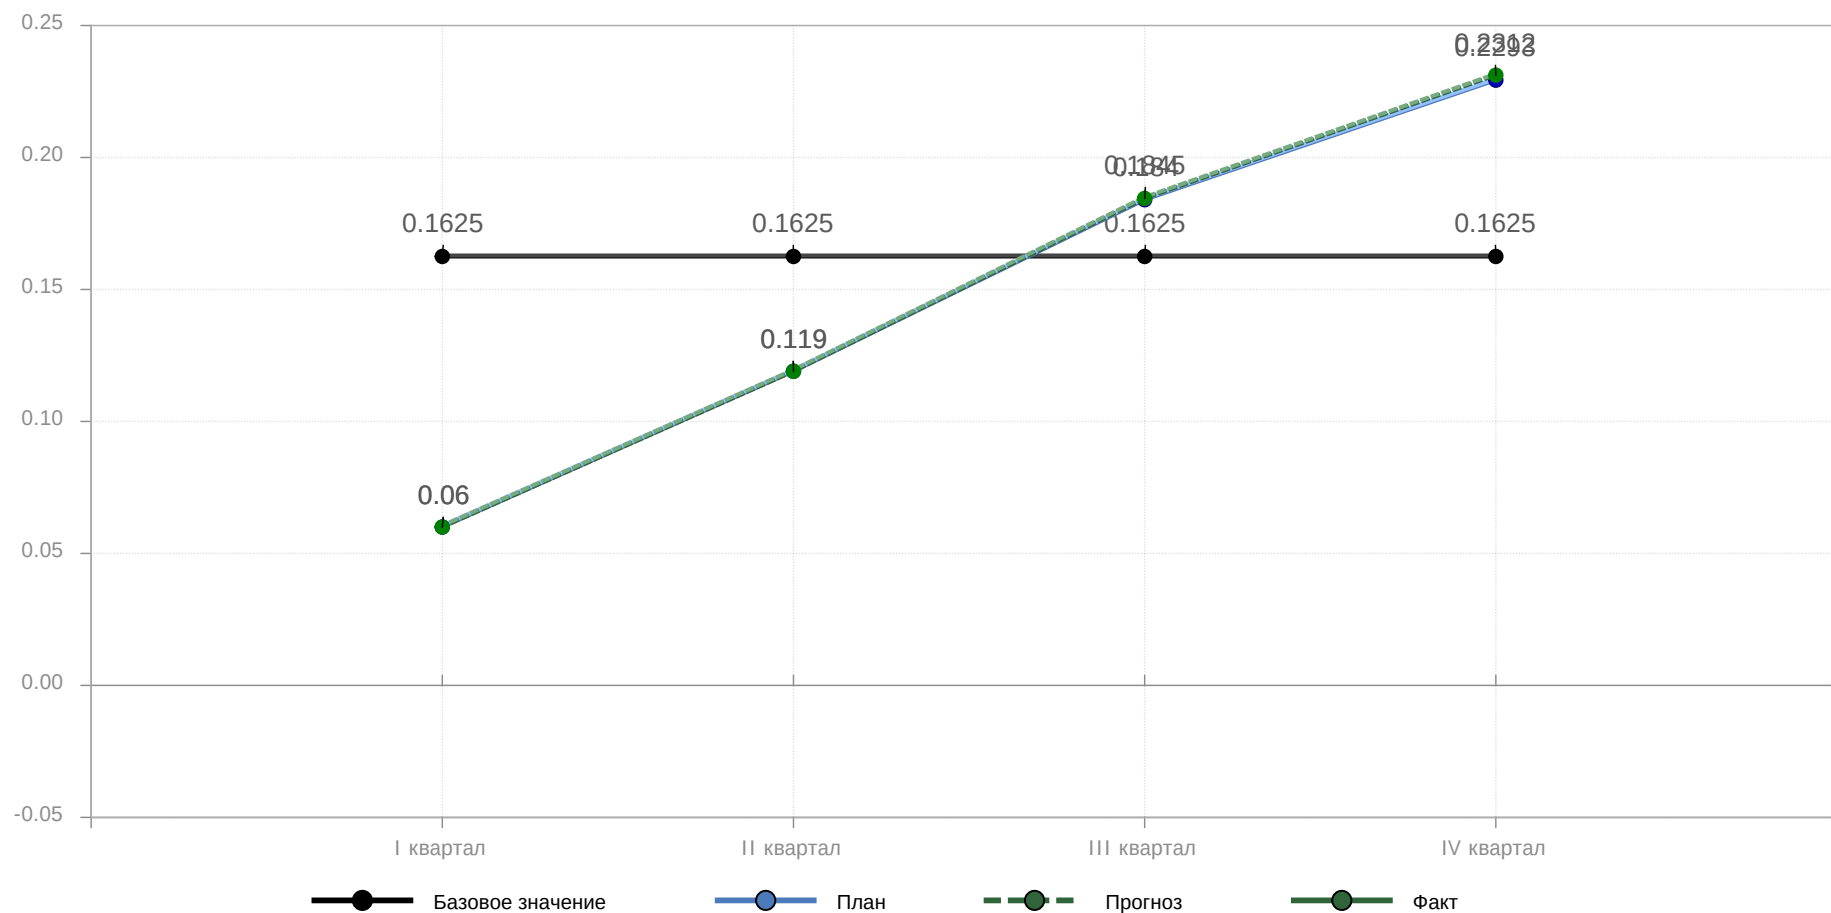


Рис. 7. Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд.долл.США

Диаграмма достижения показателя

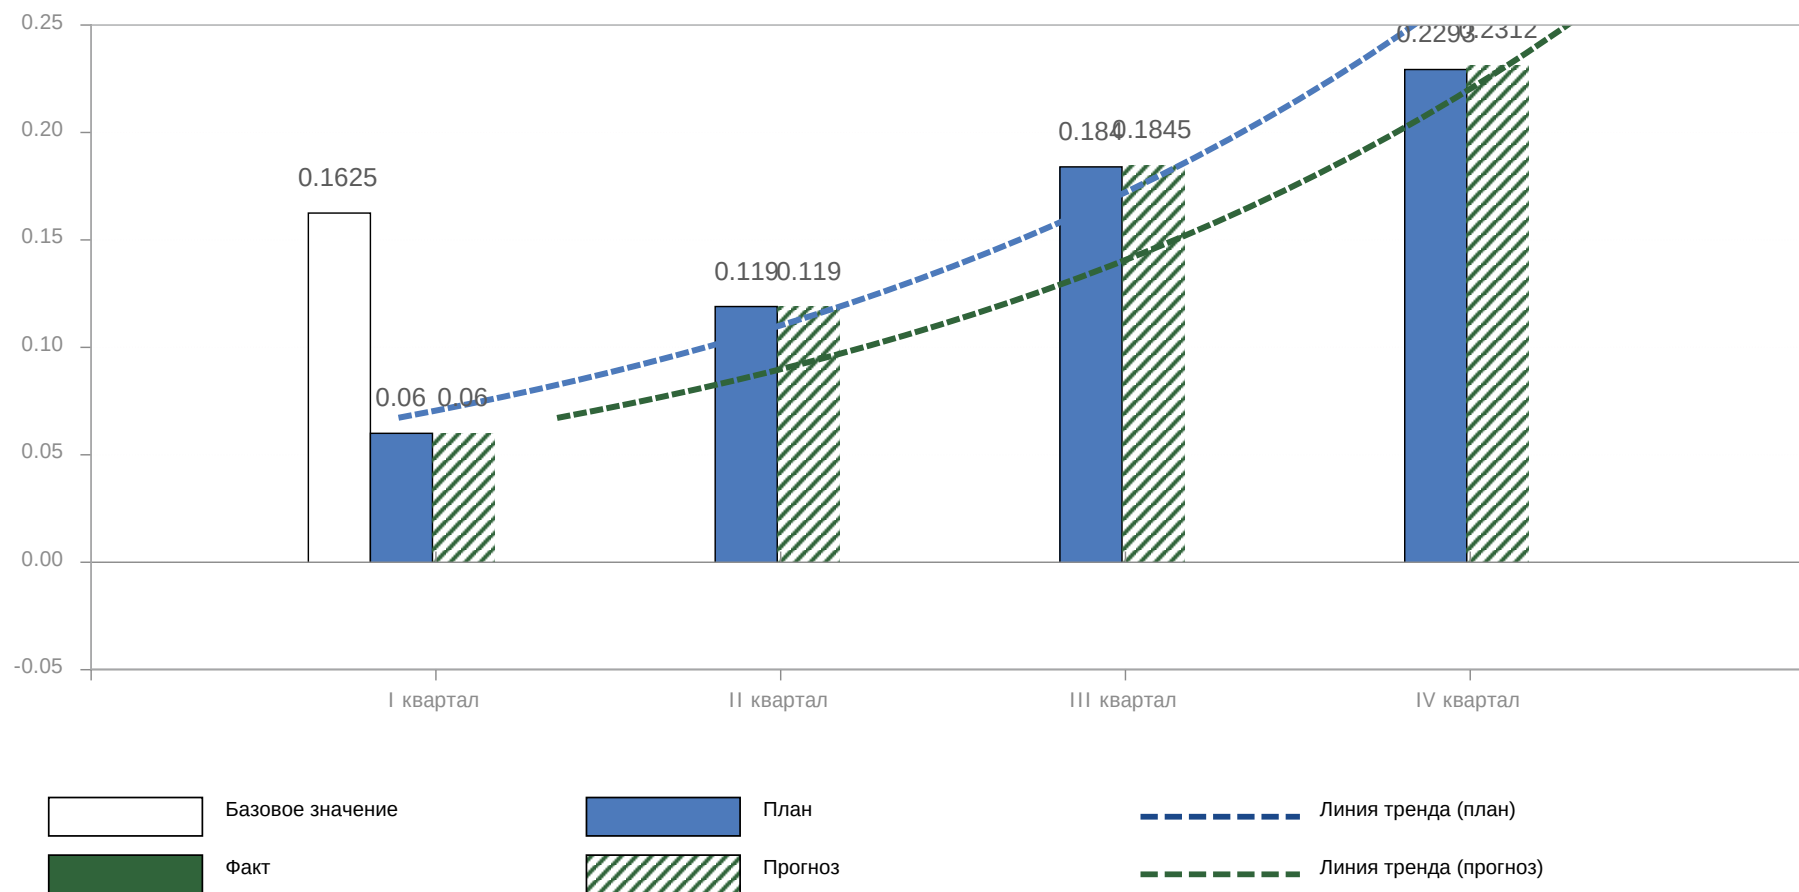


Рис. 8. Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд.долл.США

График достижения показателя

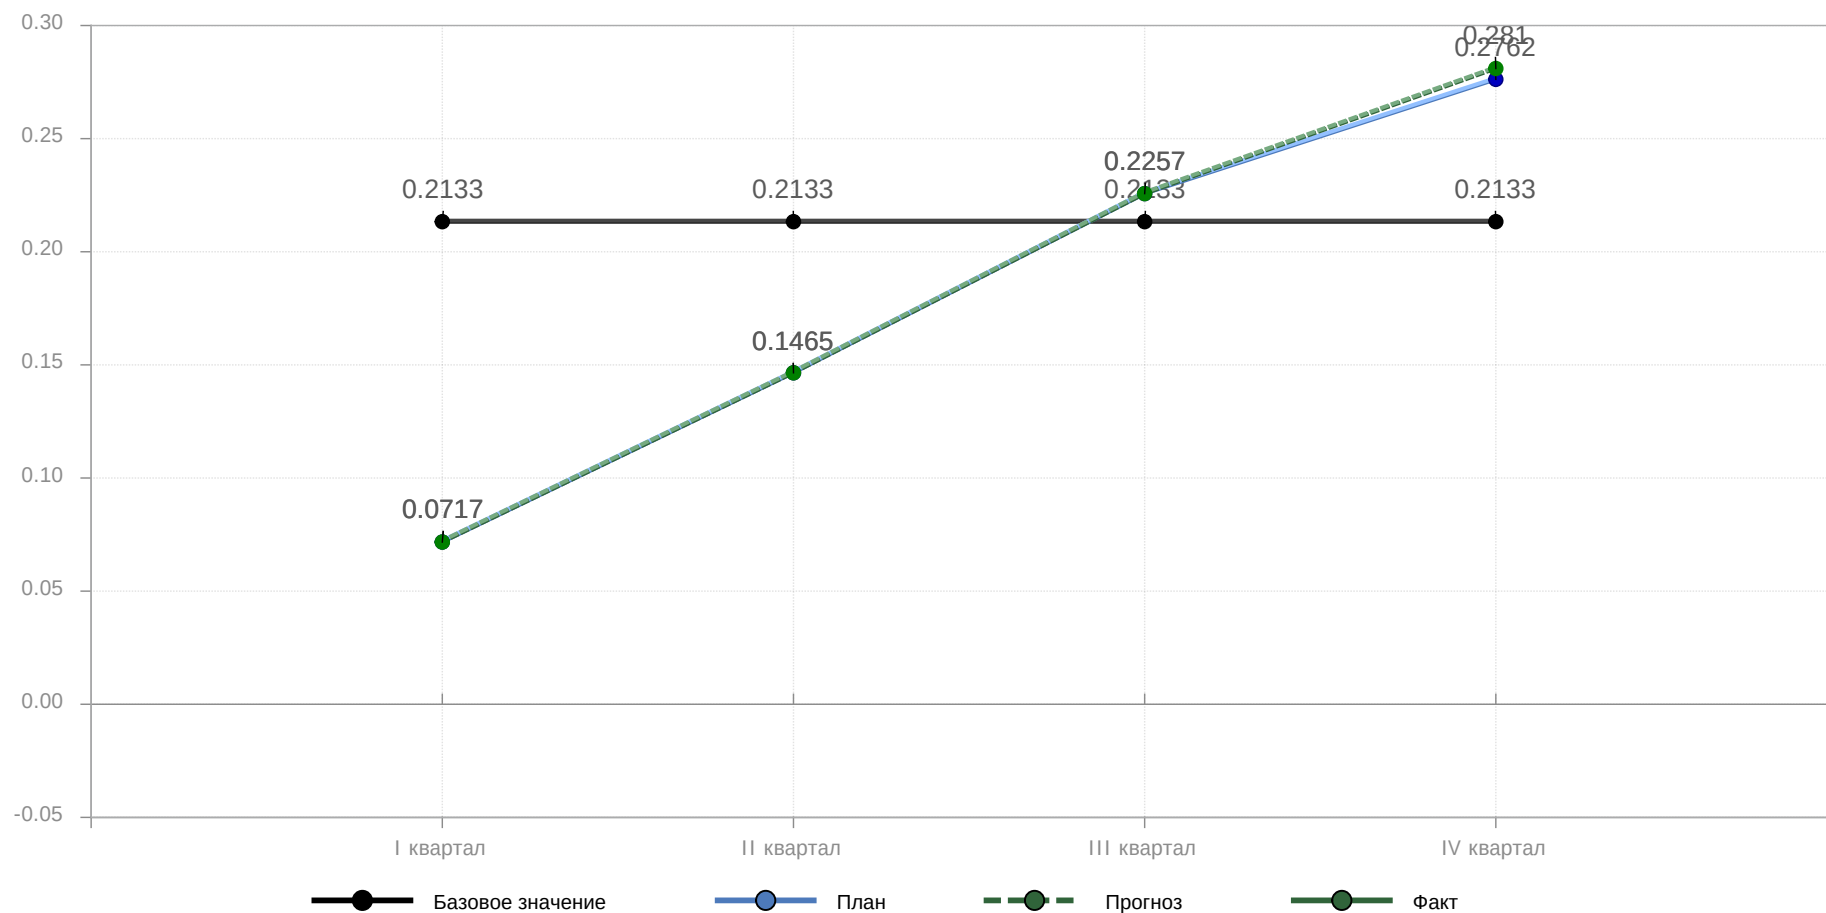


Рис. 9. Объем экспорта продукции АПК, млрд.долл.США

Диаграмма достижения показателя

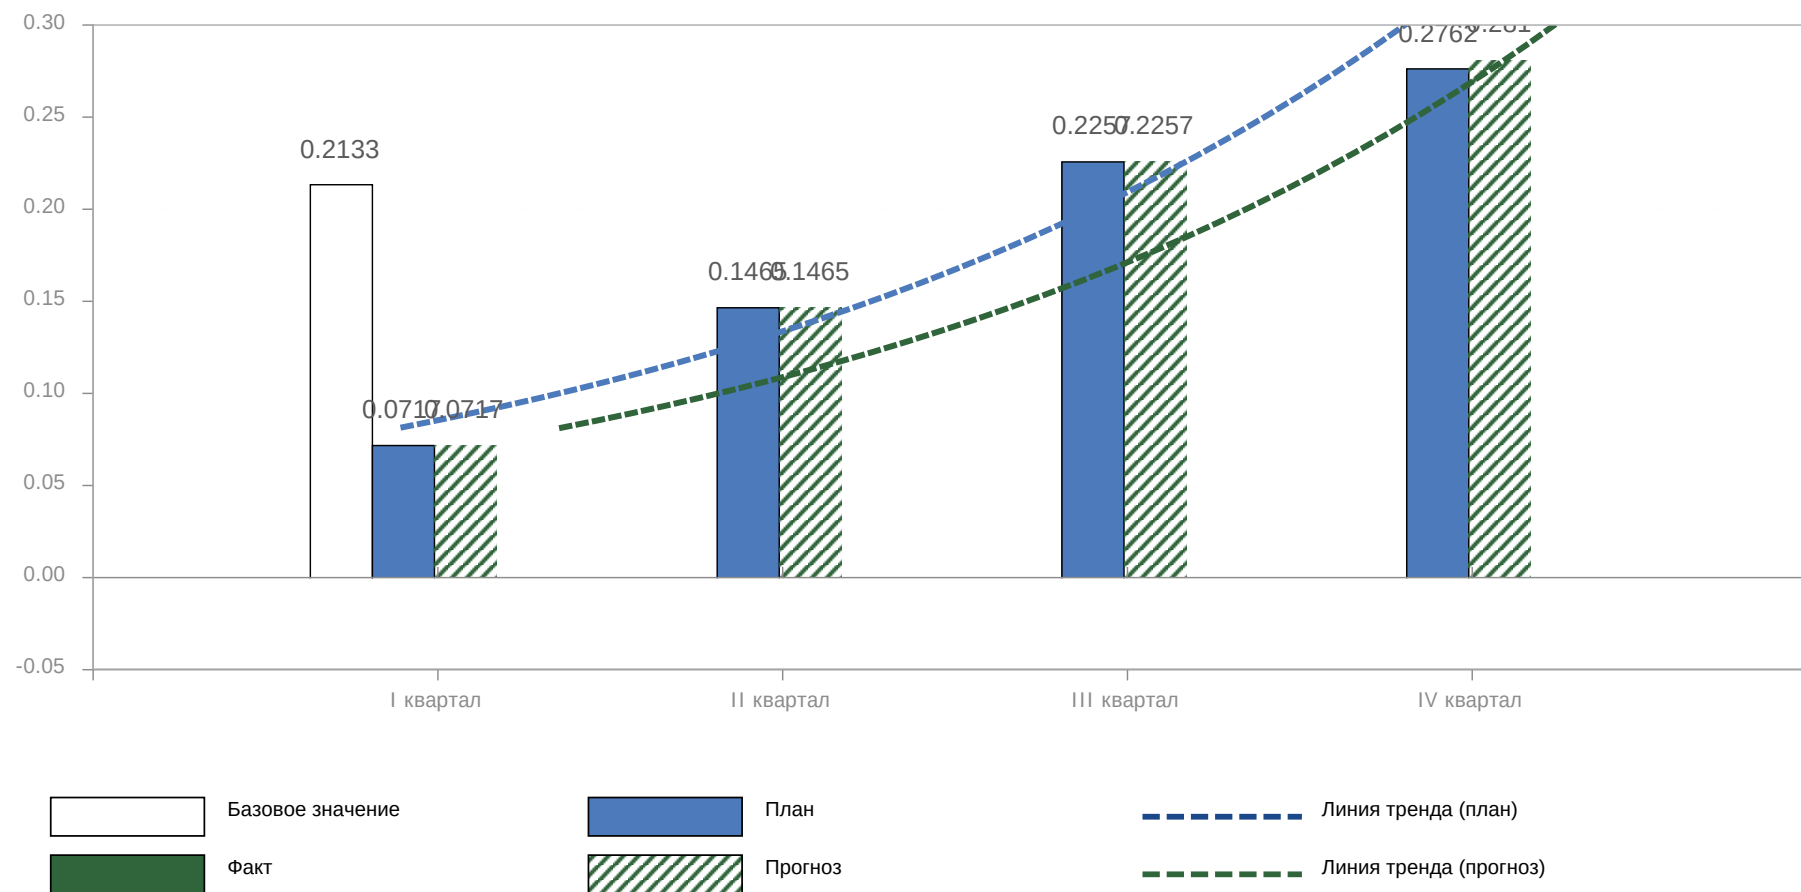


Рис. 10. Объем экспорта продукции АПК, млрд.долл.США

График достижения показателя

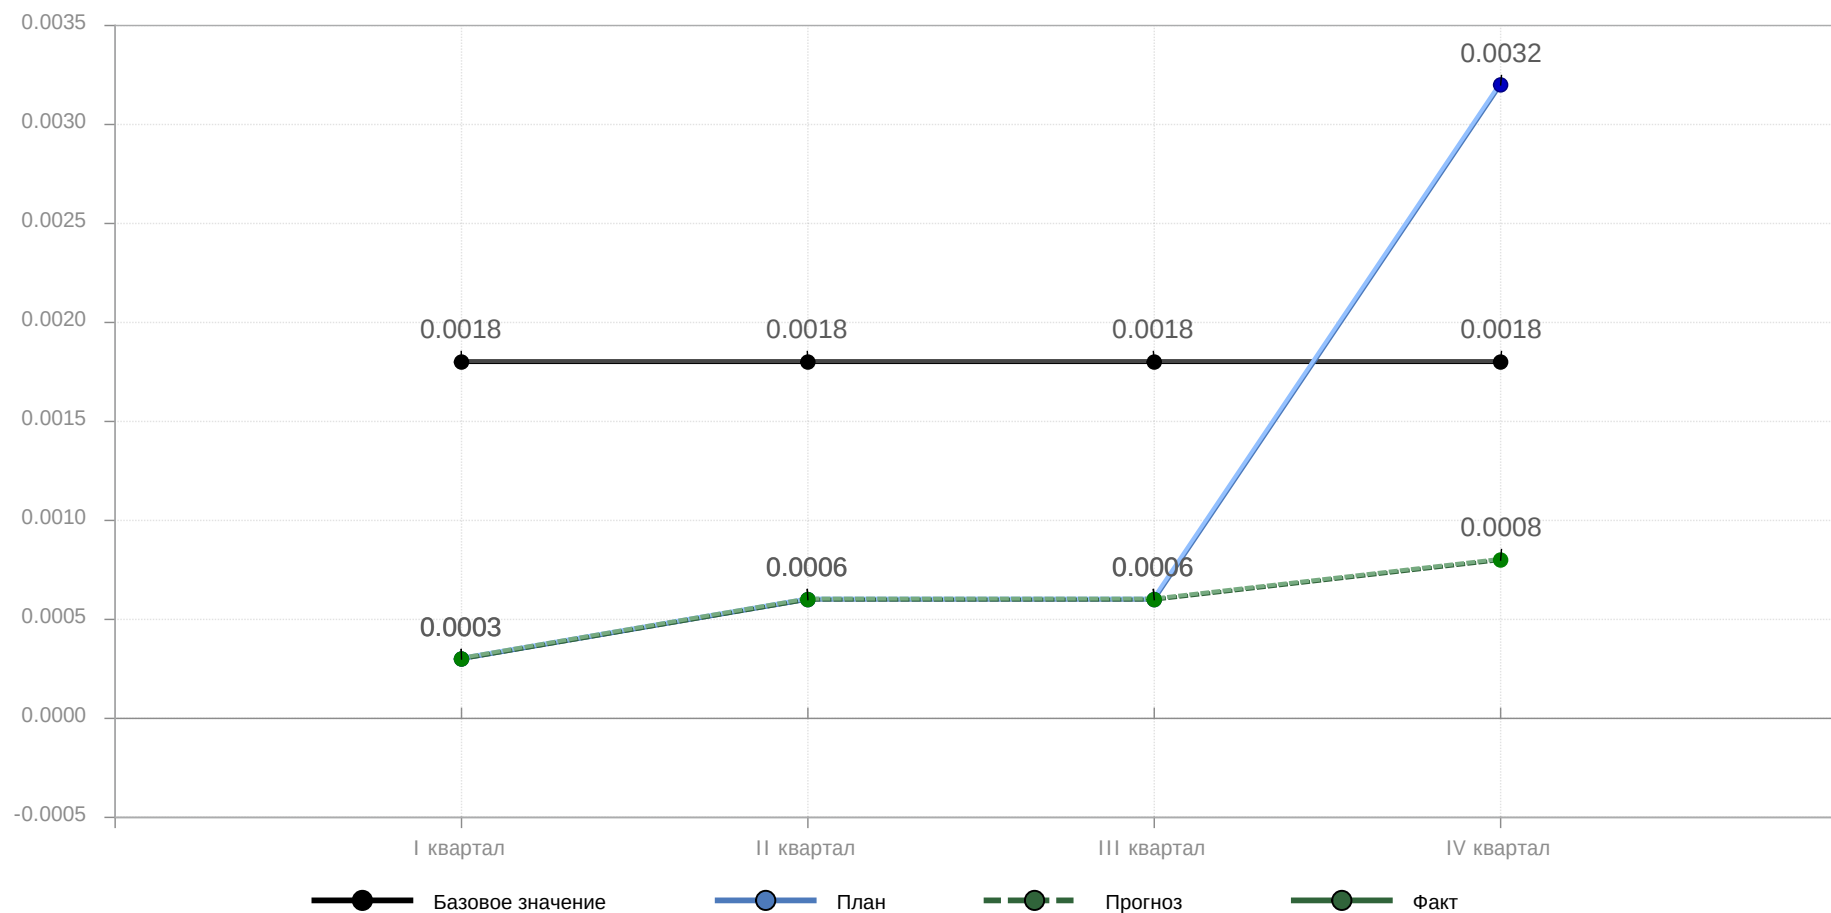


Рис. 11. Объем экспорта мясной и молочной продукции, млрд.долл.США

Диаграмма достижения показателя

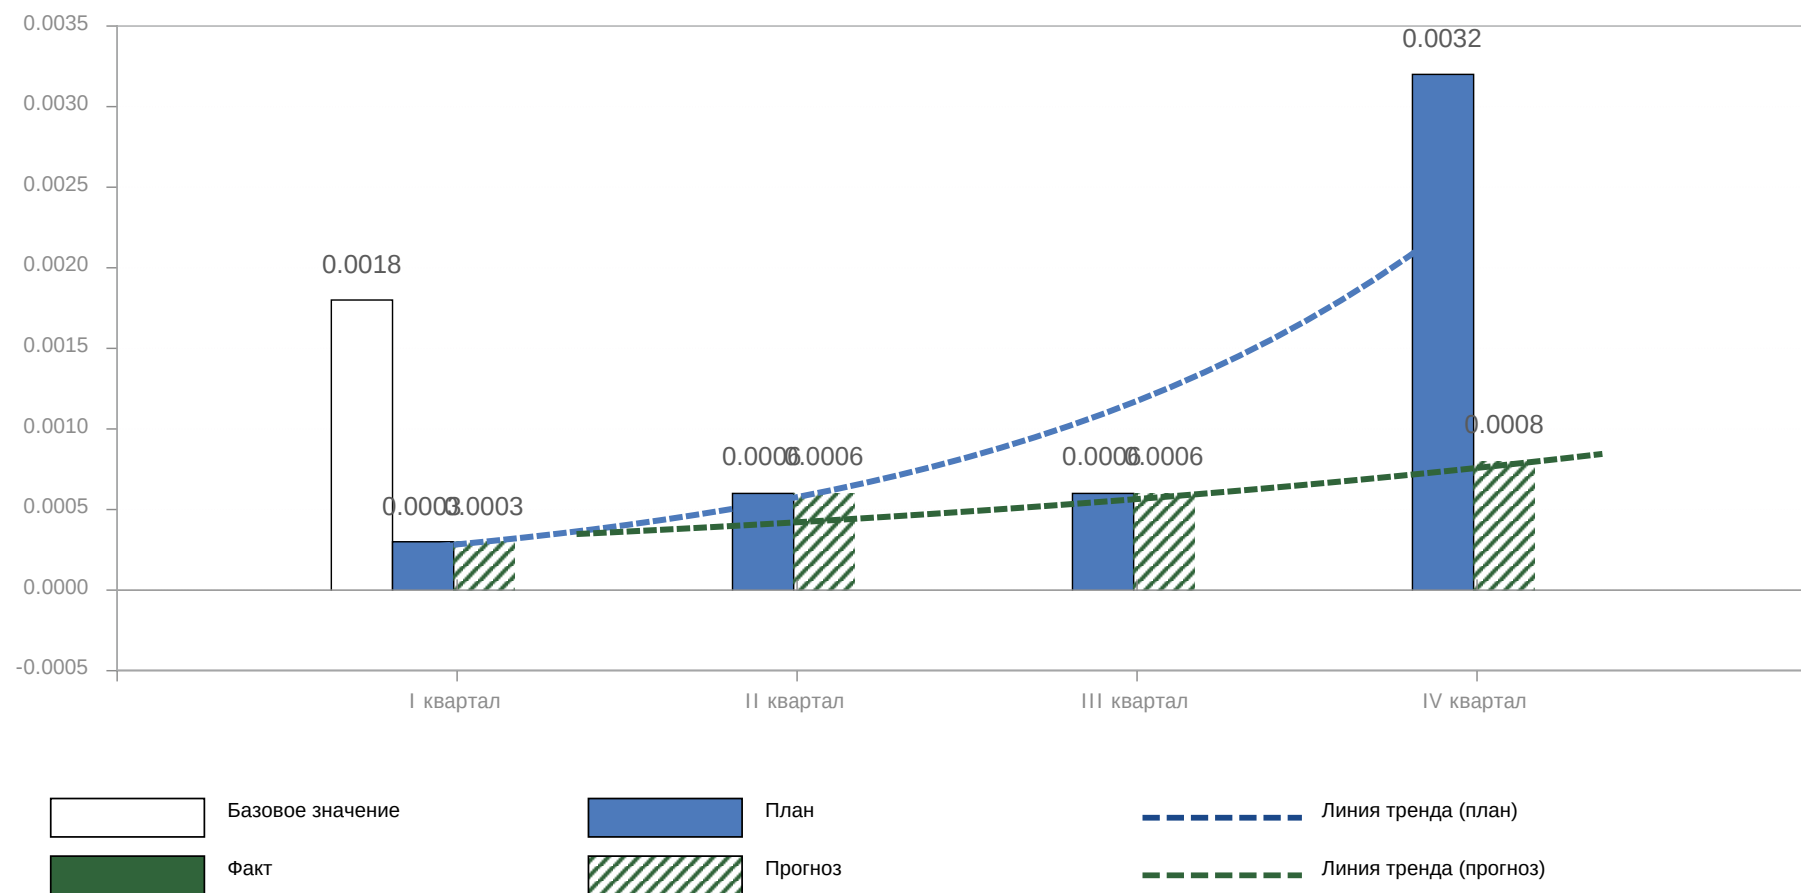


Рис. 12. Объем экспорта мясной и молочной продукции, млрд.долл.США
