

Руководитель  
регионального проекта —  
Малин Михаил Васильевич  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

27.12.2019

Сертификат:  
10470920D03BF29E0651368C1872D71E2E248AF1

Владелец: Малин Михаил Васильевич

Действителен: с 14.11.2019 по 14.02.2021

ОДОБРЕН

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД**

*"(N1-32) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Кемеровская область)"*

**Общий статус реализации**

| 1. Риски                                                                          | 2. Показатели                                                                     | 3. Бюджет                                                                           | 4. Результаты                                                                       | 5. Контрольные точки                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Отсутствие отклонений                                                             | Отсутствие отклонений                                                             | Отсутствие отклонений                                                               | Отсутствие отклонений                                                               | Отсутствие отклонений                                                               |

## 1. Ключевые риски

| № п/п                      | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Отсутствуют ключевые риски |        |                                                        |                        |                      |

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

| № п/п | Статус | Наименование целей и показателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |      |      |      | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------|------|------|---------------------------------|--------------------|-------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                        | I                     | II   | III  | IV   |                                 |                    |             |
| 1     |        | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»                                                                                                                                                                         | Единица                     | 0                                      | 5                     | 52   | 68   | 77   | 77                              | 100,00%            |             |
| 2     |        | Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) | Процент                     | 0                                      | 52.1                  | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 32.8                            | 100,00%            |             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование целей и показателей                                                                                                                | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |         |      |       | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------|------|-------|---------------------------------|--------------------|-------------|
|       |        |                                                                                                                                                 |                             |                                        | I                     | II      | III  | IV    |                                 |                    |             |
| 3     |        | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации                                        | Процент                     | 10                                     | 9                     | 9       | 9    | 36    | 17                              | 100,00%            |             |
| 4     |        | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты               | Процент                     | 0                                      | 0                     | 0       | 0    | 0     | 0                               | 0,00%              |             |
| 5     |        | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее                            | Человек                     | 0                                      | 0                     | 0       | 0    | 0     | 0                               | 0,00%              |             |
| 6     |        | Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре | Процент                     | 8.9                                    | 8.1                   | 9.5     | 10   | 10.8  | 10.8                            | 100,00%            |             |
| 7     |        | Число граждан, прошедших профилактические осмотры                                                                                               | Миллион человек             | 0.95                                   | 0.194                 | 0.611   | 0.9  | 1.07  | 1.072                           | 99,81%             |             |
| 8     |        | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями    | Процент                     | 12                                     | 12.6                  | 13.7    | 15.2 | 17.9  | 15                              | 100,00%            |             |
| 9     |        | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад                                                                                   | Тысяча посещений            | 250.1                                  | 44                    | 110.773 | 200  | 254.5 | 254.5                           | 100,00%            |             |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета<sup>2</sup>

Бюджет субъекта  
на 2019 год  
Всего: 0,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО  
на 2019 год  
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов  
на 2019 год  
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники  
на 2019 год  
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

<sup>2</sup> При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

## Сведения об исполнении бюджета

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения                | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей               |                        | Процент исполнения (8)/<br>(4)*100 | Комментарий |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|
|          |        |                                                                                                  | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Ученные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                    |             |
| 1        | 2      | 3                                                                                                | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                     | 8                      | 9                                  | 10          |
| 1        |        | (09) Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов                                     | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                               |             |
| 1.1      |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                  | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                               |             |
| 1.1.1    |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                             | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                               |             |
| 1.1.2    |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                               |             |
| 1.2.3    |        | бюджеты муниципальных образований                                                                | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                               |             |
| 1.2      |        | внебюджетные источники                                                                           | 0,00                                                   | X                               | X                                   | X                                     | 0,00                   | 0,00                               |             |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения                          | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент исполнения (8)/(4)*100 | Комментарий |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|
|          |        |                                                                                                            | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                |             |
| 1        | 2      | 3                                                                                                          | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                              | 10          |
| 2        |        | (14) Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                           |             |
| 2.1      |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                            | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                           |             |
| 2.1.1    |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                       | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                           |             |
| 2.1.2    |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований           | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                           |             |
| 2.2.3    |        | бюджеты муниципальных образований                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                           |             |
| 2.2      |        | внебюджетные источники                                                                                     | 0,00                                                   | X                               | X                                   | X                                      | 0,00                   | 0,00                           |             |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения                                                                                     | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент исполнения (8)/(4)*100 | Комментарий |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|
|          |        |                                                                                                                                                                       | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>ропись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                |             |
| 1        | 2      | 3                                                                                                                                                                     | 4                                                      | 5                              | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                              | 10          |
| 3        |        | (21) Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                           |             |
| 3.1      |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                                       | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                           |             |
| 3.1.1    |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                           |             |
| 3.1.2    |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                           |             |
| 3.2.3    |        | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                           |             |
| 3.2      |        | внебюджетные источники                                                                                                                                                | 0,00                                                   | X                              | X                                   | X                                      | 0,00                   | 0,00                           |             |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п                                                                                         | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                |                                     | Исполнение, тыс. рублей               |                        | Процент исполнения (8)/(4)*100 | Комментарий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|
|                                                                                                  |        |                                                                                   | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>ропись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Ученные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                |             |
| 1                                                                                                | 2      | 3                                                                                 | 4                                                      | 5                              | 6                                   | 7                                     | 8                      | 9                              | 10          |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:                             |        |                                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                           |             |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                  |        |                                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                           |             |
| бюджет субъекта Российской Федерации                                                             |        |                                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                           |             |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |        |                                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                           |             |
| бюджеты муниципальных образований                                                                |        |                                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                           |             |
| внебюджетные источники                                                                           |        |                                                                                   | 0,00                                                   | X                              | X                                   | X                                     | 0,00                   | 0,00                           |             |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

## 4. Статус достижения результатов

| № п/п | Статус                                                                              | Наименование результата                                                                                                                                                                                               | Достижение контрольных точек                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |    | Создано 5 новых фельдшерско-акушерских пунктов                                                                                                                                                                        |    |
| 2     |    | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации                                                      |                                                                                       |
| 3     |    | В медицинские организации переданы 10 мобильных медицинских комплексов                                                                                                                                                |    |
| 4     |    | В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь     |    |
| 5     |    | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов                                                                                                                                                               |    |
| 6     |    | Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра                                                       |    |
| 7     |    | Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий                                                                                                                 |    |
| 8     |   | В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи                    |  |
| 9     |  | Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи. |  |
| 10    |  | В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"                               |  |

-----  
<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

## 5. Динамика достижения контрольных точек

## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                              | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                               | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                     |                                                                                                                                       | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1     |                               |    | Создано 5 новых фельдшерско-акушерских пунктов Значение: 5, на дату 31.12.2019                                                        | 31.12.2019      | 30.09.2019   |                           | Информация по значению результата:<br>Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода в эксплуатацию" Акт Кемеровская клиническая районная больница от 15.04.2019г. №1, приложен файл. 2. "Акт ввода в эксплуатацию" Акт Яшкинская районная больница от 21.06.2019г. №2, приложен файл. 3. "Акт ввода в эксплуатацию" Акт Яшкинская районная больница от 21.06.2019г. №3, приложен файл. 4. "Акт ввода в эксплуатацию" Акт Новокузнецкая районная больница от 21.06.2019г. №4, приложен файл. 5. "Акт ввода в эксплуатацию" Акт Яшкинская районная больница от 21.06.2019г. №5, приложен файл.<br>Информация по результату:<br>Выполнено. |
| 1.1   | ПК                            |   | Введены в эксплуатацию и подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности 5 фельдшерско-акушерских пунктов | 01.12.2019      | 30.09.2019   | Малин М. В.               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.1 | РРП                           |  | Ввод в эксплуатацию 5 фельдшерско-акушерских пунктов, закупленных в 2018 году                                                         | 01.12.2019      | 30.09.2019   | Зеленина Е. М.            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2     |                               |  | Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий Значение: 3, на дату 31.12.2020 | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Малин М. В.               | Информация по значению результата:<br>В работе.<br>Информация по результату:<br>В работе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                              | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                    |                                                                                                                                                      | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1   | ПК                            |   | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*            | 15.02.2020      | 15.02.2020   | Малин М. В.               | В работе.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.1 | РРП                           |   | Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о замене фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии | 15.02.2020      | 15.02.2020   | Малин М. В.               | В работе.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.2   | ПК                            |   | Субъектам Российской Федерации доведены иные межбюджетные трансферты на замену фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий                 | 15.03.2020      | 15.03.2020   | Малин М. В.               | В работе.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.2.1 | РРП                           |   | Получение межбюджетных трансфертов бюджета Кемеровской области для замены фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии          | 15.03.2020      | 15.03.2020   | Малин М. В.               | В работе.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3     |                               |  | Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий Значение: 0, на дату 31.12.2019                | 31.12.2019      | 04.12.2019   | Малин М. В.               | Информация по значению результата:<br>Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Кемеровская область не реализует в 2019 указанный результат" Информация ДОЗН КО от 04.12.2019г. №б/н, приложен файл.<br>Информация по результату:<br>В работе. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                  | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4     |                               |   | <i>В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь Значение: 1, на дату 31.12.2020</i> | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Малин М. В.               | Информация по значению результата:<br>В работе.<br>Информация по результату:<br>В работе.                                                                                                                                            |
| 4.1   | ПК                            |   | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта                                                                                                                                                                                     | 01.06.2019      | 23.05.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо ДОЗН КО от 23.05.2019 № 3232 и письмо ГУ архитектуры и градостроительства КО О перечне объектов для внесения на карту территориального" Письмо от 23.05.2019г. №3232, приложен файл; |
| 4.1.1 | РРП                           |   | Определены существующие и планируемые к строительству объекты медицинских организаций, для внесения в схемы территориального планирования                                                                                                                | 01.06.2019      | 23.05.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо ДОЗН КО от 23.05.2019 № 3232 и письмо ГУ архитектуры и градостроительства КО О перечне объектов для внесения на карту территориального" Письмо от 23.05.2019г. №3232, приложен файл; |
| 4.2   | ПК                            |  | В соответствии с отчетом департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, утвержденным документами территориального планирования, предусмотрены планируемые к строительству фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории             | 01.09.2019      | 23.05.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О перечне объектов для внесения на карту территориального планирования " Письмо Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 23.05.2019г. №3232, приложен файл.            |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.2.1 | РРП                           |   | Департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области обеспечена подготовка, согласование и утверждение схем или изменений в схемы территориального планирования Кемеровской области, включающих раздел по здравоохранению, в котором указаны все планируемые объекты здравоохранения, подведомственные департаменту охраны здоровья населения Кемеровской области (включая планируемые к строительству фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории), а в обосновывающих материалах к указанным документам территориального планирования учтены сведения о всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 01.06.2019      | 23.05.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О перечне объектов для внесения на карту территориального планирования " Письмо Депетамента охраны здоровья населния Кемеровской области от 23.05.2019г. №3232, приложен файл. |
| 4.3   | ПК                            |  | Сведения о планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях внесены в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31.12.2019      | 24.12.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении в геоинформационную систему" Письмо ДОЗН КО от 24.12.2019г. №8521, приложен файл.                                                                                   |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                              | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                       |
| 4.3.1 | РРП                           |    | Департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области обеспечено внесение в полном объеме сведений о существующих и планируемых объектах здравоохранения, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации (включая сведения о планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях) в геоинформационную систему Минздрава России (геоинформационную подсистему ЕГИСЗ) | 31.12.2019      | 24.12.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении в геоинформационную систему" Письмо ДОЗН КО от 24.12.2019г. №8521, приложен файл.                                                 |
| 4.3.2 | РРП                           |    | В геоинформационной подсистеме ЕГИСЗ открыта возможность внесения планируемых объектов здравоохранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.12.2019      | 24.12.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Просрочка 23 дней. Подтверждающие документы: 1. "О внесении в геоинформационную систему" Письмо ДОЗН КО от 24.12.2019г. №8521, приложен файл.                              |
| 5     |                               |   | <i>Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному проезду на автомобиле скорой медицинской помощи. Значение: 1, на дату 31.12.2020</i>                                                                                                                                                                         | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Малин М. В.               | Информация по значению результата:<br>В работе.<br>Информация по результату:<br>В работе.                                                                                             |
| 5.1   | ПК                            |  | Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31.12.2019      | 12.11.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ В МЗ РФ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ КО В ПРОЕКТ ( Вертолетные площадки)" Письмо ДОЗН КО от 12.11.2019г. №07425, приложен файл. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                              | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                   | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                        |
| 5.1.1 | РРП                           |    | Департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области по согласованию с Минздравом России определена потребность в реконструкции вертолетных (посадочных) площадок и выбрано их местоположение, определены источники финансирования | 31.12.2019      | 12.11.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ В МЗ РФ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ КО В ПРОЕКТ ( Вертолетные площадки)" Письмо ДОЗН КО от 12.11.2019г. №07425, приложен файл. |
| 6     |                               |    | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов Значение: 29, на дату 31.12.2020                                                                                                                                                  | 31.12.2020      | 31.12.2020   |                           | Информация по значению результата:<br>В работе.<br>Информация по результату:<br>В работе.                                                                                              |
| 6.1   | ПК                            |    | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*                                                                                                 | 15.02.2020      | 15.02.2020   | Малин М. В.               | В работе.                                                                                                                                                                              |
| 6.1.1 | РРП                           |    | заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о приобретении передвижных медицинских комплексов                                                                                                              | 15.02.2020      | 15.02.2020   | Малин М. В.               | В работе.                                                                                                                                                                              |
| 6.2   | ПК                            |   | 23 субъектам Российской Федерации доведены иные межбюджетные трансферты на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами                                                                                        | 15.03.2020      | 15.03.2020   | Малин М. В.               | В работе.                                                                                                                                                                              |
| 6.2.1 | РРП                           |  | Получены межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области на приобретение передвижных медицинских комплексов                                                                                                                           | 15.03.2020      | 15.03.2020   | Малин М. В.               | В работе.                                                                                                                                                                              |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                    | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                                                                                                                            | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7     |                               |        | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации<br>Значение: 0, на дату 31.12.2019                        | 31.12.2019      | 31.12.2019   | Малин М. В.               | Информация по значению результата:<br>Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Кемеровская область в 2019 году не реализует достижение результата" Информация ДОЗН КО от 04.12.2019г. №б/н, приложен файл.<br>Информация по результату:<br>В работе. |
| 8     |                               |        | В медицинские организации переданы 10 мобильных медицинских комплексов<br>Значение: 10, на дату 31.12.2019                                                                                                                 | 31.12.2019      | 08.05.2019   |                           | Информация по значению результата:<br>Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акты ввода в эксплуатацию " Акт ДОЗН КО от 08.05.2019г. № б/н, приложен файл.<br>Информация по результату:<br>Выполнено.                                              |
| 8.1   | ПК                            |        | В муниципальные районы Кемеровской области установлено 10 мобильных медицинских комплексов                                                                                                                                 | 01.12.2019      | 08.05.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акты ввода в эксплуатацию мобильных медицинских комплексов" Акт медицинских организаций от 08.05.2019г. №30, приложен файл.                                                                                 |
| 8.1.1 | РРП                           |        | В медицинские организации переданы 10 мобильных медицинских комплексов                                                                                                                                                     | 01.12.2019      | 08.05.2019   | Зеленина Е. М.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акты ввода в эксплуатацию мобильных медицинских комплексов" Акт медицинских организаций от 08.05.2019г. №30, приложен файл.                                                                                 |
| 9     |                               |        | В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"<br>Значение: 1, на дату 15.05.2019 | 15.05.2019      | 15.04.2019   | Малин М. В.               | Информация по значению результата:<br>Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " о создании регионального центра организации ПМСИ" Приказ ДОЗН КО от 15.04.2019г. №776, приложен файл.<br>Информация по результату:<br>Выполнено.                     |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                    | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                         |
| 9.1    | ПК                            |   | Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)                                                                                                                                                        | 15.05.2019      | 15.04.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ ДОЗН от 15.04.2019 № 776 о создании регионального центра организации ПМСП" Приказ от 15.04.2019г. № 776, приложен файл; |
| 9.1.1  | РРП                           |   | Департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области приняты нормативные акты, регламентирующие создание регионального проектного офиса                                                                                             | 15.05.2019      | 15.04.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ ДОЗН от 15.04.2019 № 776 о создании регионального центра организации ПМСП" Приказ от 15.04.2019г. № 776, приложен файл; |
| 10     |                               |   | <i>В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи Значение: 40, на дату 31.12.2020</i> | 31.12.2020      | 31.12.2020   |                           | Информация по значению результата:<br>В работе.<br>Информация по результату:<br>В работе.                                                                               |
| 10.1   | ПК                            |   | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                         | 01.02.2020      | 01.02.2020   | Малин М. В.               | В работе.                                                                                                                                                               |
| 10.1.1 | РРП                           |  | Утвержден планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2020 год и представлены в ЦПМСП                     | 01.02.2020      | 01.02.2020   | Малин М. В.               | В работе.                                                                                                                                                               |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                    | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                            | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11     |                               |        | <i>В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи Значение: 30, на дату 31.12.2019</i> | 31.12.2019      | 03.12.2019   |                           | Информация по значению результата:<br>Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по Новой модели" Отчет ДОЗН КО от 03.12.2019г. №7923, приложен файл. 2. "Приложение к отчету по Новой модели" Отчет ДОЗН КО от 03.12.2019г. №7923, приложен файл.<br>Информация по результату:<br>В работе. |
| 11.1   | ПК                            |        | Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                        | 01.02.2019      | 28.01.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ ДОЗН от 28-01-2019 №131 Об утверждении перечня медицинских организаций участвующих в 2019 г в создании и тиражировании Новой модели" Приказ от 28.01.2019г. №131, приложен файл;                                                                 |
| 11.1.1 | РРП                           |        | Утвержден планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2019 год и представлены в ЦПМСП                     | 01.02.2019      | 28.01.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ ДОЗН от 28-01-2019 №131 Об утверждении перечня медицинских организаций участвующих в 2019 г в создании и тиражировании Новой модели" Приказ от 28.01.2019г. №131, приложен файл;                                                                 |
| 11.2   | ПК                            |        | Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                          | 01.12.2019      | 20.11.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТАХ" Письмо ДОЗН КО от 20.11.2019г. №7617, приложен файл.                                                                                                                                                 |
| 11.2.1 | РРП                           |        | Обеспечение создания «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 77 медицинских организациях, оказывающих данный вид помощи, и методической поддержки мероприятий по ее внедрению             | 01.12.2019      | 20.11.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТАХ" Письмо ДОЗН КО от 20.11.2019г. №7617, приложен файл.                                                                                                                                                |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                              | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                        | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                  |
| 11.3   | ПК                            |    | В ЦПМСП представлен отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 20.12.2019      | 03.12.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по Новой модели" Отчет ДОЗН КО от 03.12.2019г. №7923, приложен файл. 2. "Приложение к отчету по Новой модели" Отчет ДОЗН КО от 03.12.2019г. №7923, приложен файл. |
| 11.3.1 | РРП                           |    | В ЦПМСП представлен отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 20.12.2019      | 03.12.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет по Новой модели" Отчет ДОЗН КО от 03.12.2019г. №7923, приложен файл. 2. "Приложение к отчету по Новой модели" Отчет ДОЗН КО от 03.12.2019г. №7923, приложен файл. |
| 12     |                               |   | Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра Значение: 49, на дату 31.12.2020                                               | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Малин М. В.               | Информация по значению результата: В работе.<br>Информация по результату: В работе. Подтверждающие документы: 1. "О проведенных профилактических осмотрах" Отчет ДОЗН КО от 19.12.2019г. №8362, приложен файл.   |
| 12.1   | ПК                            |  | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 15,0 %.                                                                                         | 15.03.2020      | 15.03.2020   | Цигельник А. М.           | В работе.                                                                                                                                                                                                        |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                            | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                     | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12.1.1   | РРП                              |  | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке.                                                                                                                                                                  | 15.03.2020      | 15.03.2020   | Цигельник А. М.              | В работе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13       |                                  |  | Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра Значение: 44.8, на дату 31.12.2019                                                             | 31.12.2019      | 19.12.2019   | Малин М. В.                  | Информация по значению результата:<br>Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ДОЗН КО" Отчет ДОЗН КО от 19.12.2019г. №8362, приложен файл.<br>Информация по результату:<br>В работе. Подтверждающие документы: 1. "О проведенных профилактических осмотрах" Отчет ДОЗН КО от 19.12.2019г. №8362, приложен файл. |
| 13.1     | ПК                               |  | Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                              | 10.12.2019      | 25.11.2019   | Малин М. В.                  | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации по региональным проектам" Отчет ТФОМС от 25.11.2019г. №5940, приложен файл.                                                                                                                                                                 |
| 13.1.1   | РРП                              |  | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 44,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 10.12.2019      | 25.11.2019   | Цигельник А. М.              | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации по региональным проектам" Отчет ТФОМС от 25.11.2019г. №5940, приложен файл.                                                                                                                                                                 |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                              | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                     |
| 13.2   | ПК                            |    | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 32,8 процентов медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС; функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 10.12.2019      | 06.09.2019   | Цигельник А. М.           | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о достижении показателей регионального проекта" Отчет ТФОМС от 06.09.2019г. №4233, приложен файл. |
| 13.2.1 | РПП                           |    | В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций                                                                                                   | 10.12.2019      | 06.09.2019   | Цигельник А. М.           | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о достижении показателей регионального проекта" Отчет ТФОМС от 06.09.2019г. №4233, приложен файл. |
| 13.3   | ПК                            |   | Департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 44,3 процентов                                                                                                                                                                                                                                 | 15.12.2019      | 19.12.2019   | Зеленина Е. М.            | Выполнено. Просрочка 4 дней. Подтверждающие документы: 1. "О профилактических осмотрах" Отчет ДОЗН КО от 19.12.2019г. №8362, приложен файл.         |
| 13.3.1 | РПП                           |  | Обеспечение департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.12.2019      | 19.12.2019   | Зеленина Е. М.            | Выполнено. Просрочка 4 дней. Подтверждающие документы: 1. "О профилактических осмотрах" Отчет ДОЗН КО от 19.12.2019г. №8362, приложен файл.         |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.

### Динамика достижения контрольных точек

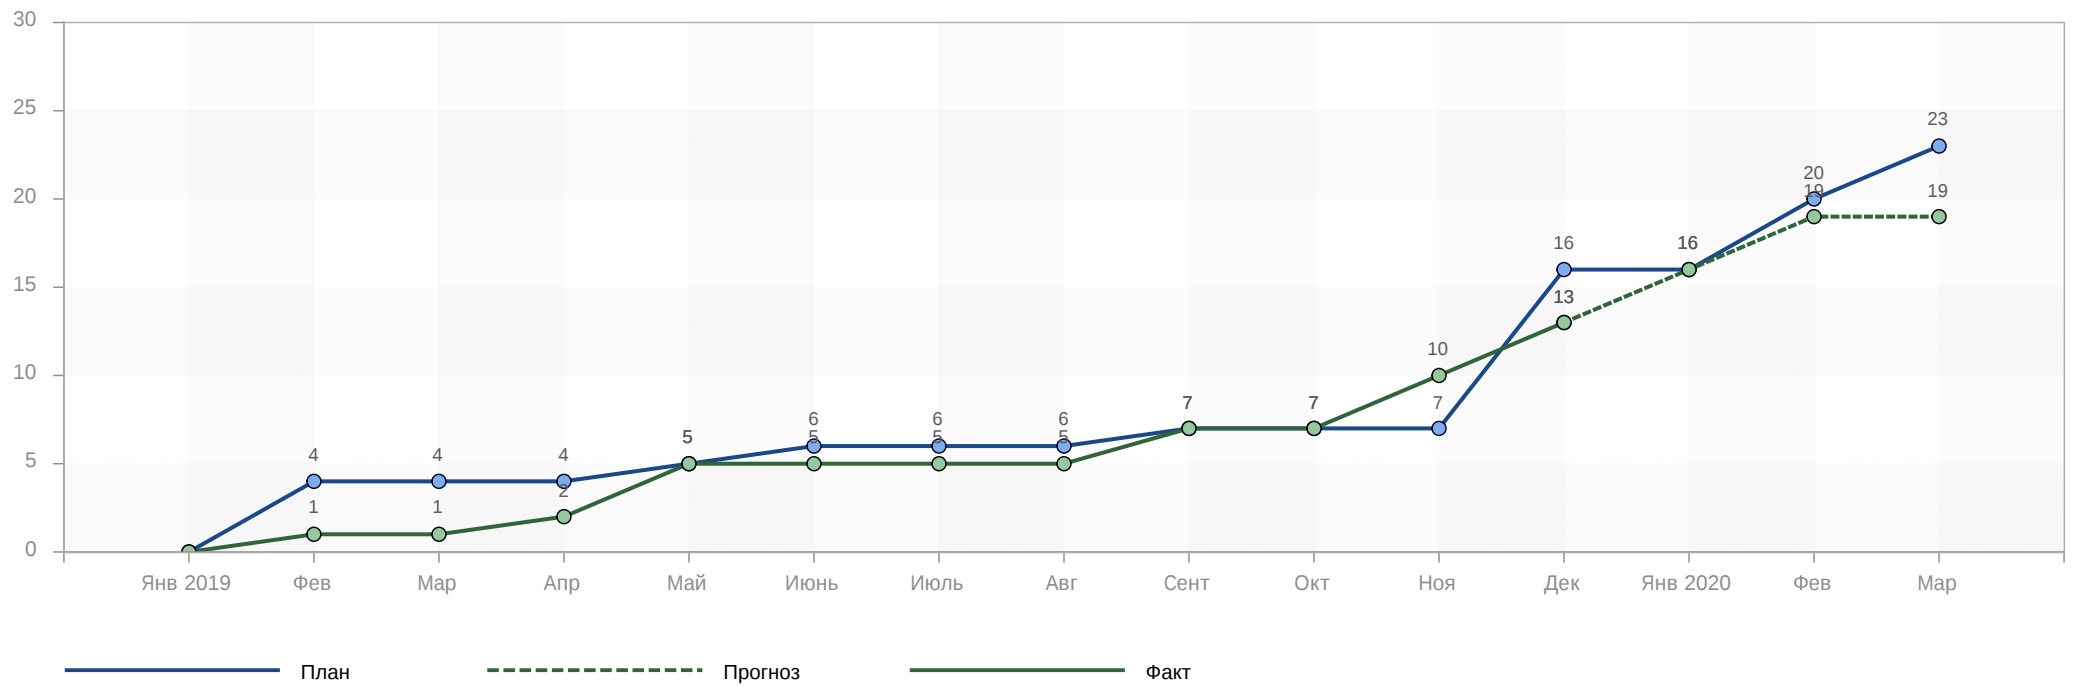


Рис. 1. "(N1-32) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Кемеровская область)"




График достижения показателя

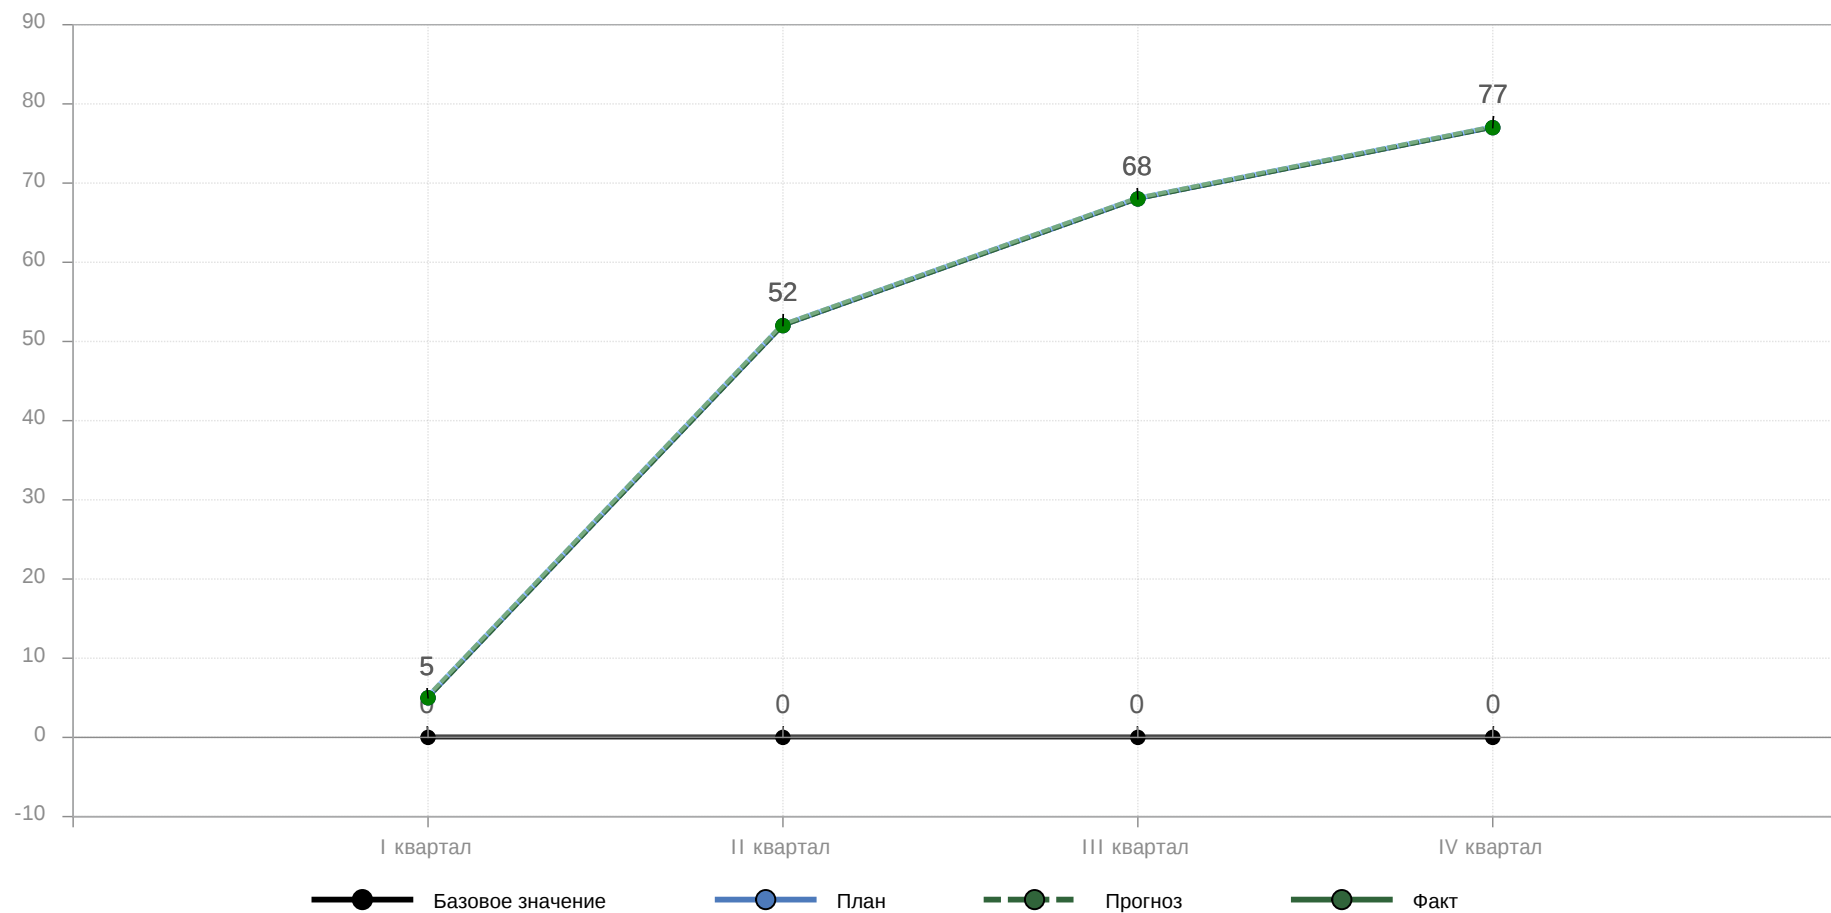


Рис. 1. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

Диаграмма достижения показателя

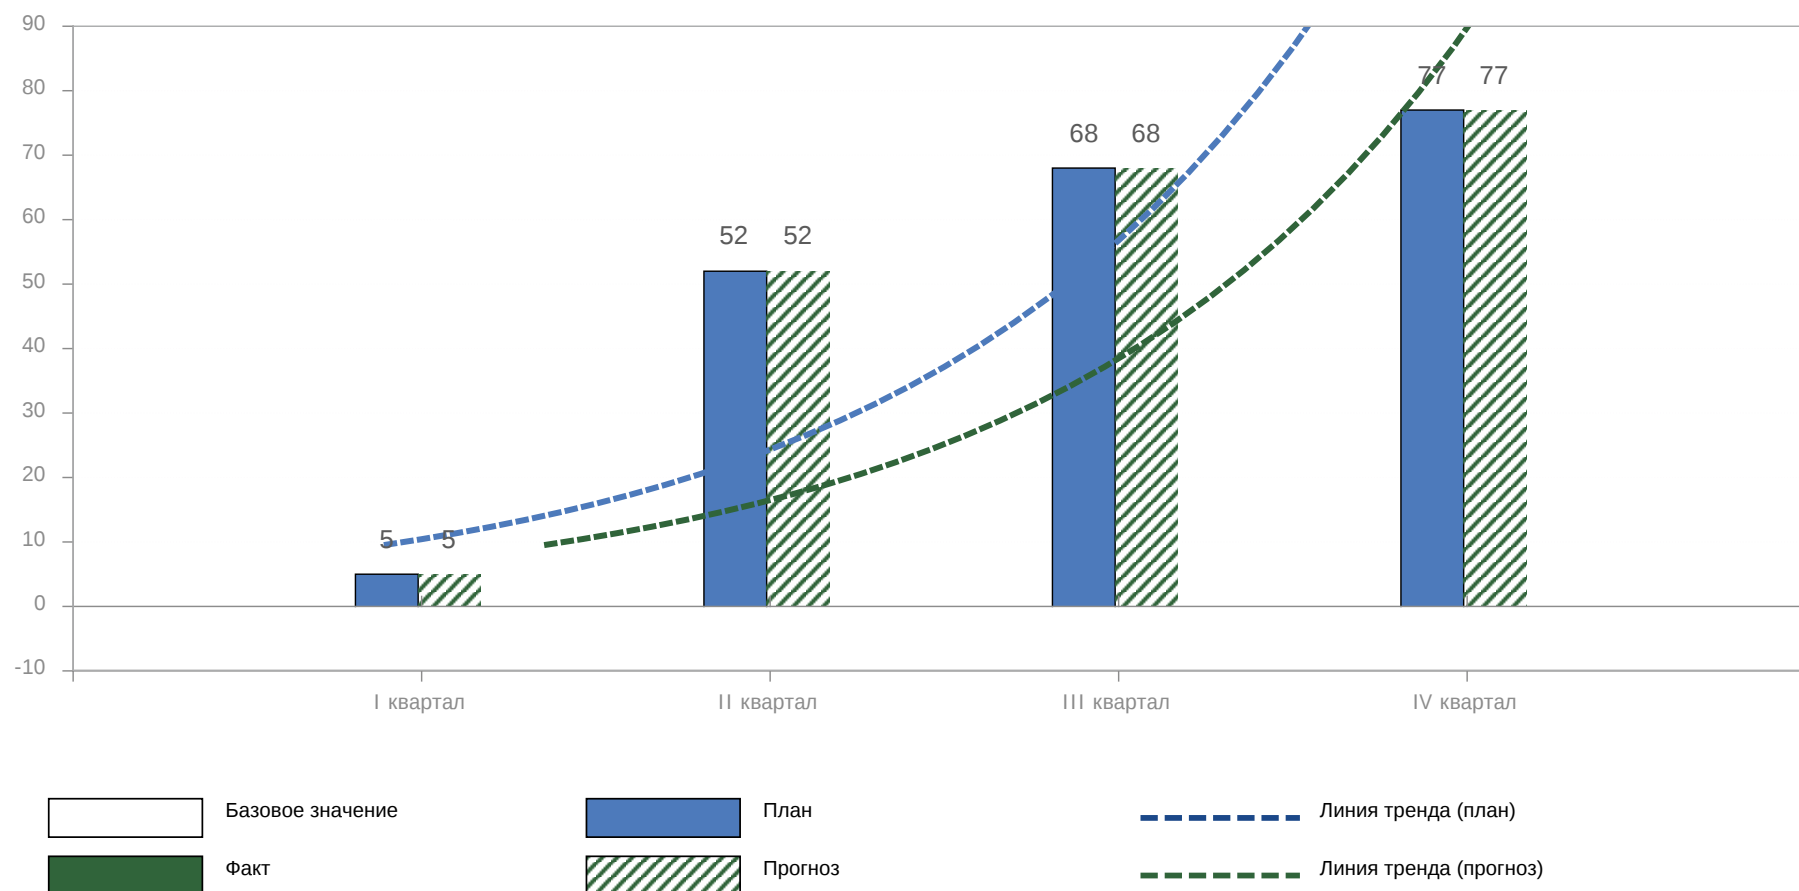


Рис. 2. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

График достижения показателя

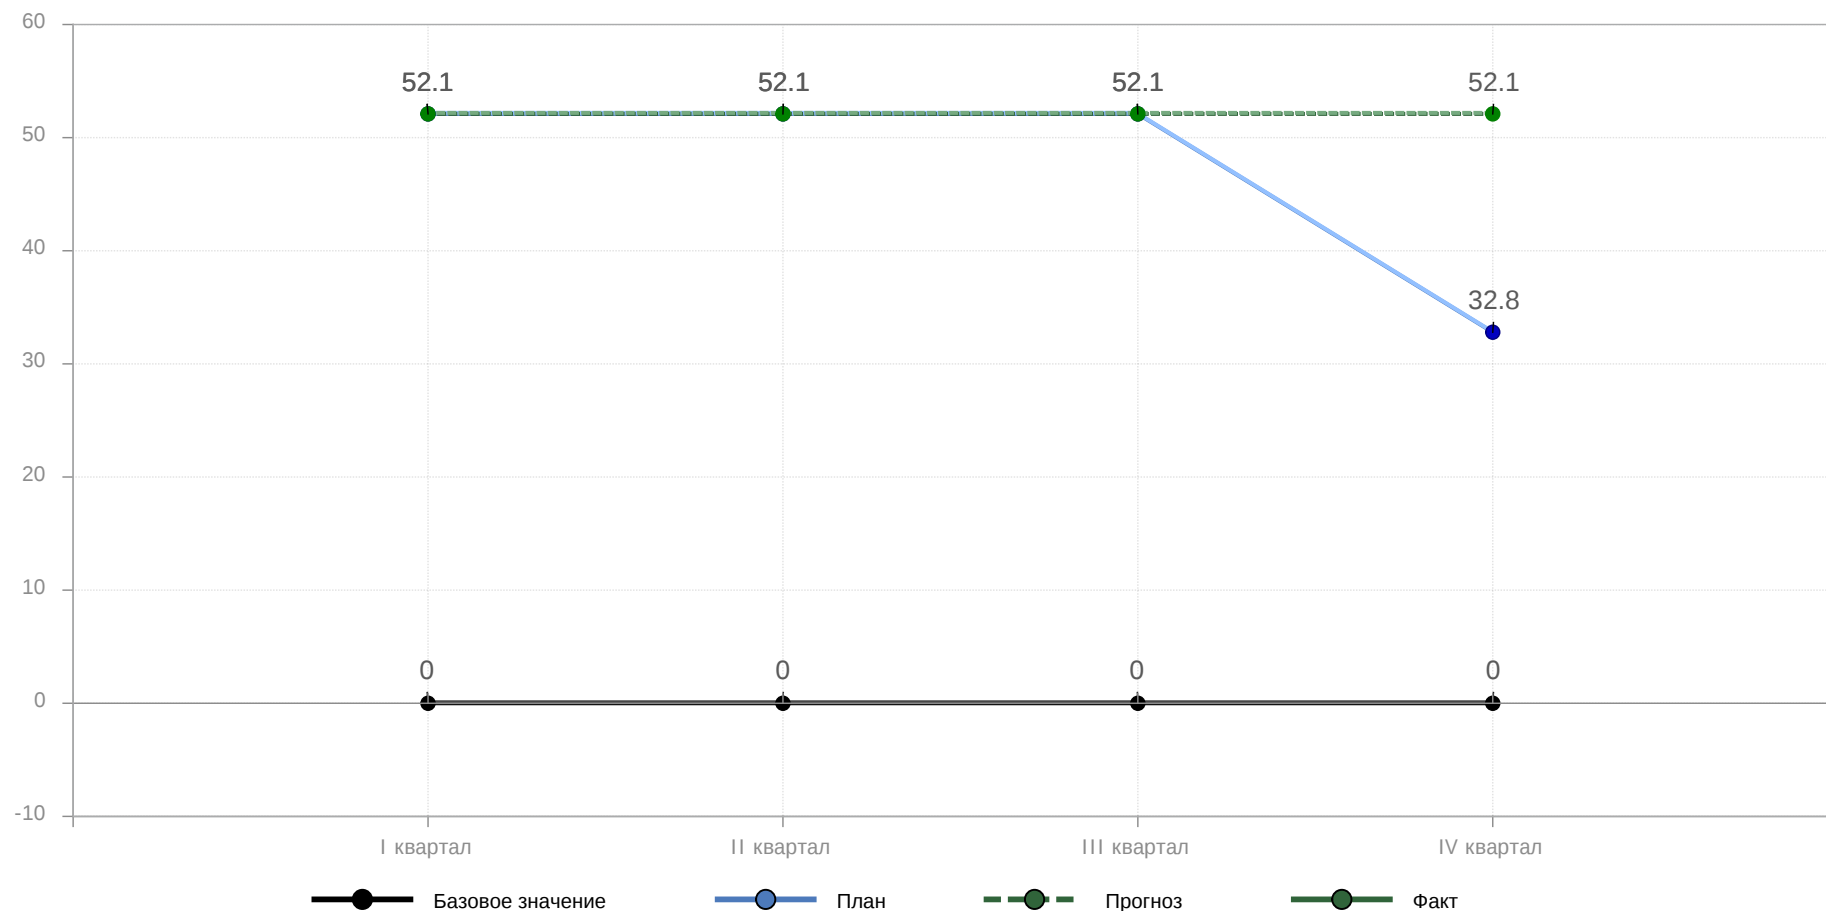


Рис. 3. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

Диаграмма достижения показателя

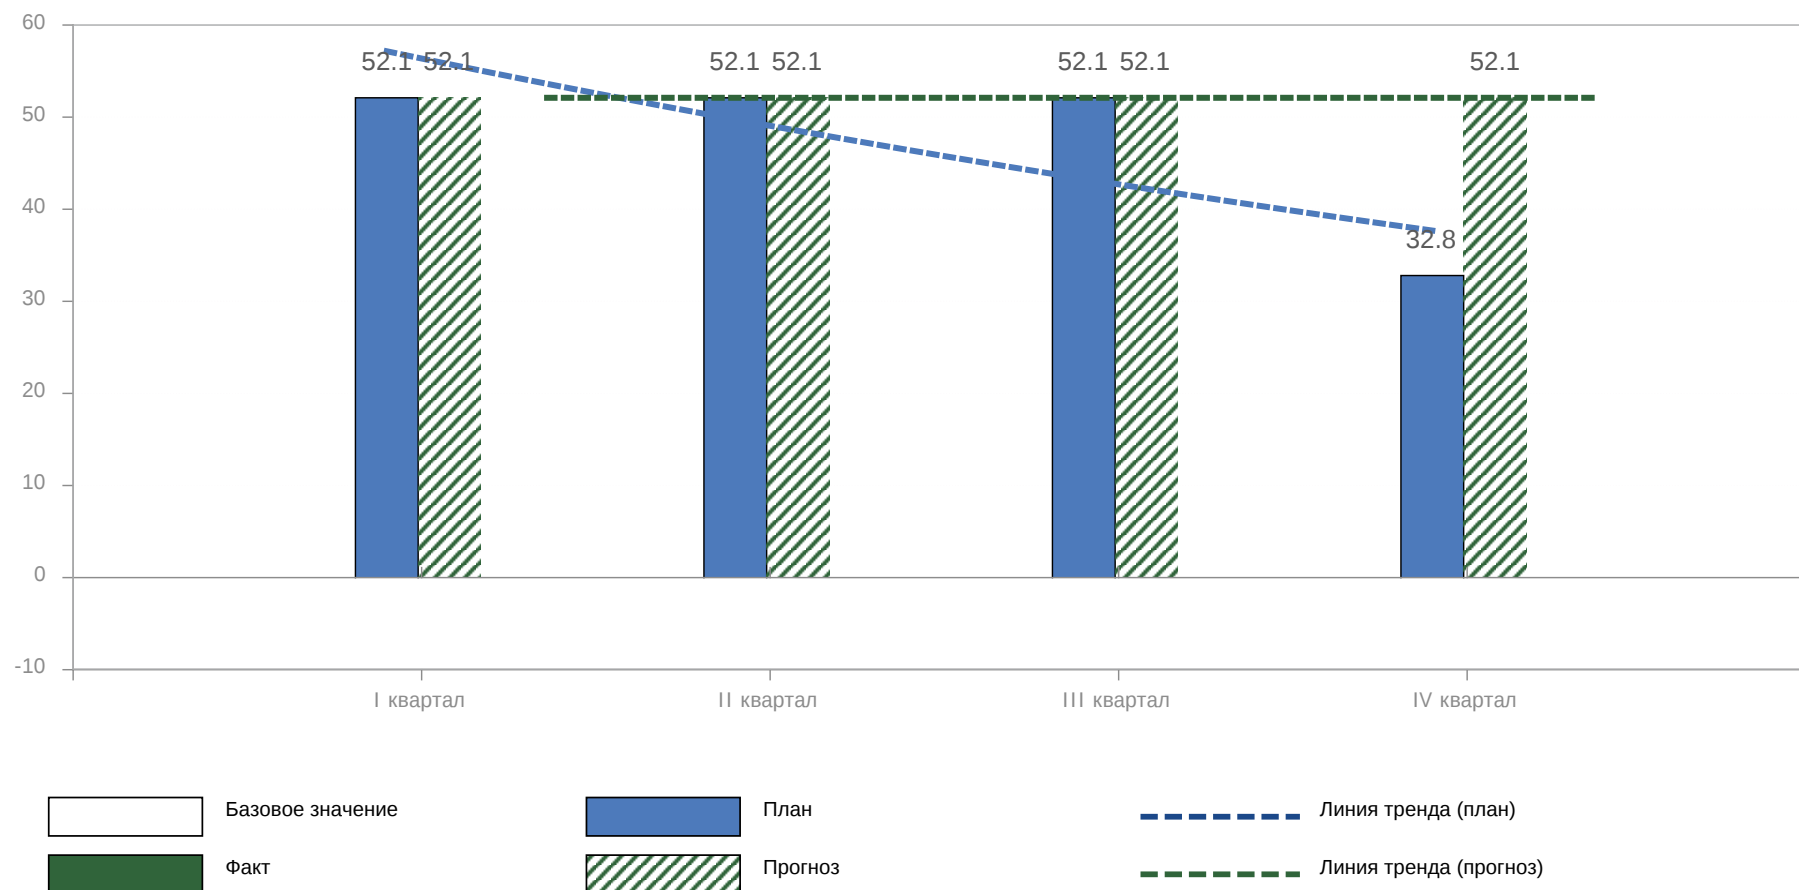


Рис. 4. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

График достижения показателя

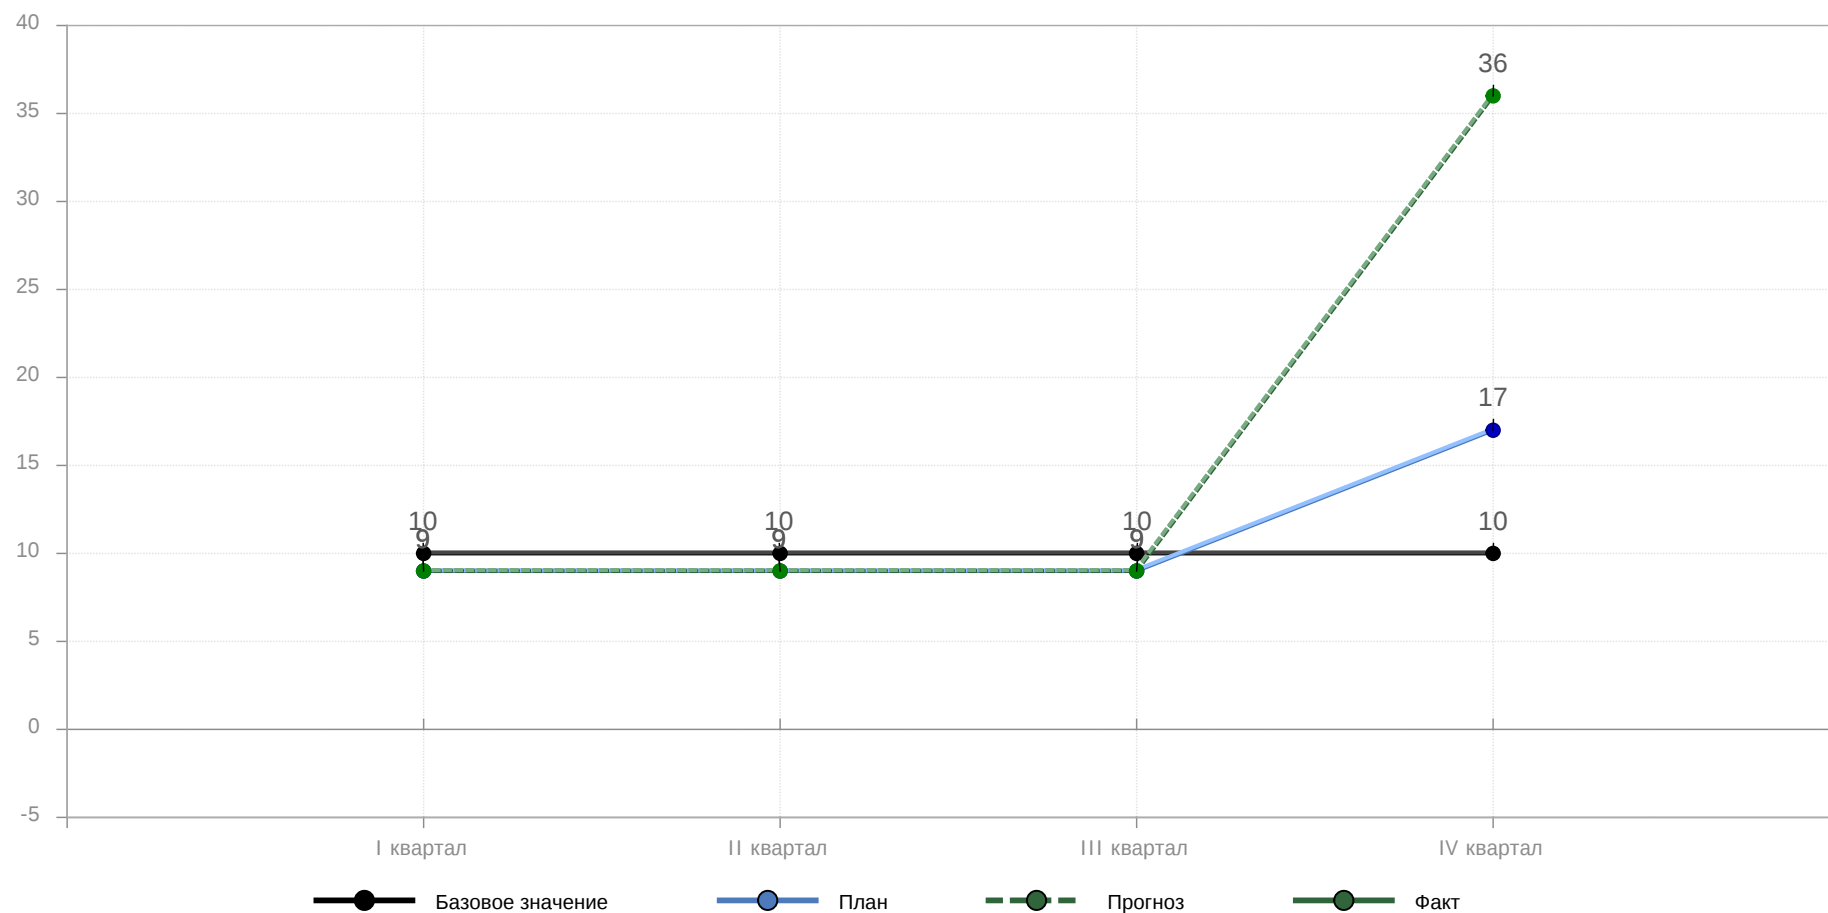


Рис. 5. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

Диаграмма достижения показателя

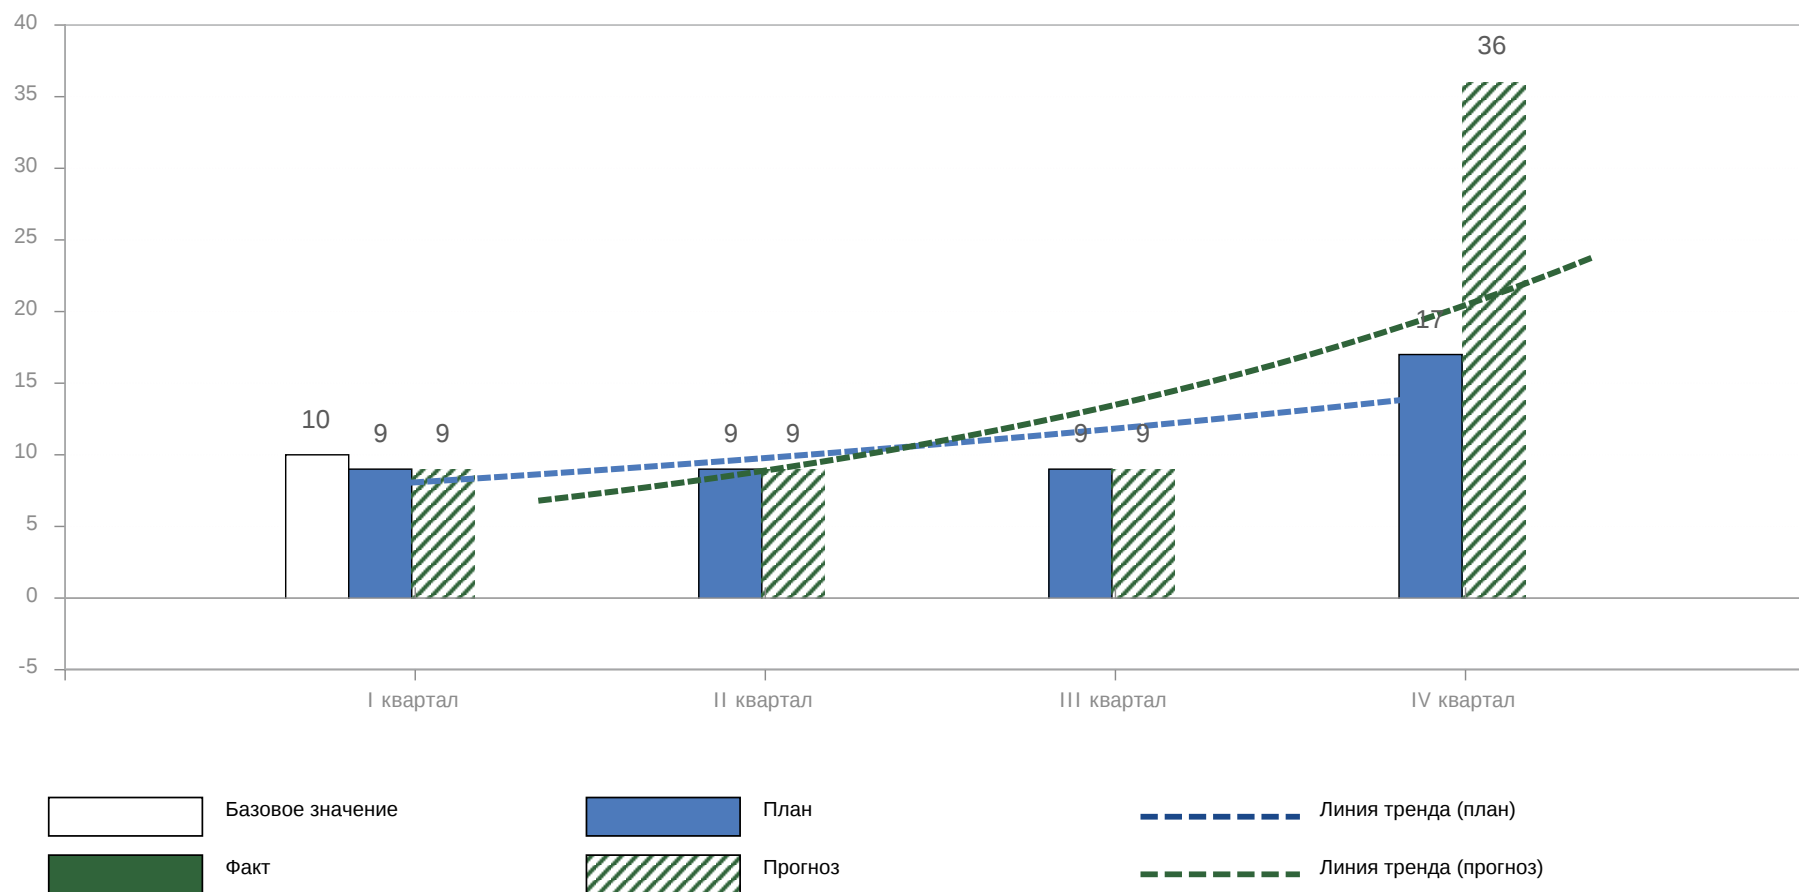


Рис. 6. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

График достижения показателя

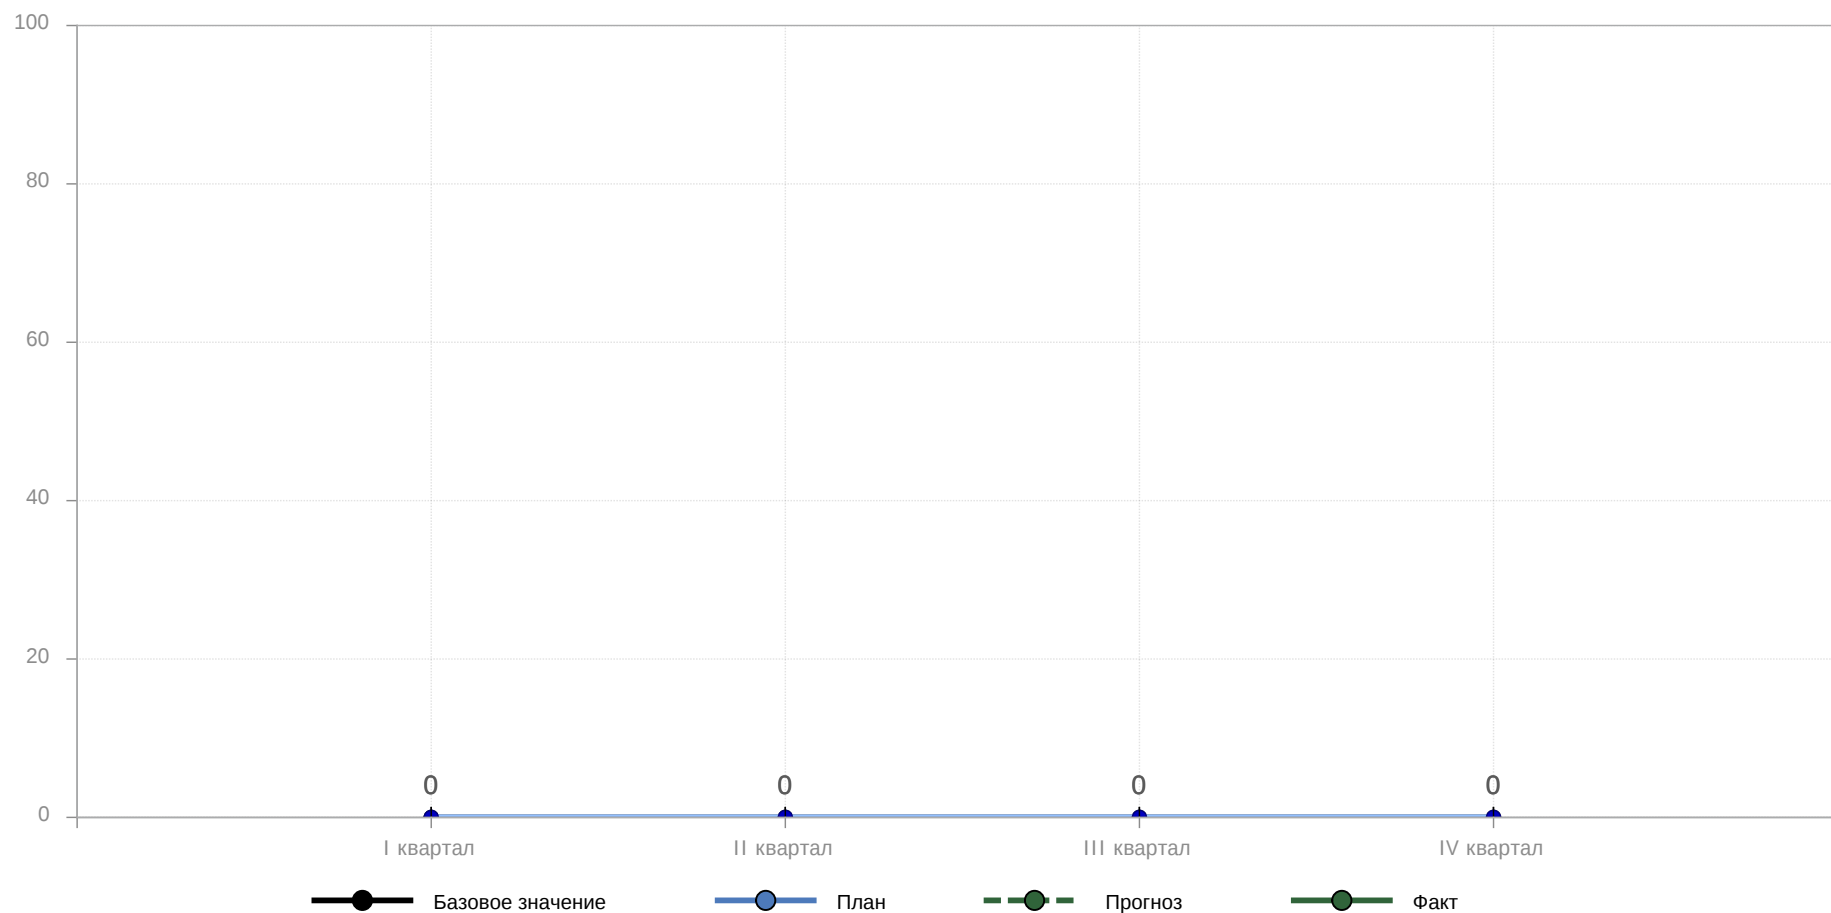


Рис. 7. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

Диаграмма достижения показателя

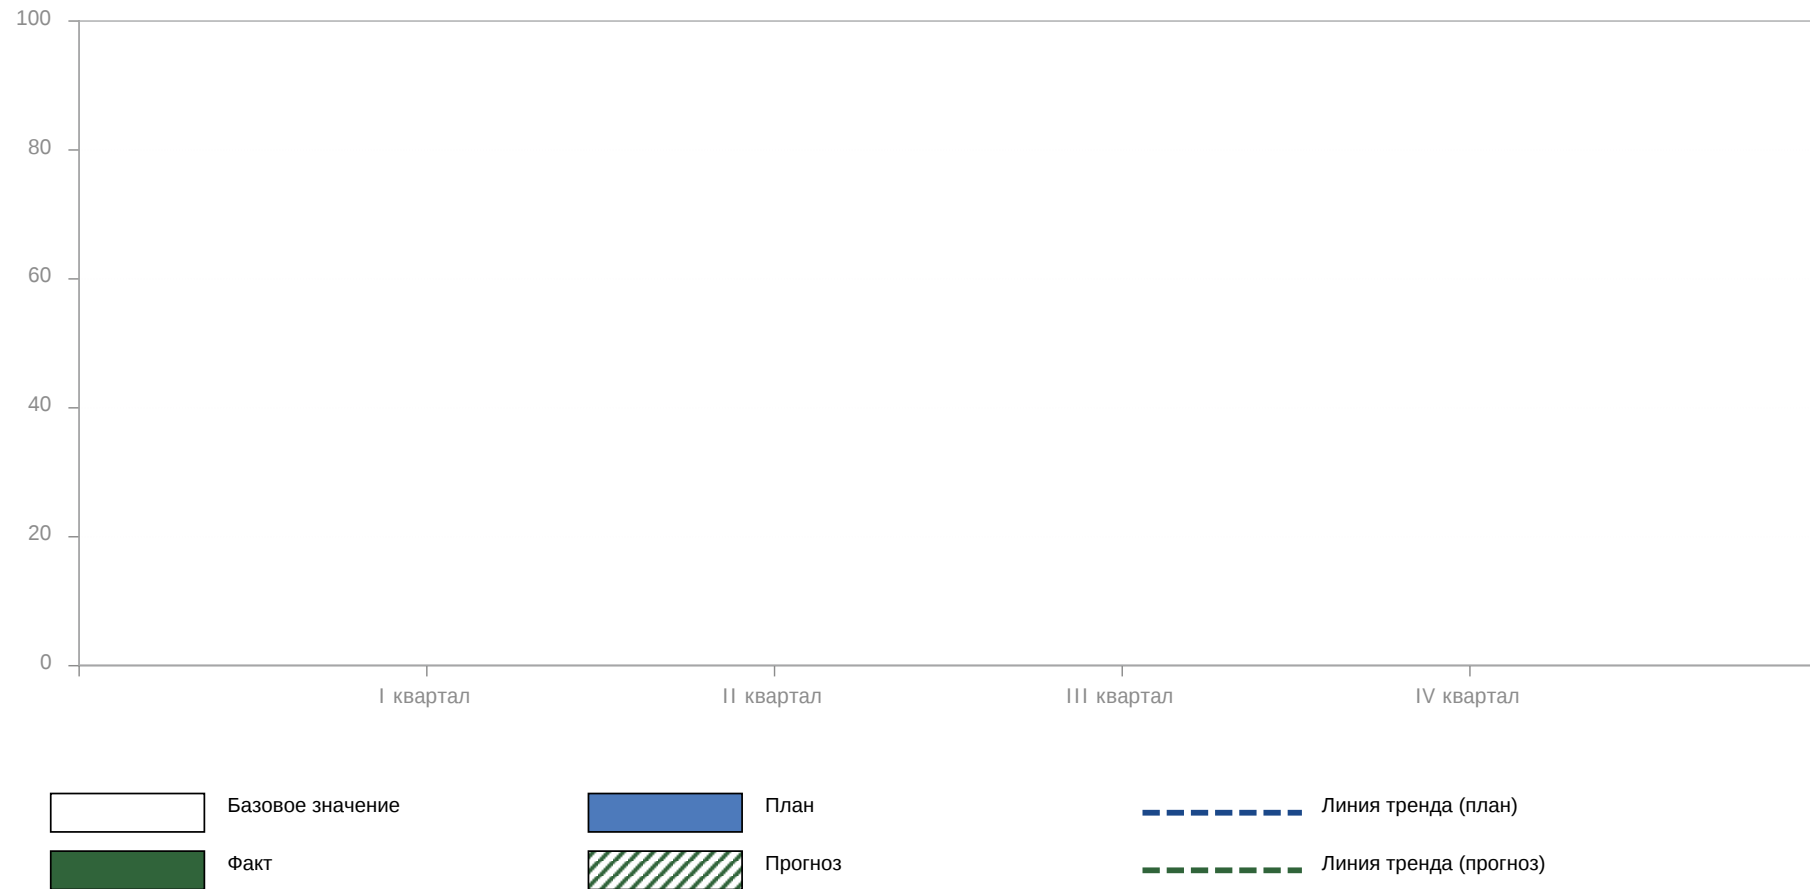


Рис. 8. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

График достижения показателя

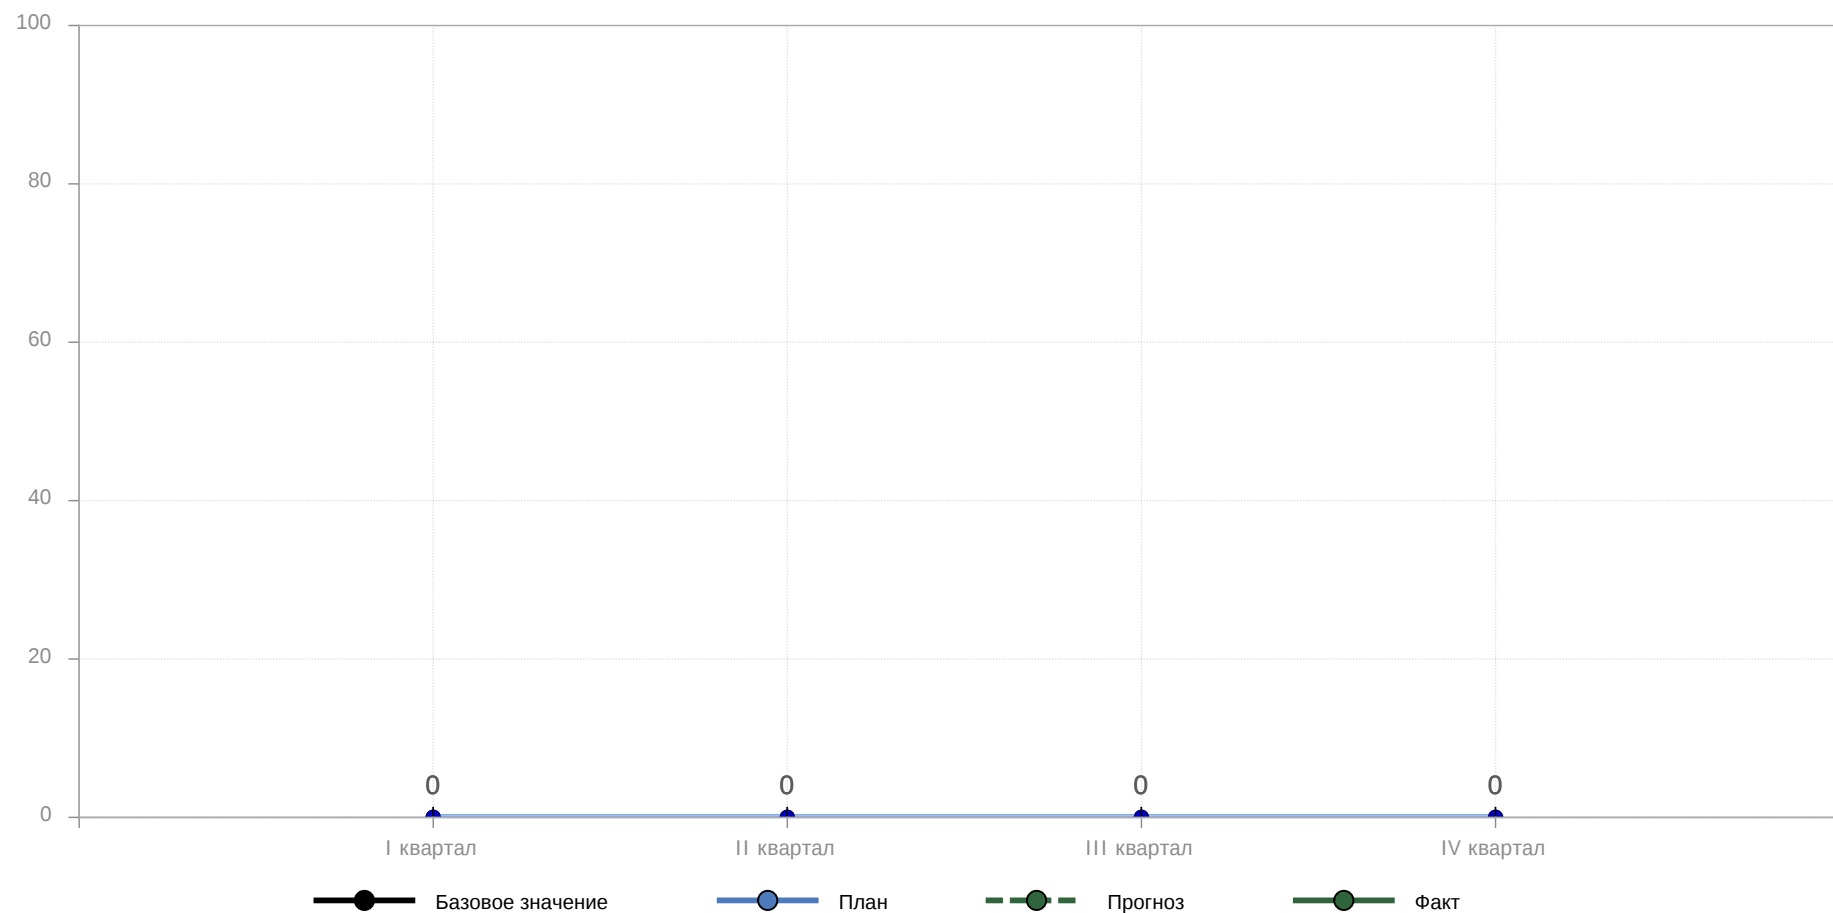


Рис. 9. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее

Диаграмма достижения показателя

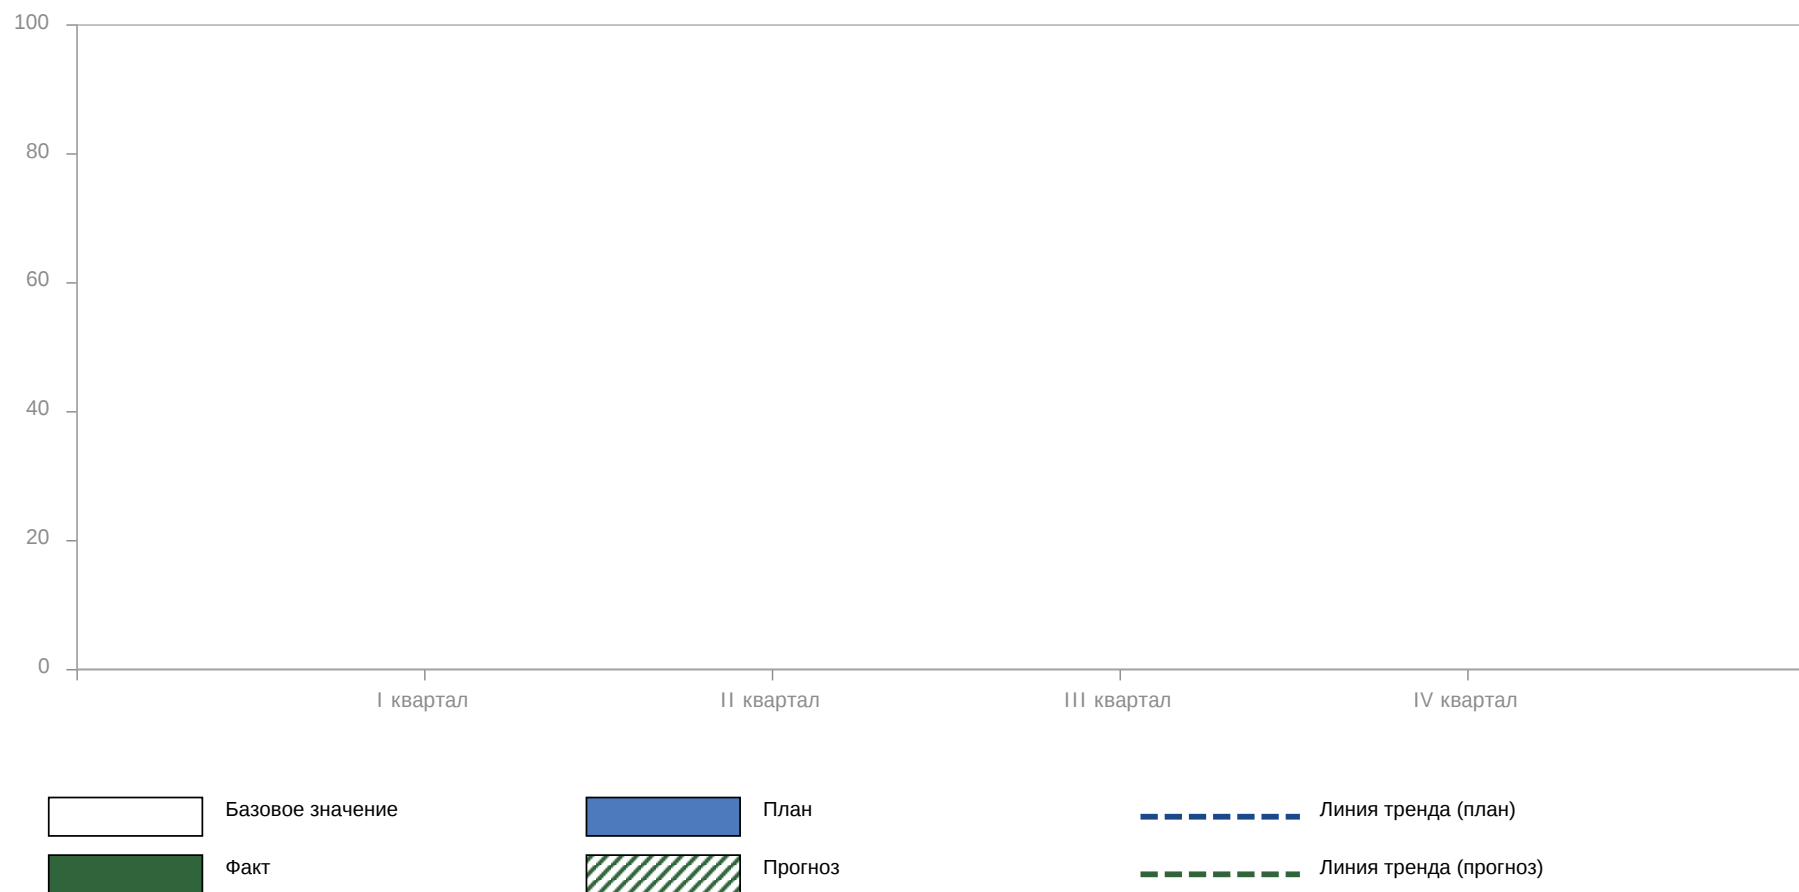


Рис. 10. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее

График достижения показателя

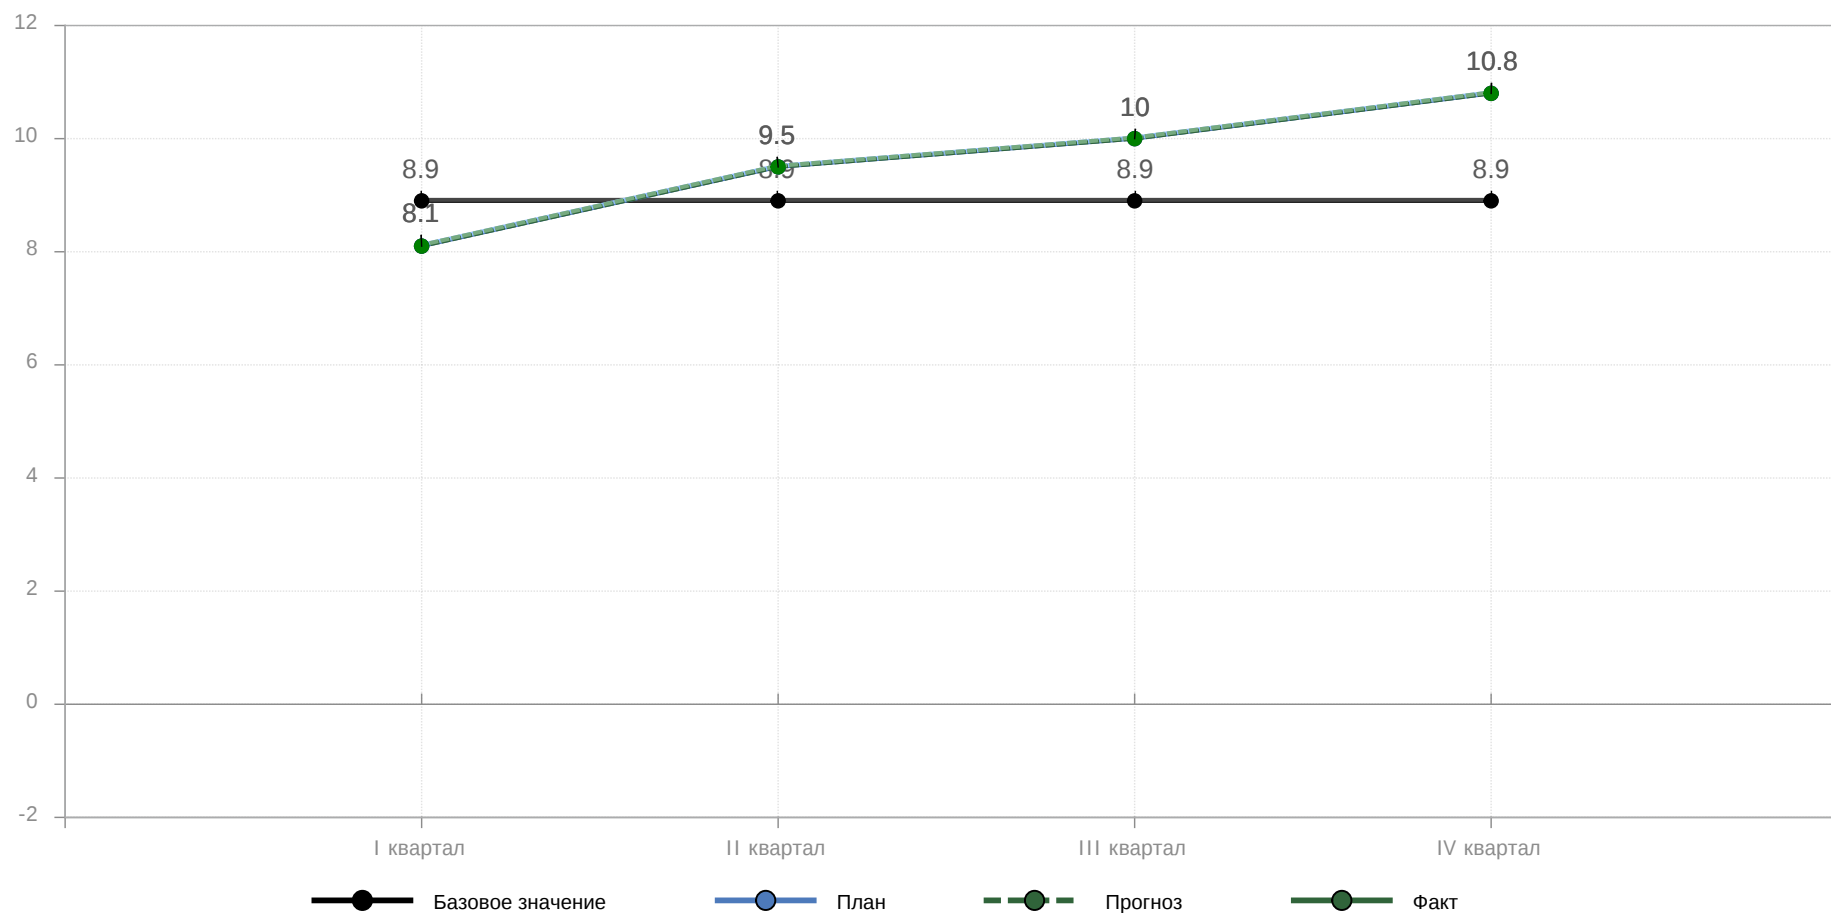


Рис. 11. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре

Диаграмма достижения показателя

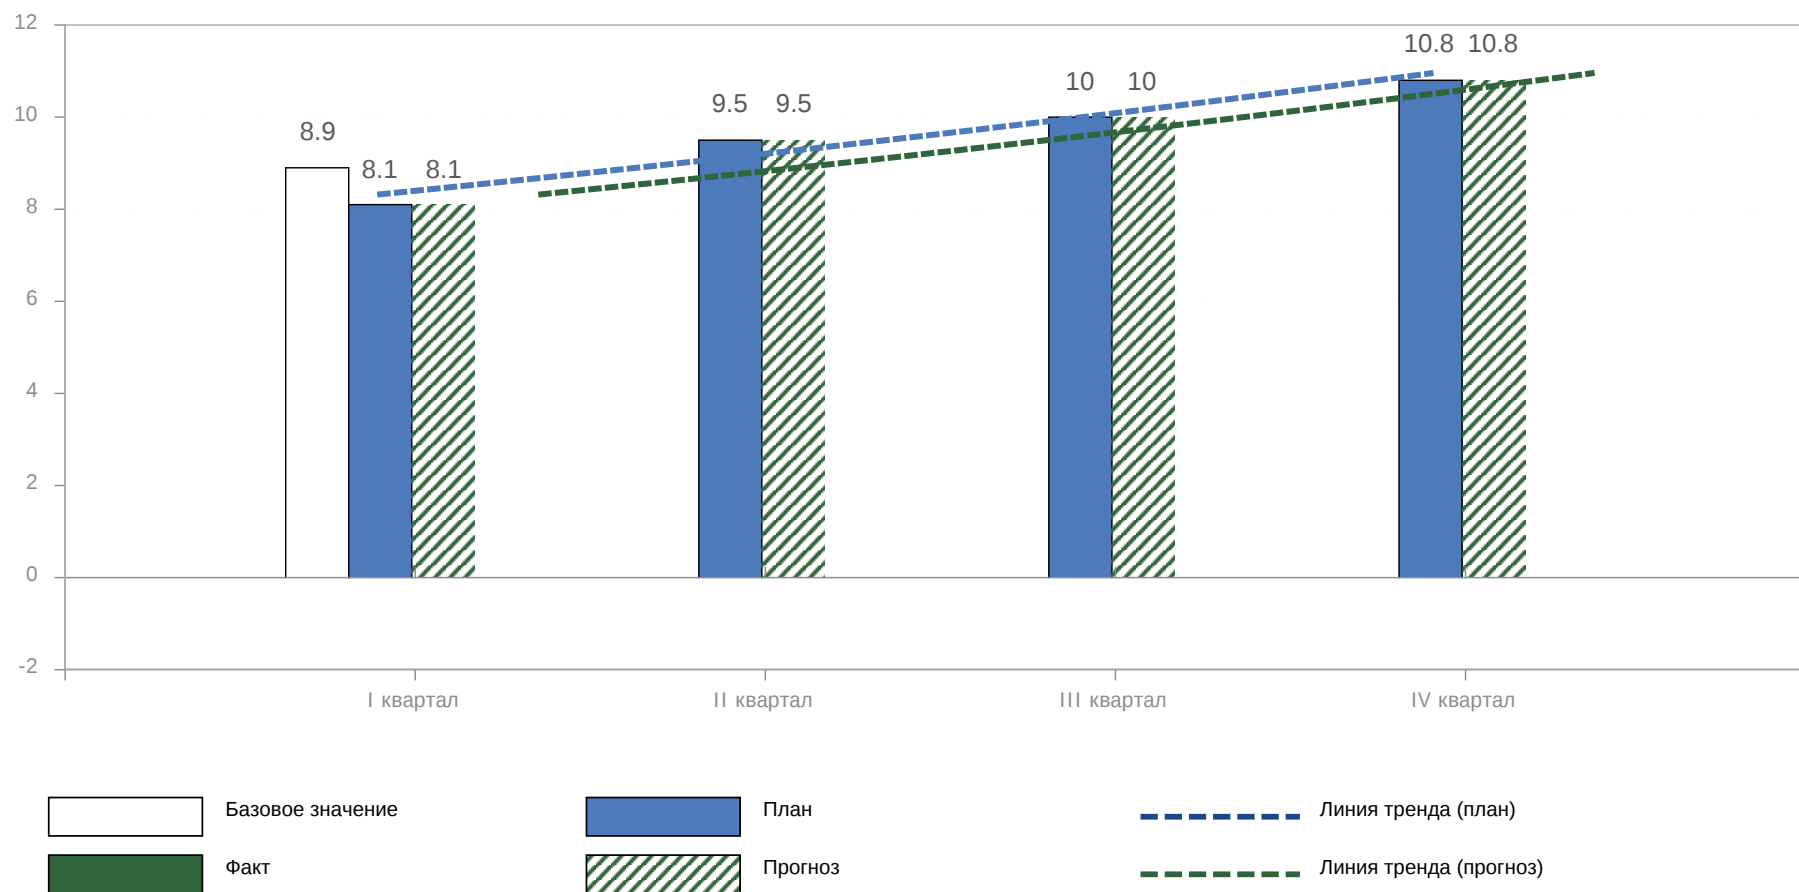


Рис. 12. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре

График достижения показателя

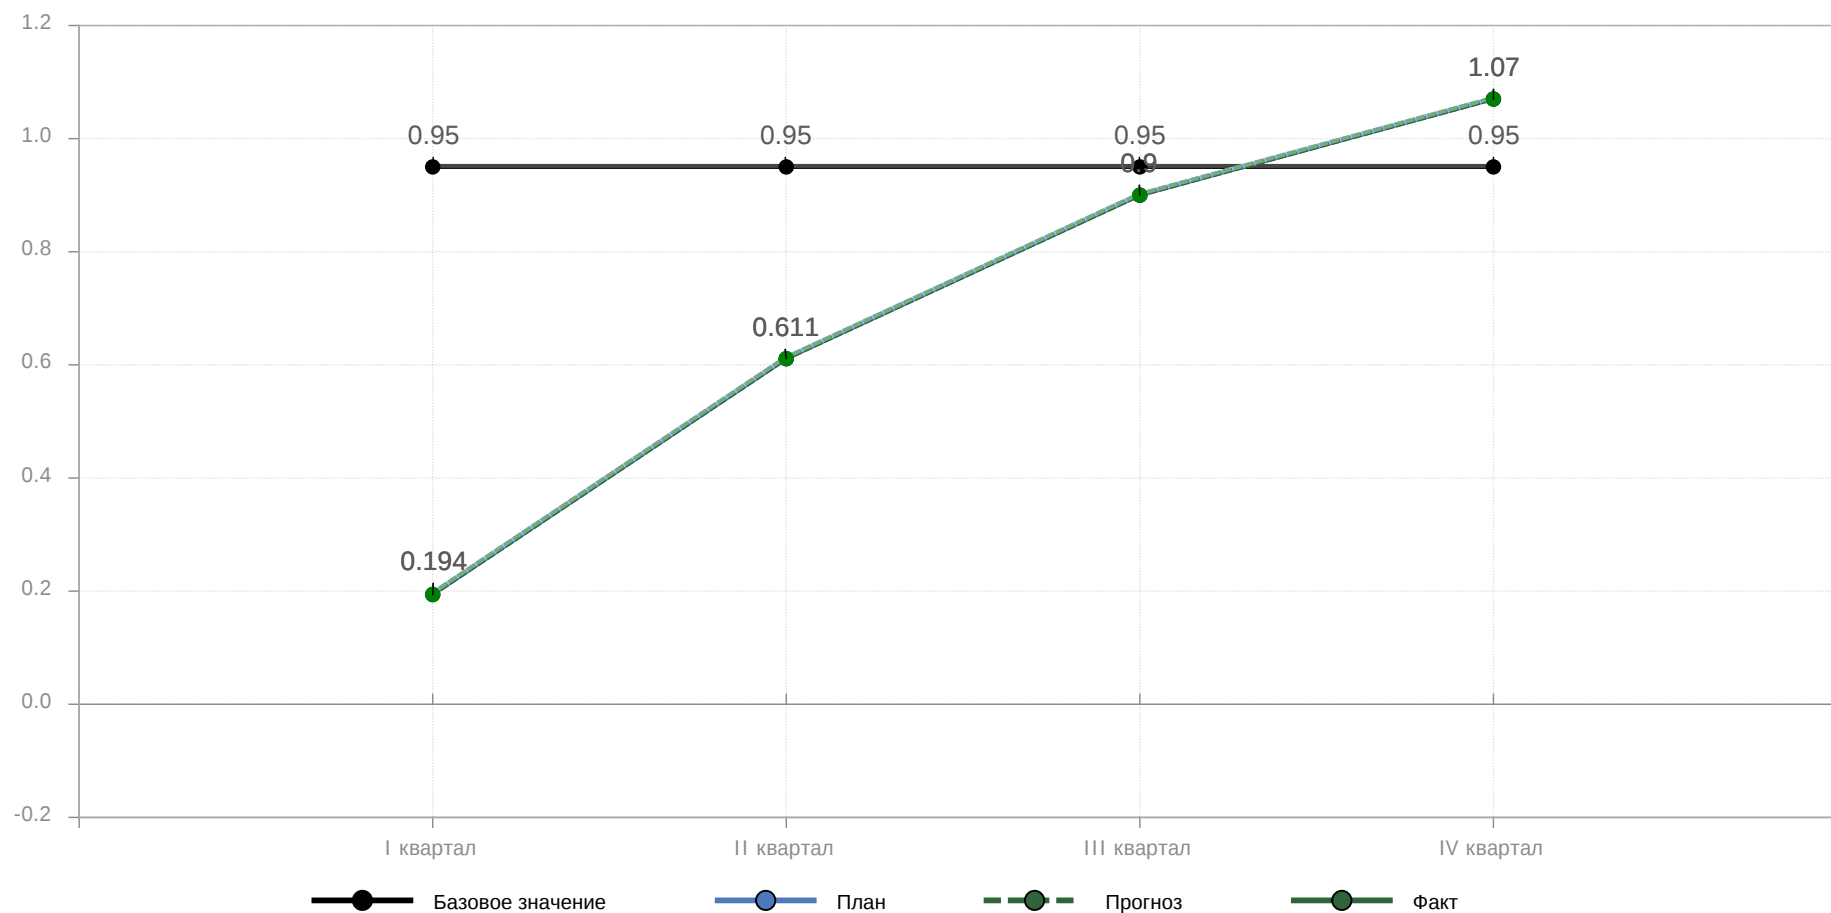


Рис. 13. Число граждан, прошедших профилактические осмотры

Диаграмма достижения показателя

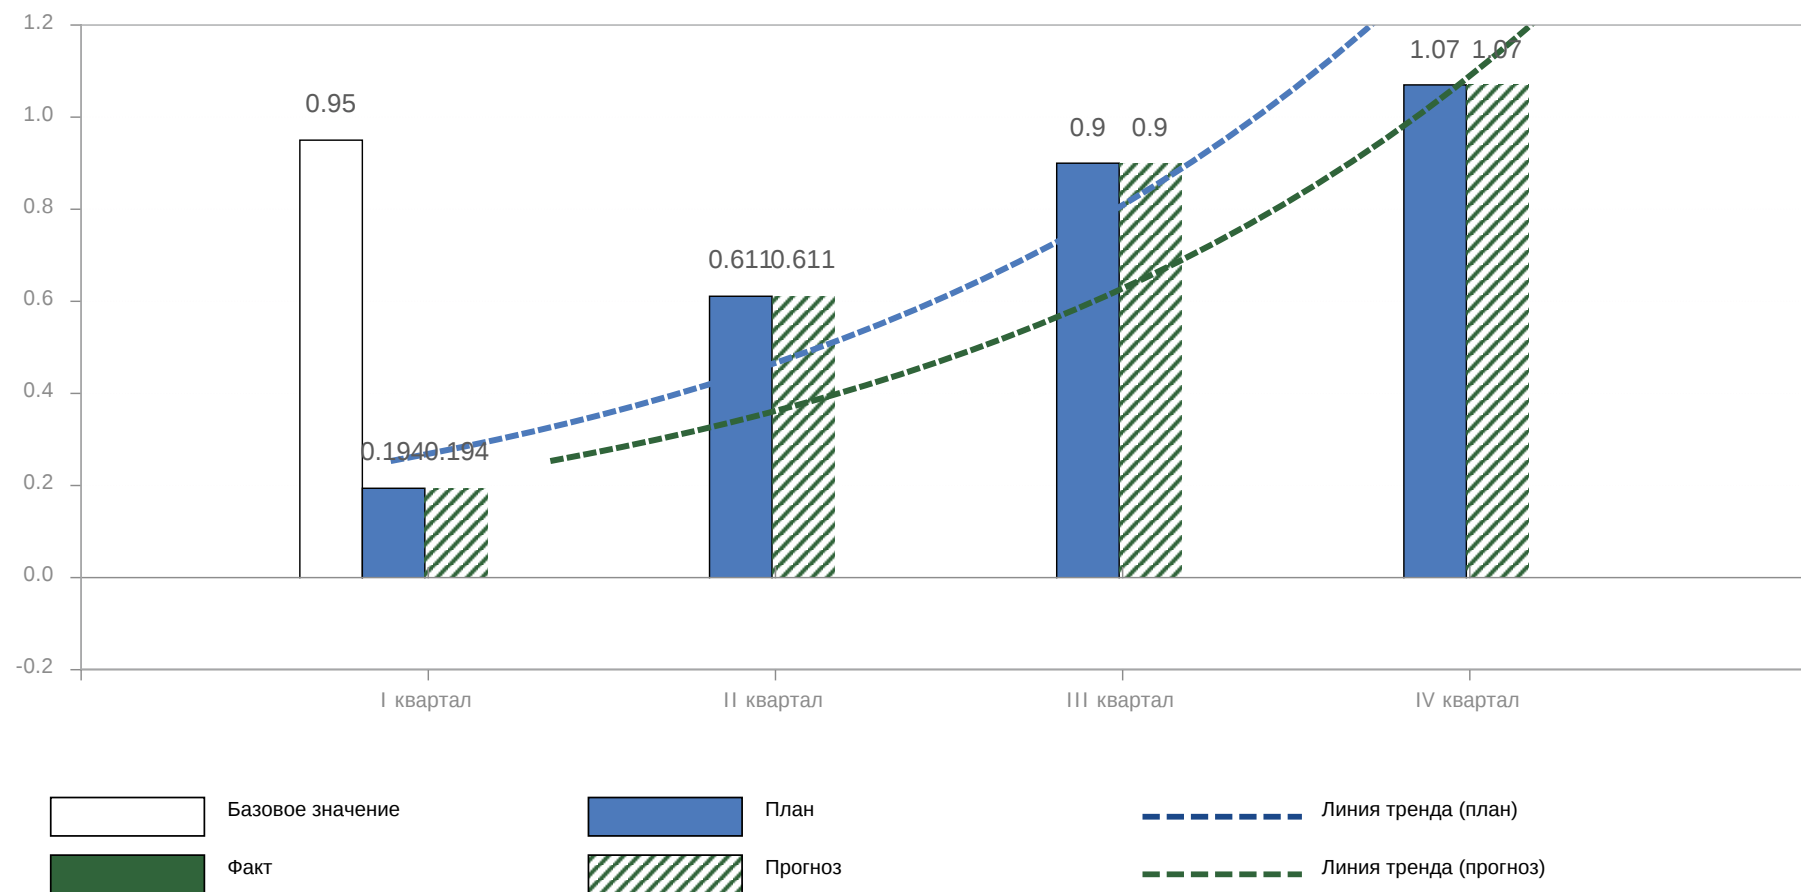


Рис. 14. Число граждан, прошедших профилактические осмотры

График достижения показателя

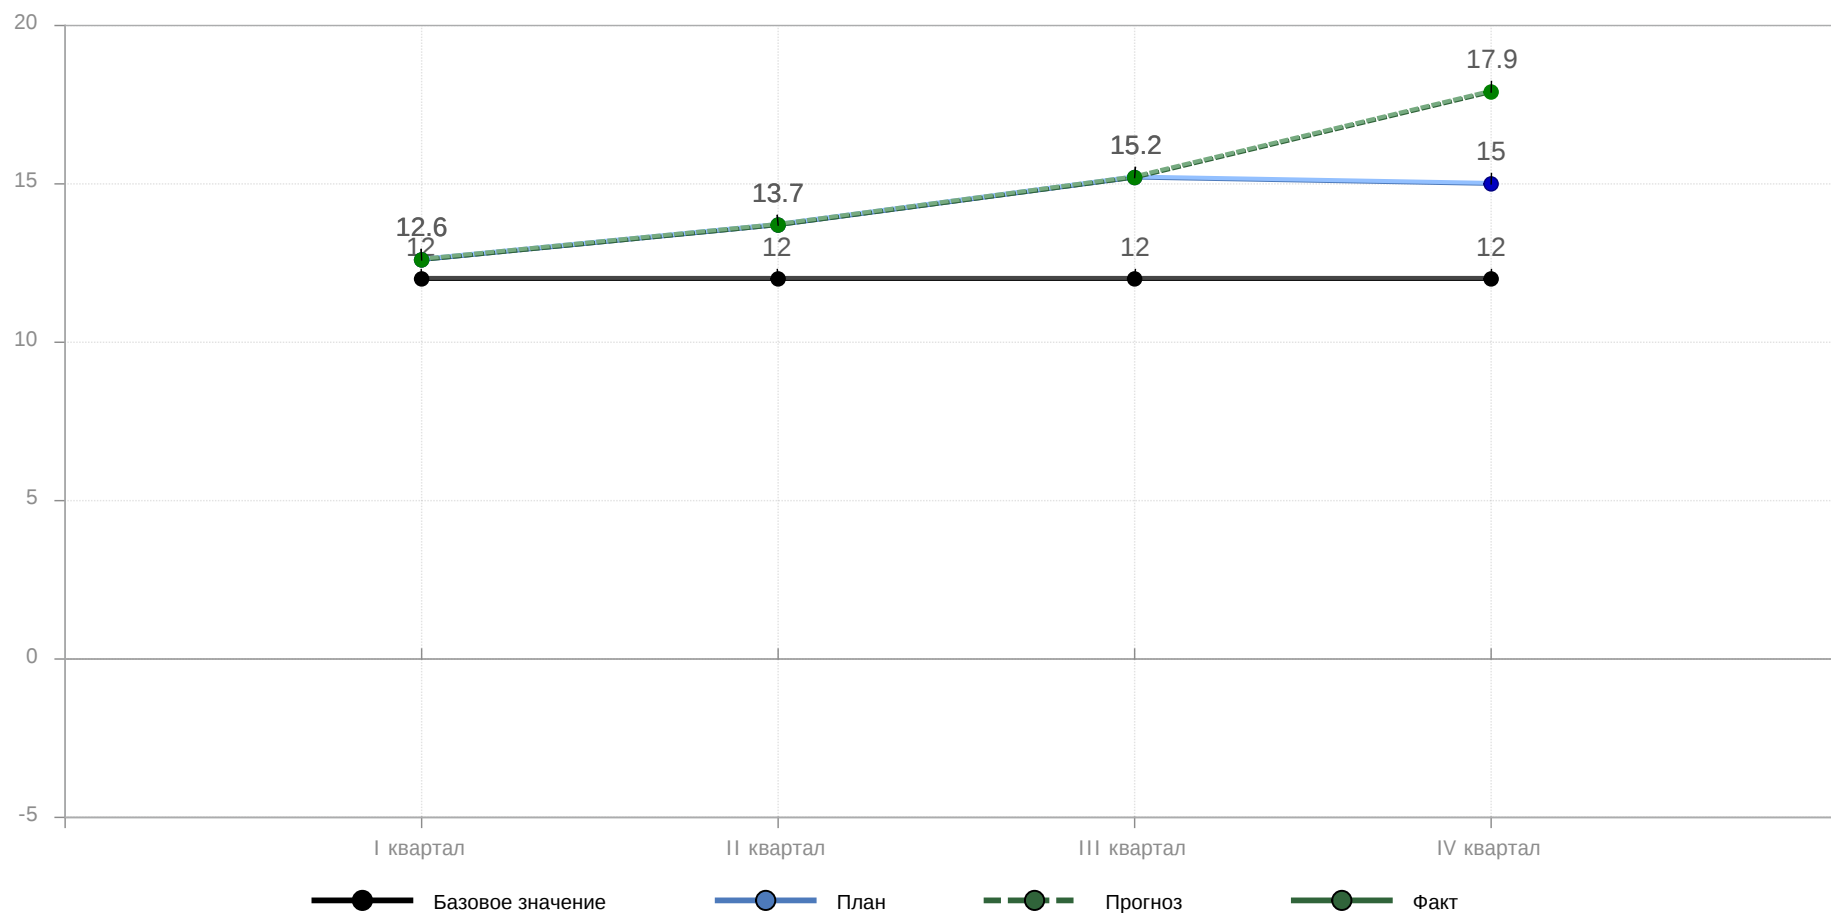


Рис. 15. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

Диаграмма достижения показателя

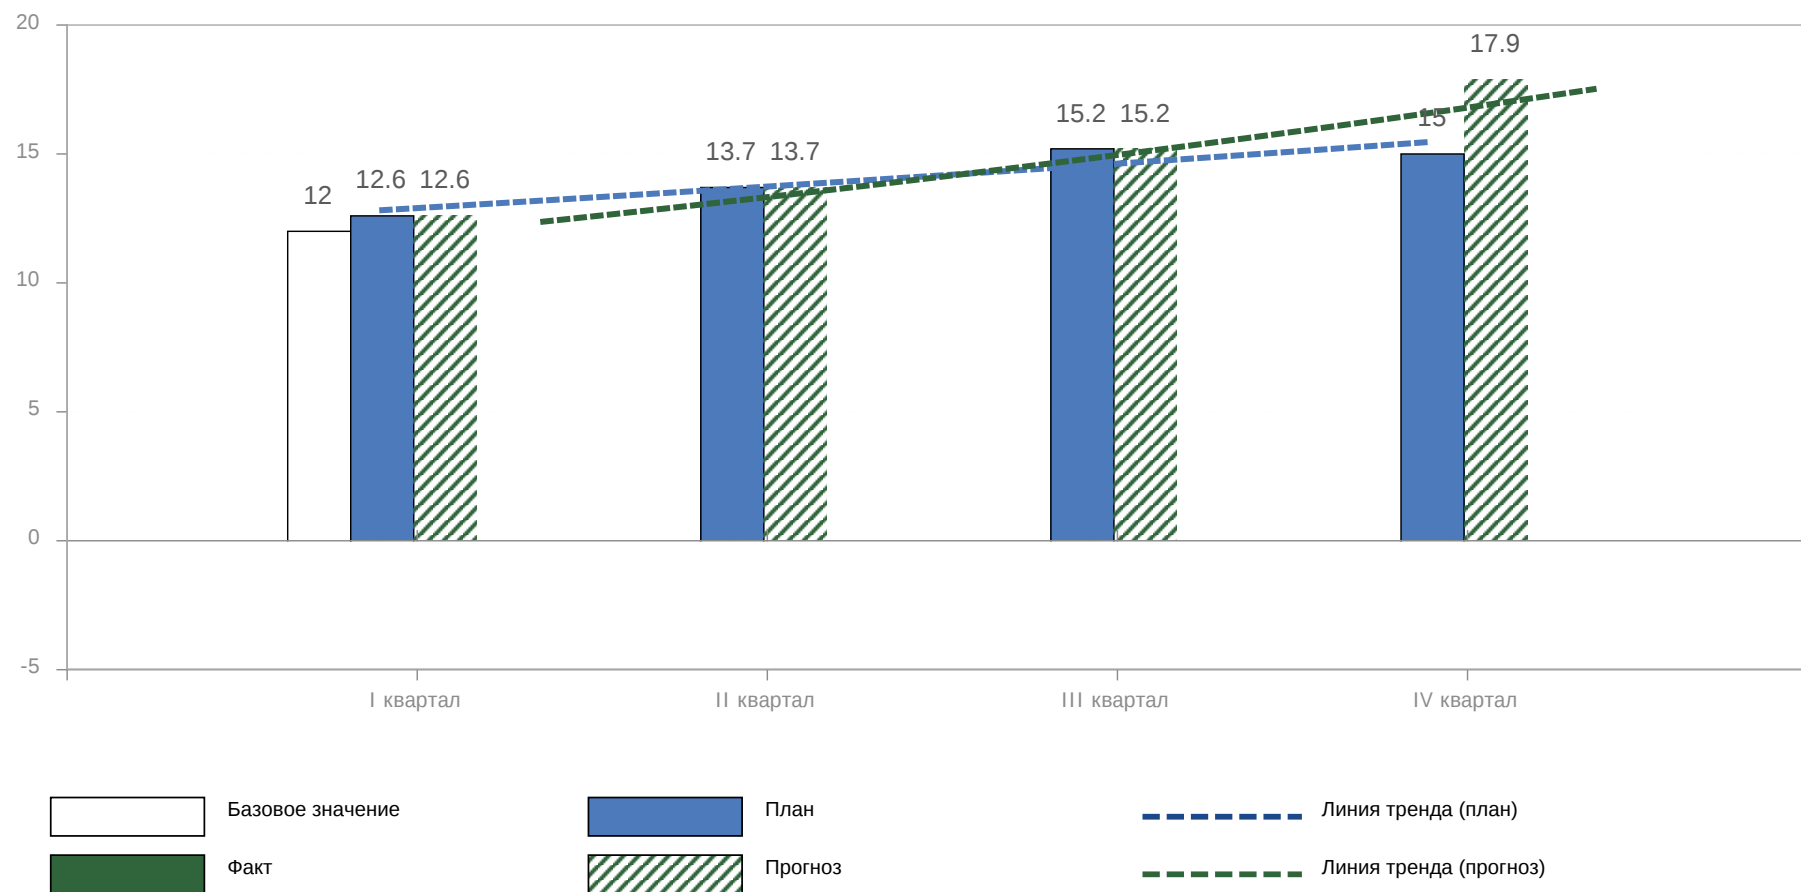


Рис. 16. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

График достижения показателя

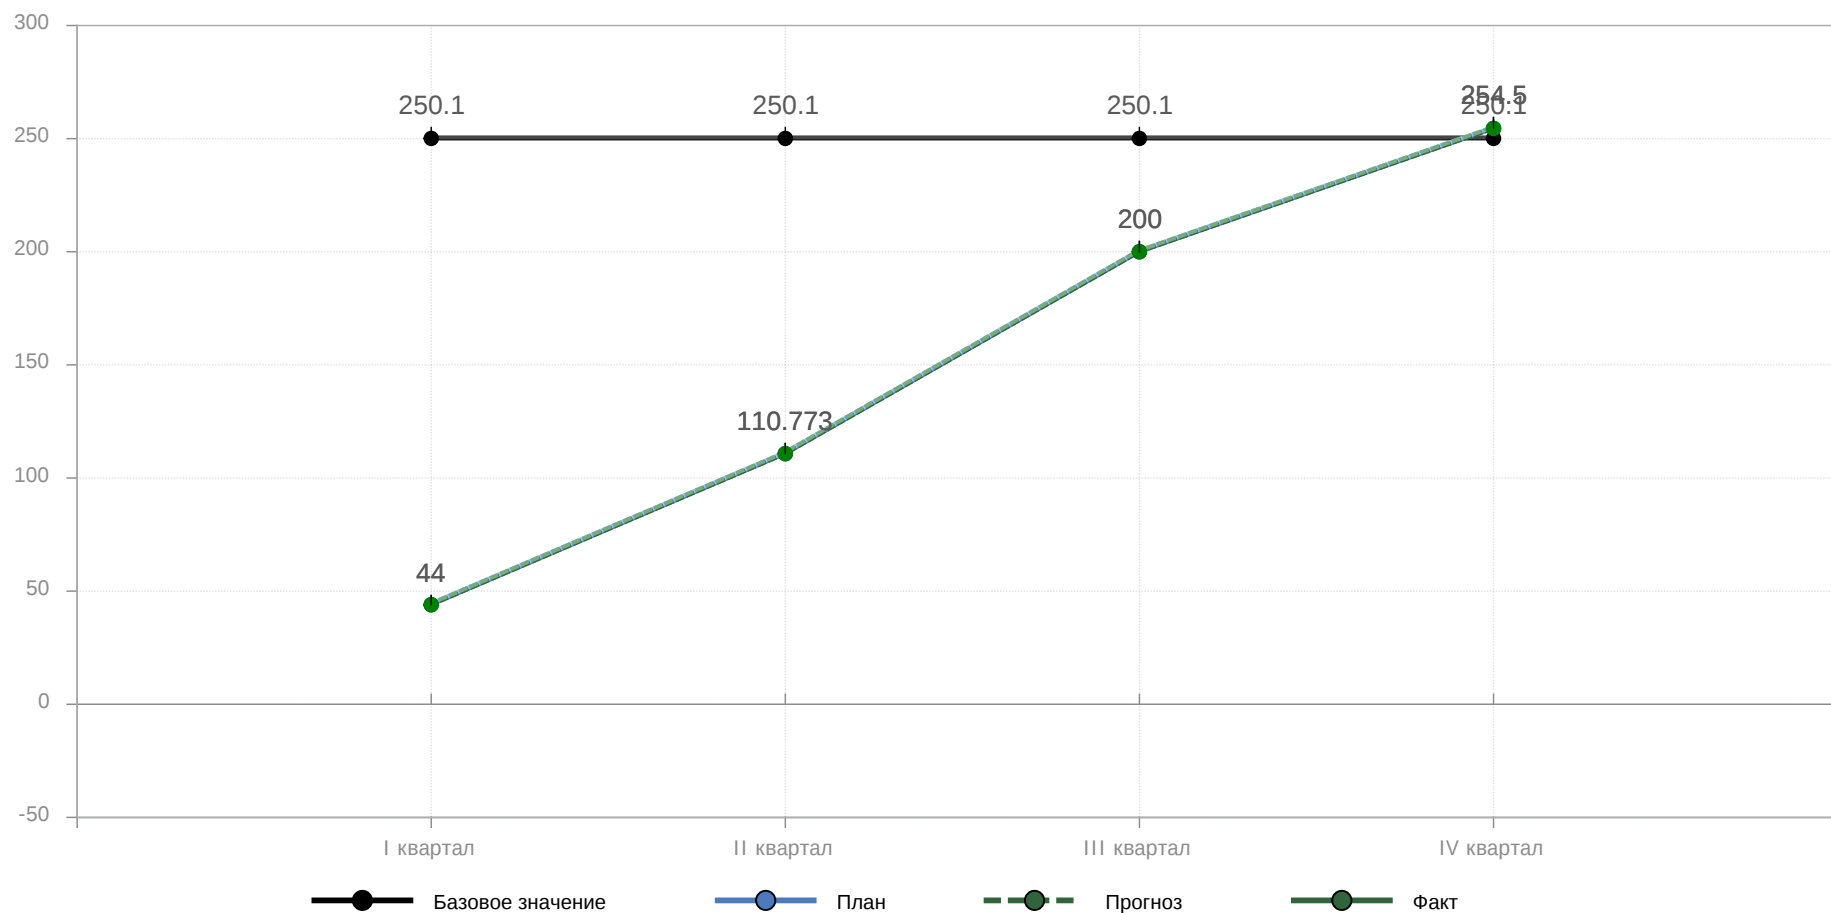


Рис. 17. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

Диаграмма достижения показателя

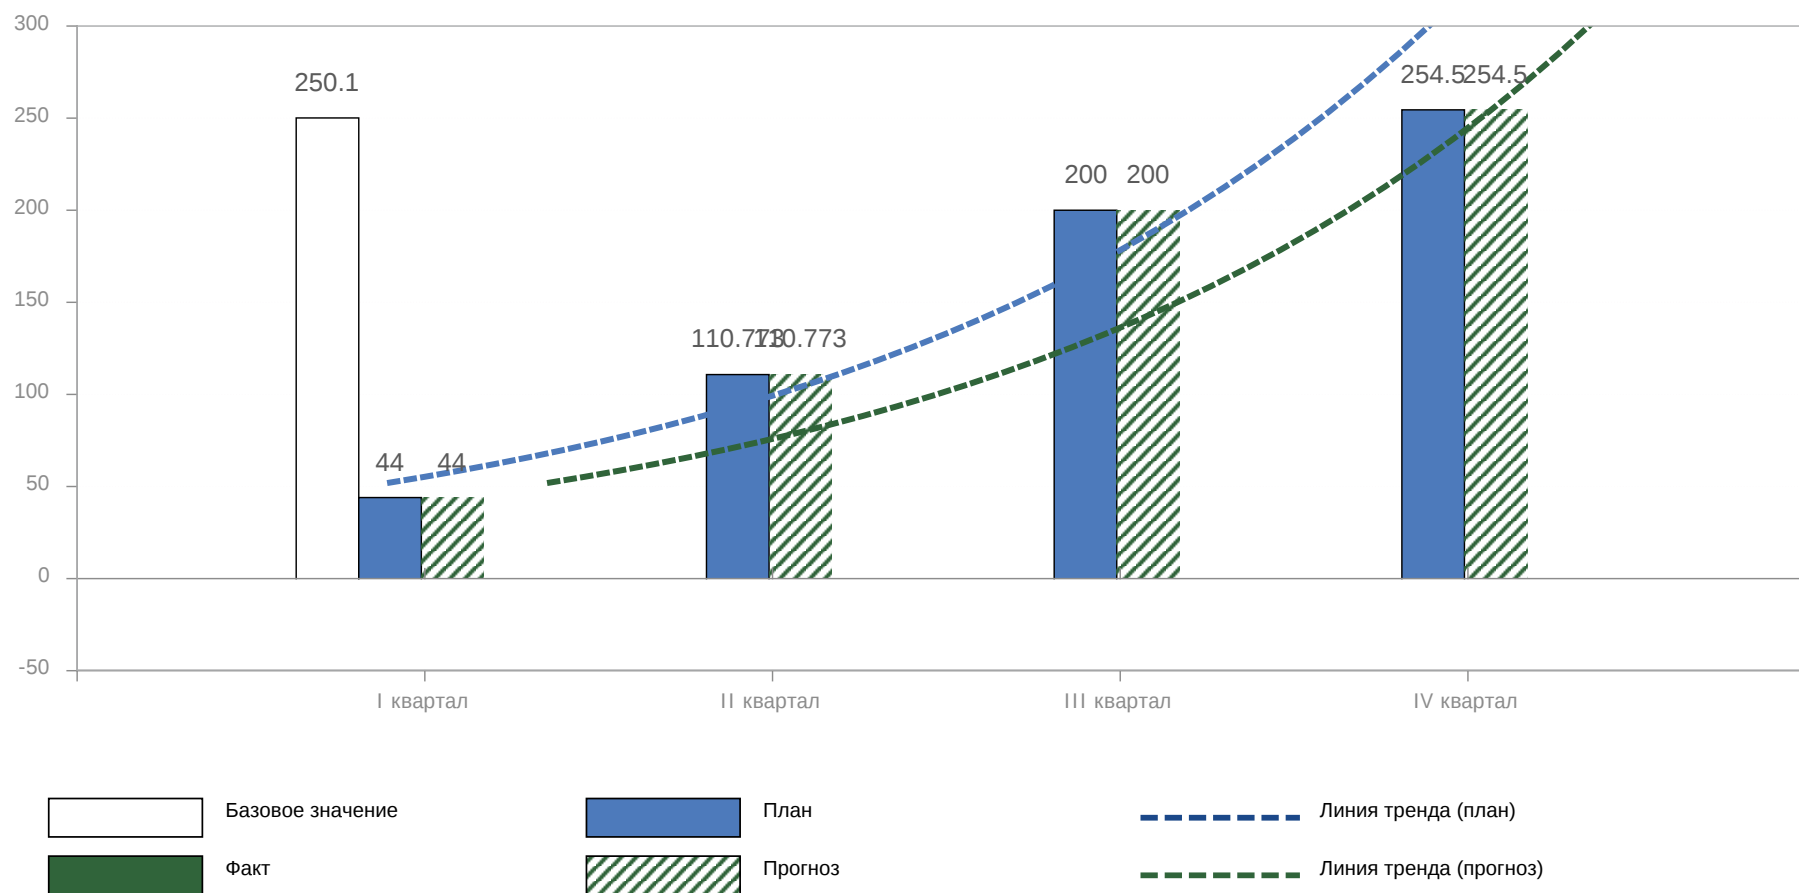


Рис. 18. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
