

Руководитель
регионального проекта —
Малин Михаил Васильевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
43ABC0E26AF3358D05B69165061410E1A5E49451

Владелец: Малин Михаил Васильевич

Действителен: с 29.06.2021 по 29.09.2022

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

" (N1-32) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Наличие критических отклонений</i>	<i>Наличие критических отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Наличие критических отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1		4. Результаты	Результат: Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), процентов, нарастающим итогом, Причина риска: В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Кузбассе в 2020 г. введен режим «Повышенной готовности». Взаимодействие граждан со страховыми представителями было ограничено., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутовые: Не достижение значения результата на 2020 г.	1. После отмены режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области-Кузбасса взаимодействие граждан со страховыми представителями будет возобновлено в полном объеме., срок исполнения 31.12.2021;
2		3. Цели и показатели	Показатель: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), Причина риска: В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Кузбассе введен режим «Повышенной готовности». Взаимодействие граждан со страховыми представителями ограничено., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутовые: Недостижение значения показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)".	1. Показатель не достигнут., срок исполнения 31.12.2021;
3		3. Цели и показатели	Показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, Причина риска: В связи с распространением новой коронавирусной инфекцией в Кемеровской области-Кузбассе введен режим "Повышенной готовности", в 2020 году было дважды приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутовые: Недостижение значения показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры" в 2020 году.	1. Недостижение значения показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры" в 2020 году., срок исполнения 31.12.2021;

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Число граждан, прошедших профилактические осмотры	Миллион человек	1.07	0.2871	0.3243	0.4327	0.778	1.119	69,53%	Подтверждающие документы: 1. "об утверждении формы 30 федерального статистического наблюдения за 2020 год" Приказ Росстата от 30.12.2020г. №863, приложен файл. 2. "о реализации регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"" Соглашение Министерства здравоохранения РФ от 07.12.2020г. №056-2019-N10042-1/1.1, приложен файл. Существует риск: Показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, Причина риска: В связи с распространением новой коронавирусной инфекцией в Кемеровской области-Кузбассе введен режим "Повышенной готовности", в 2020 году было дважды приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров., Вероятность: 100%, Сутевые: Недостижение значения показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры" в 2020 году. Предлагаемые решения: 1. Недостижение значения показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры" в 2020 году., срок исполнения 31.12.2021. Значение показателя в соответствии с доп. соглашением №056-2019-N10042-1/1.1 на 2020 год - 0,784 млн.чел., в связи с этим процент достижения итогового значения показателя за 2020 год составляет 99,24%.
2		Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении	Процент	10.8	16.4	12.08	9.17	13.587	12.6	107,83%	Подтверждающие документы: 1. "об утверждении формы 12 федерального статистического наблюдения за 2020 год" Приказ Росстата от 18.12.2020г. №812, приложен файл. 2. "о достижении целевых

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
		диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре									показателей регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.03.2021г. №2408, приложен файл.Выполнено.
3		Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	Единица	77	83	118	118	123	102	120,59%	Подтверждающие документы:1. "о выполнении результата "В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей ПМСП"" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 14.12.2020г. № 8658, приложен файл.Выполнено.
4		Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации	Процент	36	13	72.7	47.7	58.25	23	253,26%	Подтверждающие документы:1. "о достижении целевых показателей регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.03.2021г. № 2408, приложен файл.Выполнено.
5		Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями	Процент	17.9	1.6	13.2	27	30.8	19	162,11%	Подтверждающие документы:1. "о фактическом достижении целевых показателей." Отчет Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кемеровской области-Кузбасса от 25.01.2021г. №426, приложен файл.Выполнено.
6		Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя,	Процент	52.1	39.6	16.9	16.9	16.9	49.5	34,14%	Подтверждающие документы:1. "о фактическом достижении целевых показателей" Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области-Кузбасса от 25.01.2021г. №426, приложен файл.Существует риск:Показатель: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
		телефон, терминал для связи со страховым представителем)									каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), Причина риска: В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Кузбассе введен режим «Повышенной готовности». Взаимодействие граждан со страховыми представителями ограничено., Вероятность: 100%, Сутевые: Недостижение значения показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)". Предлагаемые решения: 1. Показатель не достигнут., срок исполнения 31.12.2021.
7		Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад	Тысяча посещений	254.5	49.8	52.63	65.798	101.897	254.5	40,04%	Подтверждающие документы: 1. "об утверждении формы 30 федерального статистического наблюдения за 2020 год" Приказ Росстата от 30.12.2020г. №863, приложен файл. 2. "о реализации регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"" Соглашение Министерства здравоохранения РФ от 07.12.2020г. №056-2019-N10042-1/1.1, приложен файл. Существует риск: Показатель: Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, Причина риска: Значение показателя в соответствии с доп. соглашением №056-2019-N10042-1/1.1 на 2020 год - 81,85 тыс., в соответствии с этим процент достижение показателя за 2020 год



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
											составляет 124,5%., Вероятность: 10%, Сутевые: Значение показателя достигнуто. Предлагаемые решения: 1. Значение показателя достигнуто., срок исполнения 31.12.2021.
8		Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	Процент	0	0	0	0	0	0	100,00%	Реализация данного показателя запланирована на 2021 год.
9		Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	Человек	0	0	0	0	0	0	100,00%	Реализация данного показателя запланирована на 2021 год.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены




Прогнозные
сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 522 975,90 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

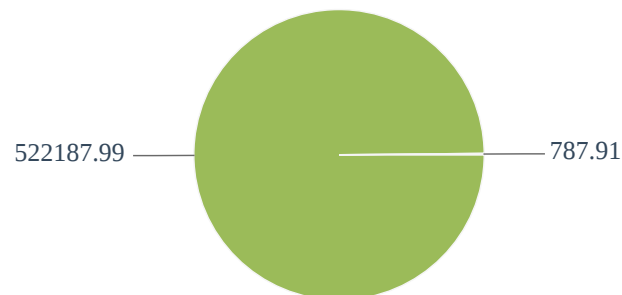

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области	174 000,00	174 000,00	174 000,00	173 213,60	173 213,60	99,55	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	174 000,00	174 000,00	174 000,00	173 213,60	173 213,60	99,55	Произведен возврат денежных средств в региональный бюджет
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	174 000,00	174 000,00	174 000,00	173 213,60	173 213,60	99,55	Произведен возврат денежных средств в региональный бюджет
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(09) Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области в 2020 году	201 436,40	201 436,40	201 436,40	201 436,40	201 436,40	100,00	

 Отсутствие отклонений




 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	201 436,40	201 436,40	201 436,40	201 436,40	201 436,40	100,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	201 436,40	201 436,40	201 436,40	201 436,40	201 436,40	100,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		(14) Созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебные амбулатории	147 539,50	147 539,50	147 539,50	147 537,99	147 537,99	100,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	147 539,50	147 539,50	147 539,50	147 537,99	147 537,99	100,00	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	147 539,50	147 539,50	147 539,50	147 537,99	147 537,99	100,00	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		(21) Выполнено не менее 129 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов Кемеровской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			522 975,90	522 975,90	522 975,90	522 187,99	522 187,99	99,85	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			522 975,90	522 975,90	522 975,90	522 187,99	522 187,99	99,85	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджет субъекта Российской Федерации	522 975,90	522 975,90	522 975,90	522 187,99	522 187,99	99,85	
		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		В схемы территориального планирования Кемеровской области и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	
2		Функционируют 34 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением Значение: 34,0000 Дата: 31.12.2021	
3		Функционируют 29 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году Значение: 29,0000 Дата: 31.12.2021	
4		Построено (реконструировано) не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинской организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному проезду на автомобиле скорой медицинской помощи. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	
5		Функционируют 34 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	
6		Функционируют 34 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н Значение: 34,0000 Дата: 31.12.2021	
7		Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области в 2020 году Значение: 29,0000 Дата: 31.12.2020	
8		Созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебные амбулатории Значение: 34,0000 Дата: 31.12.2020	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
9		Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области Значение: 29,0000 Дата: 31.12.2020	
10		Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), процентов, нарастающим итогом Значение: 44,8000 Дата: 31.12.2019	
11		Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), процентов, нарастающим итогом Значение: 49,0000 Дата: 31.12.2020	
12		Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), процентов, нарастающим итогом Значение: 66,8000 Дата: 31.12.2021	
13		В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 66 процентов медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020	
14		В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 66 процентов медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021	
15		Выполнено не менее 129 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов Кемеровской области Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	
16		Выполнено не менее 129 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов Кемеровской области Значение: 98,0000 Дата: 31.12.2021	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			<i>В схемы территориального планирования Кемеровской области и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020</i>	31.12.2020	20.10.2020	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о включении сведений о медицинских организациях в схемы территориального планирования Кемеровской области и геоинформационную систему Минздрава России" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 20.10.2020г. №7101, приложен файл, указана ссылка. Предоставлена информация : 1 из 1.
2.			<i>Функционируют 34 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением Значение: 34,0000 Дата: 31.12.2021</i>	31.12.2021	31.12.2021	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 34.
3.			<i>Функционируют 29 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году Значение: 29,0000 Дата: 31.12.2021</i>	31.12.2021	31.12.2021	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 29.
4.			<i>Построено (реконструировано) не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинской организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному проезду на автомобиле скорой медицинской помощи.</i>	31.12.2020	03.12.2020	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о создании и функционировании вертолетной площадки" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 03.12.2020г. №8303, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020				Предоставлена информация : 1 из 1.
5.			Функционируют 34 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	31.12.2020	28.12.2020	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о планируемом функционировании созданных/замененных ФАП в 2021 году" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 28.12.2020г. №9202, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0.
6.			Функционируют 34 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н Значение: 34,0000 Дата: 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 34.
6.1.	ПК		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.03.2021	31.03.2021	Абросова Оксана Евгеньевна	В работе. В работе. Отклонения отсутствуют.
6.1.1	РПП		Реконструированные (замененные) в 2020 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории оснащены в соответствии с	31.03.2021	31.03.2021	Абросова Оксана Евгеньевна	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н"				
7.			<i>Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области в 2020 году Значение: 29,0000 Дата: 31.12.2020</i>	31.12.2020	30.12.2020	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о приобретении медицинских комплексов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2020г. №9381, приложен файл. Предоставлена информация : 29 из 29.
7.1.	ПК		Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации	20.12.2020	30.12.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Просрочка 10 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о перечне медицинских организаций, в которые переданы медицинские комплексы" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2020г. №9381, приложен файл.
7.1.1	РРП		Определены медицинские организации для поставки передвижных медицинских комплексов, проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку. Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации	20.12.2020	30.12.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Просрочка 10 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о передаче передвижных медицинских комплексов в медицинские организации" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2020г. №9377, приложен файл.
7.2.	ПК		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	15.02.2020	15.02.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении межбюджетного трансферта"

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений




 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			трансфертов*				Соглашение ДФЗН КО от 20.12.2019г. №056-17-2020-049, приложен файл.
7.2.1	РРП		Заключение соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов	15.02.2020	15.02.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении межбюджетного трансферта" Соглашение ДФЗН КО от 20.12.2019г. №056-17-2020-049, приложен файл.
7.3.	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	20.07.2020	03.07.2020	Уфимцев Олег Борисович	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об использовании межбюджетных трансфертов на приобретение мобильных медицинских комплексов" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 03.07.2020г. №БН, приложен файл.
7.3.1	РРП		Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	20.07.2020	03.07.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об использовании межбюджетного трансфертов на приобретение мобильных медицинских комплексов" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 03.07.2020г. №БН, приложен файл.
7.4.	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	20.10.2020	20.10.2020	Уфимцев Олег Борисович	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 20.10.2020г. №7112, приложен файл.
7.4.1	РРП		Отчет об использовании	20.10.2020	20.10.2020	Абросова Оксана	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			межбюджетных трансфертов			Евгеньевна	Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 20.10.2020г. №7112, приложен файл.
7.5.	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	20.12.2020	29.12.2020	Уфимцев Олег Борисович	Выполнено. Просрочка 9 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.12.2020г. №9270, приложен файл.
7.5.1	РРП		Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	20.12.2020	29.12.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Просрочка 9 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.12.2020г. №9270, приложен файл.
8.			<i>Созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебные амбулатории Значение: 34,0000 Дата: 31.12.2020</i>	31.12.2020	30.12.2020	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о создании 34 фельдшерско-акушерских пунктов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 05.11.2020г. №7490, приложен файл. Отчет о реализации результата предоставлен 05.11.2020, кассовое исполнение на 01.01.2021 Предоставлена информация : 34 из 34.
8.1.	ПК		Строительно-монтажные работы завершены	30.09.2020	29.09.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении строительно-монтажных работ"

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Письмо Министерство здравоохранения Кузбасса от 29.09.2020г. №06528, приложен файл. 2. "Приложение к отчету о выполнении строитель-монтажных работ." Иное Министерство Здравоохранения Кузбасса от 29.09.2020г. №06528, приложен файл.
8.1.1	РРП		Строительно-монтажные работы завершены	30.09.2020	29.09.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приложение к отчету о выполнении строительно-монтажных работ" Иное Министерство Здравоохранения Кузбасса от 29.09.2020г. №06528, приложен файл. 2. "Отчет о выполнении строительно-монтажных работ" Письмо Министерство здравоохранения Кузбасса от 29.09.2020г. №06528, приложен файл.
8.2.	ПК		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	15.11.2020	05.11.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о введении в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 05.11.2020г. №7490, приложен файл.
8.2.1	РРП		Подписание акта ввода в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов	15.11.2020	05.11.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о введении в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 05.11.2020г. №7490, приложен файл.
8.3.	ПК		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	15.02.2020	15.02.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*				Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении межбюджетного трансферта" Соглашение ДОЗН КО от 20.12.2019г. №056-17-2020-286, приложен файл.
8.3.1	РРП		Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о создании/замене фельдшерско-акушерских пунктов	15.02.2020	15.02.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении межбюджетного трансферта" Соглашение ДОЗН КО от 20.12.2019г. №056-17-2020-286, приложен файл.
8.4.	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	20.07.2020	03.07.2020	Уфимцев Олег Борисович	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об использовании межбюджетных трансфертов на создание/замену фельдшерско-акушерских пунктов" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 03.07.2020г. №б/н, приложен файл.
8.4.1	РРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	20.07.2020	03.07.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об использовании межбюджетных трансфертов на создание/замену фельдшерско-акушерских пунктов" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 03.07.2020г. №б/н, приложен файл.
8.5.	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	20.10.2020	20.10.2020	Уфимцев Олег Борисович	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 20.10.2020г. №7103, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8.5.1	РРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	20.10.2020	20.10.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 20.10.2020г. №7103, приложен файл.
8.6.	ПК		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2020	30.12.2020	Уфимцев Олег Борисович	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2020г. №9370, приложен файл.
8.6.1	РРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2020	30.12.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2020г. №9370, приложен файл.
8.7.	ПК		Субъектам Российской Федерации доведены иные межбюджетные трансферты на замену фельдшерско- акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	15.03.2020	15.03.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении межбюджетного трансферта" Соглашение ДОЗН КО от 20.12.2019г. №056-17-2020- 286, приложен файл.
8.7.1	РРП		Получение межбюджетных трансфертов бюджета Кемеровской области для создания/замены фельдшерско-акушерских пунктов	15.03.2020	15.03.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении межбюджетного трансферта" Соглашение ДОЗН КО от 20.12.2019г. №056-17-2020- 286, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
9.			Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области Значение: 29,0000 Дата: 31.12.2020	31.12.2020	30.12.2020	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о передаче мобильных медицинских комплексов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2020г. №9377, приложен файл. Предоставлена информация : 29 из 29.
9.1.	ПК		Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта	20.07.2020	28.07.2020	Уфимцев Олег Борисович	Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие документы: 1. "Об объеме финансового обеспечения на приобретение мобильных медицинских комплексов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 28.07.2020г. №4798, приложен файл.
9.1.1	РРП		Отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта	20.07.2020	28.07.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие документы: 1. "Об объеме финансового обеспечения на приобретение мобильных медицинских комплексов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 28.07.2020г. №4798, приложен файл.
9.2.	ПК		Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта	20.10.2020	20.10.2020	Уфимцев Олег Борисович	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании финансового обеспечения" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 20.10.2020г. №Отчет об использовании финансового обеспечения, приложен файл.
9.2.1	РРП		Отчет об использовании финансового	20.10.2020	20.10.2020	Абросова Оксана	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта			Евгеньевна	Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании финансового обеспечения" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 20.10.2020г. №7102, приложен файл.
9.3.	ПК		Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта	31.12.2020	30.12.2020	Уфимцев Олег Борисович	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании финансового обеспечения" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2020г. №9366, приложен файл.
9.3.1	РПП		Отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта	31.12.2020	30.12.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании финансового обеспечения" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2020г. №9366, приложен файл.
10.			<i>Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), процентов, нарастающим итогом Значение: 44,8000 Дата: 31.12.2019</i>	31.12.2019	31.12.2019	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении показателей" Отчет ТФОМС от 25.11.2019г. №5940, приложен файл. Предоставлена информация : 44.8 из 44.8.
10.1.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	10.12.2019	25.11.2019	Друшляк Ирина Александровна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации по региональным проектам" Отчет МЗ РФ от 25.11.2019г. №5940,

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							приложен файл. Выполнено.
10.1.1	РРП		Представление отчета об обеспечении 44,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	10.12.2019	25.11.2019	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации по региональным проектам" Отчет ТФОМС Кемеровской области от 25.11.2019г. №5940, приложен файл.
10.2.	ПК		Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 15 процентов	15.12.2019	25.11.2019	Друшляк Ирина Александровна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации по региональным проектам" Отчет М/З РФ от 25.11.2019г. №5940, приложен файл.
10.2.1	РРП		Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке	15.12.2019	25.11.2019	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации по региональным проектам" Отчет МЗ РФ от 25.11.2019г. №5940, приложен файл.
11.			Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), процентов, нарастающим итогом Значение: 49,0000 Дата:	31.12.2020	25.01.2021	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Значение результатов и показателей за январь-декабрь 2020 г." Отчет ТФМОС Кемеровской области-Кузбасса от 25.01.2021г. №426, приложен файл. Существует риск: Результат: Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			31.12.2020				медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), процентов, нарастающим итогом, Причина риска: В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Кузбассе в 2020 г. введен режим «Повышенной готовности». Взаимодействие граждан со страховыми представителями было ограничено., Вероятность: 100%, Сутевые: Не достижение значения результата на 2020 г. Предлагаемые решения: 1. После отмены режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области-Кузбасса взаимодействие граждан со страховыми представителями будет возобновлено в полном объеме., срок исполнения 31.12.2021. Просрочка 24 дня. Предоставлена информация : 43.9 из 49.
11.1.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	10.12.2020	10.12.2020	Друшляк Ирина Александровна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет ТФОМС об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями" Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 10.12.2020г. №6047, приложен файл.
11.1.1	РПП		Представление отчета об обеспечении 49% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	10.12.2020	10.12.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет ТФОМС об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями" Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 10.12.2020г. №6047, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
11.2.	ПК		Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 19 процентов	15.12.2020	16.12.2020	Друшляк Ирина Александровна	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о доле обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке" Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 16.12.2020г. №6156, приложен файл.
11.2.1	РРП		Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке	15.03.2020	15.03.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о достижении целевых показателей" Отчет ТФОМС от 15.03.2020г. №2143, приложен файл.
11.3.	ПК		Представлен отчет о наличии 49,5 процентов медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	10.12.2020	10.12.2020	Друшляк Ирина Александровна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о медицинских организациях, участвующих в реализации программы ОМС, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями" Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 10.12.2020г. №6047, приложен файл.
11.3.1	РРП		В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	10.12.2020	10.12.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о медицинских организациях, участвующих в реализации программы ОМС, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями" Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 10.12.2020г. №6047, приложен файл.
11.4.	ПК		Обеспечен охват граждан	15.12.2020	18.12.2020	Друшляк Ирина	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			профилактическими медицинскими осмотрами не менее 43,4 процентов			Александровна	Просрочка 3 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об охвате граждан профилактическими медицинскими осмотрами" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 18.12.2020г. №8892, приложен файл.
11.4.1	РРП		Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами	15.12.2020	18.12.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об охвате граждан профилактическими медицинскими осмотрами" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 18.12.2020г. №8892, приложен файл.
12.			<i>Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), процентов, нарастающим итогом Значение: 66,8000 Дата: 31.12.2021</i>	31.12.2021	31.12.2021	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 66.8.
12.1.	ПК		Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 23,5 процентов	15.12.2021	15.12.2021	Друшляк Ирина Александровна	В работе. В работе. Отклонения отсутствуют.
12.1.1	РРП		Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими	15.03.2021	15.03.2021	Абросова Оксана Евгеньевна	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений




 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения




№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			организациями в досудебном порядке				
13.			<i>В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 66 процентов медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020</i>	31.12.2020	18.12.2020	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о создании и тиражировании Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 18.12.2020г. №8860, приложен файл. Предоставлена информация : 51.89 из 40.
13.1.	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.02.2020	01.02.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о включении МО в процесс создания и тиражирования "Новой модели медицинской организации, оказывающей ПМСП"" Отчет ДОЗН КО от 03.12.2019г. №7923, приложен файл.
13.1.1	РРП		Утвержден планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2020 год и представлены в ЦПМСП	01.02.2020	01.02.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о включении МО в процесс создания и тиражирования "Новой модели медицинской организации, оказывающей ПМСП"" Отчет ДОЗН КО от 03.12.2019г. №7923, приложен файл.
13.2.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2020	18.12.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о создании и тиражировании Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" Отчет Министерства Здравоохранения Кузбасса от 18.12.2020г. №8860, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							
13.2.1	РРП		Обеспечение создания «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в 102 медицинских организациях, оказывающих данный вид помощи, и методической поддержки мероприятий по ее внедрению	10.12.2020	14.12.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Просрочка 4 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о тиражировании Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" Отчет Министерства Здравоохранения Кузбасса от 14.12.2020г. №8656, приложен файл.
13.3.	ПК		В ЦПМСП представлен отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	20.12.2020	14.12.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании Новой модели медицинской организации, оказывающей медико-санитарную помощь" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 14.12.2020г. №8657, приложен файл.
13.3.1	РРП		Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	20.12.2020	14.12.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о тиражировании Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 14.12.2020г. №8656, приложен файл.
14.			В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 66 процентов медицинских	31.12.2021	31.12.2021	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 51.89 из 50.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>организаций, оказывающих данный вид помощи Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021</i>				
14.1.	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.02.2021	25.12.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " об утверждении перечня МО, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели МО, оказывающей ПМСП" на 2021 год." Приказ Министерства здравоохранения Кузбасса от 25.12.2020г. №3413, приложен файл. Отклонения отсутствуют.
14.1.1	РРП		Утвержден планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2021 год и представлены в ЦПМСП	01.02.2021	25.12.2020	Абросова Оксана Евгеньевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " об утверждении перечня МО, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели МО, оказывающей ПМСП" на 2021 год." Приказ Министерства здравоохранения Кузбасса от 25.12.2020г. №3413, приложен файл.
15.			<i>Выполнено не менее 129 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов Кемеровской области Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Кемеровская область)»" Соглашение Министерство здравоохранения Российской Федерации от 07.12.2020г. №056-2019-N10042-1/2, приложен файл. В соответствии с оглашением № 056-2019-N10042-1/2 от 07.12.2020 исполнение данного результата запланировано на 2021 год. Предоставлена информация : 0 из 0.
							

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
16.			Выполнено не менее 129 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов Кемеровской области Значение: 98,0000 Дата: 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Малин Михаил Васильевич	Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 98.
16.1.	ПК		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	15.02.2021	15.02.2021	Абросова Оксана Евгеньевна	В работе. В работе. Отклонения отсутствуют.
16.1.1	РПП		Заключены соглашения с о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год	15.02.2021	15.02.2021	Абросова Оксана Евгеньевна	В работе.
16.2.	ПК		Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам субъектов Российской Федерации	15.03.2021	15.03.2021	Абросова Оксана Евгеньевна	В работе. В работе. Отклонения отсутствуют.
16.2.1	РПП		Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены Кемеровской области	15.03.2021	15.03.2021	Абросова Оксана Евгеньевна	В работе.
16.3.	ПК		Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	01.07.2021	01.07.2021	Абросова Оксана Евгеньевна	В работе. В работе. Отклонения отсутствуют.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
16.3.1	РРП		Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	15.03.2021	15.03.2021	Абросова Оксана Евгеньевна	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек

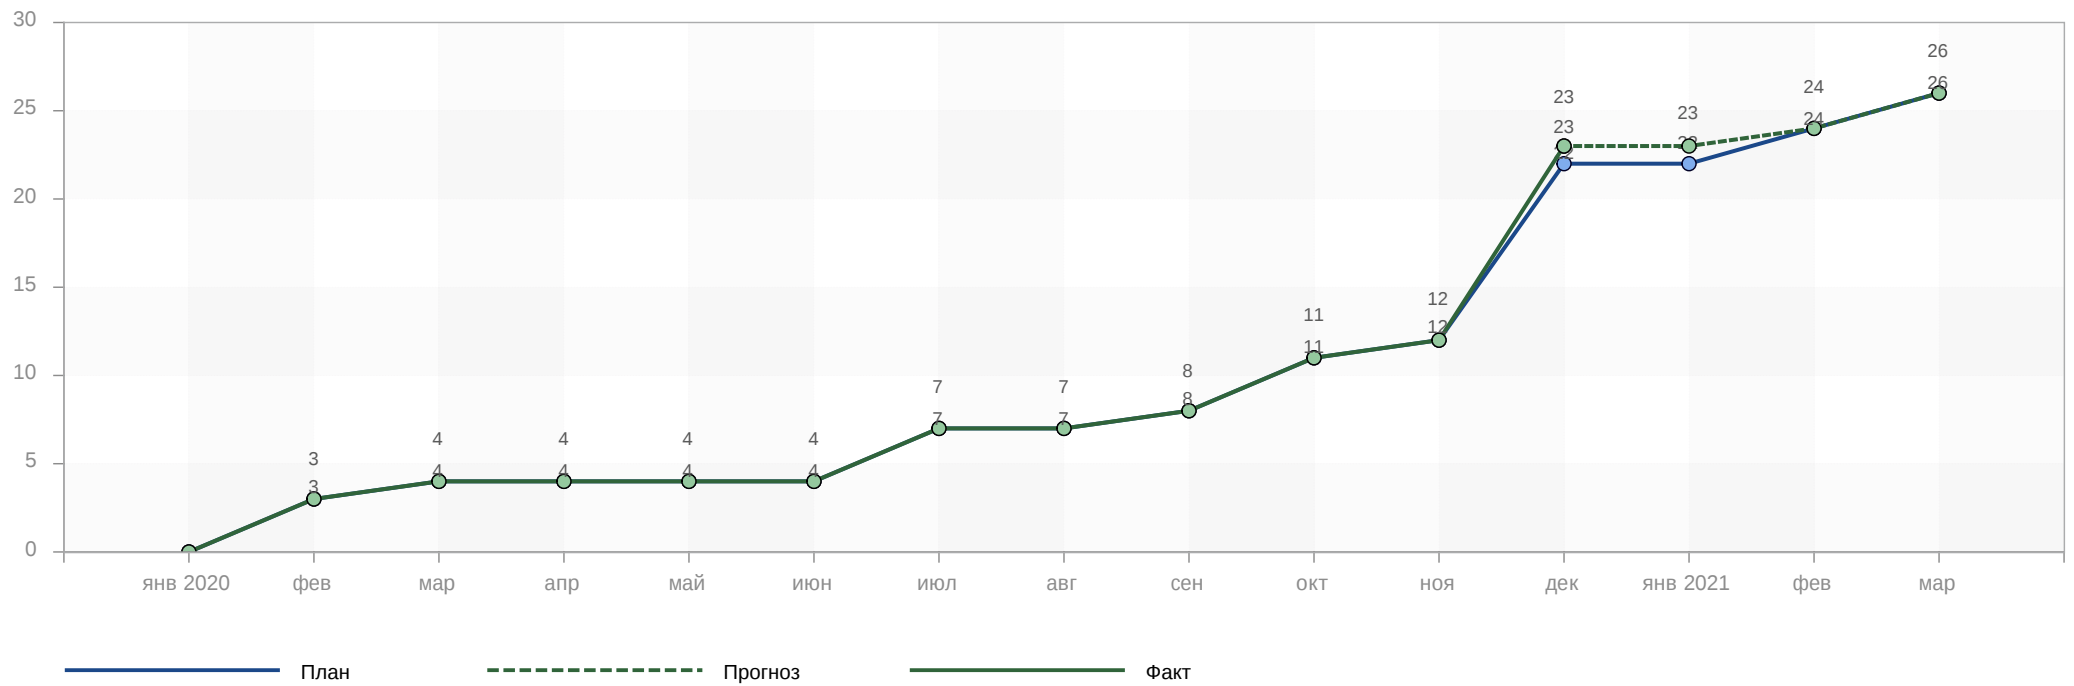


Рис. 1. " (N1-32) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Кемеровская область)"

График достижения показателя

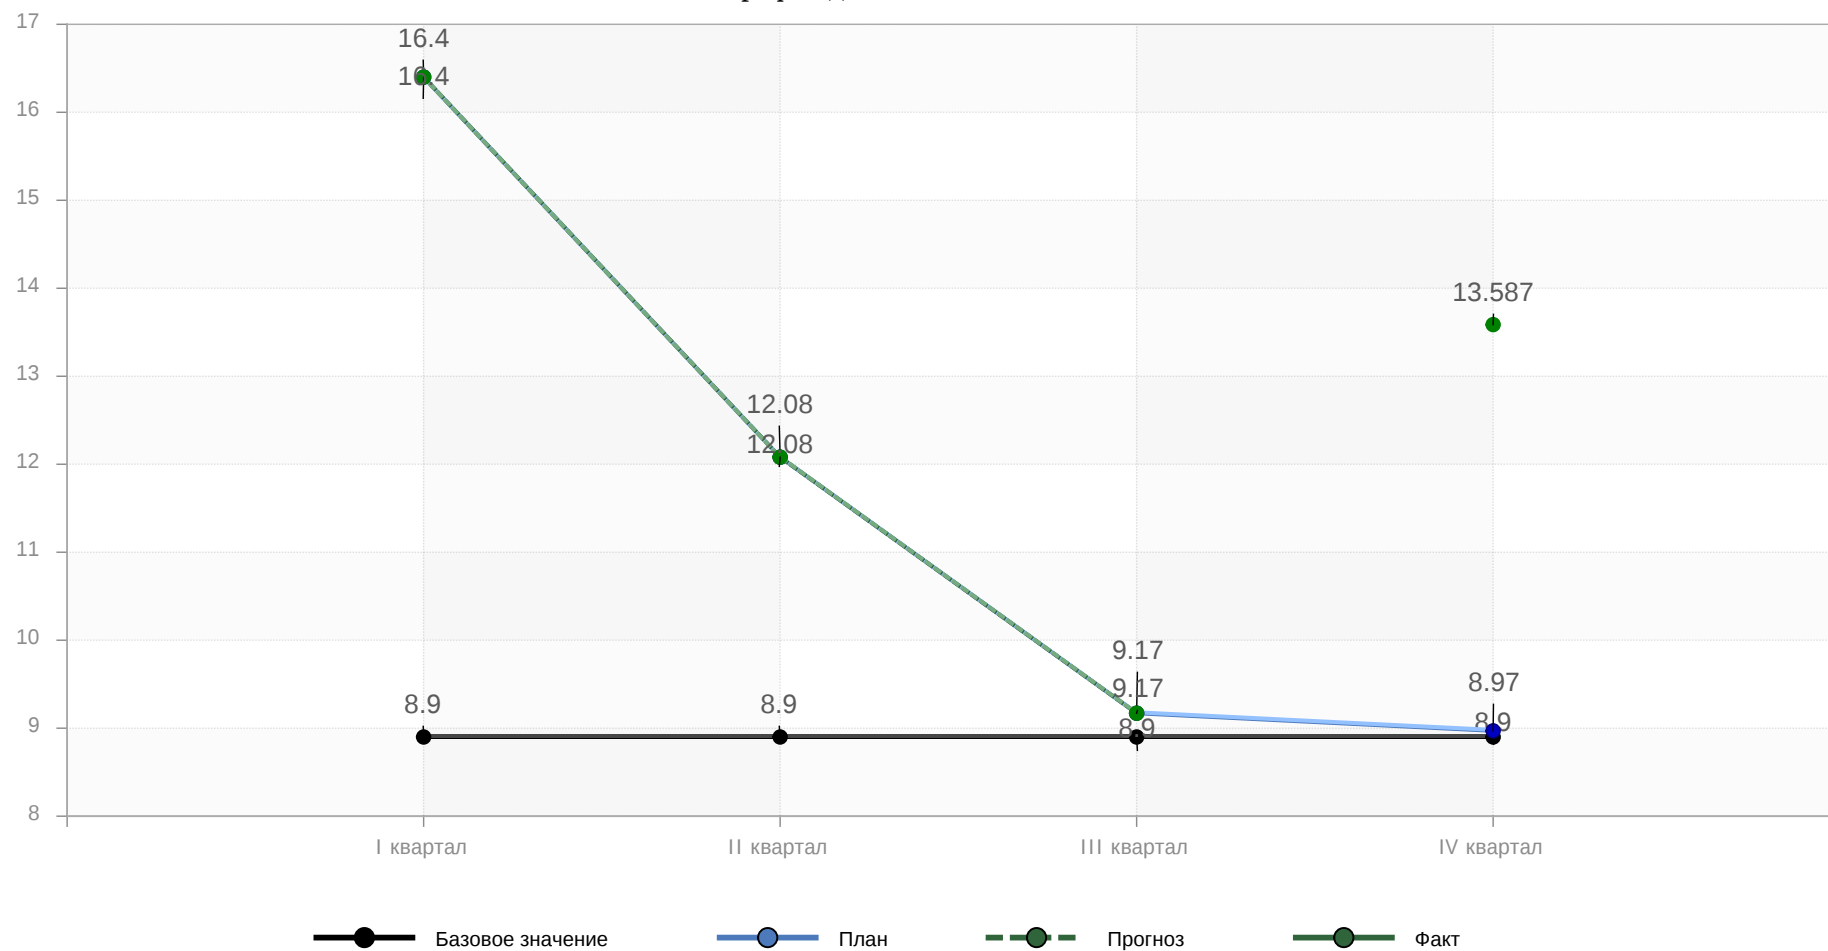


Рис. 1. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре

Диаграмма достижения показателя

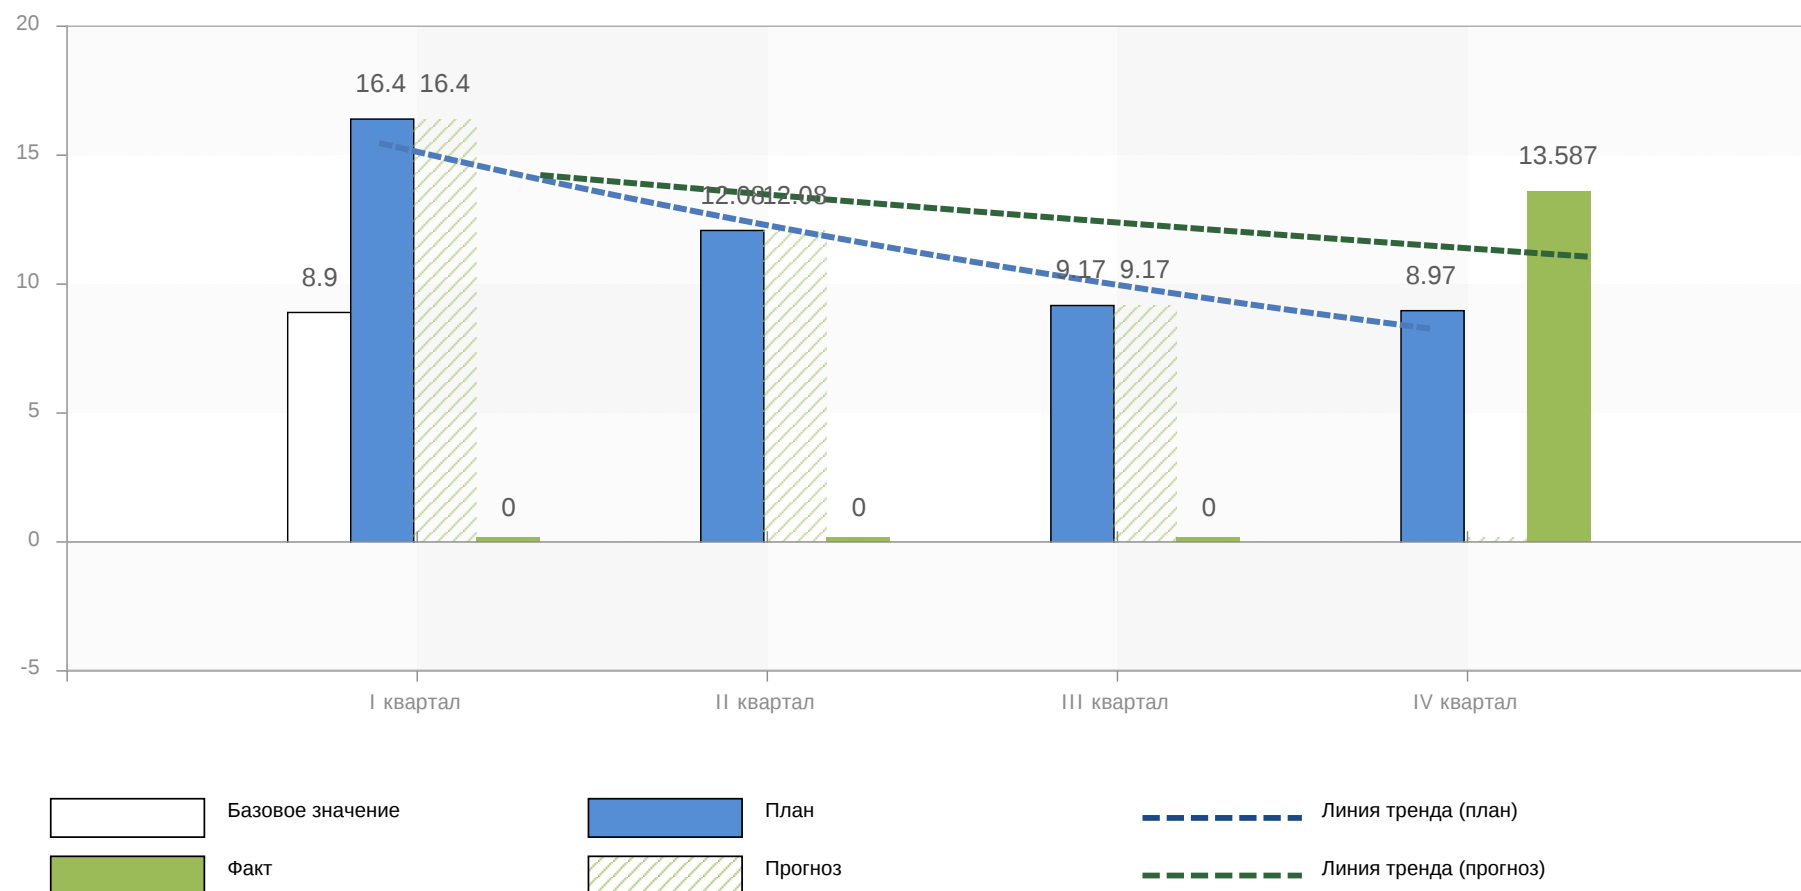


Рис. 2. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре

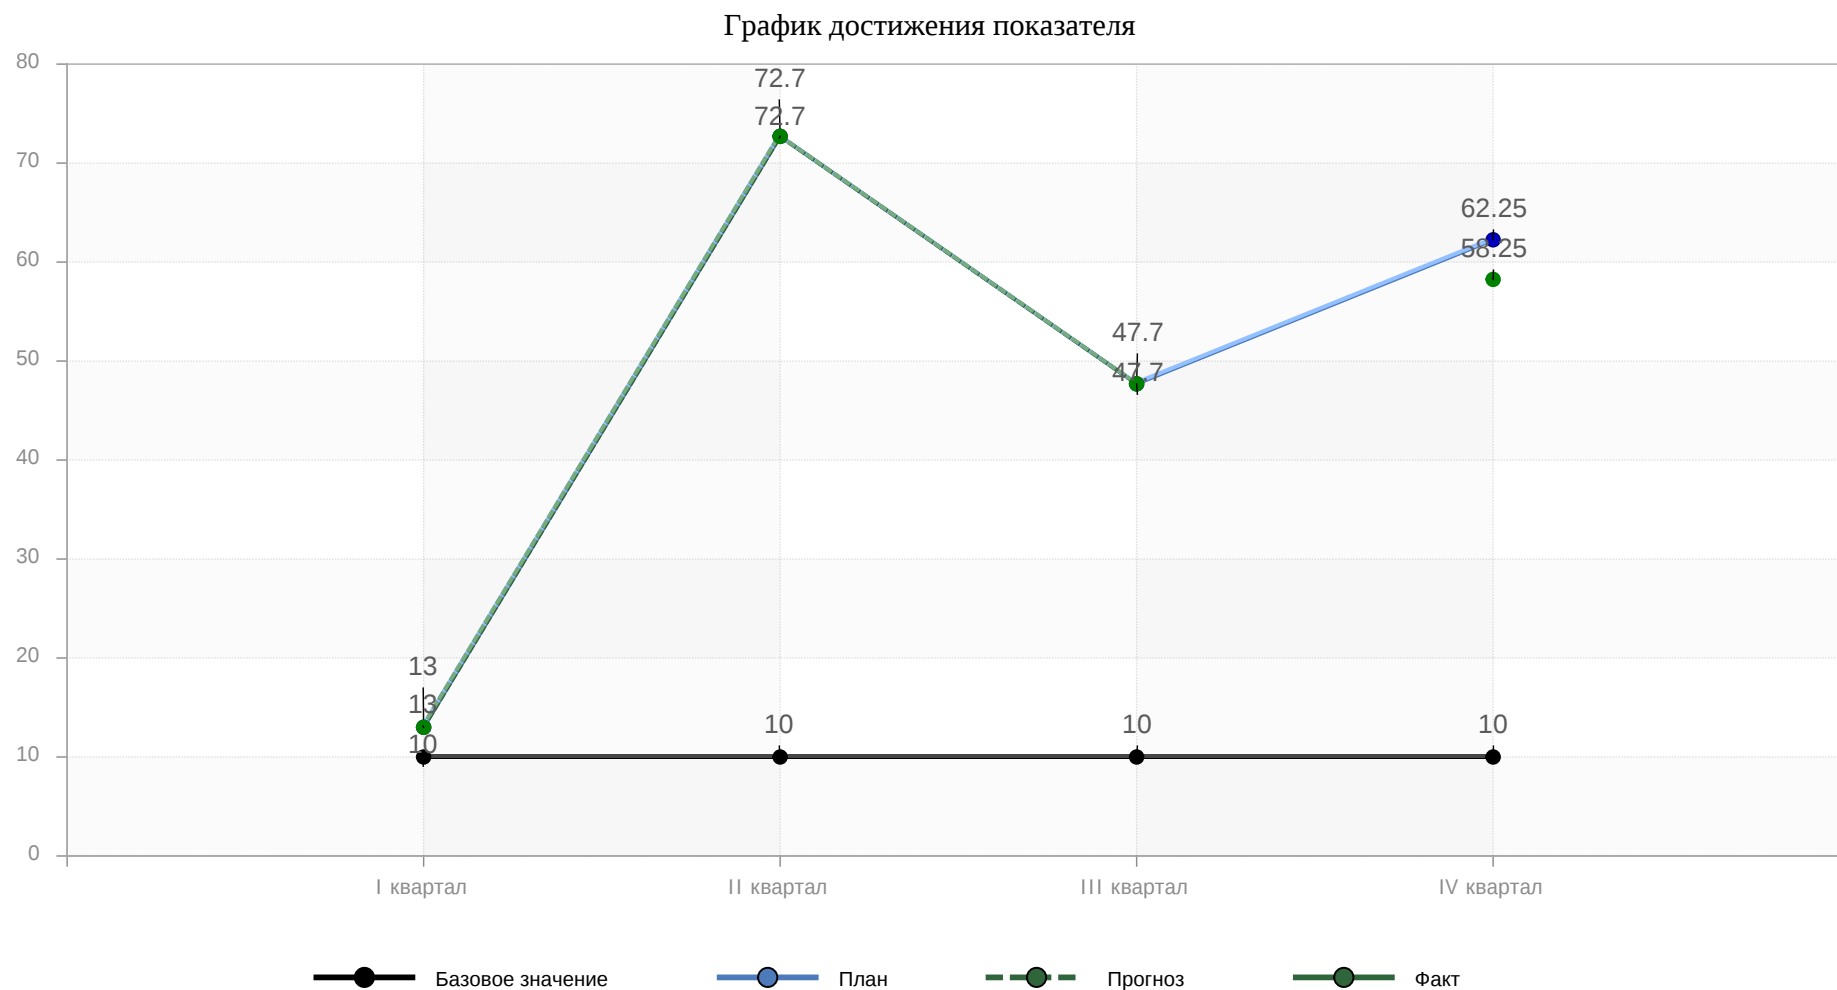


Рис. 3. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

Диаграмма достижения показателя

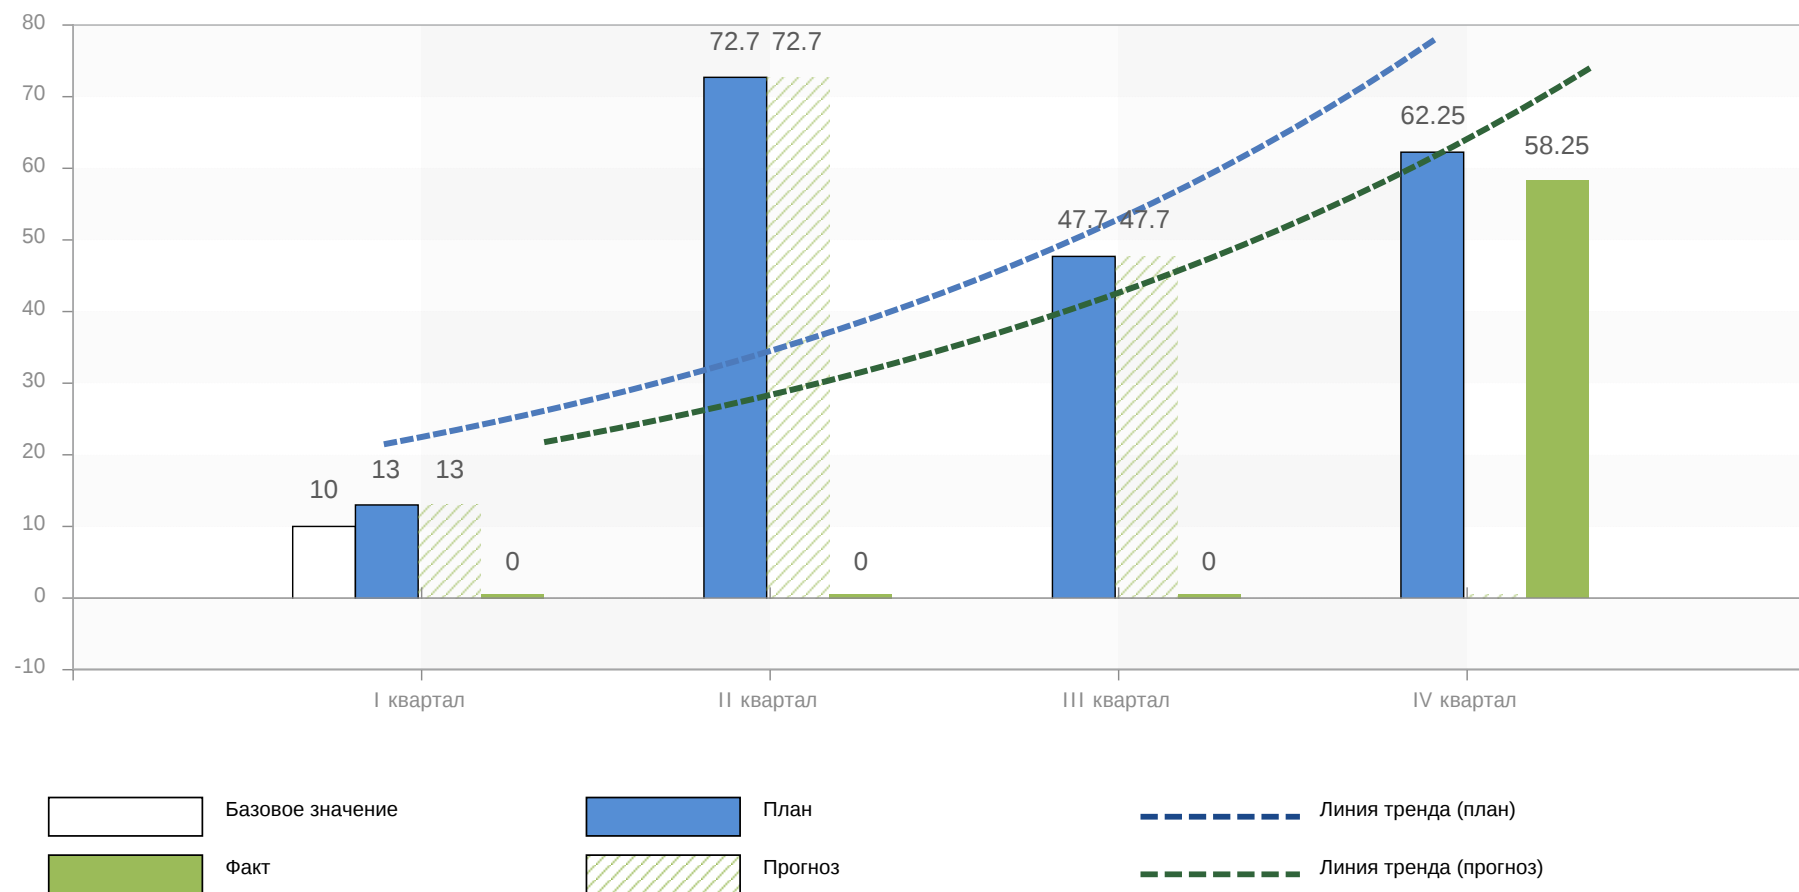


Рис. 4. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

График достижения показателя

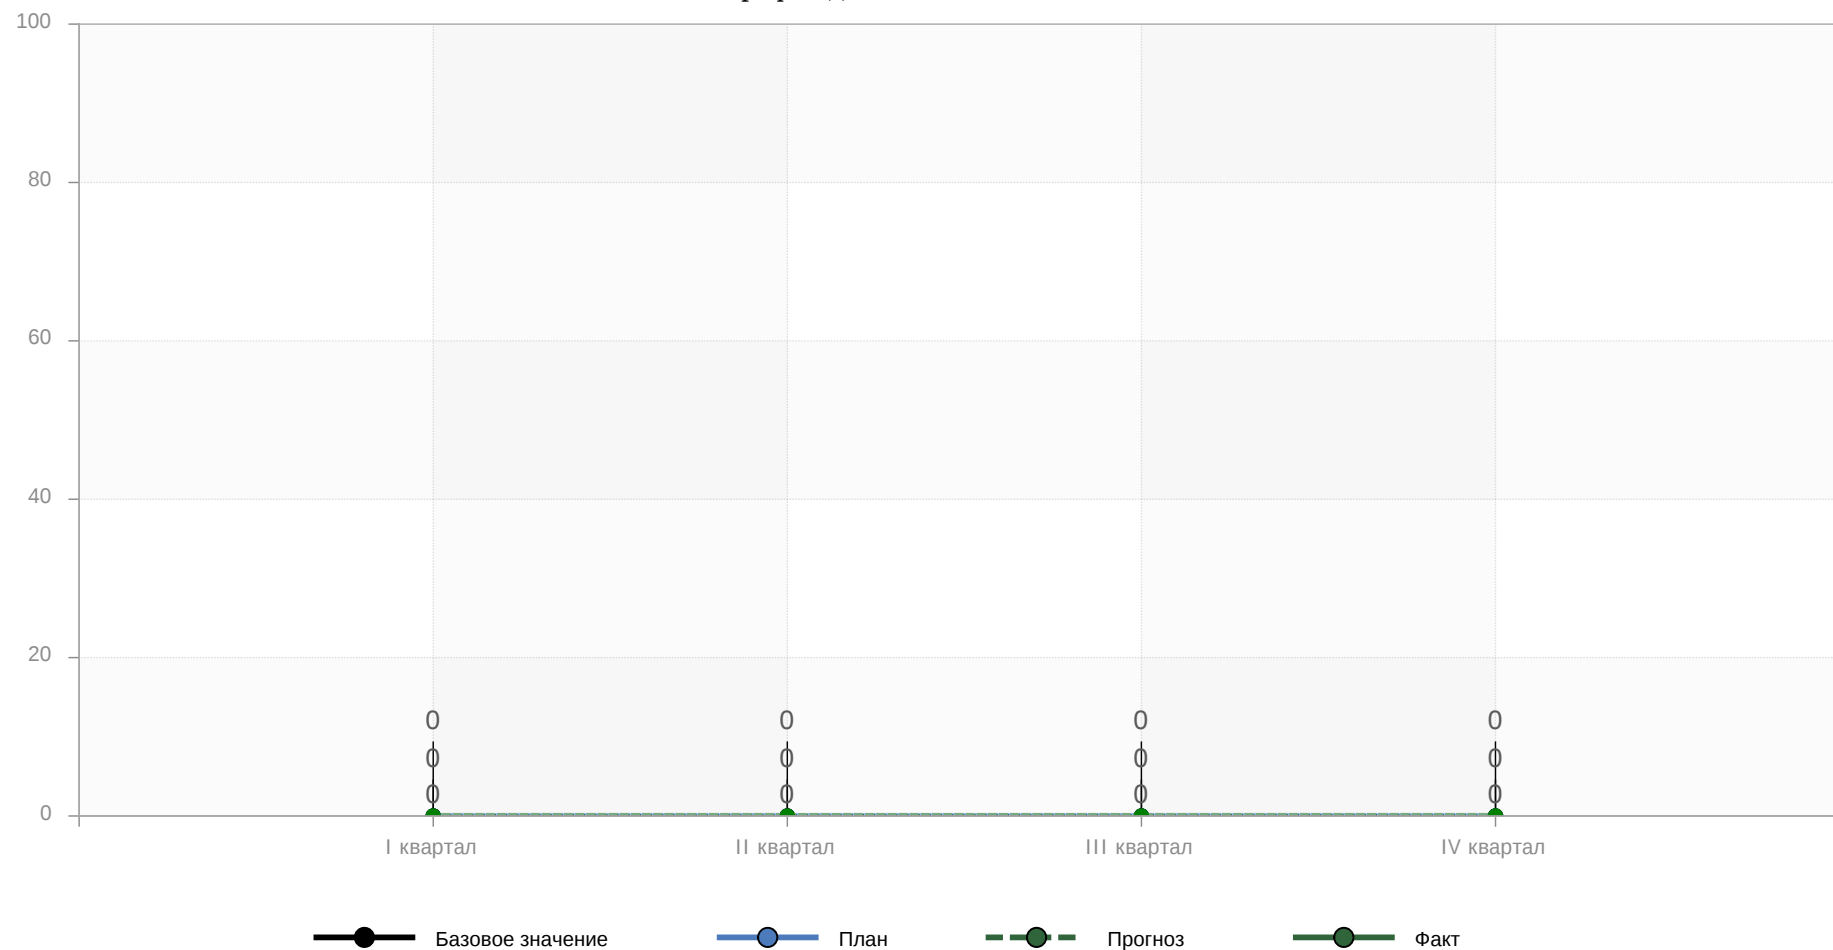


Рис. 5. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

Диаграмма достижения показателя

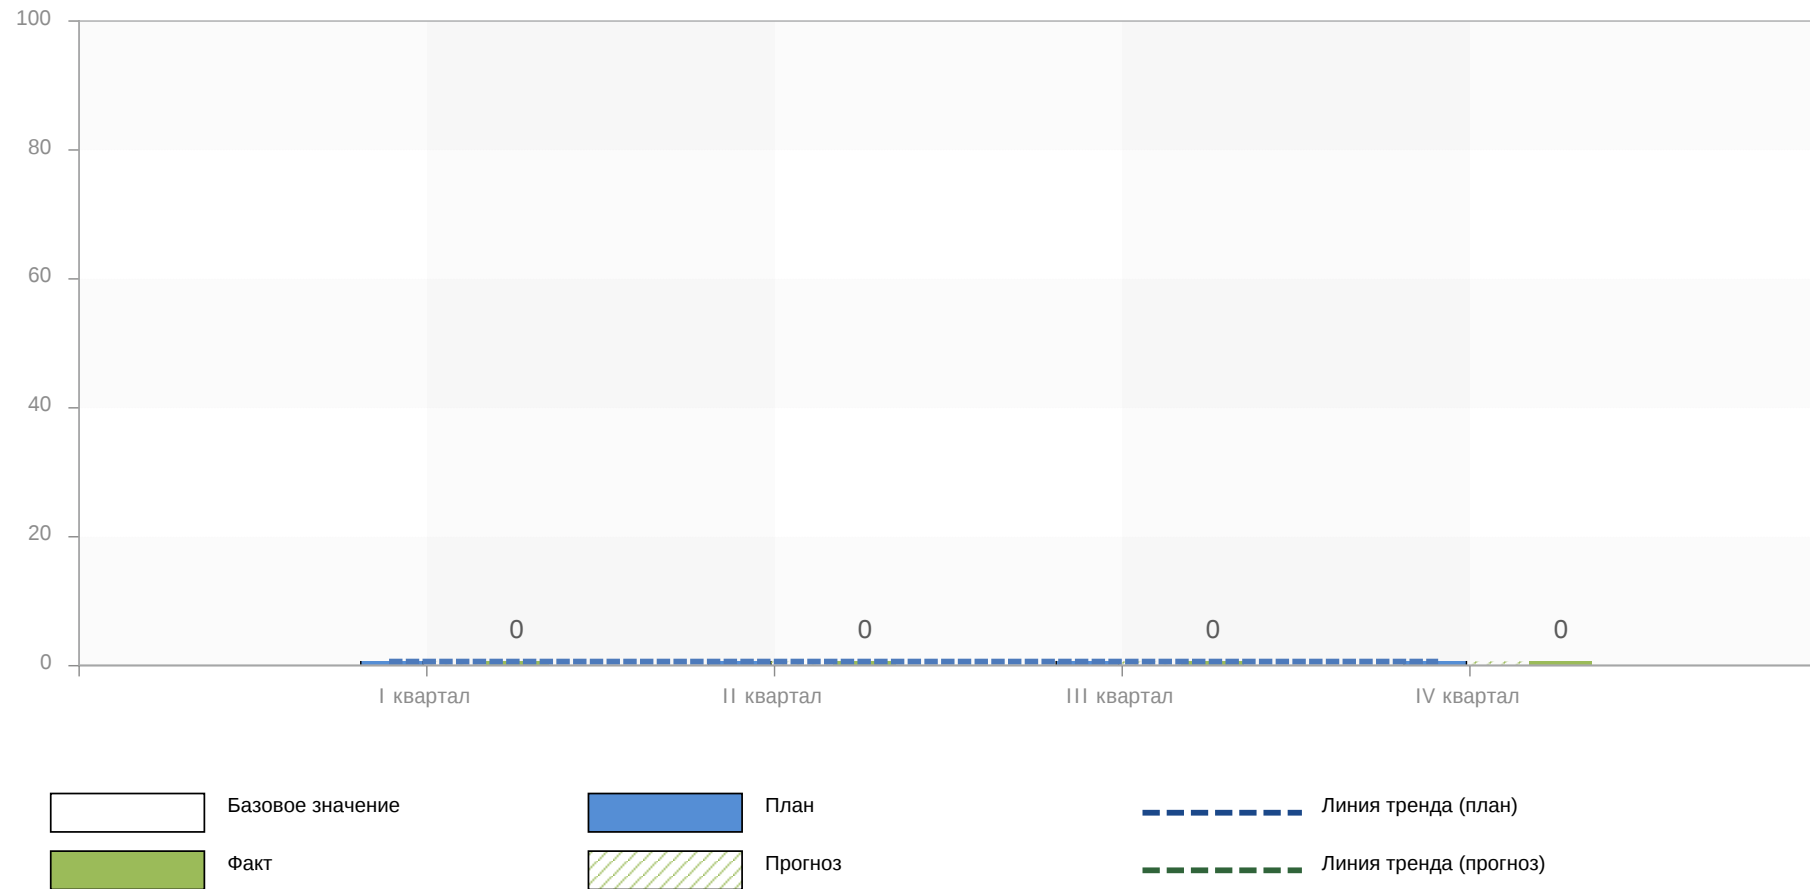


Рис. 6. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

График достижения показателя

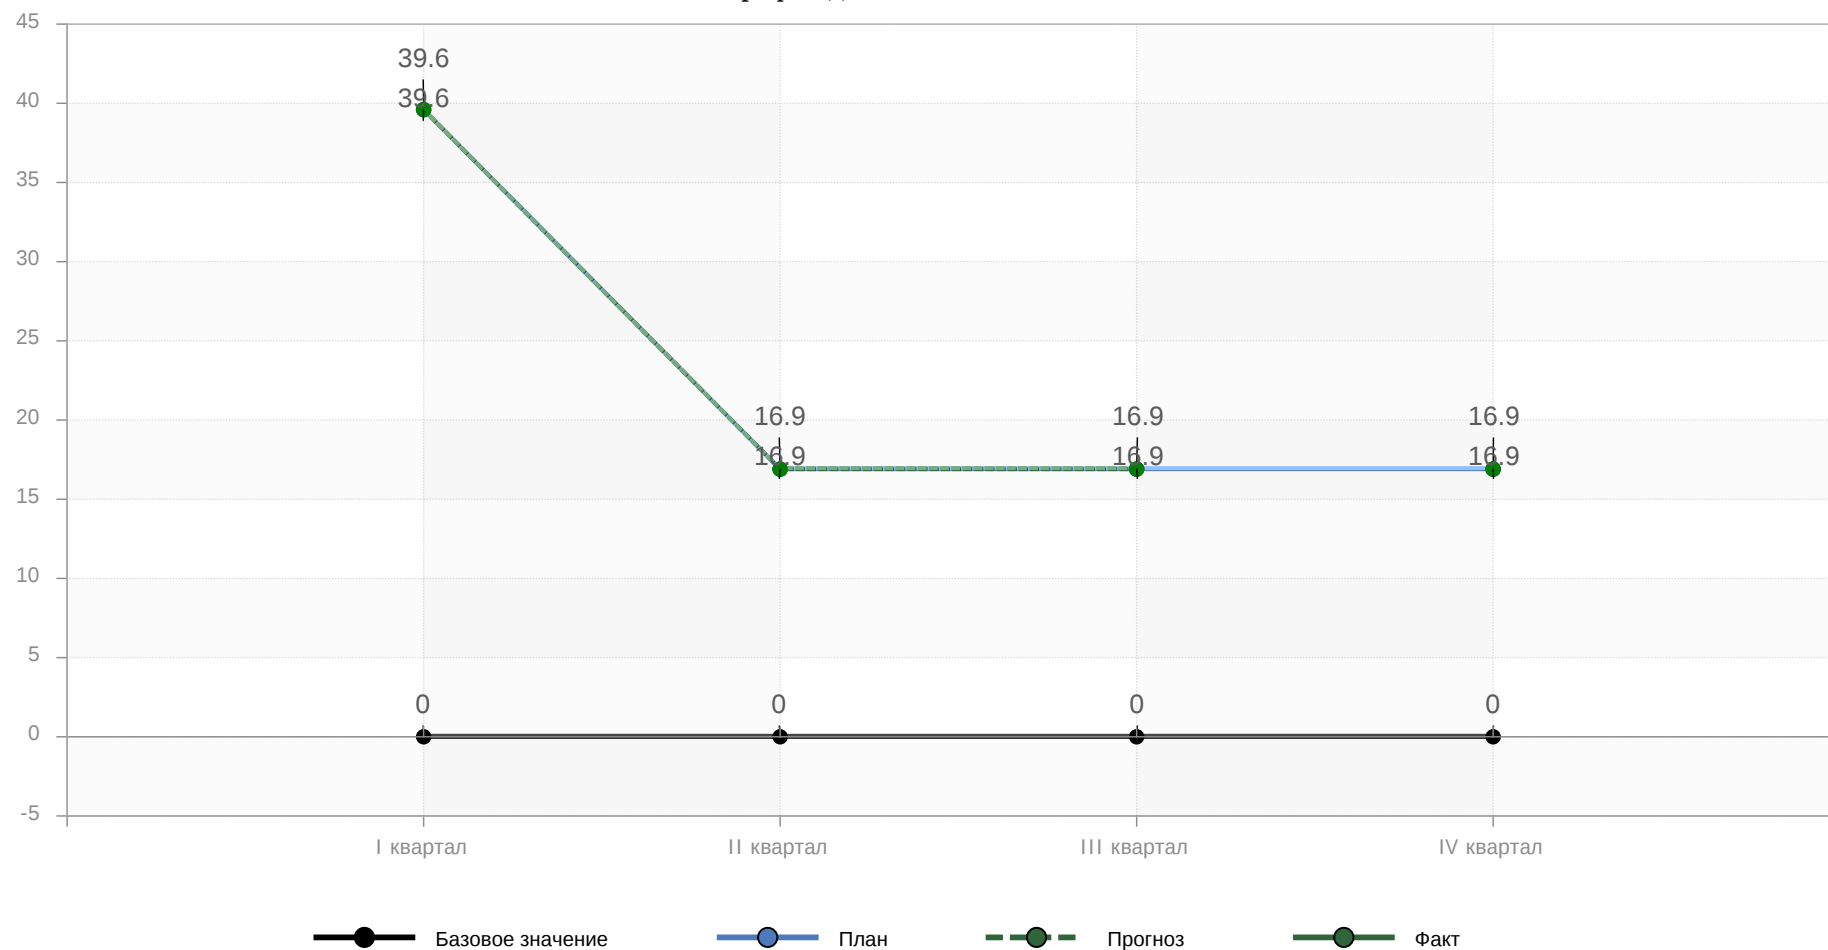


Рис. 7. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

Диаграмма достижения показателя

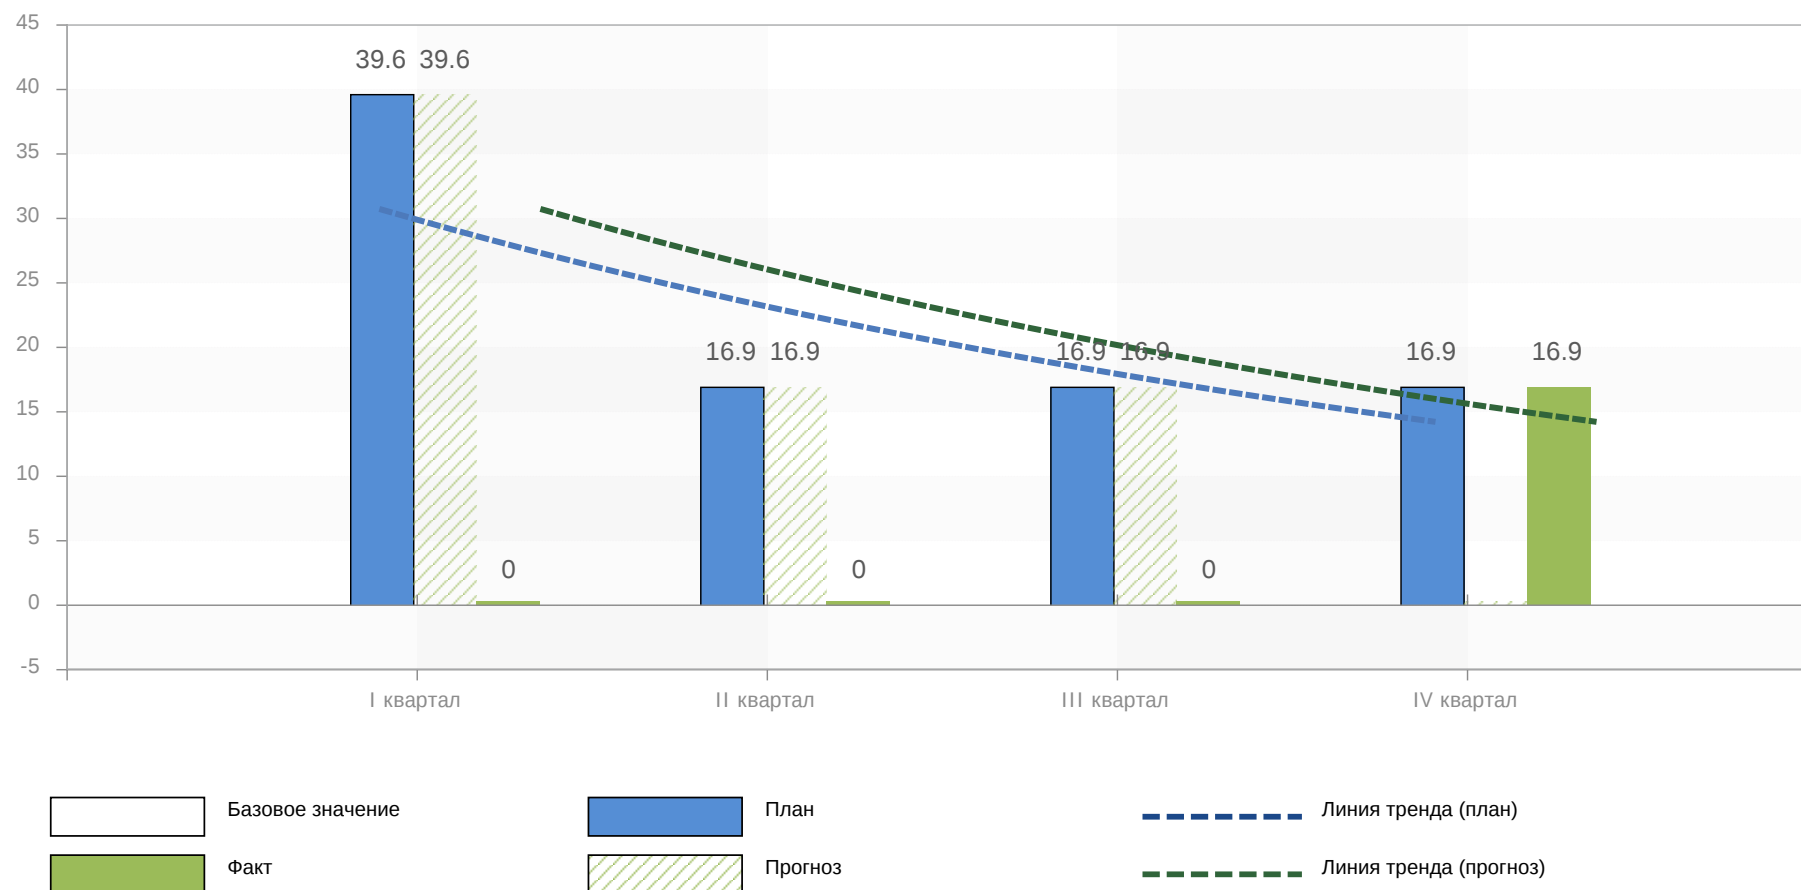


Рис. 8. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

График достижения показателя

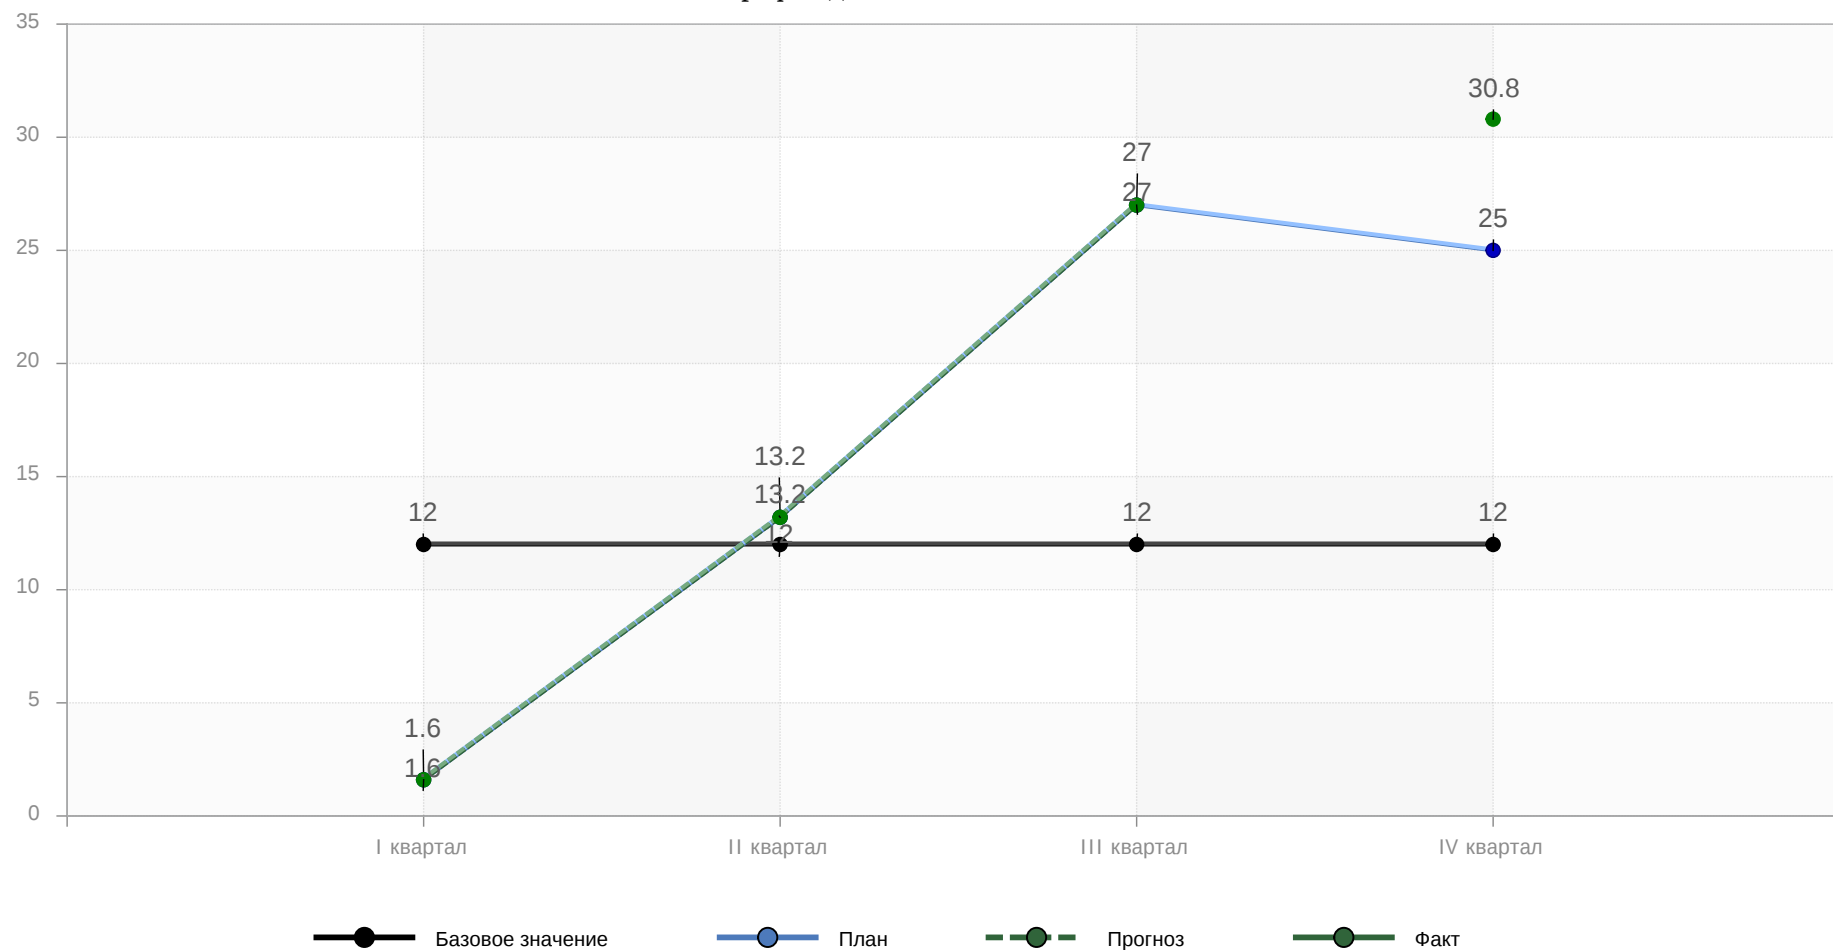


Рис. 9. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

Диаграмма достижения показателя

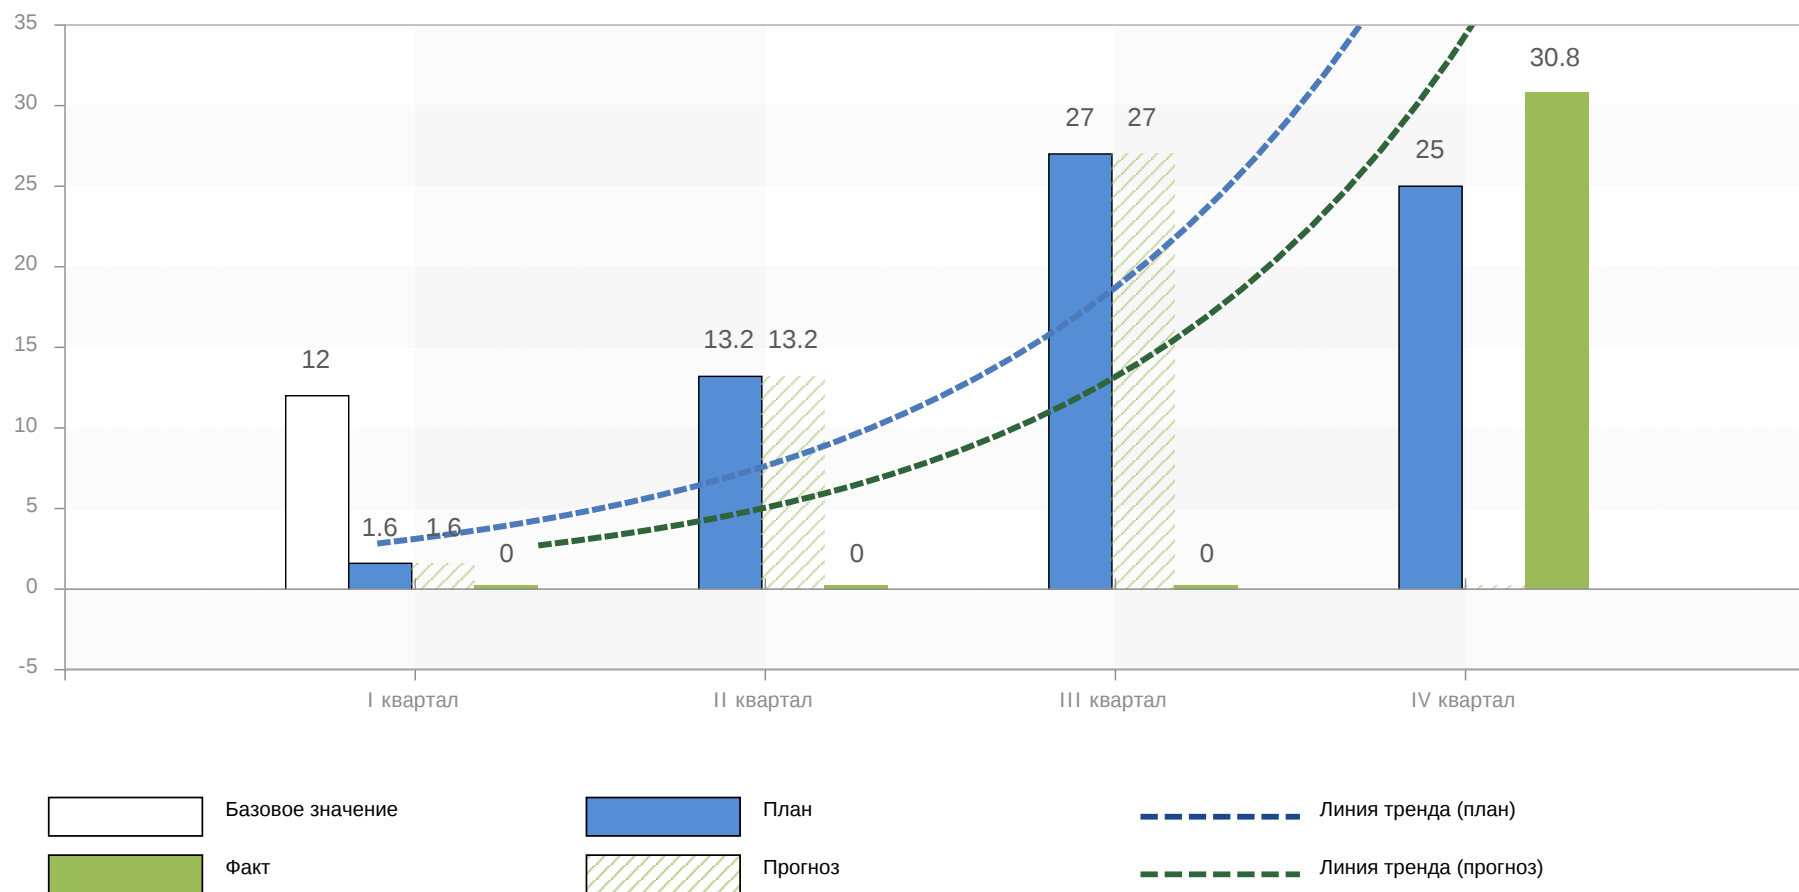


Рис. 10. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

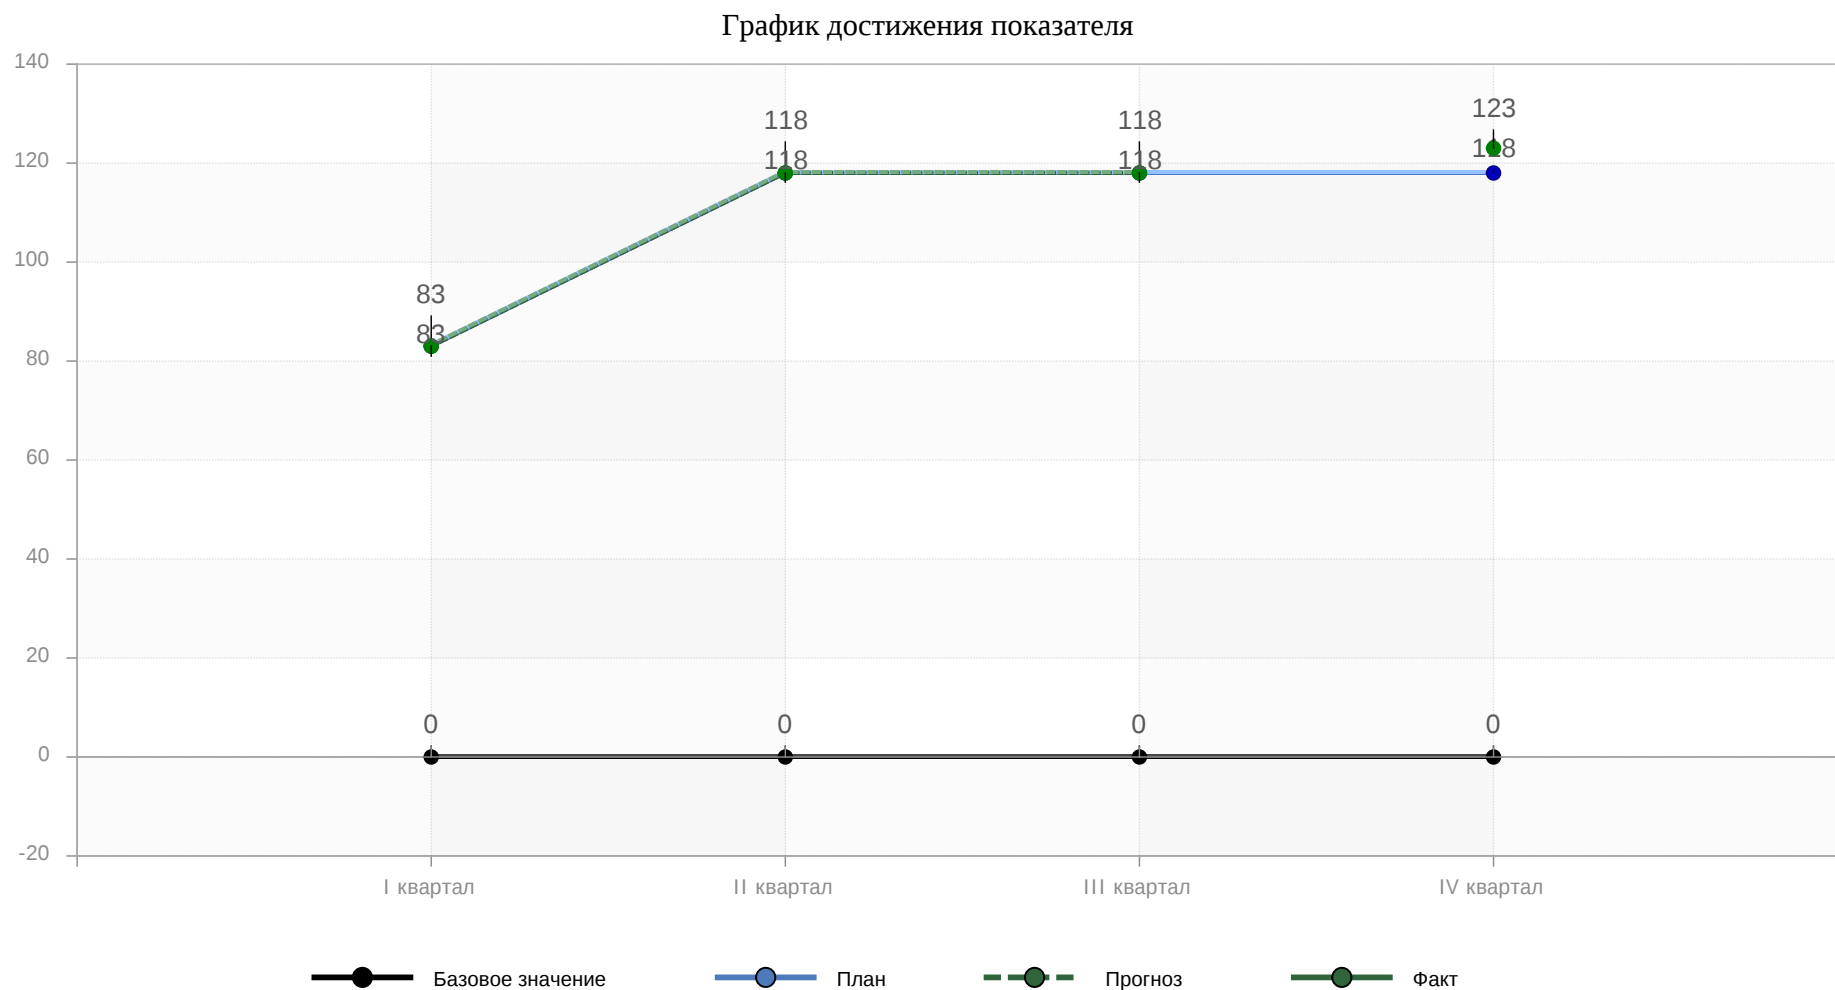


Рис. 11. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

Диаграмма достижения показателя

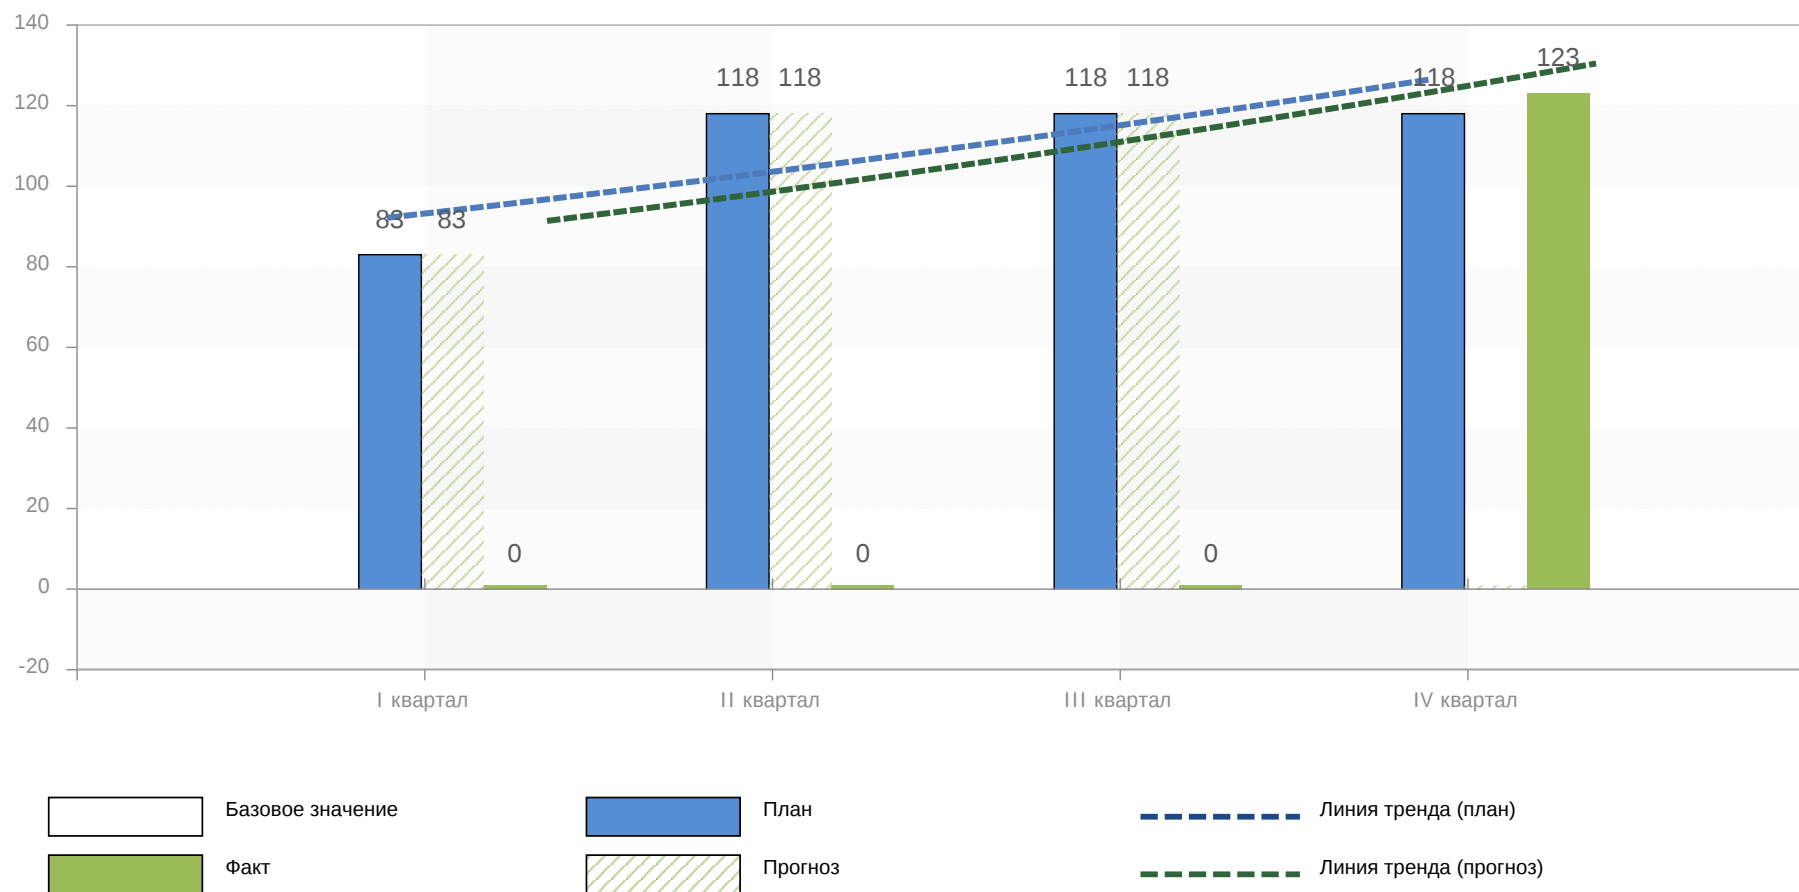


Рис. 12. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

График достижения показателя



Рис. 13. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

Диаграмма достижения показателя

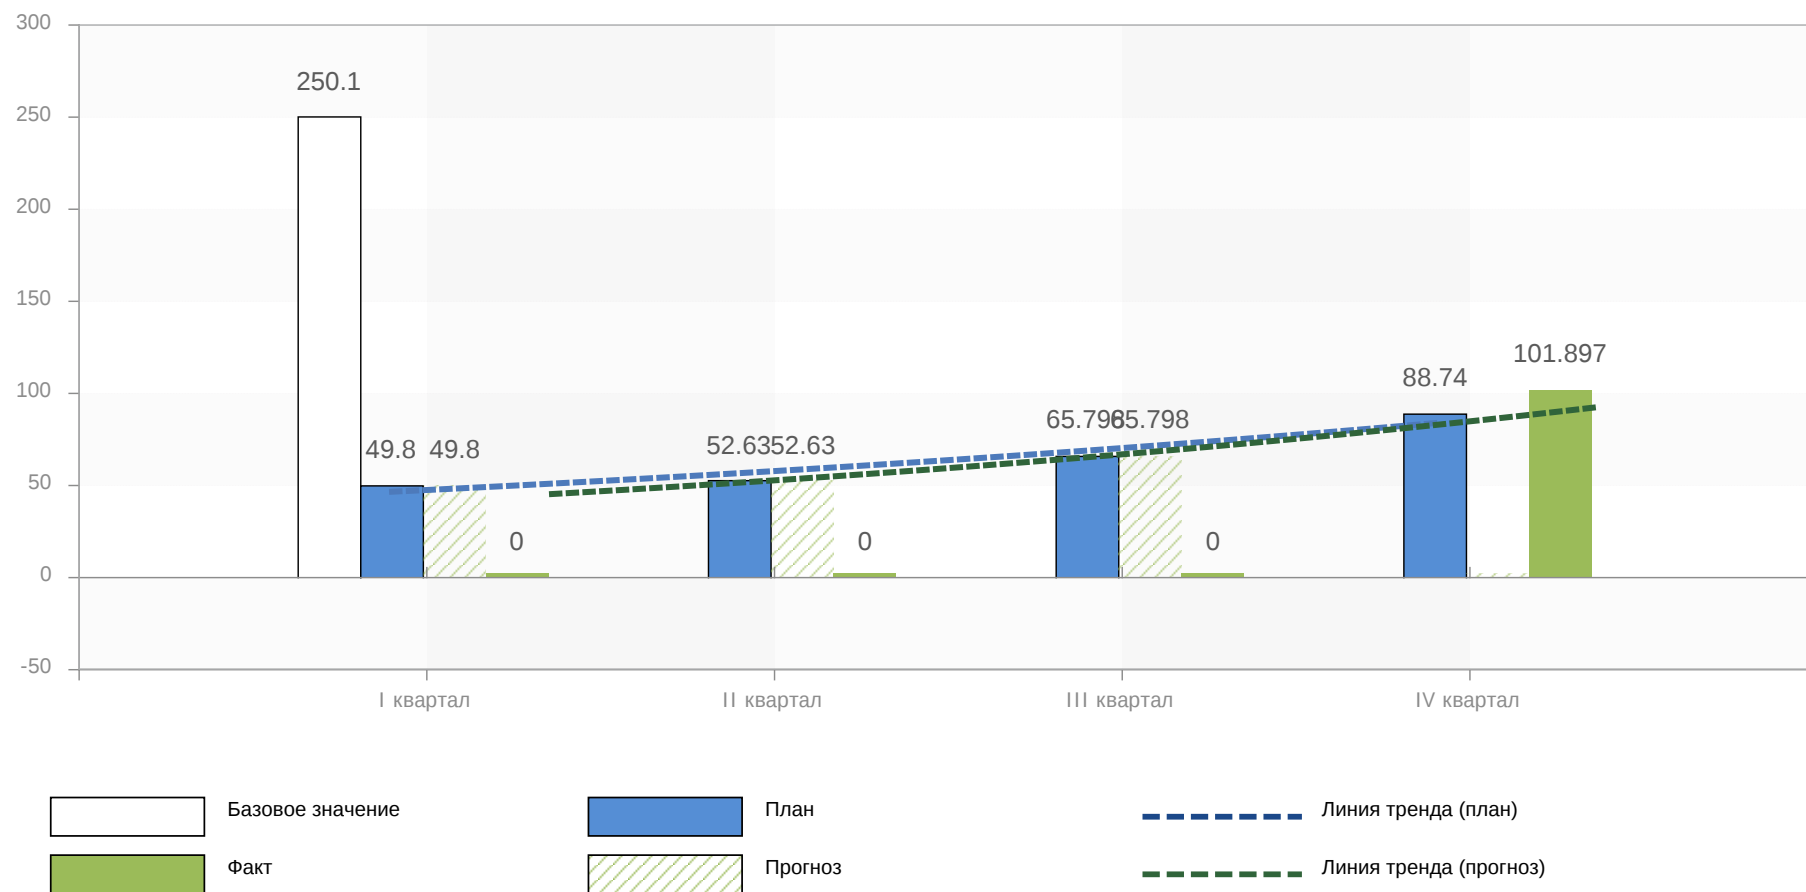


Рис. 14. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

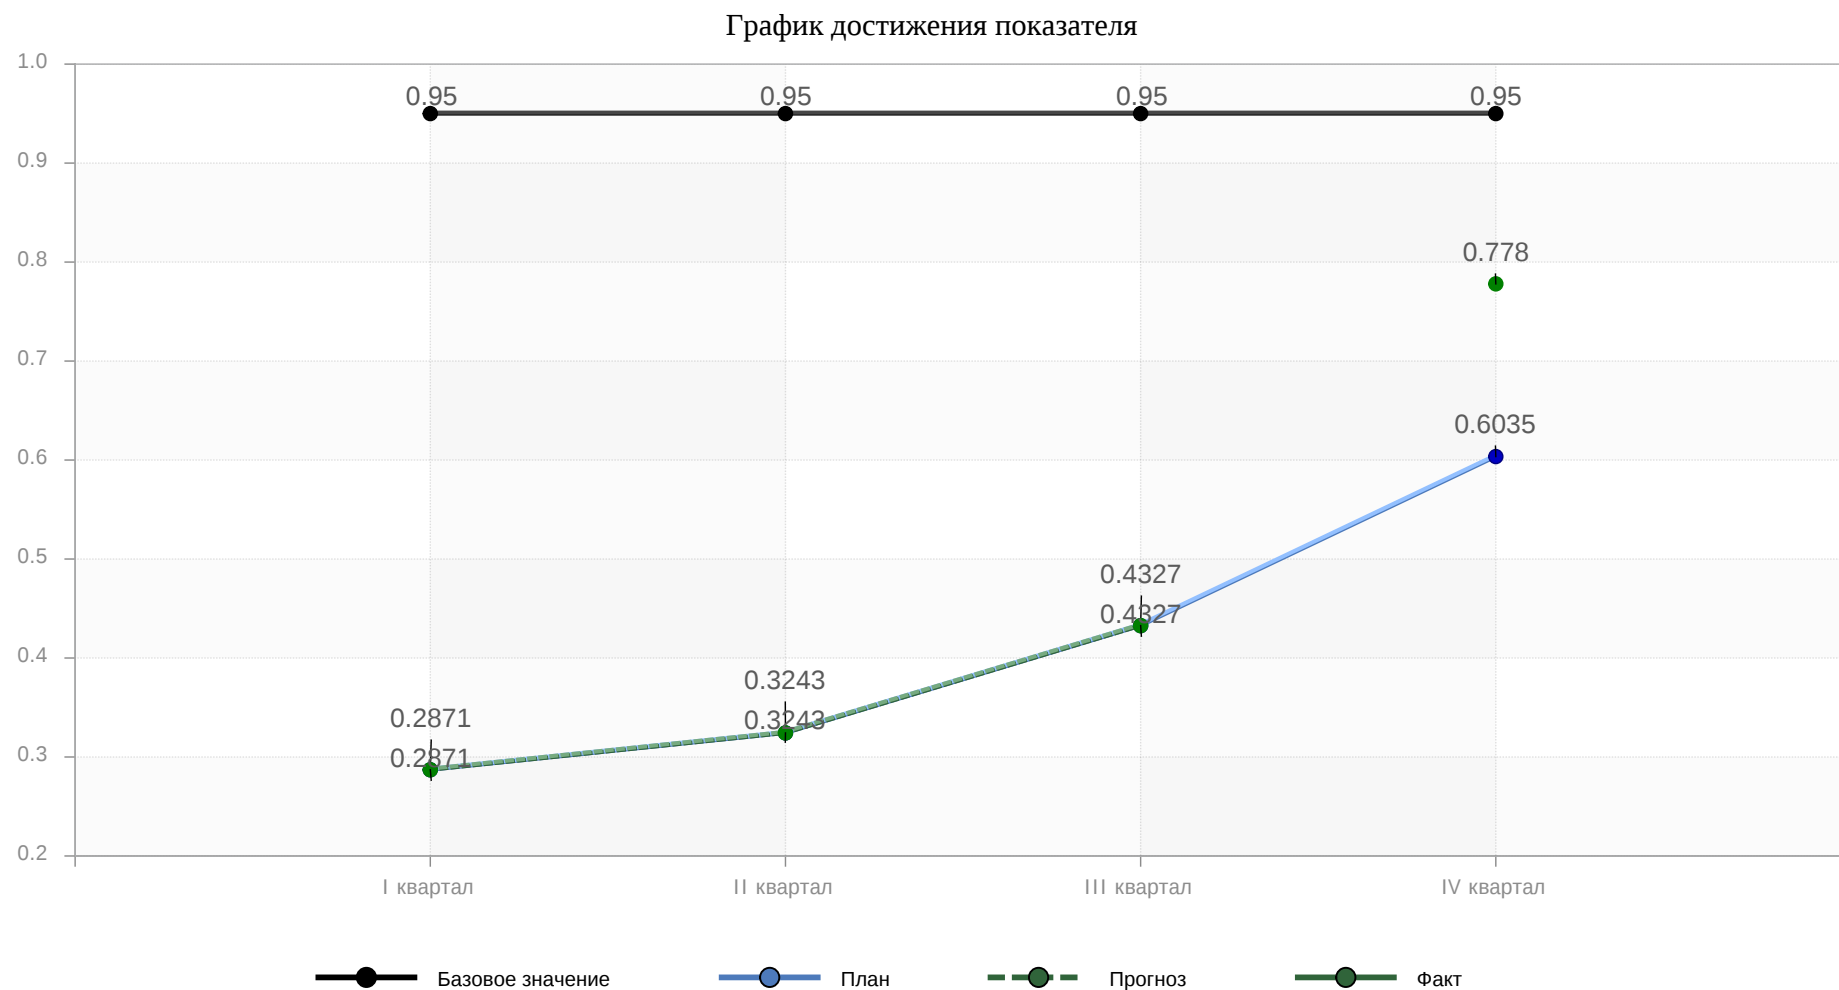


Рис. 15. Число граждан, прошедших профилактические осмотры

Диаграмма достижения показателя

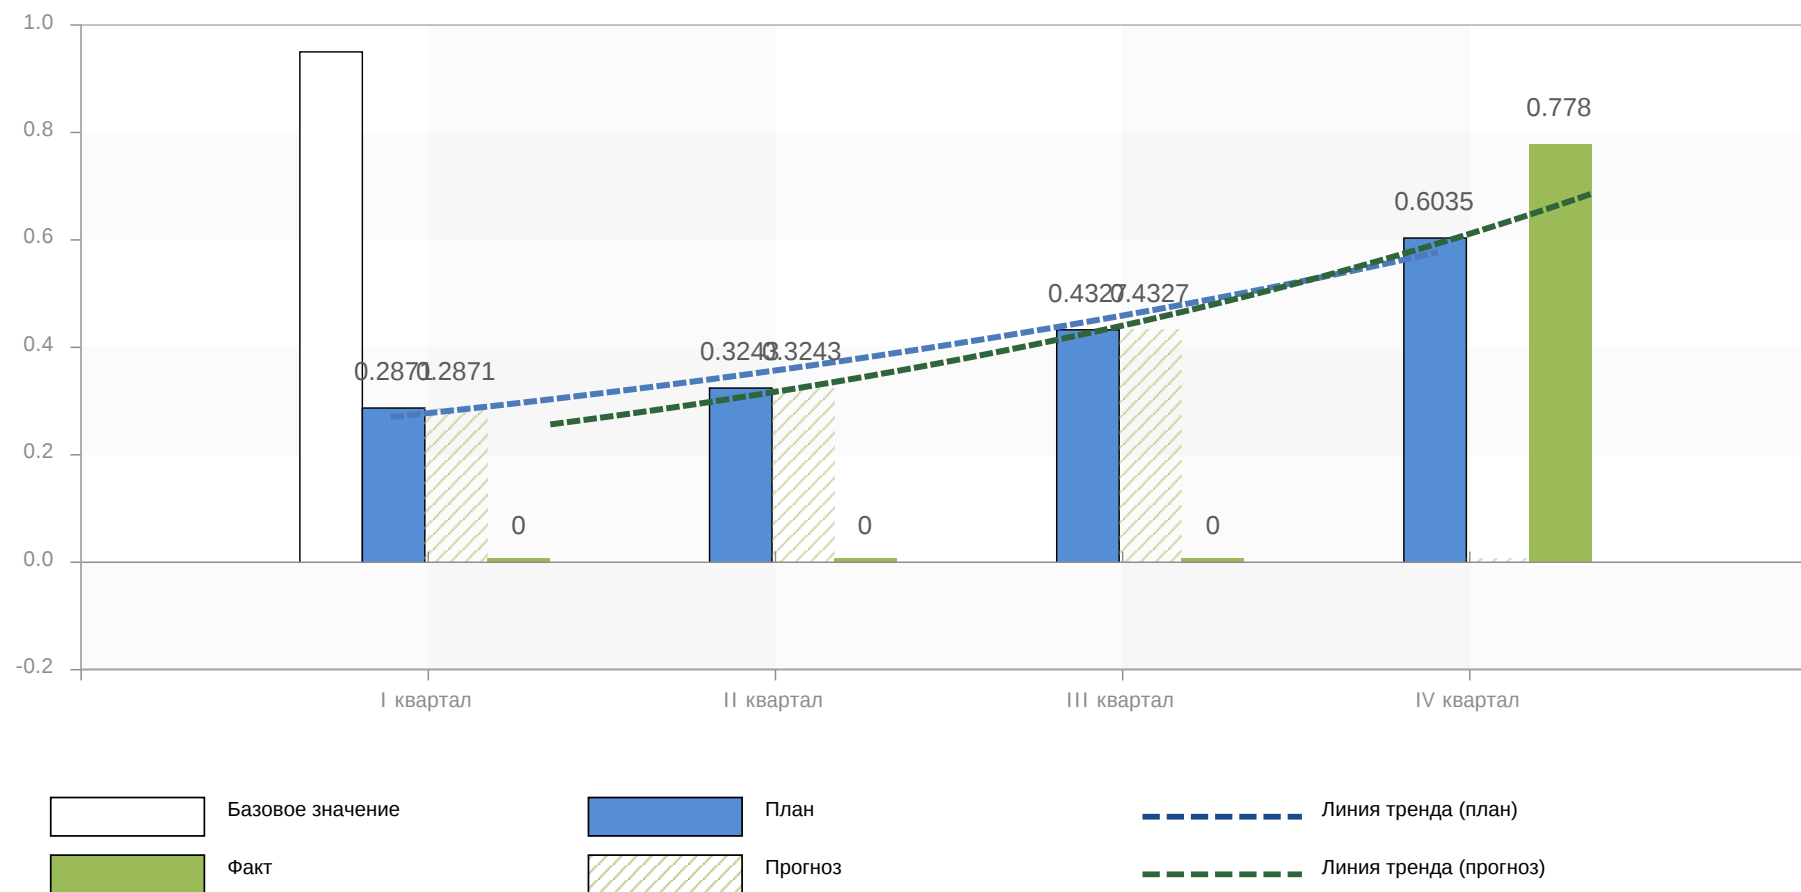


Рис. 16. Число граждан, прошедших профилактические осмотры

График достижения показателя

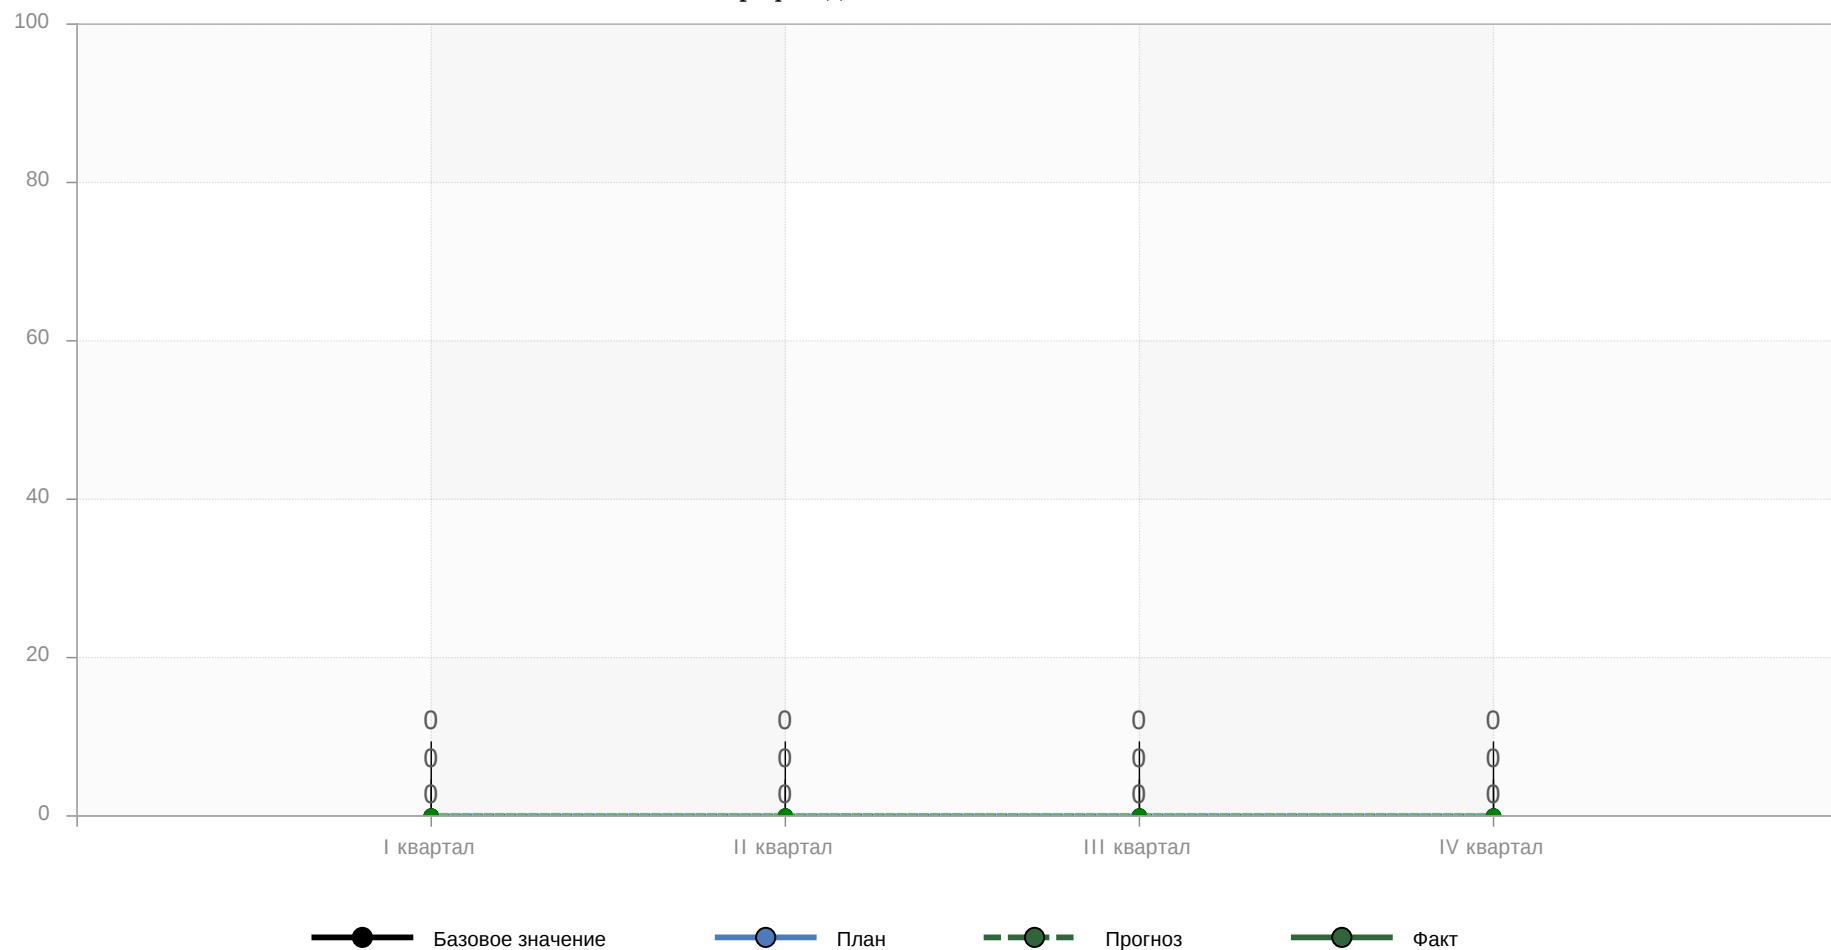


Рис. 17. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее

Диаграмма достижения показателя

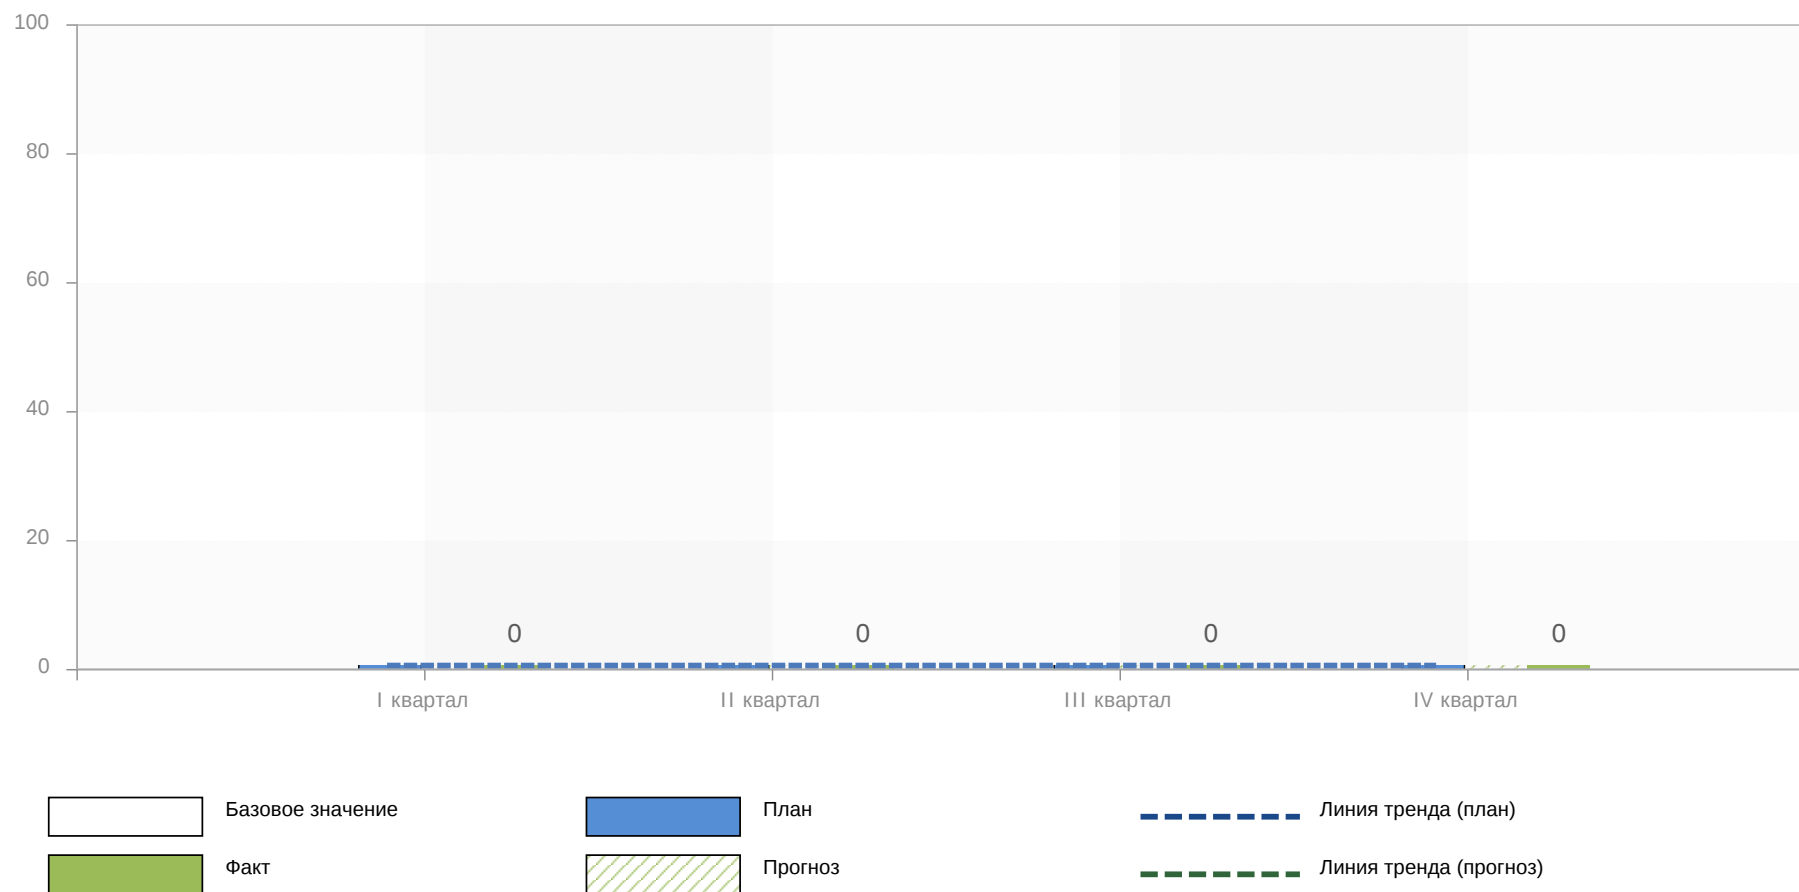


Рис. 18. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее
