

ОДОБРЕН

Руководитель
регионального проекта —
Рюмин Евгений Евгеньевич

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

13.01.2021

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
554E402249C900C528F89FF757CDE094BE3F4104

Владелец: Рюмин Евгений Евгеньевич

Действителен: с 25.02.2020 по 25.05.2021

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(R3-32) Безопасность дорожного движения (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Наличие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1		3. Цели и показатели	превышение фактического значения показателя (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения) над прогнозным, Причина риска: рост в 2020 году дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. , Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутовые: количество человек, погибших от дорожно транспортных происшествий, превысит прогнозное значение	1. Исполнение мероприятий Плана реализации основных направлений деятельности по повышению безопасности дорожного движения в 2021 году и плановых 2022-2023 годах» («Дорожной карты»), утвержденного протоколом заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от 25.12.2020, срок исполнения 31.12.2021;

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тысяч населения	Человек	10.47	2.88	5.05	8.6	12	9.24	77,00%	Подтверждающие документы: 1. "о показателях аварийности" Письмо Управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области от 08.01.2021г. №5/29, приложен файл. Существует риск: превышение фактического значения показателя (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения) над прогнозным, Причина риска: рост в 2020 году дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. , Вероятность: 100%, Сутовые: количество человек, погибших от дорожно транспортных происшествий, превысит прогнозное значение Предлагаемые решения: 1. Исполнение мероприятий Плана реализации основных направлений деятельности по повышению безопасности дорожного движения в 2021 году и плановых 2022-2023

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
											годах» («Дорожной карты»), утвержденного протоколом заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от 25.12.2020, срок исполнения 31.12.2021.причины отклонения: нарушение водителями правил дорожного движения

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 88 290,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

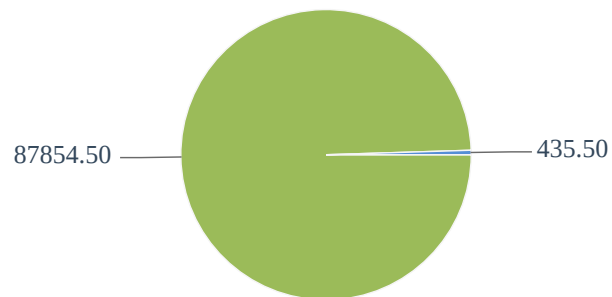

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) В медицинские учреждения Кемеровской области – Кузбасса поставлено оборудование для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 342,00	51 342,00	99,50	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 342,00	51 342,00	99,50	экономия бюджетных средств по итогам конкурса на поставку оборудования
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 342,00	51 342,00	99,50	экономия бюджетных средств по итогам конкурса на поставку оборудования
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(04) В медицинские учреждения Кемеровской области – Кузбасса поставлены автомобили скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 322,50	35 322,50	99,50	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 322,50	35 322,50	99,50	экономия бюджетных средств по итогам конкурса на поставку оборудования
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 322,50	35 322,50	99,50	экономия бюджетных средств по итогам конкурса на поставку оборудования
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(05) В Кемеровской области – Кузбассе проведены массовые мероприятия (участие во всероссийских мероприятиях) с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	100,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	100,00	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	100,00	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		(06) В Кемеровской области – Кузбассе организации, осуществляющие работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, укомплектованы средствами обучения и наглядным учебным оборудованием	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			88 290,00	88 290,00	88 290,00	87 854,50	87 854,50	99,51	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			88 290,00	88 290,00	88 290,00	87 854,50	87 854,50	99,51	
бюджет субъекта Российской Федерации			88 290,00	88 290,00	88 290,00	87 854,50	87 854,50	99,51	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		В медицинские учреждения Кемеровской области – Кузбасса поставлено оборудование для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	
2		В медицинские учреждения Кемеровской области – Кузбасса поставлены автомобили скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2020	
3		В Кемеровской области – Кузбассе проведены массовые мероприятия (участие во всероссийских мероприятиях) с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Значение: 350,0000 Дата: 31.12.2020	
4		Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	
5		Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	
6		Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	
7		В Кемеровской области – Кузбассе организации, осуществляющие работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, укомплектованы средствами обучения и наглядным учебным оборудованием Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2020	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			<i>В медицинские учреждения Кемеровской области – Кузбасса поставлено оборудование для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ Значение: 1, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	14.12.2020	Малин М. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о приемке жидкостного хроматомасс-спектрометра" Акт приема-передачи Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Новокузнецкий наркологический диспансер" от 14.12.2020г. №1, приложен файл. 2. "о приемке анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе" Акт приема-передачи Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кузбасский клинический наркологический диспансер" от 19.10.2020г. №1, приложен файл. отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.	ПК		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.09.2020	17.08.2020	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт на поставку медицинских изделий (Жидкостный хроматомасс-спектрометр с тройным квадруполом/ Анализатор масс-спектрометрический ИВД, полуавтоматический), ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия в рамках реализации государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014-2024 годы и регионального проекта «Безопасность дорожного движения» (КТРУ 26.60.12.119-00000227)" Иное

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Государственное казенное учреждение здравоохранения "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" от 17.08.2020г. №100-ЭА/20, приложен файл.
1.2.	ПК		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2020	14.12.2020	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О приемке жидкостного хроматомасс-спектрометра" Акт приема-передачи Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Новокузнецкий наркологический диспансер" от 14.12.2020г. №1, приложен файл. 2. "О приемке анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе" Акт приема-передачи Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кузбасский клинический наркологический диспансер" от 28.10.2020г. №1, приложен файл. Отклонения отсутствуют
2.			<i>В медицинские учреждения Кемеровской области – Кузбасса поставлены автомобили скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях Значение: 3, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	05.12.2020	Малин М. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о приемке автомобилей скорой медицинской помощи класса "С"" Акт приема-передачи Государственного автономного учреждения здравоохранения "Управление транспорта" от 05.12.2020г. №1, приложен файл. отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 5 из 3.
2.1.	ПК		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.09.2020	29.09.2020	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о поставке автомобилей скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							происшествиях" Иное Государственное казенное учреждение здравоохранения "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" от 29.09.2020г. №143-ЭА/20, приложен файл.
2.2.	ПК		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2020	05.12.2020	Малин М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О приемке автомобилей скорой медицинской помощи класса "С"" Акт приема-передачи Государственного автономного учреждения здравоохранения "Управление транспорта" от 05.12.2020г. №1, приложен файл. отклонения отсутствуют
3.			<i>В Кемеровской области – Кузбассе проведены массовые мероприятия (участие во всероссийских мероприятиях) с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Значение: 350, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	30.12.2020	Балакирева С. Ю.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о проведении массовых мероприятий по безопасности дорожного движения" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 30.12.2020г. №11224, приложен файл. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 380 из 350.
3.1.	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.10.2020	01.10.2020	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об утверждении Комплекса мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год" Письмо Министерства образования и науки Кузбасса от 01.10.2020г. №8119/08, приложен файл. отклонения отсутствуют
3.2.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	15.12.2020	15.12.2020	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о проведении мероприятий с использованием

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							мобильного автогородка" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 15.12.2020г. №10655/08, приложен файл.
3.3.	ПК		обеспечено участие команды детей в возрасте от 10 до 12 лет во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо»	30.06.2020	30.12.2020	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Просрочка 183 дней. Подтверждающие документы: 1. "об участии команды в конкурсе " Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 30.12.2020г. №11224/08, приложен файл. Риск снят: перенос конкурса на более поздний срок, Причина риска: письмо Минпросвещения России от 20.07.2020 № ДГ-1121/07 о переносе финала Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. обеспечить участие в конкурсе команды Кузбасса в декабре 2020 года, срок исполнения 31.12.2020.
3.4.	ПК		проведен областной конкурс отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо»	30.09.2020	19.10.2020	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о награждении победителей и участников регионального этапа Всероссийского конкурса "Безопасное колесо-2020"" Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 19.10.2020г. №1683, приложен файл.
4.			Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-	31.12.2020	25.12.2020	Балакирева С. Ю.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. Значение: 1, на дату 31.12.2020</i>				1. "О создании условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 24.12.2020г. №10988/08, приложен файл. 2. "О проведении массовых мероприятий" Отчет Администрации Правительства Кузбасса от 25.12.2020г. №И14-60/10594, приложен файл. отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1.
4.1.	ПК		Документ утвержден (подписан)	31.12.2020	24.12.2020	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о развитии отрядов юных инспекторов движения, детско-юношеских автошкол" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 24.12.2020г. №10988/08, приложен файл.
4.2.	ПК		Документ утвержден (подписан)	31.12.2020	25.12.2020	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении массовых мероприятий" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 24.12.2020г. №10988/08, приложен файл. 2. "о проведении массовых мероприятий" Отчет Администрации Правительства Кузбасса от 25.12.2020г. №И14-60/10594, приложен файл.
4.3.	ПК		Документ утвержден (подписан)	31.12.2020	24.12.2020	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о проведении курсов повышения квалификации педагогического состава" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 24.12.2020г. №10988/08,

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							приложен файл.
5.			Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. Значение: 1, на дату 31.12.2020	31.12.2020	23.11.2020	Балакирева С. Ю.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о проведении системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения" Отчет Администрации Правительства Кузбасса от 23.11.2020г. №И14-19/9474, приложен файл. 2. "о проведении системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 20.11.2020г. №9872/08, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
5.1.	ПК		Документ утвержден (подписан)	25.11.2020	23.11.2020	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о проведении родительских собраний с освещением вопросов безопасности детей на дорогах" Отчет Администрации Правительства Кузбасса от 23.11.2020г. №И14-19/9474, приложен файл. 2. "о проведении родительских собраний с освещением вопросов безопасности детей на дорогах" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 20.11.2020г. №9872/08, приложен файл.
5.1.1	РПП		Проведение родительских собраний с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	25.11.2020	23.11.2020	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о проведении родительских собраний с освещением вопросов безопасности детей на дорогах" Отчет Администрации Правительства Кузбасса от 23.11.2020г. №И14-19/9474, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений





Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							2. "о проведении родительских собраний с освещением вопросов безопасности детей на дорогах" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 20.11.2020г. №9872/08, приложен файл.
5.2.	ПК		Документ утвержден (подписан)	25.11.2020	23.11.2020	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о создании и функционировании родительских патрулей" Отчет Администрация Правительства Кузбасса от 23.11.2020г. №И14-19/9474, приложен файл. 2. "о создании и функционировании родительских патрулей" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 20.11.2020г. №9872/08, приложен файл.
5.2.1	РПП		Создание и функционирование родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей	25.11.2020	23.11.2020	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о создании и функционировании родительских патрулей" Отчет Администрация Правительства Кузбасса от 23.11.2020г. №И14-19/9474, приложен файл. 2. "о создании и функционировании родительских патрулей" Отчет Министерство образования и науки Кузбасса от 20.11.2020г. №9872/08, приложен файл.
6.			<i>Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма</i> Значение: 1, на дату 31.12.2020	31.12.2020	30.12.2020	Балакирева С. Ю.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О приобретении 10 комплектов обучающего оборудования" Отчет Министерства образования и науки Кузбасса от 30.12.2020г. №11228/08, приложен файл. отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 0.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.			<i>В Кемеровской области – Кузбассе организации, осуществляющие работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, укомплектованы средствами обучения и наглядным учебным оборудованием Значение: 10, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	26.06.2020	Балакирева С. Ю.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о приобретении 10 комплектов оборудования" Отчет Министерства оразования и науки Кузбасса от 26.06.2020г. №4984, приложен файл. Предоставлена информация : 10 из 10.
7.1.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	15.12.2020	26.06.2020	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о приобретении 10 комплектов оборудования" Отчет Министерства образования и науки Кузбаса от 26.06.2020г. №4984/08, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек

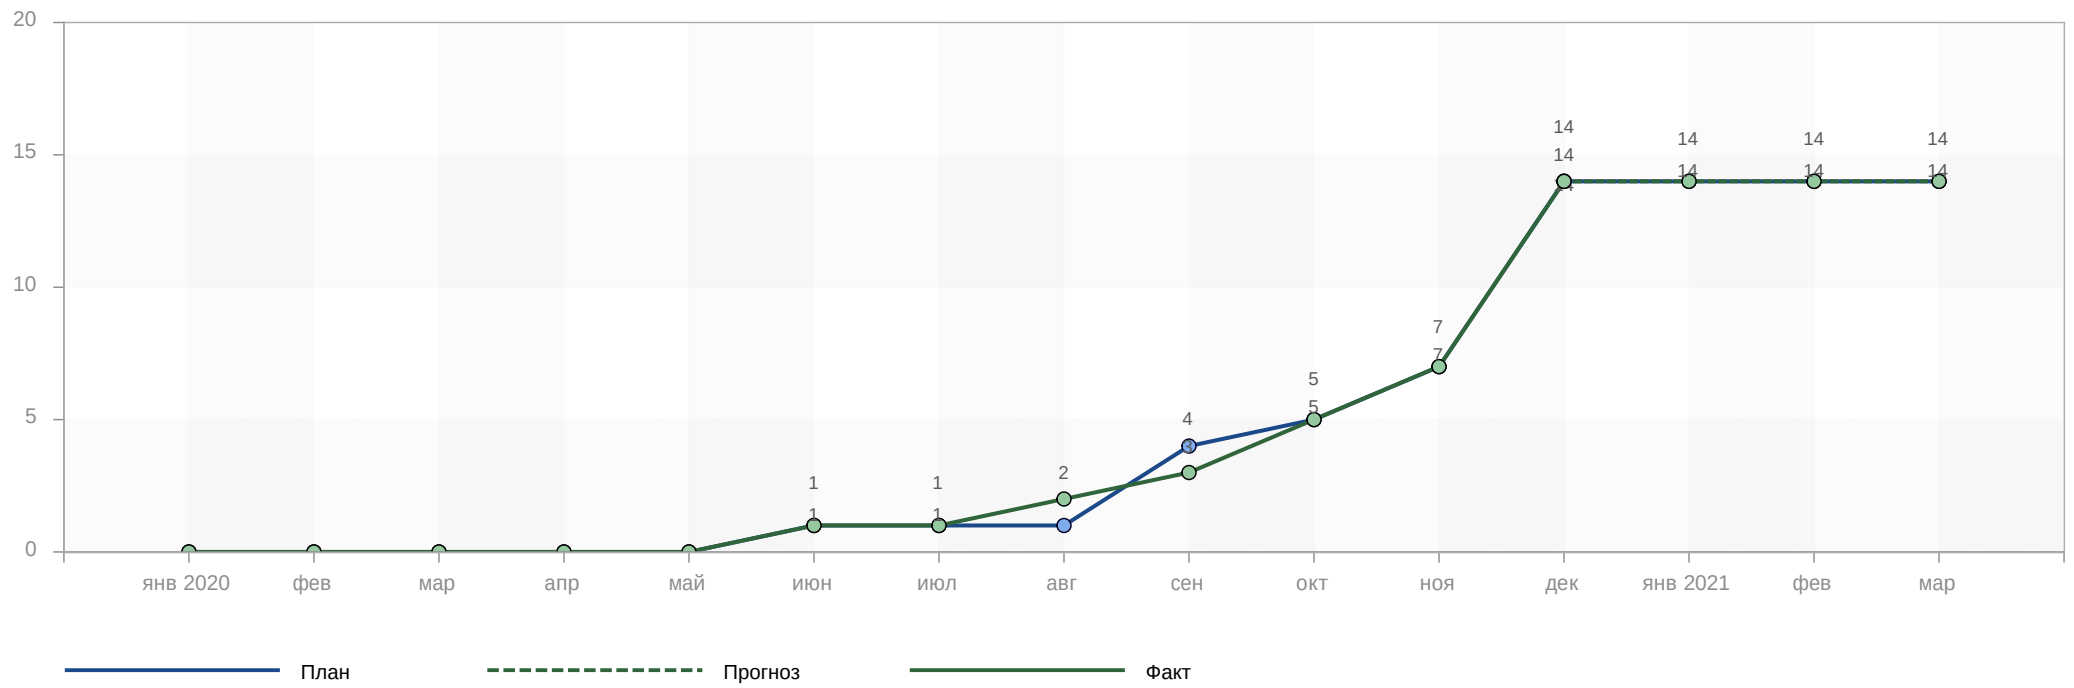


Рис. 1. "(R3-32) Безопасность дорожного движения (Кемеровская область - Кузбасс)"

График достижения показателя

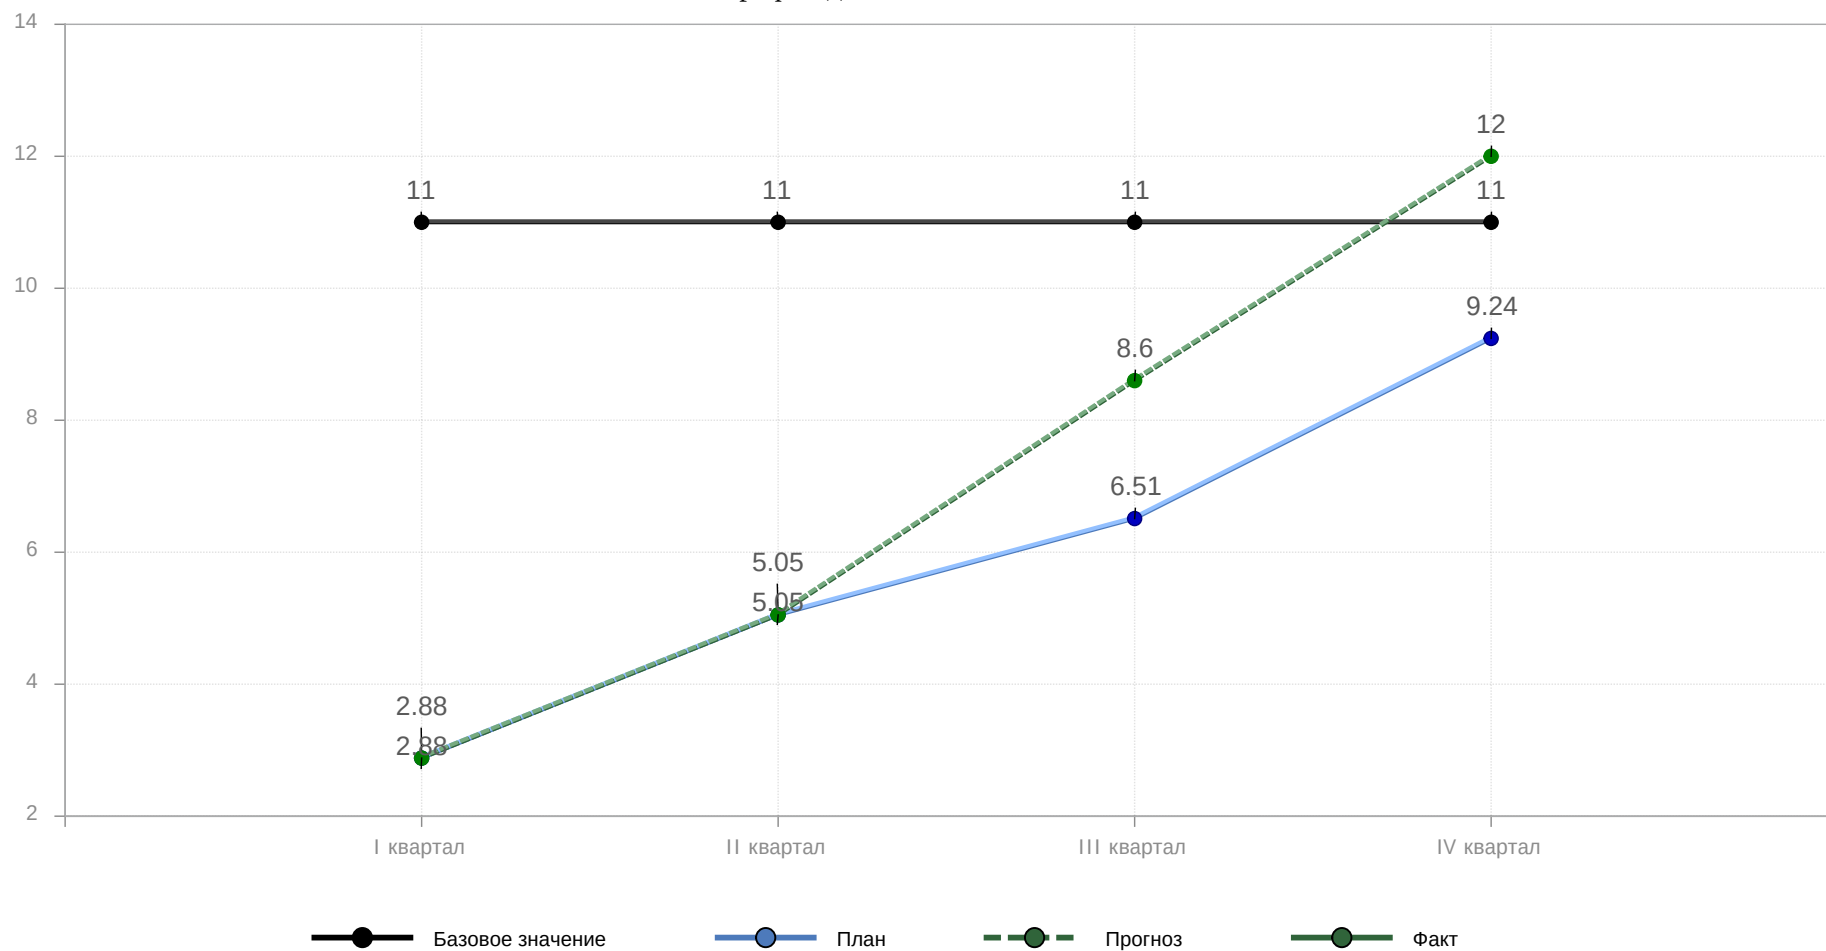


Рис. 1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тысяч населения

Диаграмма достижения показателя

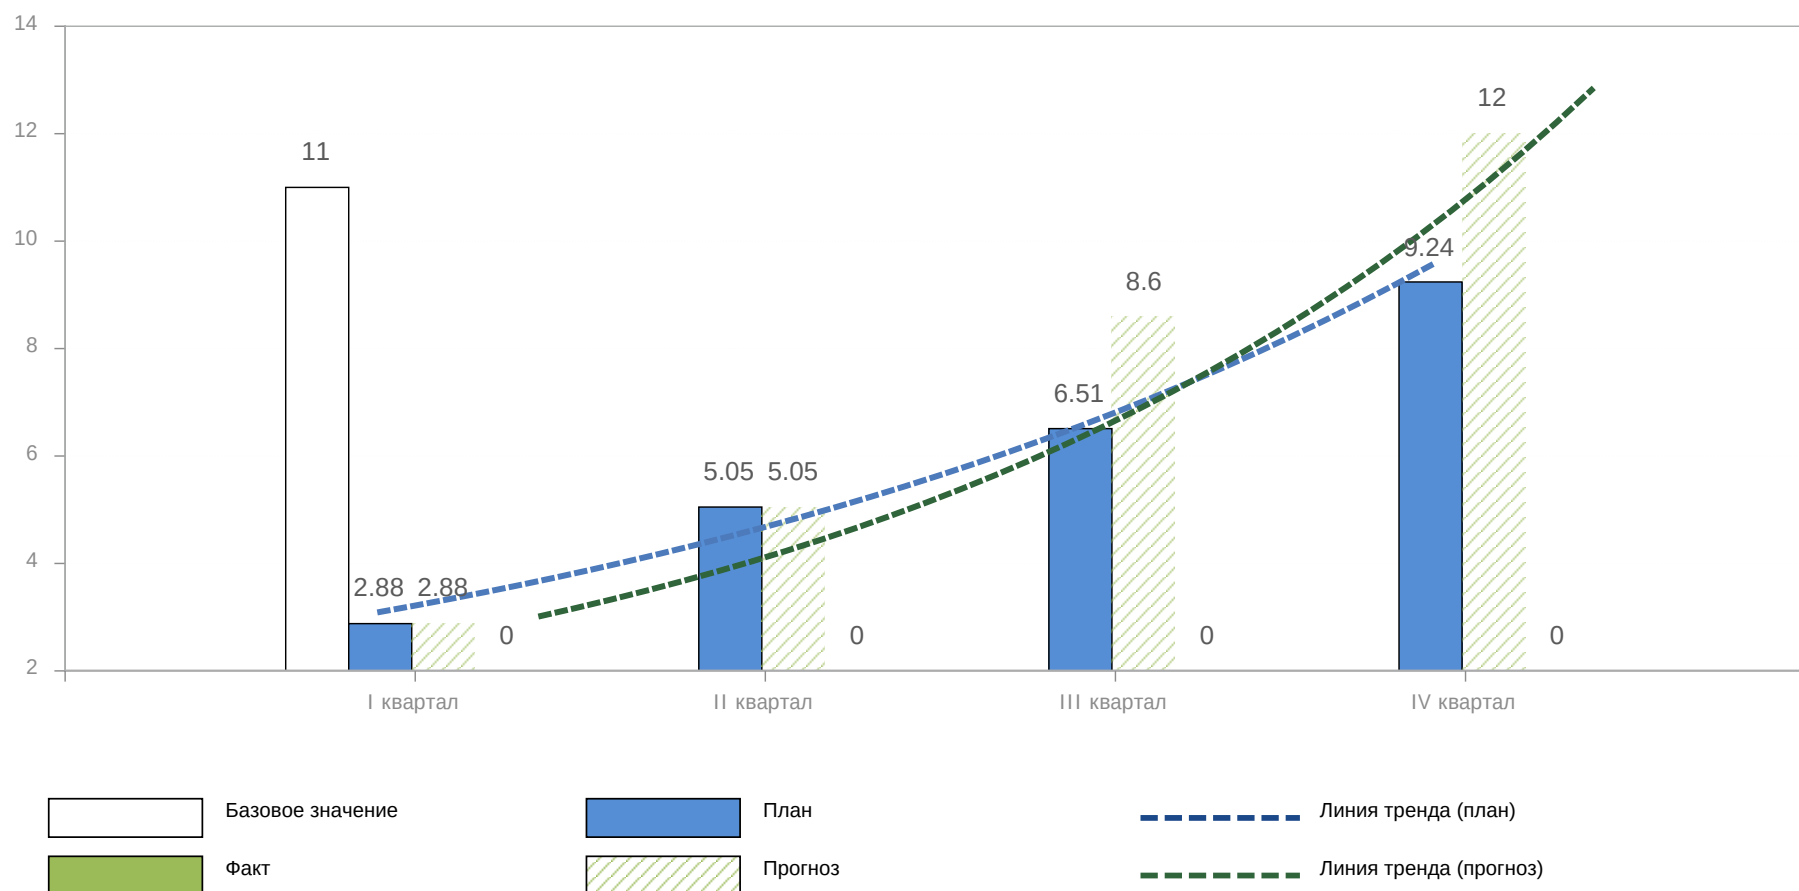


Рис. 2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тысяч населения
